

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-754/00066001/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-139

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj – BIM**
PRAGOPROJEKT, a.s.
zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.:
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

- zastoupená: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem společnosti
bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s., č. ú.
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 31260
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice – PD**“ dále jen „smlouva“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Jedná se o zpracování PD pro společné povolení (DUSP), zadání stavby (PDPS) a souvisejícího výkonu IČ k získání společného povolení při dodržení platných norem. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD). Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 1 164 000 Kč
DPH: 244 440 Kč
včetně DPH: 1 408 440 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Martin Staněk

email: _____

tel:

a

Jméno: Ing. Marek Hanuš, MPA

email: _____

tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Předpokládaná lhůta plnění:

Dokumentace pro sloučené povolení - koncept

- Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace pro sloučené povolení - čistopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro sloučené povolení od Objednatele

Podání žádosti o vydání společného povolení

- Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP

Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodloužení s plněním, jenž je sankcionována.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb

Výkon autorského dozoru

- Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby do kolaudace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na stavbě „III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice“

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Technická specifikace

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele Ing. Martin Staněk
za zhotovitele Ing. Karel Nejedlý
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Výsledky poskytnutých služeb:
- Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku

 - Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 3x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku,

 - Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě
a 1x digitálně na flash disku,

 - Dokladová část 1x v tištěné podobě
a 1x digitálně na flash disku

 - Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 1x v tištěné podobě
a 1x kopie na flash disku.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

oprávněný podepisovat jménem či v
zastoupení Společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK
Stř. kraj - BIM na základě plné moci

Technická specifikace pro vypracování projektové dokumentace

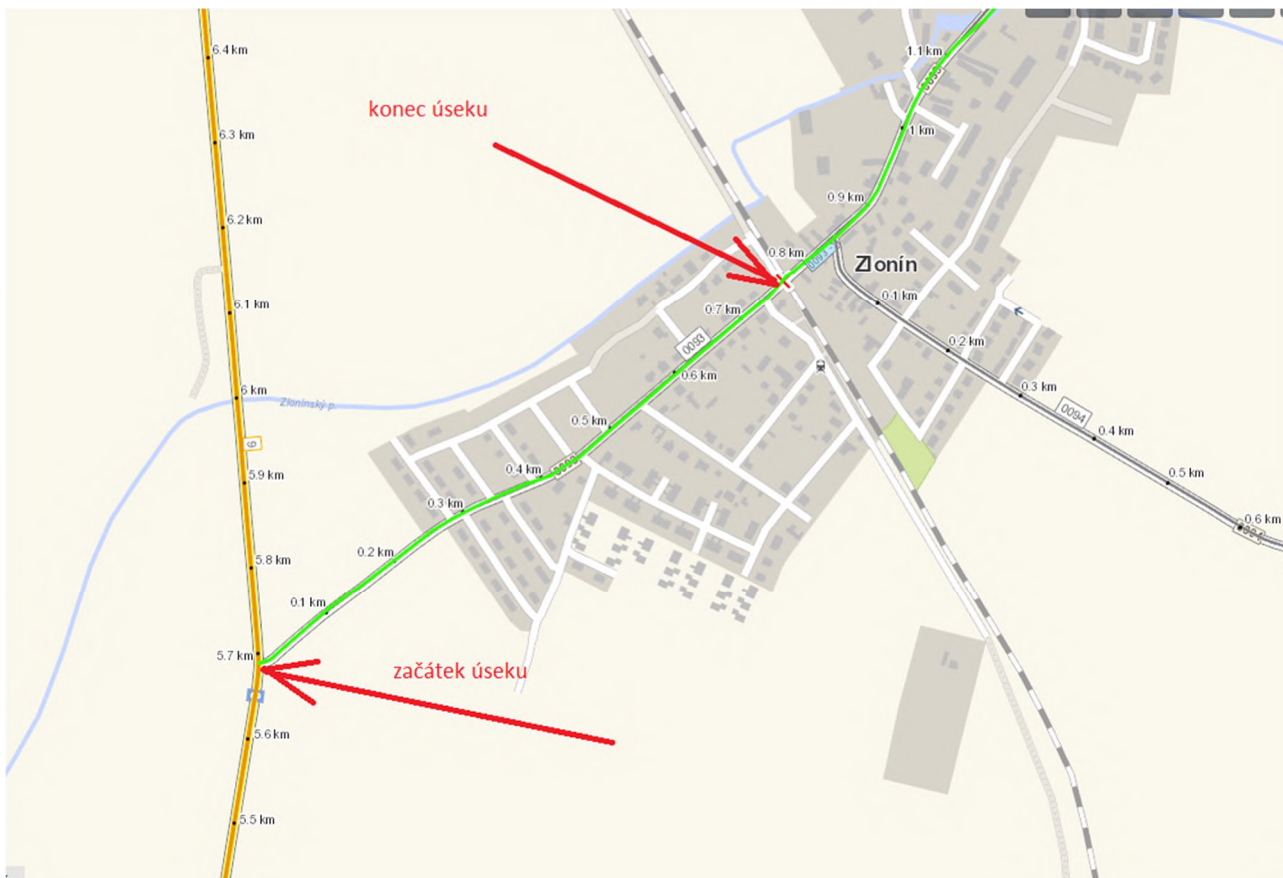

Popis akce:

1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu (stavby):

„III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice“

Staničení:

silnice III/0093 Zlonín ve staničení km 0,000 – 0,766 v obci Zlonín.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci části silnice III/0093 v obci Zlonín, staničení km 0,000 - 0,766.

Cílem PD je celková rekonstrukce silnice. Požadována je výměna všech konstrukčních vrstev, návrh celkového odvodnění komunikace, napojení sjezdů, úprava krajnic, obnova příkopů a nové

SDZ a VDZ. V případě nutnosti vybudování nové dešťové kanalizace, je takovéto navržení odvodnění komunikace součástí díla.

Požaduje se vypracování dokumentace (DÚSP + PDPS), zajištění stavebního povolení a majetkoprávní příprava akce.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Současný stav komunikace III. třídy v extravilánu a intravilánu obce Zlonín, kde se v minulosti vystavěla obytná zóna, vykazuje poruchy typické pro staré vozovky, tj. síťový rozpad, praskliny, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s vyšší intenzitou osobní i nákladní automobilové dopravy. Celý úsek je dlouhý 766 m, průměrné šíře 5,8 m. Povrch je značně nerovný po předchozích opravách a vysoké zátěži v průběhu výstavby obytné zóny ve Zloníně.

3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:

V daném úseku je požadováno projekčně připravit celkovou rekonstrukci silnice, která předpokládá výměnu všech konstrukčních vrstev s pravděpodobným zpevněním jejich podloží, návrh celkového odvodnění komunikace, napojení sjezdů, úpravu krajnic, obnovu příkopů a nové SDZ, VDZ. S výměnou obrub u komunikace se nepočítá.

Projekt je nutno koordinovat s obcí Zlonín, která bude provádět v roce 2022 výstavbu nového chodníku podél komunikace III/0093 a vznesla požadavek na vybudování přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem ve staničení km 0,470 v rámci rekonstrukce silnice III/0093. Dále je na základě požadavku vedení obce Zlonín požadováno vyřešení usměrnění dopravy ve směru od silnice č. I/9 směrem do centra obce (např. vjezdová brána, zpomalovací práh apod.).

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD, vše však výhradně na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány.

5. Územně – technické podmínky:

Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví České republiky (ŘSD), Středočeského kraje, obce Zlonín a obce Bašť.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Rekonstruovaná komunikace bude ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje. Po provedení stavby bude zajištěn odpovídající technický stav komunikace, přičemž rekonstrukcí se podstatně zlepší bezpečnost provozu a dojde i ke zlepšení výkonu letní a zimní údržby.

Zakázka obsahuje:

Průzkumy a rozbory (diagnostika konstrukce silnice, průběh inženýrských sítí apod.) vč. vyřešení přeložek inženýrských sítí, POV a DIO.

Dokumentaci pro sloučené povolení (DÚSP) nebo ohlášení stavby (DOS)
Inženýrskou činnost pro zajištění sloučeného povolení stavby (sloučeného povolení)
Zajištění vydání právoplatného povolení stavby (společného povolení)
Dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) vč. neoceněného výkazu výměr
Oceněný výkaz výměr (rozpočet)
Výkon autorského dozoru
Průzkumy a rozbory (zaměření, průběh inženýrských sítí, diagnostika apod.)

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

V celém úseku bude posouzena sanace krajnic vozovky a v případě její potřeby, bude do rozpočtu stavby uvedena položka na sanaci krajnic s čerpáním v rozsahu dle domluvy s TDS.

Předmětem díla jsou opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

V rámci plnění bude zhodnocen stávající silniční záchytný systém a bude navržena jeho případná obnova a doplnění. Dále bude v řešeném úseku silnice obnoveno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude obnoveno a doplněno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Příkopy budou pročištěny strojně na údržbu.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky dešťové kanalizace.

Termíny plnění:

Dokumentace pro sloučené povolení - koncept

- **Nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy**

Dokumentace pro sloučené povolení - čistopis

- **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro sloučené povolení od Objednatele**

Podání žádosti o vydání společného povolení

- **Nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP**

Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby do kolaudace stavby**

Předpokládané stavební náklady:

20 000 000 Kč bez DPH

Kontakty:

Ing. Marek Hanuš, MPA

Ing. Jan Fidler, DiS

Fotodokumentace

Začátek úseku (pracovní spára I/9)







Konec úseku (pracovní spára před železničním přejezdem)



Podrobná specifikace ceny

AKCE

III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice - PD

Žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému SP+UR vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
20 000 000	3,000%	1,750%	0,750%	800,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	80	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	630 000	410 000	210 000	64 000	1 314 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	600 000	350 000	150 000	64 000	1 164 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	95,24%	85,37%	71,43%	100,00%	88,58%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke společnému UR a SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice - PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	80 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	40 000,00
Potřebné průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, Diagnostický průzkum vozovek, Dopravně inženýrský průzkum a další doplňující průzkumy)	90 000,00
Průzkumy DUSP celkem	210 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	30 000,00
Souhrnné technické řešení	130 000,00
Stavební část	190 000,00
DIO	30 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	5 000,00
BOZP	5 000,00
DUSP celkem	390 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	600 000,00
IČ-zajištění vydání společného UR a SP	
projednání dokumentace	240 000,00
majetkoprávní podklady	90 000,00
podání žádosti bez poplatků	20 000,00
IČ celkem	350 000,00
PDPS	
Technická zpráva	20 000,00
Výkresová část	100 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
PDPS celkem	150 000,00
celkem bez DPH	1 100 000,00

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III/0093 Zlonín – rekonstrukce silnice - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	10	800	8 000
Cena AD celkem bez DPH	70		56 000
Celkem	80		64 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	8
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	5
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	7
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	30
celkem hodin	70
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	56 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
