

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO



KUJIP01L8M3T

1809/23

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2023/00054**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená dle pověření Ing. Miroslavem Kotem, manažerem, Výstavba a údržba fixní sítě Morava jih
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
datová schránka: qa7425t
(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina**Objednatel: Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Urbanov; Žatec na Moravě spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 25.3.2022 vydané pod čj. 562087/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II403 Urbanov JI - průtah**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **314.654,- Kč** (slovy: tři sta čtrnáct tisíc šest set padesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **35.284,- Kč** (slovy: třicet pět tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společností CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společností CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společností CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společností CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítí - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz , tel.: 238 462 454

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Houška
funkce: náměstek hejtmána
e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 126

ve věcech technických: Ing. Miroslav Dokulil
funkce: úředník na úseku investic 02
e-mail: dokulil.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 222, 734 694 517

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
 Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
 Registr smluv: ANO

- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoli platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00054
Číslo smlouvy Stavebníka: 160168

SAP S/4 Hana: 8030003993
Registr smluv: ANO

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

V Brně

Ing. Miroslav Kot
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Kot
Datum: 2023.03.16
20:55:14 +01'00'

CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
Manažer, Výstavba a údržba fixní sítě
Morava jih

Stavebník:

V Jihlavě

Ing. Miroslav Houška
Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2023.03.30 07:19:44
+02'00'

Kraj Vysočina
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Technická zpráva

Název stavby : VPIC II403 Urbanov JI - průtah

Stručný popis:

V rámci projektové dokumentace II403 Urbanov JI - průtah je navržena přeložka podpěr a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., které jsou nevhodně umístěny v ochranném pásmu komunikace.

Dotčené prvky NVSEK :

Kabel met. TCEKES20XN0,6, TCEKES10XN0,6, TCEKES3XN0,6

Technické řešení :

V úseku, kde začíná rekonstrukce komunikace od Stonařova, je potřeba přeložit stávající nadzemní trasu vedení SEK v majetku Cetin a.s. dále od osy komunikace – v polohopisu se jedná o sloupky označené čísly 1 až 3. K přeložení je použitelný pouze sloup č. 2, sloupky 1 a 3 budou nahrazeny novými podpěrami Dp7. Stávající kabel TCEKES20XN0,6 bude v tomto úseku snesen a po montáži nových sloupů, bude na tyto nově upevněn. Takto překládaná trasa bude realizována až po sloup u obecního úřadu, na kterém bude v souvislosti s řešením přeložky nadzemního vedení v zastavěné části obce (mezi OÚ a sloupovým rozvaděčem URBA42) zřízena nová hrncová spojka.

Nadzemní vedení mezi UR URBA42 a obecním úřadem bude nově vedeno po podpěrách EG.D. (viz polohopis), staré vedení k UBRA152 a dále přes OÚ směrem k nové hrncové spojce bude zdemontováno a nahrazeno novými kabely TCEKPFLES20XN0,6 a TCEKPFLES3XN0,6.

Kabely budou přeloženy dle přiloženého polohopisu a schema. Pro nové úseky budou použity kabely o stejném profilu jako překládané kabely.

Nová trasa nadzemního vedení vede částečně v souběhu stávající nadzemní vedení EG.D., na několika místech se budou tato vedení křížit, navíc dojde k novému křížení vedení nad komunikací.

ÚŘ – ANO – zajistí stavebník

PD - ANO

Geo – ANO

GP - ANO

09.03.2023


VBŘ – ANO

Zástupce investora:

Ing. Miroslav Dokulil
Oddělení investiční a správy komunikací
tel.: +420 564 602 222
mobil: +420 734 694 517
mail: Dokulil.M@kr-vysocina.cz

Projektant:

M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Datová schránka: v2rbcjz
E-mail: info@m4roaddesign.cz
Ing. ZBYNEK KARÁSEK
mobil: 777 563 315
e-mail: zbynek.karasek@m4roaddesign.cz

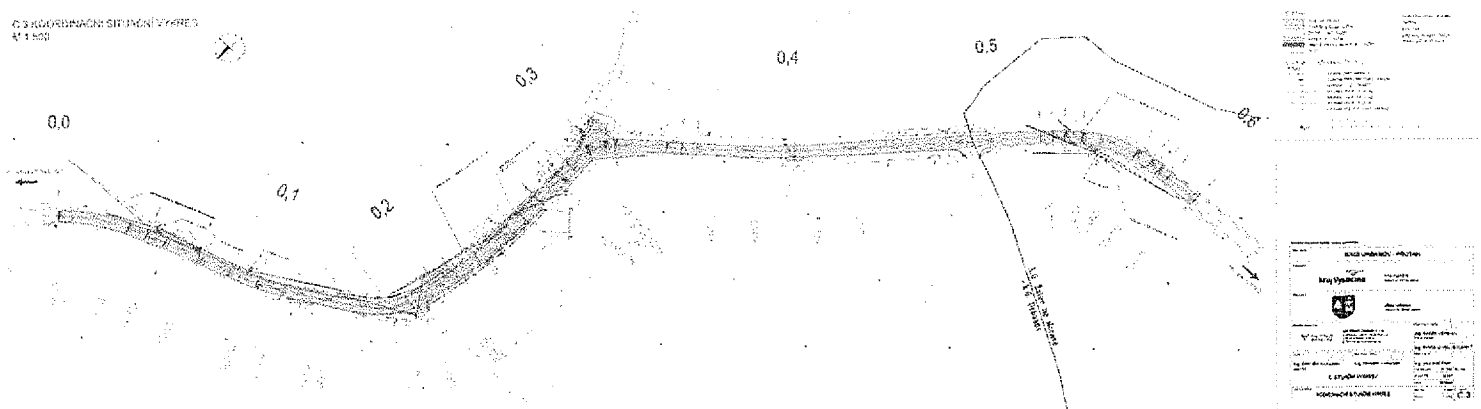

URBA43

EG.D.

544

32

(G.D.

26

EG.8.

URB A152

27

25

EG 9.

24

23

43


URBA31

[illegible]

URBA49Z


MR 3

URBA6

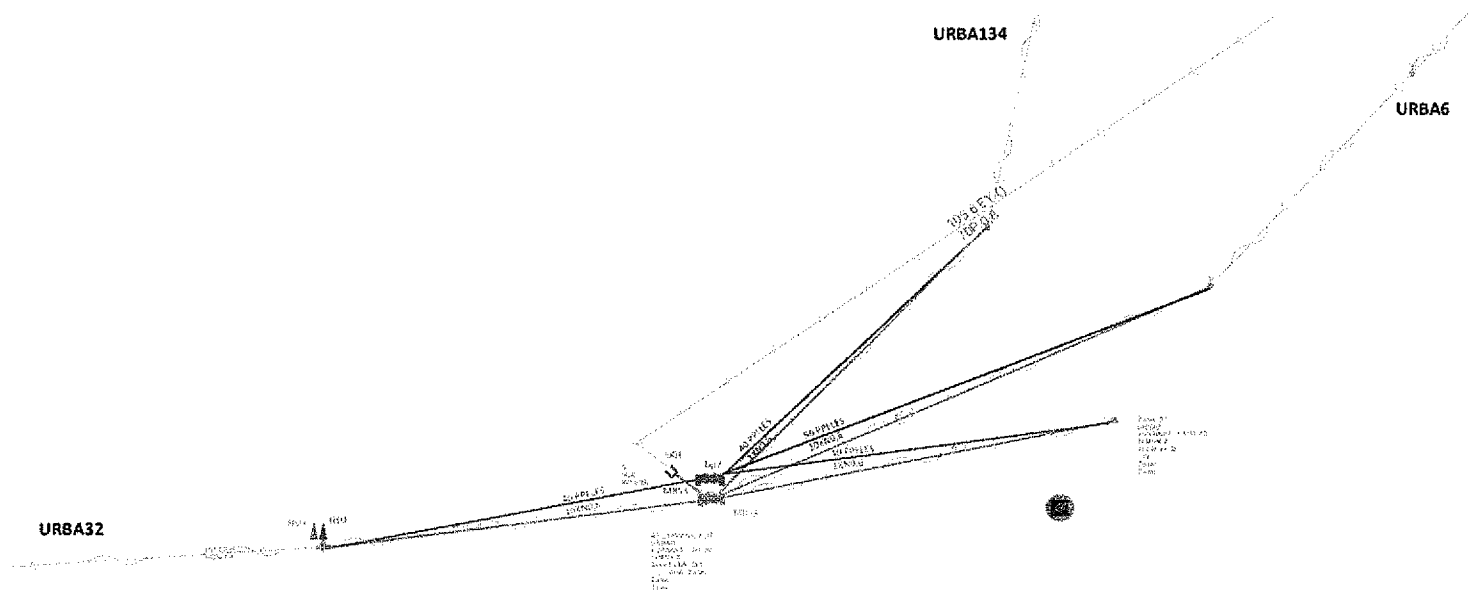

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>392/1</u> 
Obec:	<u>Urbanov</u> <u>[588067]</u> 
Katastrální území:	<u>Urbanov</u> <u>[774693]</u>
Číslo LV:	<u>45</u>
Výměra [m ²]:	703
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplošná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

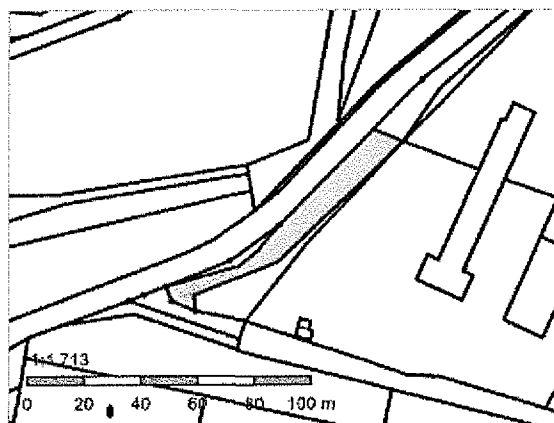

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Hrůza Zdeněk Mgr., náměstí Bratří Čapků 270, Telč-Štěpnice, 58856 Telč	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.04.2022 15:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	399/4
Obec:	Urbanov [588067]
Katastrální území:	Urbanov [774693]
Číslo LV:	69
Výměra (m ²):	165
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha

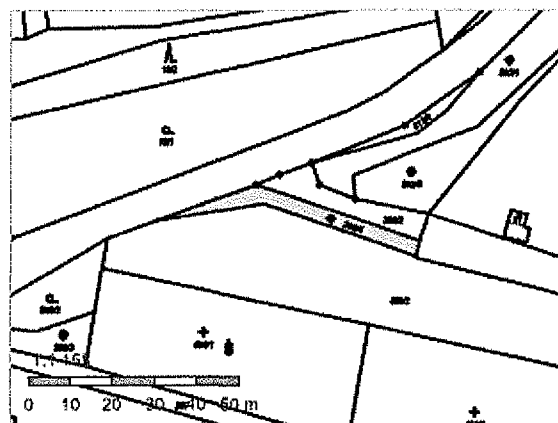

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Hrůza Zdeněk Mgr., náměstí Bratří Čapků 270, Telč-Štěpnice, 58856 Telč	1/2
Vaculčíková Libuše RNDr., Pod Jakubem 1325/13, 66491 Ivančice	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


✓ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.04.2022 15:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [403/2](#) 
Obec: [Urbanov \[588067\]](#) 
Katastrální území: [Urbanov \[774693\]](#)
Číslo LV: [75](#)
Výměra [m²]: 2277
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: manipulační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha

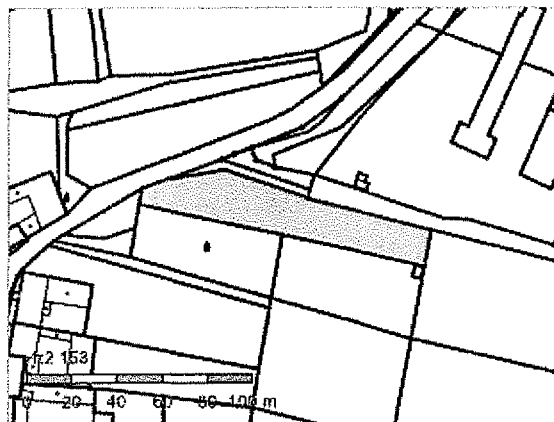

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Vaculčíková Libuše RNDr., Pod Jakubem 1325/13, 66491 Ivančice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.04.2022 15:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [809/1](#) ↗
Obec: [Urbanov \[588067\]](#) ↗
Katastrální území: [Urbanov \[774693\]](#)
Číslo LV: [10001](#)
Výměra [m²]: 4070
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: ostatní komunikace
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Urbanov, č. p. 50, 58862 Urbanov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


↗ ↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.04.2022 15:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	809/14 ↗
Obec:	Urbanov [588067] ↗
Katastrální území:	Urbanov [774693]
Číslo LV:	35
Výměra [m ²]:	108
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha

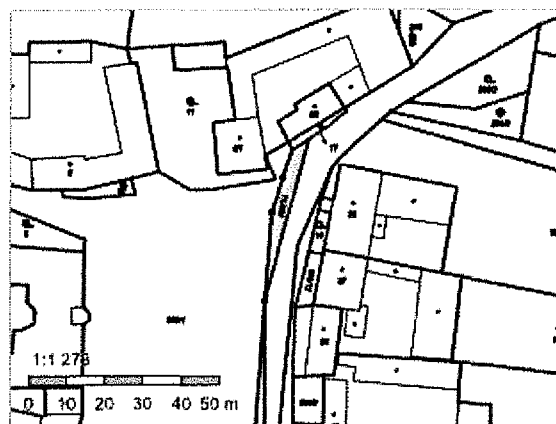

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

[↗](#) Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu](#), [Katastrální pracoviště Jihlava](#) [↗](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 24.04.2022 15:00.

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle CTN

Ceník: k VP TEMO 2021 - STAND. k 2022.12
Položková databáze: 2022.12

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

VPIC II403 Urbanov II - průtah

Roman Vlk

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	23 879,11 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	10 085,15 Kč
MONTÁŽ	140 690,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 751,41 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 404,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	31 490,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 272,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	86 080,47 Kč

Celkové náklady: 314 654,44 Kč

Číslo SAP	Seznam položek		
	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 546,95 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	18332.16 JV	18 332,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 866,63 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	4.00 m	1 550,32 Kč
952352	Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	4.00 m	434,00 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	5.00 m	2 172,40 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	10.00 m	61,80 Kč
MONTÁŽ			
955020	Demontáž dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	4 522,48 Kč
955018	Demontáž jednod.patkov.stož.se vzpěrou	2.00 ks	6 497,36 Kč
955017	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks	5 095,20 Kč
955091	Demontáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 305,68 Kč
955015	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	285.00 m	9 815,40 Kč
955016	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	235.00 m	10 676,05 Kč
956509	Demontáž samostatné konzole(háku) na stěnu	3.00 ks	744,30 Kč
955078	Demontáž spojky hrncové	1.00 ks	441,88 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	1 199,76 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	79.00 ks	3 637,16 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	79.00 ks	2 428,46 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	6.00 ks	645,84 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	30.00 ks	1 151,70 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	61,47 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 324,41 Kč
954981	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	80.00 m	3 377,60 Kč
954982	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	395.00 m	21 258,90 Kč
955285	Montáž spojky hrncové	2.00 ks	1 236,78 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 801,88 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	18600.00 JV	18 600,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	85.00 ks	2 581,45 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	4 455,90 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	6315.32 JV	6 315,32 Kč
954988	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	3.00 ks	15 741,03 Kč
954985	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	3 009,23 Kč
954989	Vystrojení na stávajících podpěrách	5.00 ks	3 135,15 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 122,78 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	85.00 ks	1 700,00 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	10.00 ks	1 839,20 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	967,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	70.00 m	1 486,10 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 265,31 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	11 404,95 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 261,03 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	10000.00 JV	10 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 535,43 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 693,98 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	2.00 ks	478,92 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	22.00 ks	947,76 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks	520,88 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	22.00 ks	1 325,28 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu		
	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	20.00 kg	1 831,80 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	1.80 kg	141,32 Kč
303394	Držák svorky SH1 na betonový stožár	5.00 ks	1 785,95 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	4.00 m	18,60 Kč
315633	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	9.00 ks	2 461,05 Kč
300175	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6	80.00 m	3 337,60 Kč
300177	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6	40.00 m	3 911,60 Kč
300179	Kabel samonosný TCEKFLES 20x4x0,6	170.00 m	23 896,90 Kč
316527	Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm	1.00 ks	51,12 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	142,50 Kč
306701	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	140,00 Kč
303174	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	231,58 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	65,42 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	6.00 ks	15 857,34 Kč
325647	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA	1.00 ks	5 687,44 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	6.00 ks	15 543,30 Kč
314750	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	2.00 ks	2 038,44 Kč
313998	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	2.00 ks	358,50 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	31,28 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	4.00 ks	172,72 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	7.00 ks	843,99 Kč
306824	Svorník M 20x370x90x25	6.00 ks	337,56 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	21.00 ks	1 236,48 Kč
309759	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	10.00 ks	713,80 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	150.00 m	483,00 Kč
302289	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	4.00 ks	977,40 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	6.00 ks	3 783,78 Kč
