

Dodatek č.1
ke
Smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
(dále jen „Smlouva“)

ev. č. město: SO/2020/ 0234

ev. č. SVS:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupené: MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátorem a
Jaroslavem Bernatem, ved. OI
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
Bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu: 19-121454/0100
Telefon: 483 357 111
„dále jen město “

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ : 49099469
DIČ: CZ49099469,
zapsaná: v OR vedené Krajským soudem v Ústí n.L. v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing.Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Teplice
č.ú.: 711620257 / 0100
„dále jen SVS“

Preambule

SVS provedla v roce 2020 realizaci své rekonstrukce sítí pod názvem „**JN 008 404 Jablonec nad Nisou, Anenské nám., Fügnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „**Stavba**“)
V rámci Stavby došlo z důvodu provádění výkopových prací k zásahu do tělesa komunikací, jejímž vlastníkem je jednak ŘSD a dále SMJN.

Statutární město Jablonec nad Nisou na základě této smlouvy **provedlo po dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Fügnerova a rekonstrukci vodovodu v části ulice U Zeleného stromu v úseku od OK k mostu obnovu finálního povrchu komunikace** v celé její šíři, tak jak vyplývalo z této smlouvy, a to včetně tomu předcházejícímu frézování. **Finální obnovu povrchu komunikace I/14 U Zeleného stromu podél Anenského náměstí k hotelu Merkur provedlo až v roce 2022**, a to z důvodů nevhodných klimatických podmínek, které neumožnily realizovat finální živičné povrchy na konci roku 2020. Na základě odkladu realizace finálních povrchů na I/14 na Anenském náměstí proto provedlo město na své náklady (po dohodě s ŘSD) na této komunikaci pouze provizorní živičné povrchy, které nejsou předmětem tohoto dodatku ani původní Smlouvy o spolupráci.

Předmět Dodatku č.1

A. Obnova povrchu komunikace I/14 U Zeleného stromu podél Anenského náměstí k hotelu Merkur, provedená v roce 2022.

1. Předmětem části A. tohoto Dodatku č.1 je stanovení skutečné výše příspěvku v souladu s odst. č. 6 smlouvy který se týká **obnovy povrchu komunikace I/14 U Zeleného stromu u Anenského náměstí, po provedené rekonstrukci vodovodu**, kde se na obnově těchto povrchů podílejí 3 investoři – SMJN, GasNet a SVS.
2. **Výše příspěvku** se tak odvíjí z příložené „Faktury 220750_zjišťovacího protokolu č.140 k zak.č.220166“, (jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku a který je v souladu s nabídkovým rozpočtem vybraného zhotovitele, jak vyplývá z odst.č.6 smlouvy) a je stanovena jako poměrná částka 1/3 z celkových nákladů 999 960,94 Kč včetně DPH, která činí **pro SVS celkem 333 320,31 Kč včetně DPH**, slovy (třistatřicettřicetřístadvacet korun českých, třicetjeden haléř).
3. Úhrada podílu SVS a.s. bude provedena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma stranami.

B. Obnovy povrchů komunikací v ul. Fügnerova a části ul. U Zeleného stromu v úseku od OK k mostu, provedené v roce 2020.

1. Předmětem části B. tohoto Dodatku č.1 je vypořádání obnovy finálního povrchu komunikace v ulici Fügnerova a části ulice U Zeleného stromu v úseku od OK k mostu, po SVS provedené rekonstrukci kanalizace a vodovodu, kde se žádní další investoři v koordinaci s touto stavbou SVS nevyskytovali.
2. **Výše příspěvku za provedené frézování** se tak rovná výši fakturace uhrazené městem dodavateli této akce, společnosti TSJ, která:
 - i) dle „Faktury 200812_zjišťovací protokol č.203 k zak.č.244“, (jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku) činí **128 466,- Kč včetně DPH**, slovy (stodvacetosmtisícčtyřistašedesátšest korun českých) za ulici Fügnerovu.
 - ii) dle „Faktury 201003_zjišťovací protokol č.274 k zak.č.244“, (jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku) činí **91 724,- Kč včetně DPH**, slovy (devadesátjedntisícsešmdsetdvacetčtyři koruny české) za část ulice U Zeleného stromu.
3. **Výše příspěvku za provedené finální asfalty** se tak rovná výši fakturace uhrazené městem dodavateli této akce, společnosti TSJ, která dle „Faktury 201004_zjišťovací protokol č.203 k zak.č.275“ (jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku) činí **320 750,- Kč včetně DPH**, slovy (třistadvacetisícsešmdsetpadesát korun českých) za ulici Fügnerovu a za část ulice U Zeleného stromu.
4. **Celková výše úhrady** tak v součtu činí **540 940,- Kč včetně DPH**, slovy (čtyřistačtyřicetdevětticdvěstěšestnáct korun českých).
5. Úhrada této částky společností SVS a.s. bude provedena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma stranami.

C. Celková výše příspěvku SVS dle bodu A a B je celkem 874 260,31 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti nezměněny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý účastník dohody obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. SVS a.s. prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“). Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní Město Jablonec nad Nisou, smluvní strana vymezená § 2 a § 3 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále též „povinný subjekt“). Pokud tato povinnost není povinným subjektem splněna v přiměřené době, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, nese povinný subjekt odpovědnost za škodu, způsobenou takovým jednáním/nekonáním. Náhrada škody může být druhou smluvní stranou požadována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství.
5. Město zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č.1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit dle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců SVS a.s., jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
6. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text tohoto Dodatku č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy. Fyzické osoby, které tento Dodatek č.1 uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku č.1.

Tento právní úkon schválila Rada města Jablonec nad Nisou na svém zasedání dne 13.3.2023 pod číslem usnesení RM/117/2023.

Přílohy: Původní Smlouva o spolupráci SVS_povrchy u Zeleného Stromu a Fügnerova_2020
Situace_obnova asfalty U Zel. Stromu Fügnerova 2020 a I/12 U Zel. Stromu 2022
Fa 220750_protok č.140 k zak.č.220166_finální asfalty U Zeleného Stromu_2022
Fa 201003_protok č.274 k zak.č.244_frézování u Zeleného Stromu_2020
Fa 200812_protok č.203 k zak.č.244_frézování Fügnerova_2020
Fa 201004_protok č.203 k zak.č.275_finální asfalty Fügnerova a U Zel. Stromu_2020

V Teplicích dne:

V Jablonci nad Nisou dne:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

MgA. Jakub Chuchlík,
náměstek primátora



Jaroslav Bernat
vedoucí OI

.....
za věcnou správnost
Ing. Pavel Sluka – vedoucí OPRI

Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby (dále jen „Smlouva“)

ev. č. město: SO/2020/ 0234

ev. č. SVS:

Statutární město Jablonec nad Nisou

zastoupené: Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a
Ing. Otakarem Kyprou, vedoucím odboru územního
a hospodářského rozvoje
Se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
č.ú.: 121451/0100

„dále jen město“

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ : 49099469
DIČ: CZ49099469,
zapsaná: v OR vedené Krajským soudem v Ústí n.L. v oddílu B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Teplice
č.ú.: 711620257 / 0100

„dále jen SVS“

1. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů stavby „JN 008 404 Jablonec nad Nisou, Anenské nám., Fügnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „Stavba“). Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude provedena obnova povrchů komunikace, jejímž investorem bude město.
3. Město, v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajistí výběrové řízení na zhotovitele nových povrchů komunikace, uzavře svým jménem a na své náklady smlouvu o dílo se zhotovitelem a časově a věcně bude koordinovat všechny práce na staveništi. SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad - potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.
4. V Jablonci nad Nisou v ulici U Zeleného stromu, Budovatelů a Fügnerova bude v roce 2020 realizována „Stavba“, jejímž investorem bude SVS.

Zásyp výkopu v MK III.tř. ulice Fügnerova (od křižovatky s ul. Budovatelů po most přes Lužickou Nisu) pro inženýrskou síť (dále jen „IS“) bude proveden dle příslušných ČSN a konstrukční vrstvy komunikace budou provedeny dle platných Technických podmínek města Jablonec nad Nisou schválených RM (RM/22/2018) a platných v době provádění stavebního zásahu do komunikace.

Zásyp rýhy ve výkopu bude proveden šterkovým materiálem frakce 32-63 mm v tloušťce 300 mm a materiálem frakce 0-18mm v tl.150 mm. Následně SVS v rámci své akce zajistí položení spodní konstrukční vrstvy vozovky z ACO 16 (11) v tl. 50-70mm v rozsahu a kvalitě dle TP města.

Město v požadovaném rozsahu zajistí před zahájením stavby SVS provedení obrusu obrusné vrstvy a po realizaci stavby SVS zajistí město pokládku nové finální vrstvy ACO 11 tl.50-70mm vč. postřiku živичného spojovacího s asfaltovou emulzí 0,30 kg/m².

Zásyp výkopu a provedení spodní konstrukční vrstvy v silnici I.tř. (I/14) provede SVS dle TP 146 (ŘSD).

Rozsah těchto úprav vychází ze zápisu z jednání dne 4.12. 2019 a 23.1.2020 a především z vytvořené situace obnovy povrchů (C.4), která je přílohou této Smlouvy. Podíl SVS z celkové výměry obnov povrchů stavby vychází na 1.128,83 m².

Pokud v době výstavby bude rozhodnuto jinak, bude řešeno po vzájemné dohodě individuálně.

5. Na základě koordinačního jednání zástupců města a společnosti SVS a.s. v roce 2019 a 2020 bylo dohodnuto zajištění financování úprav komunikací před a po ukončení „stavby“ SVS (viz bod č. 2 smlouvy). Město se zavazuje finančně uhradit náklady na obrus a obnovu povrchu komunikace před a po provedené realizaci „Stavby“.
6. Společnost SVS a.s. se zavazuje uhradit městu příspěvek na obrus a obnovu povrchů komunikací, a to v rozsahu a uvedených podílů na nákladech, které byly dojednány na koordinačních jednáních ve dnech 4.12.2019 a 23.1.2020, a které byly zhmotněny do situace obnovy povrchů (C.4), která je přílohou této Smlouvy. Skutečná výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této smlouvě. Úhrada podílu SVS a.s. bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby mezi investorem výše uvedené stavby a vlastníkem komunikace.
7. V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku SVS a.s., který je stanoven v odstavci 6. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS a.s. Znění (v tomto odstavci) o navýšení ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací se však nevztahuje na náklady za provedení prací v ul. Fügnerova, kde probíhá samostatná Stavba SVS.
8. Vodovod a kanalizace, která je předmětem Smlouvy dle odstavce 2., je ve výhradním vlastnictví společnost SVS a.s.
9. SVS a.s. se zavazuje provést a uhradit rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně provedení zásypu výkopu ve skladbě dle čl. 4 této smlouvy v celé šířce a délce výkopu stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
10. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem povrchu komunikace bude město.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv:

- a) V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č.340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- b) Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- c) Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- d) V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v „Závěrečném ustanovení“ platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- e) K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- 12.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
- 12.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
- 12.1.3 ochrana majetku a osob správce;
- 12.1.4 ochrana právních nároků správce;
- 12.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
- 12.1.6 plnění zákonných povinností správce.

12.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- 12.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.1 výše);
- 12.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 12.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 12.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 12.1.5 výše);
- 12.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše).

12.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

12.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

- 12.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
- 12.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
- 12.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
- 12.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

- 12.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- 12.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
- 12.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení:

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dle zveřejnění v registru smluv. Pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.2 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku.
- 13.3 Smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 13.5 Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 13.6 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento právní úkon schválila Rada města Jablonec nad Nisou na svém zasedání dne 18.6.2020 pod číslem usnesení RM/285/2020.

V Teplicích dne:

V Jablonci nad Nisou dne:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(14)

Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora



Ing. Otakar Kypťáček
vedoucí OÚaHR

.....
za věcnou správnost
Ing. Pavel Sluka – ved. odd. investiční výstavby

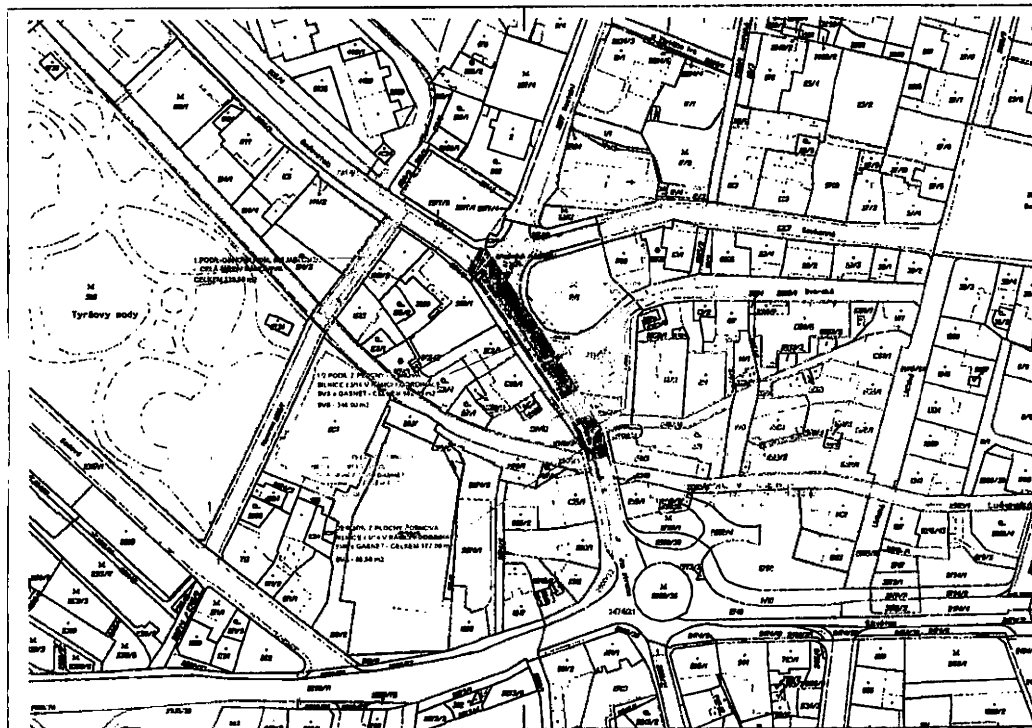

LEGENDA


- KANALIZAČNÍ STOKY – REKONSTRUKCE
- VODOVODNÍ ŘADY – REKONSTRUKCE
- OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE ŘSD (INVESTICE SVS, s.n. – 317,50 m²)
- OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE ŘSD (INVESTICE SVS, GASNET, SBAJ – CELKEM 82,0 m²) (SVS, s.n. – 27,33 m²)
- OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE ŘSD (INVESTICE SVS, GASNET – CELKEM 669,0 m²) (SVS, s.n. – 434,50 m²)
- NTL PLYNOVOD – REKONSTRUKCE (NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD)
- STL PLYNOVOD – REKONSTRUKCE (NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD)
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD)
- OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE MĚSTA JABLONEC (INVESTICE SBAJ-REALIZACE 2022 – NENÍ SOUČÁSTÍ TETO PD)

K.Š. JABLONEC nad Hrubou
SOUDNOSTVÝ SYSTÉM JTM
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALI P.V.



SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE			OTVÁR PROJEKTU	
AKČOVÁ SPOLEČNOST			SLADOVSKÁ 1982	
PROJEKT			463 11 LIBEREC – VRASTELAVICE	
VÝPOČETNÍ KATEGORIE	PODPÍŠKOVÝ PROJEKT	KLASIFIKACE PROJEKTU	OBECNOST	TERENNÍ ÚSTRAHA
III/1	SVS, s.n.	III/1	LIBEREC	III/1
10 01 KANALIZAČNÍ STOKA			III/1	III/1
10 02 VODOVODNÍ ŘADY			III/1	III/1
OBNOVA POVRCHU			III/1	III/1
SITUACE			III/1	III/1
JABLONEC nad Hrubou, Městská část, PŘÍRODA			III/1	III/1
REKONSTRUKCE VODOVODNÍ A KANALIZACE			III/1	III/1
1:1000			III/1	III/1
C.4			III/1	III/1

Schéma rozsahů a účastníků na obnově povrchů 2020 a 2022

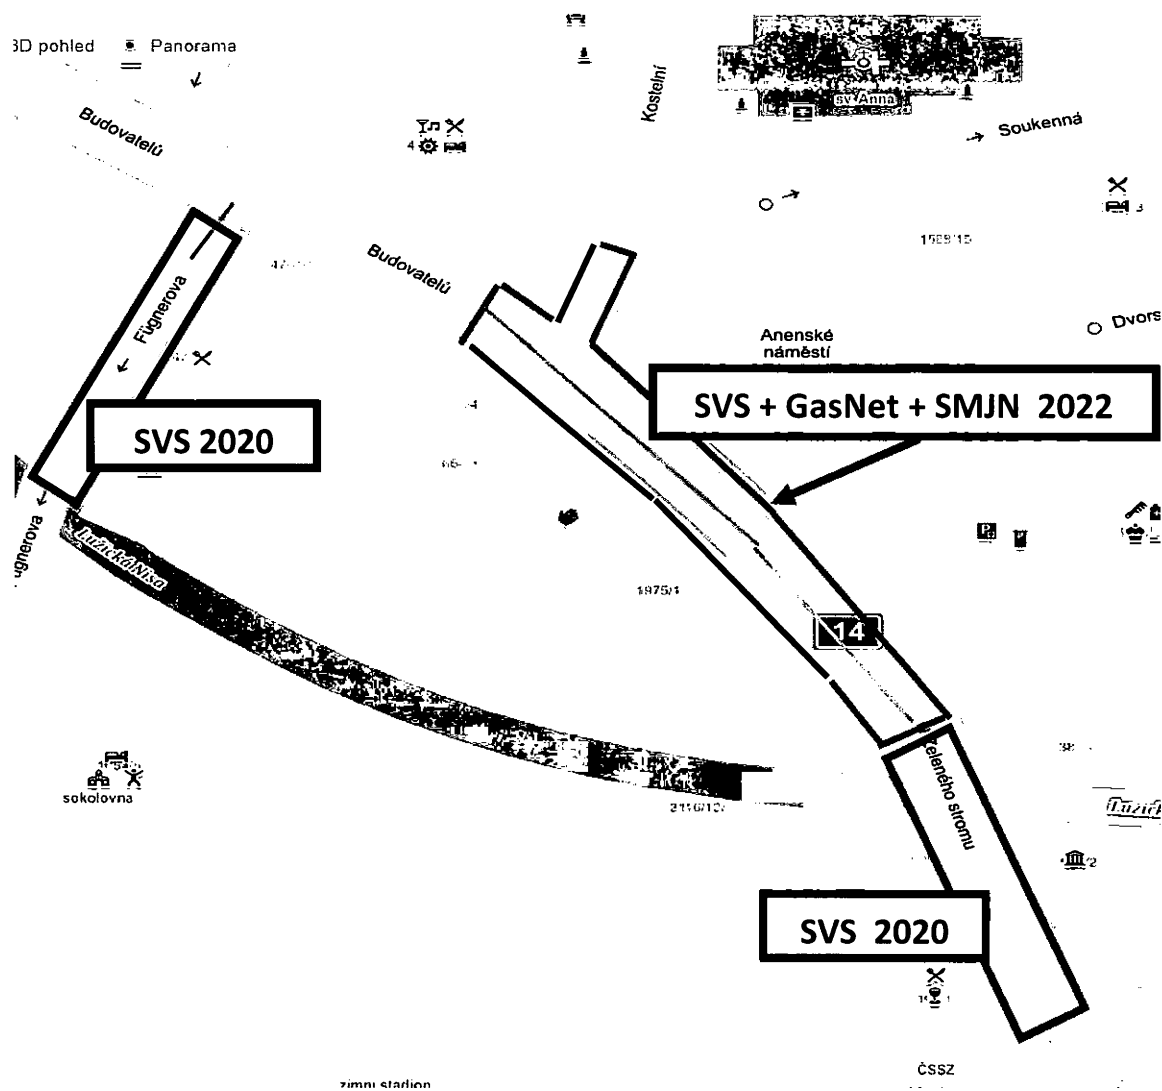

Faktura

Daňový doklad číslo: 220750

Dodavatel:

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7

466 01 Jablonec nad Nisou 1

Česká republika

Bankovní spojení: 27-633560227/0100
CZ02 0100 0000 2706 3356 0227

IČ: 25475509 DIČ: CZ25475509

tel.: 483 369 911

e-mail:

Datum splatnosti: 13.10.22

Forma úhrady: převodním příkazem

Datum vystavení: 29.09.22

Datum zdanitelného plnění: 26.09.22


Číslo objednávky: SD/2022/0746

Dodací podmínky:

Vystavil: Michaela Dostálová

tel.: 775 790 301

e-mail:



Variabilní symbol:

220750

Konstantní symbol:

0308

Příjemce:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou 1

Odběratel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou 1

IČ: 00262340 DIČ: CZ00262340

Místo určení:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 19

466 01 Jablonec nad Nisou 1

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. SD/2022/0746 za obnovu živičného povrchu po IS - I/14, ul. U Zeleného stromu.

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Za předmět (bez DPH)	Srážky	Sazba	DPH	Celkem
1. obnova živičného povrchu		1.000		826 414.00	0.00	21%	173 546.94	999 960.94



QR Platba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	826 414.00	21 %	173 546.94	999 960.94
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				999 960.94

Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení ve výši 0.03% za každý den prodlení.
Při platbě použijte číslo daňového dokladu jako var. symbol platby.

SOUHLASÍM 11.10. 2022
KORELY

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem C 19806 dne 25.09.2003 u Krajského soudu KS v Ústí n. Labem.



Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou
T 483 369 911 www.tsj.cz

ZJIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 140

AKCE

Obnova živičného povrchu po IS - I/14,
ul. U Zeleného stromu, Jablonec nad Nisou
dle CN č. KO/068/2022

ZAKÁZKA

objednávka č.
smlouva č.

220166

SD/2022/0746

ZHOTOVITEL

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Souběžná 2349/7
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 75 509, DIČ: CZ254 75 509

OBJEDNATEL

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Jan

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A ODSOUHLASENÉ ÚDAJE:

ČP	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.	1. Část - pravá strana komunikace				
1..1.	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	35,20	2060,00	72 512,00
1..2.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	704,00	17,00	11 968,00
1..3.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	704,00	27,00	19 008,00
1..4.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	20,00	115,00	2 300,00
1..5.	OPRAVA TRHLIN - TYP A profrezování trhlin, vyčištění, zalití asf. modifikov.	M	125,00	99,00	12 375,00
1..6.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ + ruční dobourání ACO	KUS	5,00	2090,00	10 450,00
1..7.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+; 11S TL. 50MM	M2	704,00	484,00	340 736,00
1.	1. Část - pravá strana komunikace				469 349,00
2.	2. Část - levá strana komunikace				
2..1.	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	23,25	2060,00	47 895,00
2..2.	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	465,00	17,00	7 905,00
2..3.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	465,00	27,00	12 555,00
2..4.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	20,00	115,00	2 300,00
2..5.	OPRAVA TRHLIN - TYP A profrezování trhlin, vyčištění, zalití asf. modifikov.	M	125,00	99,00	12 375,00
2..6.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ + ruční dobourání ACO	KUS	5,00	2090,00	10 450,00
2..7.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	465,00	484,00	225 060,00
2.	2. Část - levá strana komunikace				318 540,00
3.	3. Vodorovné dopravní značení				
3.1.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, BARVA BÍLÁ, OBNOVA STÁVAJÍCÍ	M2	115,00	335,00	38 525,00
3.	3. Vodorovné dopravní značení				38 525,00

Celkem bez DPH	826 414,00 Kč
DPH 21 %	173 546,94 Kč
Celkem s DPH	999 960,94 Kč

PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole odpovídá provedené skutečnosti.
Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel přijímá dílo bez výhrad.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců

POZNÁMKA:



MUJNP012Q3QT

Faktura

Daňový doklad číslo: 201003

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7 466 01 Jablonec nad Nisou 1 Česká republika Bankovní spojení: 27-633560227/0100 CZ02 0100 0000 2706 3356 0227 IČ: 25475509 DIČ: CZ25475509 tel.: 483 369 911 e-mail: [redacted]		Variabilní symbol: 201003 Konstantní symbol: 0308 Příjemce: [redacted] Statutární město Jablonec nad Nisou Odbor územního a hospodářského rozvoje - OÚaHR Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou
Datum splatnosti: 27.11.20 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 13.11.20 Datum zdanitelného plnění: 30.10.20 Číslo objednávky: SD/2020/0580 Dodací podmínka: Vystavit: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]		Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou IČ: 00262340 DIČ: CZ00262340 Město uhraní: Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. SD/2020/0580 za provedení odfrézování obrusné vrstvy vozovek.

Název	Cena za jednotku	Množství	Mj	Základ (bez DPH)	Sazba	Sazba	DPH	Celkem
1. odfrézování obrusné vrstvy vozovek		1.000		75 820.00	0.00	21%	15 922.20	91 742.20



QR Plátba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	75 820.00	21 %	15 922.20	91 742.20
Zaokrouhlení:				-0.20
Zaokrouhleno:				91 742.00
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				91 742.00

[redacted]
[redacted][redacted] služby
[redacted]
[redacted]



Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

483 369 911 www.tsj.cz

ZIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 274

244

AKCE

Frézování asfaltů

Místo:

ul. U Zeleného Stromu, Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 2349/7

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ254 75 509

z [redacted] a [redacted]

ZAKÁZKA

objednávka č.

smlouva č.

SD/2020/0580

OBJEDNATEL

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340, DIČ: CZ00262340

[redacted]

[redacted]

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ A ODSOUHLASENÉ ÚDAJE:

č.	položka	Mj.	počet Mj.	cena Mj.	cena celk.
1	asfaltobetonové povrchy komunikací:				
	frézování vozovek asfaltových plochy	m3	10,72	2 740,00	29 572,80
	odvoz asf.drti	m3	10,72	380,00	3 859,20
	likvidace asf.drti	t	27,30	1 580,00	42 688,00

Celkem bez DPH	76 820 Kč
DPH 21 %	16 922 Kč
Celkem s DPH	91 742 Kč

PROHLÁŠENÍ:

Podpisání prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole odpovídá provedené skutečnosti.

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel přijímá dílo bez výhrad.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců

POZNÁMKA:

29.8.2020
[redacted]

PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST:
(PROSÍME ZÁSKRTNĚTE)

ANO
☐

NE
☒

1309



MUJNP012Q2H9


Faktura

Daňový doklad číslo: 200812

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7 466 01 Jablonec nad Nisou 1 Česká republika Bankovní spojení: 27 833560227/0100 CZ02 0100 0000 2706 3356 0227 IČ: 25475509 DIČ: CZ25475509		Variabilní symbol: 200812 Konstantní symbol: 0308 Příjemce: Statutární město Jablonec nad Nisou Odbor územního a hospodářského rozvoje - OÚaHR Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou Datum splatnosti: 14.10.20 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 30.09.20 Datum zdanitelného plnění: 25.09.20 Číslo objednávky: SD/2020/0580 Dodací podmínka: Vystavil: tel.: e-mail:
Datum splatnosti: 14.10.20 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 30.09.20 Datum zdanitelného plnění: 25.09.20 Číslo objednávky: SD/2020/0580 Dodací podmínka: Vystavil: tel.: e-mail:		Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou IČ: 00262340 DIČ: CZ00262340 Místo určení: Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. SD/2020/0580 za odfrézování obrusné vrstvy vozovek v části ulice Fügnerova, v ulici U Zeleného stromu a části křižovatky u hotelu Merkur a Anenské náměstí.

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Základ (bez DPH)	Sazba	Sazba	DPH	Celkem
1. odfrézování obrusné vrstvy vozovek	106 170.25	1.000		106 170.25	0.00	21 %	22 295.75	128 466.00



QR Platba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	106 170.25	21 %	22 295.75	128 466.00
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				128 466.00

Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení ve výši 0.03% za každý den prodlení.
 Při platbě použijte číslo daňového dokladu jako var. symbol platby.

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem C 19806 dne 25.09.2003 u Krajského soudu KS v Ústí n. Labem.



Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

☎ 483 369 911 www.tsj.cz

ZJIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 203

244

AKCE

Frézování asfaltů

Místo:

ul. Fügnerova, Jablonec nad Nisou

ZHOTOVITEL

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 2349/7

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ254 75 509

zastoupený: Stanislav Havelka

ZAKÁZKA

objednávka č.

smlouva č.

SD/2020/0580

OBJEDNATEL

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340, DIČ: CZ00262340

zastoupený: Ing. Luboš Kousal

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A ODSOUHLASENÉ ÚDAJE:

č.	položka	Mj.	počet Mj.	cena Mj.	cena celk.
1	asfaltobetonové povrchy komunikací:				
	frézování vozovek asfaltových plochy	m3	16,00	2 740,00	41 100,00
	odvoz asf.drti	m3	15,00	360,00	5 400,00
	likvidace asf.drti	t	38,25	1 560,00	59 870,00

Celkem bez DPH	106 170 Kč
DPH 21 %	22 296 Kč
Celkem s DPH	128 466 Kč

PROHLÁŠENÍ:

Podpisuji prohlašuji, že objem prací uvedených v tomto protokole odpovídá provedené skutečnosti.

Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel přijímá dílo bez výhrad.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců

POZNÁMKA:

3. 6. 2020

PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST:
(PROSÍME ZAŠKRTNĚTE)

ANO

☐

NE

☒



MUJNP012Q3PY

Faktura

Daňový doklad číslo: 201004

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Souběžná 7 486 01 Jablonec nad Nisou 1 Česká republika Bankovní spojení: 27-8335802270100 CZ02 0100 0000 2706 3356 0227 IČ: 25475509 DIČ: CZ25475509 tel.: 483 369 911	Variabilní symbol: 201004 Konstantní symbol: 0308 Příjemce: Statutární město Jablonec nad Nisou Odbor územního a hospodářského rozvoje - OÚaHR Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou IČ: 00262340 DIČ: CZ00262340 Město Ústí nad Labem: Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou
Datum splatnosti: 27.11.20 Forma úhrady: převodním příkazem Datum vystavení: 13.11.20 Datum zdanitelného plnění: 30.10.20 Číslo objednávky: SD/2020/0615 Dodací podmínka:	

Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. SD/2020/0615 za provedení pokládky asfaltů.

Název	Cena za jednotku	Množství	MJ	Základ (bez DPH)	Sazba	Sazba	DPH	Celkem
1. provedení pokládky asfaltů		1.000		265 083.00	0.00	21 %	55 687.43	320 750.43



QR Platba

	Základ	Sazba	DPH	Celkem
Celkem daňový doklad:	265 083.00	21 %	55 687.43	320 750.43
Zaokrouhlení:				-0.43
Zaokrouhleno:				320 750.00
Uhrazeno:				0.00
K úhradě v Kč:				320 750.00

Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti účtujeme úroky z prodlení ve výši 0.03% za každý den prodlení.
Při platbě použijte číslo daňového dokladu jako var. symbol platby.

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem C 19806 dne 25.09.2003 u Krajského soudu KS v Ústí n. Labem.



Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou

☎ 483 369 911 www.tsj.cz

ZJIŠŤOVACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 203

275

AKCE

Pokládka asfaltů dle CN č. KO/133/2020

Místo:

ul. U Zeleného Stromu, Fügnerova

ZHOTOVITEL

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Souběžná 2349/7

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 254 75 509, DIČ: CZ254 75 509

ZAKÁZKA

objednávka č.

smlouva č.

SD/2020/0615

OBJEDNATEL

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19

466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340, DIČ: CZ00262340

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A ODSOUHLASENÉ ÚDAJE:

č.	popis práce	Mj.	počet Mj.	cena Mj.	cena celk.
1	asfaltobetonové povrchy komunikací:				
	ruční dobourávání, řezání, DIO	hod	6,00	1 420,00	7 100,00
	spojovací posádky živý (500 - 800 m2)	m2	668,00	24,00	13 584,00
	očistění asfaltových vozovek metaním	m2	668,00	9,00	5 548,80
	strojní pokládka ACO velkoplošná tl. 5 cm (od 800 m2)	m2	668,00	422,00	238 852,00

Celkem bez DPH	265 083 Kč
DPH 21 %	55 667 Kč
Celkem s DPH	320 760 Kč

PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašují, že objem prací uvedených v tomto protokole odpovídá provedené skutečnosti.
Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel přijímá dílo bez výhrad.

ZÁRUČNÍ DOBA:

24 měsíců

POZNÁMKA:

ul. Fügnerova, celá - 268 m2

ul. U Zeleného Stromu, 1. etapa od OK k mostu - 298 m2

PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST:
(PROSÍME ZAŠKRTNĚTE)

ANO

☐

NE

☒
