

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2017/167

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Votýpka (technický dozor)

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s r.o.

IČ: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 21377

sídlo: Benešov nad Černou č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: p. Pavlem Štemberou

ve věcech technických jedná: p. Arnošt Bednář

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo *Propustky na revírech Nový Dvůr a Borová*, evidenční číslo zakázky **S928/2017/167** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

– Dle cenové nabídky 35982, která je součástí SOD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 9.5.2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.7.2017. Tato lhůta se prodlužuje (zkracuje) o počet dní, o než došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **223.056,- Kč** bez DPH, slovy **dvěstědvacetřítisíc padesátšest Kč** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorů staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

- Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
- Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
- Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
- V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uverejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uverejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: 27.4.2017

V Dobré Vodě, dne: 3.5.2017

Doklad

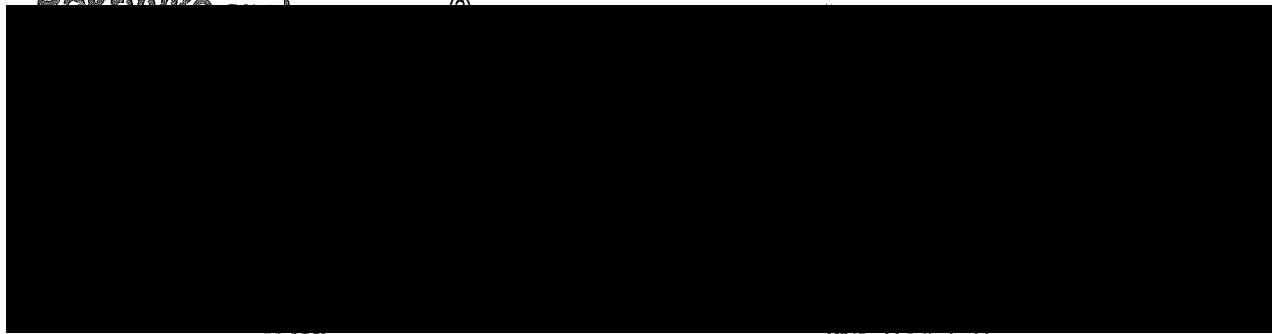

Ing. Radek Pomije

Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.4.2017

Stavba : 17LCK001

Oprava 3 propustků

Objednatel : Lesy ČR, s.p.
Lesní správa Český Krumlov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Pokrývka spol. s r.o.

IČO :
DIČ :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 01 Oprava 2 propustů a zhotovení nového na Kletci	269 898	0	223 056	46 842
Celkem za stavbu	269 898	0	223 056	46 842

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	01 Výměna propustu na l.c Jandova	88 786	0	73 377	15 409
SO 01	02 Výměna propustu na l.c. Červenodvorská	98 925	0	81 756	17 169
SO 01	03 Výměna propustu na l.c. U Kuželáku	82 187	0	67 923	14 264
	Celkem za stavbu	269 898	0	223 056	46 842

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	3,6	7 980	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5,9	13 200	0	0	0
5 Komunikace	16,1	35 970	0	0	0
8 Trubní vedení	20,6	45 847	0	0	0

91	Doplňující práce na komunikaci	40,7	90 750	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5,1	11 280	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4,6	10 197	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3,5	7 833	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	223 056	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		01 Výměna propustu na l.c Jandova		JKSO	
Objekt				SKP	
SO 01		Oprava 3 propustů		Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	0
17LCK001		Oprava 3 propustů		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
		73			
Z	HSV celkem	377	Ztížené výrobní podmínky		0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště		0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora		0
	ZRN celkem	73 377	Kompletační činnost (IČD)		0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac		0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla		0
	ZRN+HZS	73 377	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	73 377	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%		73 377 Kč
DPH		21,0	%		15 409 Kč
Základ pro DPH		0,0	%		0 Kč
DPH		0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					88 786 Kč

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů na Kleti	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu na l.c Jandova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 040	0	0	0	
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	
5 Komunikace	15 330	0	0	0	
8 Trubní vedení	12 686	0	0	0	
91 Doplnující práce na komunikaci	30 200	0	0	0	
96 Bourání konstrukcí	7 380	0	0	0	
97 Prorážení otvorů	2 219	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	2 522	0	0	0	
CELKEM OBJEKT	73 377	0	0	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	K
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	73 377	
Mimostaveništní doprava	0	0,0	73 377	
Zařízení staveniště	0	0,0	73 377	
Provoz investora	0	0,0	73 377	
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	73 377	
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0	0,0	73 377	
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	73 377	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů na Kleti	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu na l.c Jandova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³	m ³	16,00	145,00	2 320,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m ³	16,00	25,00	400,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m ³	16,00	20,00	320,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 040,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m ² vysp. MCs, 20 cm	m ²		1 572,00	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
5	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	18,00	455,00	8 190,00
6	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltem, do 4 cm obrusná vrstva ACO	m ²	12,00	240,00	2 880,00
7	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltem, do 6 cm ložná vrstva ACL	m ²	12,00	355,00	4 260,00
	Celkem za	5 Komunikace				15 330,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	6,00	50,00	300,00
9	28614296	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 600x6000mm PP	kus	1,00	12 385,95	12 385,95
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 685,95
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	11 500,00	23 000,00
11	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m ³	3,00	2 400,00	7 200,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				30 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	966008113R0R	Bourání trubního propustku z trub DN do 60 cm	m	6,00	1 230,00	7 380,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 380,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	12,33	180,00	2 219,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 219,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	44,01	57,30	2 521,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 521,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		02		Výměna propustu na I.c. Červenodvorská		JKSO		
Objekt						SKP		
SO 01				Oprava 3 propustů na Kleti		Měrná jednotka		
Stavba						Počet jednotek		0
17LCK001				Oprava 3 propustů na Kleti		Náklady na m.j.		0
Projektant						Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu								
Objednatel								
Dodavatel						Zakázkové číslo		
Rozpočtoval						Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady				
			81					
Z	HSV celkem		756	Ztížené výrobní podmínky				0
R	PSV celkem		0	Mimostaveništní doprava				0
N	M práce celkem		0	Zařízení staveniště				0
	M dodávky celkem		0	Provoz investora				0
	ZRN celkem		81					
			756	Kompletační činnost (IČD)				0
				Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac				0
	HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla				0
	ZRN+HZS		81					
			756	Ostatní náklady neuvedené				0
	ZRN+ost.náklady+HZS		81					
			756	Ostatní náklady celkem				0
Vypracoval				Za zhotovitele			Za objednatele	
Jméno :				Jméno :			Jméno :	
Datum :				Datum :			Datum :	
Podpis :				Podpis:			Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%			81 756 Kč		
DPH		21,0	%			17 169 Kč		
Základ pro DPH		0,0	%			0 Kč		
DPH		0,0	%			0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM							98 925 Kč	

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů na Kleti	Rozpočet : 02
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu na l.c. Červenodvorská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 660	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 300	0	0	0	0
5 Komunikace	15 240	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 686	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	30 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 900	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 978	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 793	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	81 756	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	81 756	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	81 756	0
Zařízení staveniště	0	0,0	81 756	0
Provoz investora	0	0,0	81 756	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	81 756	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0	0,0	81 756	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	81 756	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů Kleti	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu na l.c. Červenodvorská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	14,00	145,00	2 030,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	14,00	25,00	350,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	14,00	20,00	280,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 660,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	6,00	1 050,00	6 300,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 300,00
Díl: 5		Komunikace				
5	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným	t	18,00	450,00	8 100,00
6	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltem, do 4 cm obrusná vrstva ACO	m2	12,00	245,00	2 940,00
7	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu asfaltem, do 6 cm ložná vrstva ACL	m2	12,00	350,00	4 200,00
	Celkem za	5 Komunikace				15 240,00
Díl: 8		Trubní vedení				
8	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	6,00	50,00	300,00
9	28614296	Trubka kanal. korug. PRAGMA+ID 10 DN 600x6000mm PP	kus	1,00	12 385,95	12 385,95
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 685,95
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	11 500,00	23 000,00
11	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	3,00	2 400,00	7 200,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				30 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	966008113R0R	Bourání trubního propustku z trub DN do 60 cm	m	6,00	650,00	3 900,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 900,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	12,33	647,00	7 977,51
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 977,51
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	48,74	57,30	2 793,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 793,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		03	Výměna propustu l.c. U Kuželáku	JKSO	
Objekt				SKP	
SO 01		Oprava 3 propustů na Kleti		Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	0
17LCK001		Oprava 3 propustů na Kleti		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel				Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
		67			
Z	HSV celkem	923	Ztížené výrobní podmínky		0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště		0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora		0
ZRN celkem		67			
		923	Kompletační činnost (IČD)		0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac		0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla		0
ZRN+HZS		67			
		923	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	67			
		923	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%		67 923 Kč
DPH		21,0	%		14 264 Kč
Základ pro DPH		0,0	%		0 Kč
DPH		0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					82 187 Kč

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů na Kleti	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu l.c. U Kuželáku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 280	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 900	0	0	0	0
5 Komunikace	5 400	0	0	0	0
8 Trubní vedení	20 475	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	30 350	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 518	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	67 923	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	67 923	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	67 923	0
Zařízení staveniště	0	0,0	67 923	0
Provoz investora	0	0,0	67 923	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	67 923	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0	0,0	67 923	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	67 923	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17LCK001 Oprava 3 propustů na Kleti	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 Oprava 3 propustů na Kleti	Výměna propustu l.c. U Kuželáku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,00	145,00	1 740,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	12,00	25,00	300,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,00	20,00	240,00
	Celkem za	1 Zemní práce				2 280,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	6,00	1 150,00	6 900,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				6 900,00
Díl: 5		Komunikace				
5	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	12,00	450,00	5 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				5 400,00
Díl: 8		Trubní vedení				
6	812441121R00	Montáž trub beton hrdlových, MC provazec DN 600	m	7,50	650,00	4 875,00
7	59223716	Trouba beton TBH-Q 600/2500/Z 600x2500x100 mm	kus	3,00	5 200,00	15 600,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				20 475,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	919441211R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	11 500,00	23 000,00
9	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	m3	3,00	2 450,00	7 350,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				30 350,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	43,94	57,30	2 517,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 517,72
