

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-1067/00066001/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 11

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

**1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

**AFRY CZ, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

**SAGASTA, s. r. o.**

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

**SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 9, Pod pekárny 878/2, 190 00

zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,

bankovní spojení: KB a.s, č. účtu:

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

#### **4roads s.r.o.**

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

#### **SHB, akciová společnost**

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD**“ dále jen „smlouva“.

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS na akci: „III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč“.

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:

[http://www.pjpk.cz/data/USR\\_001\\_2\\_11\\_METODICKE\\_POKYNY/SDS\\_PK\\_2022\\_final.pdf](http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf)

Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Objednatel požaduje, pokud je to technicky proveditelné, vymístit případné IS z prostoru mostního objektu.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 895 200 Kč  
DPH: 187 992 Kč  
včetně DPH: 1 083 192 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Miroslav Týnek

email: \_\_\_\_\_

tel:

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
**Předpokládaná lhůta plnění:**
  - Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept
  - DÚSP koncept – do 4 měsíců od podpisu smlouvy
  - DÚSP čistopis – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
  - Podání žádosti o společné rozhodnutí nebo povolení stavby příslušným stavebním úřadem – do 5 měsíců od vydání čistopisu DÚSP
  - PDPS – nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo od písemné výzvy objednatele
  - Autorský dozor (technická pomoc): na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na stavbě „**III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč**“

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Technická specifikace
  - HPMDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele Miroslav Týnek  
za zhotovitele Ing. Jan Komanec
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:  
**Výsledky poskytnutých služeb:**
  - Průzkumy a zaměření 3x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku  
-----
  - Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 3x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku,  
-----
  - Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 5x v listinné podobě  
a 1x digitálně na flash disku,  
-----
  - Dokladová část 3x v tištěné podobě  
a 1x digitálně na flash disku  
-----
  - Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 1x v tištěné podobě  
a 1x kopie na flash disku.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech

V Praze


**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Martin Havlík, jednatel  
**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
(Správce – vedoucí společník)

# Technická specifikace

**Název akce:** „ III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD “

**Místo realizace akce :** most na silnici č. III/25920 přes strouhu před obcí Boreč ,  
okres : Mladá Boleslav

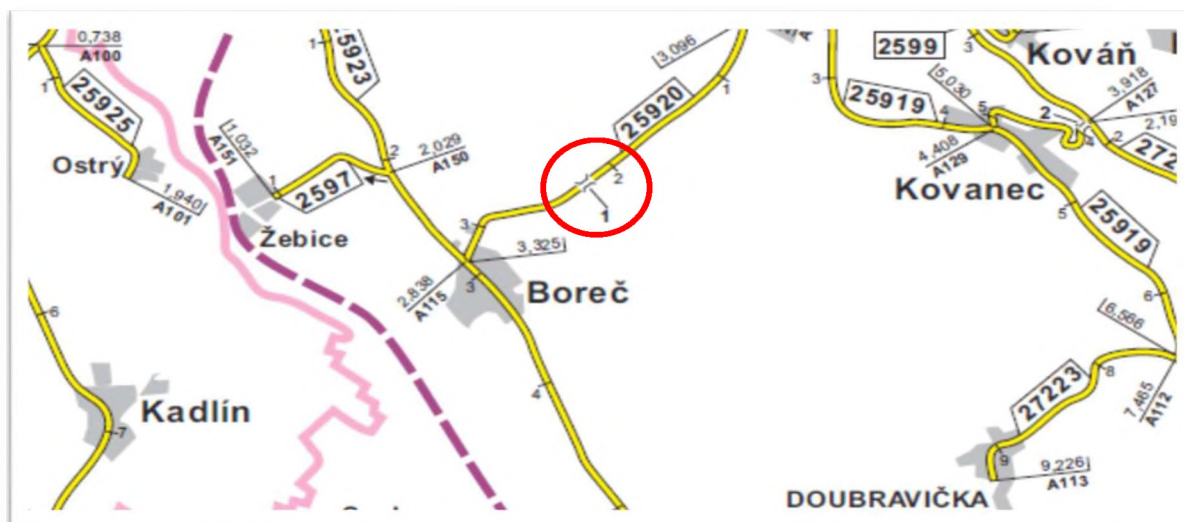

**Staničení provozní v km : 1,676 km, CMS: Bělá pod Bezdězem**

## **1. Předmět akce:**

Kompletní vypracování projektové dokumentace (PD) pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP); vypracování PD pro provádění stavby (PDPS); výkon autorského dozoru (AD); vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS na akci: „III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč-PD “.

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:

[http://www.pjpk.cz/data/USR\\_001\\_2\\_11\\_METODICKE\\_POKYNY/SDS\\_PK\\_2022\\_final.pdf](http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf)

## **2. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Jedná se o most o 1 poli. SS i NK tvoří 10 ks prefabrikovaných betonových uzavřených rámců Beneš 3/1,5 m. Délka přemostění je 3,4 m.

Lokálně koroze obnažené výztuže opěr. Degradace betonu ve spárách, průsaky mezi spárami, masivní degradace betonu křídla OP1 vpravo. Trhliny ve spárách mezi některými prefabrikáty. Zatékání do NK mezi spárami, degradace betonu, lokálně odpadlá krycí vrstva nebo výztuž zcela bez krytí (nejhorší stav 3. nosník zleva). Na boku vpravo trhliny v dobetonávce, část dobetonávky odpadlá. Vozovka nerovná, trhliny,

vysprávký. Hlubková degradace obrusné vrstvy, poklesy v přechodových oblastech. Beton říms degradovaný. Lokální odpadávání dobetonávky čel, obnažená výztuž koroduje. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Deformace svodidla na pravé straně. Jedná se o most přes suchou strouhu bez stálé vodoteče .

Most má zatížitelnost  $V_n = 20 \text{ t}$   $V_r = 35 \text{ t}$

**Stavební stav NK – VI.- velmi špatný, SS – V. - špatný.**

**Součástí zakázky je prověření možnosti zrušení mostu bez náhrady ( suchá strouha - hydrotechnický výpočet) , případně jeho nahrazení propustkem, a provedení diagnostického průzkumu objektu, které upřesní rozsah rekonstrukce – možnost zrušení mostu či náhradu mostu propustkem, rekonstrukce stávajícího objektu či kompletní náhrada mostu novým objektem .**

### **3. Výčet požadovaných prací:**

- Provedení hydrotechnického posouzení a diagnostického průzkumu mostu, který upřesní rozsah rekonstrukce – možnost zrušení mostu či náhradu mostu propustkem, rekonstrukce stávajícího objektu či kompletní náhrada mostu novým objektem .
- Vypracování PD pro společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP).
- Vypracování PD pro provádění stavby (PDPS).
- Výkon autorského dozoru (AD).
- Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS.

### **4. Termíny pro předkládání PD:**

DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy.

DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP. **Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.** Inženýrská činnost bude považována za dokončenou teprve po uzavření všech majetkoprávních smluv potřebných pro realizaci stavby .

PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

### **5. Náklady stavby jsou dány odhadem:**

**8.000 tis Kč bez DPH, tj. 9.680 tis. Kč s DPH 21%**

### **6. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- Demolice mostu či rekonstrukce stávajícího objektu
- Most včetně napojení stávající komunikace
- Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti
- DIO

### **7. Termín realizace**

- **PD:** dle SOD
- Stavba: **předpoklad zahájení v r. 2024**

**Kontakt :**

**Miroslav Dostál** vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil \_\_\_\_\_, email:

[miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Miroslav Týnek**, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil \_\_\_\_\_, email:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Týnek

Datum : 5.1. 2023

Přílohy : HPM ze 6.10. 2022 včetně fotodokumentace



## Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 2

## III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
8 000 000	5,000%	2,500%	1,190%	1000,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	200	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	414 000	238 000	90 000	200 000	942 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	400 000	200 000	95 200	200 000	895 200
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96,62%	84,03%	105,78%	100,00%	95,03%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část IČ ke společnému povolení Rozdíl:	Ok
Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 15.2.2023

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o. -  
Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 –  
PXAFSASA4fSHB

III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč -  
PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	40 000,00
Geotechnický průzkum dle TP 76	40 000,00
Průzkumy pro DUSP ( Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika mostu, hydrotechnické posouzení, vyhl. 130/2019 )	30 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>110 000,00</b>
<b>DUSP</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00
Stavební část	160 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000,00
BOZP	15 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>290 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>400 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání společného povolení</b>	
projednání dokumentace	120 000,00
majetkoprávní podklady	50 000,00
podání žádosti bez poplatků	30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>200 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	5 000,00
Výkresová část	60 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	25 200,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>95 200,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>695 200,00</b>

V Praze dne 15.2.2023

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s  
r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 2021 –  
PXAFSASA4fSHB

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## III/25920 Boreč, most ev.č. 25920-1 přes strouhu před obcí Boreč - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	60	1 000	60 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	40		40 000
Cena AD celkem bez DPH	100		100 000
<b>Celkem</b>	<b>200</b>		<b>200 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
<b>činnost</b>	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	40
celkem hodin	100
Kč/hod	1 000
Celkem Kč bez DPH	100 000

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
