

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2023/00021**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Brno

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření

[.]

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy MMB

korespondenční adresa: Odbor dopravy MMB, Kounicova 67a, 601 67 Brno

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111211222/0800

datová schránka: a7kbrnn

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Slatina spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 13.2.2023 vydané pod čj. 40328/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno-Slatina rozhodnutí o umístění stavby „ul. Řípská/Šmahova – veřejné osvětlení a přeložka sítí při budování zastávkového zálivu na pozemcích parc. 2002/10,2002/13,2002/14,202/15, 2022/150,2002/33,2022/39,2002/79,2010/2,2058/5,2058/11,2196/1,2205/13,2215/1,22 21/3,2224/1, vše v k.ú Slatina, obec Brno“, které bylo vydáno dne 6.6.2022, pod čj. MCBSLA/04616/20/VK pravomocné dne 13.7.2022, (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.055.047,- Kč** (slovy: jeden milion padesát pět tisíc čtyřicet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **6.150,- Kč** (slovy: šest tisíc jedno sto padesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO


- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány elektronicky, a to na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE


- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



- 8.2 Za Stavebníka:



9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Stavebník obdrží dvě (2) vyhotovení a CETIN obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části města Brna, Brno-Slatina rozhodnutí o umístění stavby „Ul. Řípská/Šmahova – veřejné osvětlení a přeložka sítí při budování zastávkového zálivu na pozemcích parc.2002/10,2002/13,2002/14,202/15,2022/150,2002/33,2022/39,2002/79,2010/2,2058/5,2058/11,2196/1,2205/13,2215/1,2221/3,2224/1, vše v k.ú Slatina, obec Brno“, které bylo vydáno dne 6.6.2022, pod čj. MCBSLA/04616/20/VK

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/ dne [•].

CETIN:

Stavebník:

V Brně dne _____

V Brně dne _____

CETIN a.s.


Statutární město Brno
Ing. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy MMB

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00021
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Informace o pozemku


Parcelní číslo: [2196/1](#)
Obec: [Brno \[582786\]](#)
Katastrální území: [Slatina \[612286\]](#)
Číslo LV: [60000](#)
Výměra [m²]: **18426**
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: **KMD**
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha

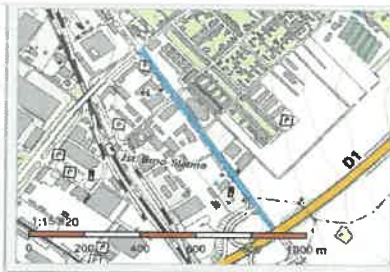

[Sousední parcely](#)

Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Prislušnost hospodářit s majetkem státu	Podíl
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	

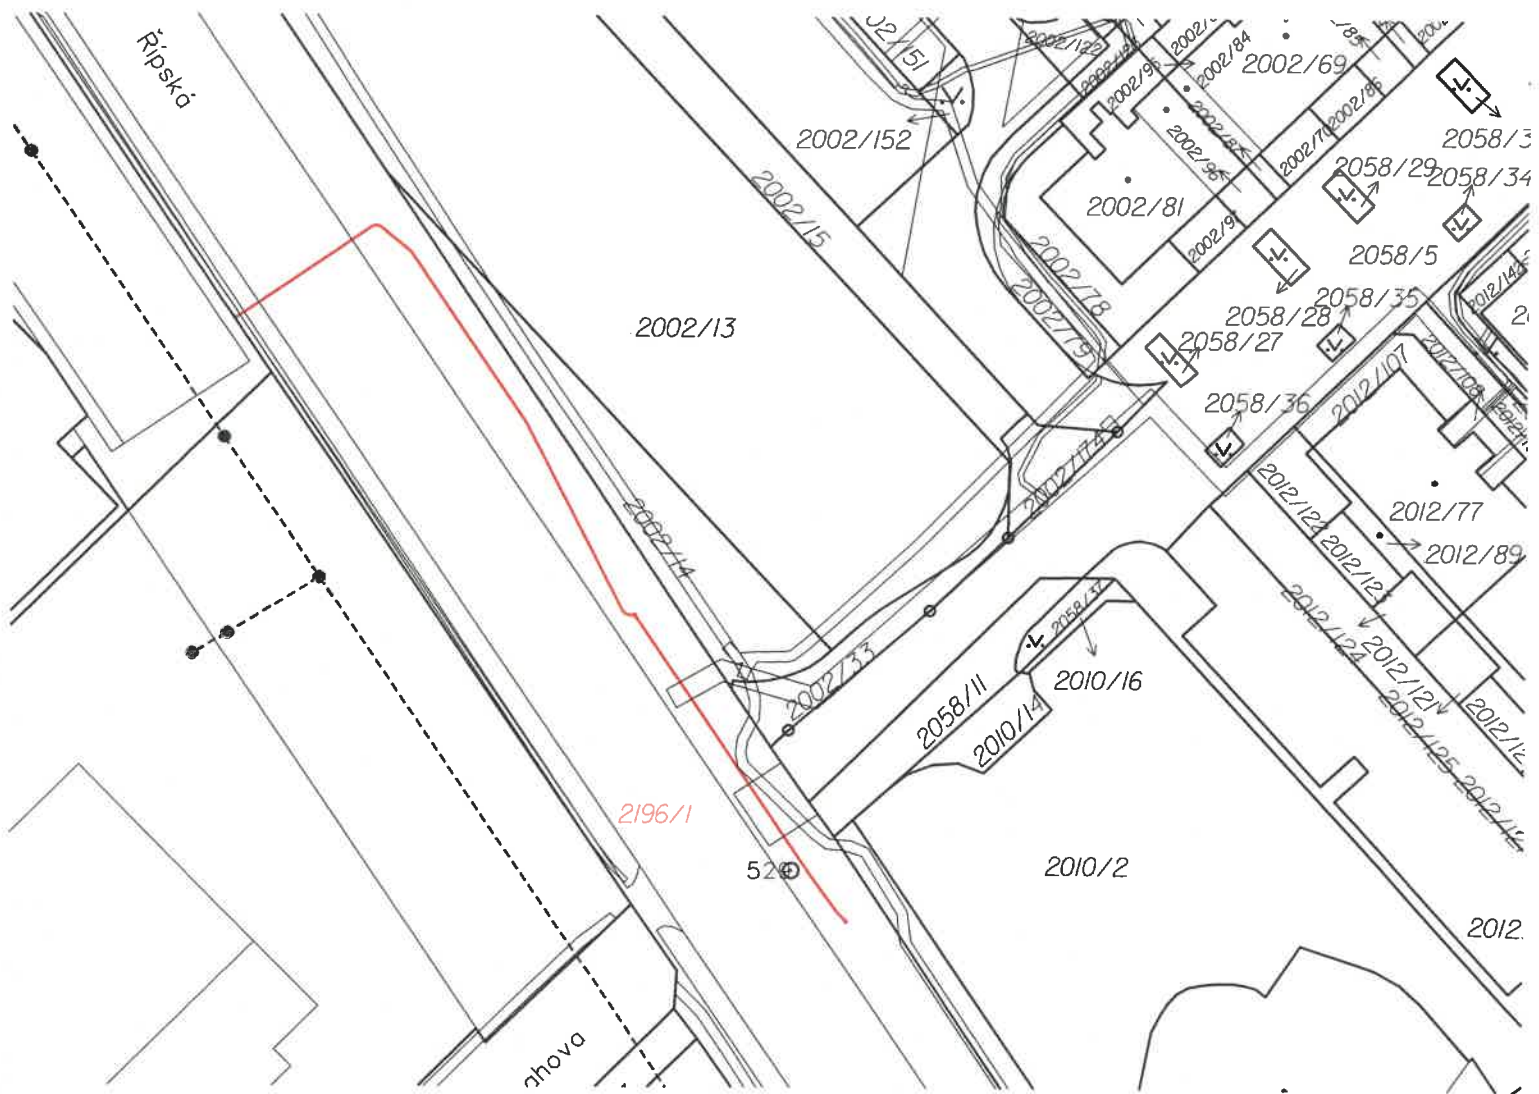



75018/19/0024 VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2023.04

Položková 2023.04

Název stavby: **75018/19/0024 VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: XXXXXXXXXX Vegacom a.s.

KPO: JMO

HOST: Brno - Zábrdovice

VUJ: Slatina

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 150,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	425 543,35 Kč
MONTÁŽ	385 393,49 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 005,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	26 108,87 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykaz	193 195,71 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 1 055 047,46 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 027 790,62 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 27 256,84 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
955833	Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN 2023		6150.00 JV	6 150,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm		60.00 m	220 925,40 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		25.00 m	654,50 Kč
952367 S	Pokládka žlabů TK1		5.00 m	441,80 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové kontrola průtočnosti vpustí , likvidace náletových dřevin a keřů		21832.50 JV	21 832,50 Kč
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		250.00 m	22 827,50 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		10.00 m	2 482,50 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		67.00 m	45 042,09 Kč
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		208.00 m	40 133,60 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		5.00 m	4 442,80 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		50.00 m	29 250,00 Kč

954962 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	20.00 m	10 225,20 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	5.00 m	13 107,30 Kč
954965 S	Rýha vjezd litý asf. 35/70-90rozš.o 10cm	5.00 m	2 138,45 Kč
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	5.00 m	7 939,35 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	192.00 m	2 832,00 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových	4.00 m	1 120,88 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	147,48 Kč
MONTÁŽ			
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	60.00 m	3 664,80 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	327.00 m	1 448,61 Kč
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - sta	48.00 ks	9 261,60 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - sta	48.00 ks	25 366,56 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - sta	48.00 ks	4 536,48 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	791,48 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřky	350.00 ks	16 044,00 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřky	330.00 ks	10 058,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřky	2.00 ks	213,84 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřky	2.00 ks	395,74 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	435.00 ks	13 258,80 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	335.00 ks	12 803,70 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	61,08 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	98400.00 JV	98 400,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 257,26 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	5.00 ks	10 686,15 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	348,78 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	2460.00 JV	2 460,00 Kč
montáž dělených trubek, manipulace se stáv. kabely			
952602 S	Montáž trubky úložné	237.00 m	4 718,67 Kč
952603 S	Montáž trubky závlačné-4 ks	90.00 m	6 128,10 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	97.00 m	4 446,48 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	79.00 m	2 534,32 Kč
958325 S	Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	200.00 m	4 524,00 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	64 694,56 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	20 171,58 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	5535.00 JV	5 535,00 Kč
Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí			
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a	48.00 ks	22 711,68 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 361,73 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HD	400.00 m	11 748,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	3 165,90 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
955070 S	Zrušení spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	879,96 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	2.00 ks	2 015,56 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 991,38 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	150.00 m	1 474,50 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	50.00 m	1 604,00 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	50.00 m	1 069,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě si 6826.50 JV 6 826,50 Kč
GEO vytyčení, EZA

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1k 50.00 m 1 487,50 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1k 1.00 ks 6 691,91 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 650,13 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m', 2.00 ks 8 652,16 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břem 10900.00 JV 10 900,00 Kč
náhrada za VBŘ odhadovaná - 10 900 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího
určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se
všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 838,99 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene 1.00 ks 3 717,72 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	175.00 ks	7 973,00 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	60.00 m	251,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	200.00 m	958,00 Kč
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	49.00 m	12 667,97 Kč
300111 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	3.00 m	1 470,69 Kč
300112 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4	75.00 m	55 074,00 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	109.00 m	50 919,35 Kč
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	48.00 ks	203,04 Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x	2.00 ks	1 044,74 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	169,85 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	13395.00 ks	13 395,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	2 000,88 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	56.00 ks	2 820,16 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	14.00 ks	343,56 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	259,68 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	10.00 ks	527,30 Kč
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	2.00 ks	1 415,44 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	105,12 Kč
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	2.00 ks	583,20 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks	2 441,55 Kč
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks	5 131,41 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	5.00 ks	223,05 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 694,92 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	794,88 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	42.00 ks	1 533,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	7.00 m	4 050,27 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	109.00 m	3 539,23 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	109.00 m	3 539,23 Kč

300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	109.00 m	3 539,23 Kč
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	10.00 ks	11 085,50 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	25.00 m	1 382,50 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	51,36 Kč
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	5.00 ks	1 007,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	3.00 ks	0,00 Kč

VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 75018/19/0024 na zpracování CTN: VPIC_Brno_Řípská-Šmahova_SSZ_4.15

2.2 Navrhované řešení:

Cenový a technický návrh (CTN) řeší překládku SEK spol. CETIN v Brně - Slatině, z důvodu výstavby autobusové zastávky a SSZ na nové křižovatce Řípská x Šmahova.

Pro předmětný CTN bylo využito podkladů z předložené PD od [REDAKCE]. Jedná se o stavební objekty SO 461 (metalické kabely) a SO 481 (trubky HDPE a OK). Kompletní technická zpráva je obsažena v předložené PD.

Doplnění CTN:

Stávající neevidovaný kabel typu PFLE 75XN0,4 byl zrušen. Z toho důvodu se překládat nebude. Nebude provedeno ani prodloužení stávající chráničky dělenou trubkou na ul. Šmahova (u BD).

Na ulici Šmahova (u autobazaru) bude provedena ochrana stávající SEK. Jedná se o kabel typu TCEKE 25XN0,4. Ochrana bude provedena pomocí dělené trubky SYSPRO160/110mm.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu PFLE, HDPE40
Spojky XAGA500, TS40Pl.
Mini Markér Ball
PE125, PE110, SYSPRO160/110mm
OS COYOTE RIL

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

[REDAKCE] zástupce stavebníka
[REDAKCE] projektant překládky
[REDAKCE] zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: stavebník zajistil PD pro překládku

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO (nová trasa SEK) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Při překládání HDPE: Překládku je nutné realizovat s poloměry ohybu min. 1,2m.

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení MK a OK) – min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.



Úřad městské části města Brna
Brno - Slatina

B R N O

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE, STAVEBNÍ ÚŘAD, TILHONOVA 59, 627 00 BRNO

NAŠE ČJ.: MCBSLA/00777/22/OVÚR/POKI
SPIS. ZN.: S MCBSLA/04616/20/VK
OPR.ÚŘ.OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:
ID DS:
DATUM: 06.06.2022

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

ul. Řípská / Šmahova – veřejné osvětlení a přeložka sítí při budování zastávkového zálivu na pozemcích parc. č. 2002/10, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/150, 2002/33, 2002/39, 2002/79, 2010/2, 2058/5, 2058/11, 2196/1, 2205/13, 2215/1, 2221/3, 2224/1, vše k.ú. Slatina, obec Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina, Odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný podle § 11 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), věcně a místně příslušný podle čl. 18 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 15.07.2020 podalo Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, které zastupuje Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

ul. Řípská / Šmahova – veřejné osvětlení a přeložka sítí při budování zastávkového zálivu na pozemcích parc. 2002/10, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/150, 2002/33, 2002/39, 2002/79, 2010/2, 2058/5, 2058/11, 2196/1, 2205/13, 2215/1, 2221/3, 2224/1, vše k.ú. Slatina, obec Brno (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

SO 401 Ochrana kabelů VN

V souvislosti s rozšířením křižovatky ulic Řípská, Šmahova je nutno prodloužit stávající chráničky na kabelech VN. Jedná se o kabely na levé straně ul. Řípské VN č.1216 typu NA2XS(F)2Y 240, které napájí trafostanici č.8526 Slatina Transtechnik (3ks kabelů) a kabel na pravé straně ul. Řípské VN 1364 typu NA2XS(F)2Y 240, který napájí trafostanici spol. Auto Kelly. Chráničky budou prodlouženy dělenými trubkami pr.160 mm. Na levé straně ul. Řípská budou položeny 2ks dělených trubek v délce 5 m a na pravé straně bude položena 1ks trubky v celkové délce 7 m. Současně budou přeloženy dva kabely VN č.1216 typu NA2XS(F)2Y 240 v d1. 25 m podél chodníku v ul. Šmahova z důvodu kolize s chodníkovou obrubou a ostatními sítěmi.

SO 451 Veřejné osvětlení

V křižovatce ul. Řípská, Šmahova bude posíleno VO na základě zpracovaného světlo-technického výpočtu. V křižovatce budou vybudovány 2ks nových stožárů VO dl.12 m s 2,5m výložníky. V ul. Šmahova bude doplněn 1 nový stožár dl.12 m s 2,5 m výložníkem. V souladu s městskými standardy VO budou osazena svítidla LNA-S100. S ohledem na vybudování chodníků budou 2ks stávajících stožárů přesunuty za obrubu. V místě autobusové zastávky bude osazen 1ks sadového stožáru se svítidlem EP 50 W pro dodržení min. osvětlenosti v prostoru zastávek MHD. Celkem budou tedy instalována čtyři nová světelná místa nad rámec stávajícího stavu (v situaci vyznačena modře).

Stožáry budou ocelové bezpaticové, oboustranně žárově zinkované v provedení „Brno“ s PVC manžetou.

Přeložený nový stožár S-1493-001 bude v zesíleném provedení, jelikož bude opětovně osazen stávajícím reklamním zařízením, dvojitým výložníkem a nově i dopravními značkami.

Napojení stožárů bude vyřešeno novými kabely CYKY-J 4x16mm². Kabel bude v celé délce trasy v zelených pasech a pod chodníky uložen v chráničce PE063mm. Při přechodu navržených komunikací a vjezdů bude kabel uložen v plastové chráničce DN 110 mm (vždy bude založena jedna chránička rezervní). Uzemnění stožárů bude provedeno zemnicím páskem FeZn 30/4 mm uloženým ve výkopu společně s kabelem. Veřejné osvětlení je navrženo s rovnoměrným zatížením všech tří fází a musí splňovat požadavky dle ČSN EN 13201.

SO 461 Přeložka místních kabelů CETIN

S ohledem na vybudování autobusového zálivu a současně kvůli rozšíření křižovatky ul. Řípská, Šmahova bude nutno přeložit stávající metalické místní kabely spol. CETIN. Kabely se nachází v místě budoucí obruby. Jedná se o kabely TCEPKPFLE 300 XN 0.4 a 35 XN 0.8. Jedná se o kabely, které vedou směrem k letišti a do Šlapanic. Kabel 300 XN 0.4 je v křižovatce dělen na kabely 100 XN 0.4, 75 XN 0.4 (směr nové sídliště). Oba kabely budou přeloženy.

Trasa přeložky je navržena do nově navrženého chodníku a do zeleného pásu. S ohledem na krátký kabelový prostup pod ul. Řípská bude nutno vybudovat protlak. V místě křižovatky budou kabely přeloženy do stávajících chrániček, které budou prodlouženy. Napojení na kabely bude provedeno ve stávajících spojkách. Současně bude nutno prodloužit stávající prostupy pod ul. Šmahova v sídlišti.

Pro přeložku budou použity kabely stejného typu, tedy TCEPKPFLE se stejnými profily. Min. krytí kabelů bude dle normy v chodníku 0,5m, ve volném terénu 1,0m a ve vozovce 1,2m (souběh s DOK). Kabely pod vozovkou musí budou v chráničkách, ve volném terénu a v chodníku budou kryty plastovou deskou a výstražnou fólií. V případě křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy do betonového žlabu. Pro napojení na stávající síť budou použity smršťovací kabelové spojky. Po provedení přeložek bude provedeno kontrolní měření na všech kabelech v souladu s TPP 2001 a bude provedeno geodetické zaměření nových tras dle směrnice 02 TSM 2096. Celková délka přeložky je 118 m.

SO 481 Přeložka DOK CETIN

V rámci výstavby SSZ a související rekonstrukce křižovatky Brno Řípská-Šmahova dojde ke střetu se stávajícím optickým kabelem CETIN, který je nutno přeložit.

Objekt řeší přeložku dálkového optického kabelu (DOK) Černovice-Šlapanice SAMSUNG 48f, který vede ze spojky ROS02 (ul. Tuřanka) směrem na letiště Tuřany a do Šlapanic. Kabel je zafouknut v zelené HDPE trubce. Společně vedou v trase ještě dvě trubky HDPE 40 mm bílá a zelenobílá. Přeložka se provede novými trubkami, které se položí v souběhu s místními metalickými kabely (objekt 461). Vlivem přeložky nedojde k podstatnému nárůstu délky kabelu (cca 1 m). Na straně ve směru k D1 se kabel přeruší ve stávající optospojce OS05, která je vzdálená cca 389 m od křižovatky Tuřanka. Kabel se odtud vyfoukne směrem k začátku přeložky a zde bude zafouknut zpět do nových trubek, které budou předem připraveny. Poté dojde k zpětné montáži optické spojky OS05. Napojení trubek se provede pomocí spojek, pod komunikací budou trubky uloženy v samostatné chráničce. Celková délka přeložky trubek je 109 m. Výkopové práce a pokládka trubek bude provedena v koordinaci s objektem SO 461.

SO 482 Přeložka optického kabelu Faster CZ

Podél ulice Řípská vede stávající optický kabel FASTER 48vl. 9/125 SM včetně 2x HDPE 40mm barvy modrá, šedá. Stávající optický kabel křižuje ul. Šmahova. V místě křížení s ul. Šmahova dojde k rozšíření křižovatky a v místech rozšíření bude nutno stávající optotrubky HDPE společně s optickým kabelem ochránit dělenou chráničkou PE0160/110 mm a připojit jednu chráničku PE0110mm v celé délce křížení. Celková délka úpravy je 24 m.

SO 483 Přeložka optického kabelu VIVO

Podél ulice Řípská vede stávající optický kabel VIVO CONNECTION včetně trubek HDPE 40 mm. Stávající optický kabel křížuje ul. Šmahova.

V místě křížení s ul. Šmahova dojde k rozšíření křižovatky a v místech rozšíření bude nutno stávající optotrubky HDPE společně s optickým kabelem ochránit dělenou chráničkou PE0160/110 mm a připojit jednu chráničku PE0110mm v celé délce křížení. Celková délka úpravy je 24 m.

Zabezpečení bude provedeno bez přerušení optického kabelu.

Území dotčené vlivy stavby:

Pozemky, na nichž je stavba umístěna: pozemky parc. č. 2002/10, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/150, 2002/33, 2002/39, 2002/79, 2010/2, 2058/5, 2058/11, 2196/1, 2205/13, 2215/1, 2221/3, 2224/1, vše v k.ú. Slatina, obec Brno.

Pozemky přímo sousedící s pozemky, na nichž je stavba umístěna: pozemky parc. č. 1775/1, 1775/10, 1875/1, 1927, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/7, 2002/8, 2002/9, 2002/11, 2002/12, 2002/18, 2002/70, 2002/72, 2002/76, 2002/78, 2002/85, 2002/86, 2002/87, 2002/92, 2002/93, 2002/94, 2002/95, 2002/96, 2002/97, 2002/98, 2002/99, 2002/100, 2002/101, 2002/102, 2002/120, 2002/122, 2002/123, 2002/124, 2002/141, 2002/142, 2002/143, 2002/144, 2002/145, 2002/146, 2002/147, 2002/148, 2002/149, 2002/151, 2002/152, 2002/154, 2002/160, 2002/162, 2002/168, 2002/170, 2002/171, 2002/172, 2010/1, 2010/4, 2010/7, 2010/12, 2010/14, 2010/15, 2010/16, 2011/1, 2012/54, 2012/56, 2012/57, 2012/70, 2013/4, 2058/1, 2058/6, 2058/13, 2058/15, 2058/37, 2195/1, 2195/13, 2195/16, 2195/17, 2195/18, 2195/19, 2195/31, 2195/48, 2195/49, 2195/51, 2196/6, 2196/7, 2196/16, 2197/4, 2197/23, 2197/62, 2200/3, 2200/4, 2202/6, 2202/21, 2204/1, 2205/1, 2205/2, 2205/12, 2205/14, 2205/18, 2205/24, 2207/2, 2211, 2212, 2214/8, 2214/9, 2215/2, 2215/3, 2216/1, 2218/5, 2221/3, 2221/7, 2224/2, 2231/1, 2231/17, 2941/2, 2941/6, 2941/14, 2944/1, 2946, 2947/7, vše k.ú. Slatina, obec Brno.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou opatřil autorizačním razítkem autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb [redacted] ČKAIT 1000695, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Pro uskutečnění záměru se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc. č. 2002/10, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/150, 2002/33, 2002/39, 2002/79, 2010/2, 2058/5, 2058/11, 2196/1, 2205/13, 2215/1, 2221/3, 2224/1, vše v katastrálním území Slatina, obec Brno.
4. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
6. Stavba nesmí, a to ani žádnou svou částí, přesahovat na sousední pozemek v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení stavby na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace dle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
7. Jakýkoliv stavební zásah nebo zábor komunikace, event. silničního pozemku smí být realizován pouze na základě povolení zvláštního užívání příp. uzavírky komunikace, o které zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad min. 3 týdny před realizací po předchozím vyjádření Policie ČR KŘ JMK DI a spol. Brněnské komunikace a.s.

8. Při provádění stavebních prací a při manipulaci se sypkými materiály budou zavedena a dodržována technická a organizační opatření k eliminaci prašnosti a to zejména kropení prašných ploch v době suchého a větrného počasí, pravidelná kontrola a v případě způsobeného znečištění důkladná očista dotčených přilehlých komunikací a chodníků, omezení větrné eroze deponie zemin, skladování sypkých a lehkých stavebních materiálů na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.
9. Pokud dojde v souvislosti se stavebními pracemi k omezení možnosti svozu komunálního odpadu od občanů (včetně svozu separovaných složek komunálního odpadu) je požadováno oznámení začátku a ukončení prací včetně přesného určení oblasti, kde nebude možno dočasně svážet komunální odpad stávajícím způsobem a poskytnutí součinnosti při umístění náhradních kontejnerů v dané lokalitě dle pokynů OŽP MMB, popř. svozové společnosti. Vývoz náhradních kontejnerů či popelnic je vždy prováděn popelářskými vozidly.
10. Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítáním Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
11. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz. § 176 stavebního zákona.
12. **Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců sítí dopravní a technické infrastruktury obsažené v níže uvedených vyjádřeních a smlouvách:**
 - MMB odbor investiční – MMB/0359516/2020 ze dne 31.08.2020, MMB/0113357/2022 ze dne 14.04.2022
 - MMB/012982/2018 ze dne 31.07.2018
 - MMB majetkový odbor – MMB/0360970/2020 ze dne 11.09.2020, MMB/0119228/2018 ze dne 29.03.2018
 - Brněnské komunikace a.s. – BKOM/200/60/2020 ze dne 02.09.2020
 - BKOM/12536/2019 ze dne 20.05.2019, BKOM/28988/2021 ze dne 06.12.2021
 - Cetin a.s.- 596838/21 ze dne 25.03.2021
 - DPMB a.s. – č. j.: 14184/2020/5040 ze dne 26.8.2020 a č.j.: 3367/2018/5040 ze dne 12.04.2018
 - TSB a.s. - TSB/09944/2020 ze dne 23.09.2020 prodloužené TSB/13341/2021 ze dne 25.11.2021
 - Brněnské vodárny a kanalizace a.s., – č.j.: 722/005956/2019/IBa ze dne 25.03.2019 prodloužené č.j.:722/018884/2020/IBa ze dne 31.08.2020 a č.j.: BVK/02733/2022 ze dne 10.02.2022
 - GridServices s.r.o. – 5002215085 ze dne 11.09.2020
 - Vodafone Czech Republic a.s. – n. zn.: 211116-1208360113 ze dne 18.11.2021
 - SMART Comp, a.s. vyjádření č.: V-0315/2018 ze dne 08.12.2021
 - Vivo Connection spol. a.s. č. vyjádření 2205000692 ze dne 27.08.2020
 - Faster CZ spol. s.r.o. – ze dne 02.09.2020
 - Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, SPMO:1899-993/2020-1150 ze dne 08.09.2020
 - EG.D, a.s. n. zn.: B6941-26101890 ze dne 17.03.2021
13. **Budou dodrženy podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů:**
 - MMB OÚPR – koordinované stanovisko MMB/0356845/2020 ze dne 30.10.2020 MMB/0119154/2018 ze dne 5.11.2018
 - MMB – odbor dopravy – MMB/0253189/2021 ze dne 19.05.2021, č.j.: MMB/0362535/2020 ze dne 13.10.2020, č.j.: MMB/0425078/2018 ze dne 22.10.2018
 - Policie – spec. Pracoviště dopravního inženýrství č.j.: KRPB-66556-1/ČJ-2019-0600DI-SBI ze dne 01.04.2019

14. Vlastní realizací stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek, ani stavební materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění komunikace. Terén bude po skončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu a obnovena zeleň.
15. Případné poškození komunikace při realizaci stavby musí být odstraněno na náklady investora stavby.
16. S odpady, vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s podmínkami, stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy – především vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve znění pozdějších předpisů. Průběžná evidence odpadů bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebnímu úřadu včetně doložení způsobu nakládání s odpadem (recyklace, spalování, skládkování.)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Brno Eastgate I. s.r.o., U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

STAVOS Brno, a.s., U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Společenství pro dům Šmahova 88, 90, 92, Brno, Šmahova č.p. 1430/90, Slatina, 627 00 Brno

FLSmidth spol. s r.o., Řípská č.p. 1229/4a, Slatina, 627 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha

RENOCAR, a.s., Podolí č.p. 445, 664 03 Podolí u Brna

PRO-DOMA, spol. s r.o., Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha

RENOCAR Real Estate, a.s., Řípská č.p. 1293/5c, Slatina, 627 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 15.07.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad žádost prozkoumal a zjistil, že nepředstavuje dostatečný podklad pro vydání územního rozhodnutí. Proto dne 13.08.2020 vyzval stavebníka k doplnění podkladů výzvou MCBSLA/05276/20/OVUR/NEH a řízení přerušil unesením č.j. MCBSLA/05275/20/OVUR/NEH.

Stavební úřad podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 12.03.2021 pod č.j. MCBSLA/01956/21/OVÚR/NEH zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Rovněž poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a to do 5 dnů od výše uvedeného termínu. Celková lhůta uplynula dne 14.04.2021.

Dne 17.05.2021 stavební úřad vyzval žadatele výzvou vydanou pod č.j.: MCBSLA/03611/21/OVÚR/NEH k doplnění podkladů a řízení přerušil usnesením vydaným pod č.j.: MCBSLA/03625/21/OVÚR/NEH ze dne 17.05.2021, které nabylo právní moci dne 19.06.2021.

Dne 26.04.2022 stavební úřad oznámil pokračování v územním řízení veřejnou vyhláškou vydanou pod č.j.: MCBSLA/03033/22/OVÚR/VK.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

K žádosti byla připojena DUR v plném rozsahu (ve dvojím vyhotovení), obsahující též tyto dokumenty dokladové části:

MMB OÚPR – koordinované stanovisko MMB/0356845/2020 ze dne 30.10.2020

MMB/0119154/2018 ze dne 5.11.2018

MMB – odbor dopravy – MMB/0253189/2021 ze dne 19.05.2021, MMB/0362535/2020 ze dne 13.10.2020, MMB/0425078/2018 ze dne 22.10.2018

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – SPMO 1899-993/2020-1150 ze dne 05.04.2018, a ze dne 08.09.2020

Krajská hygienická stanice – KHSJM 14187/2018/BM/HOK ze dne 10.04.2018

MMB odbor investiční – MMB/0359516/2020 ze dne 31.08.2020

MMB/012982/2018 ze dne 31.07.2018, MMB/0113357/2022 ze dne 14.04.2022

MMB majetkový odbor – MMB/0360970/2020 ze dne 11.09.2020

MMB/0119228/2018 ze dne 29.03.2018

Brněnské komunikace a.s. – BKOM/200/60/2020 ze dne 02.09.2020 prodloužená platnost

BKOM/28988/2021 ze dne 06.12.2021, BKOM/12536/2019 ze dne 20.05.2019

DPMB a.s. – 14184/2020/5040 ze dne 26.8.2020, 3367/2018/5040 ze dne 12.04.2018

TSB a.s. - TSB/09944/2020 ze dne 23.09.2020, prodloužené TSB/13341/2021 ze dne 25.11.2021

BVK a.s – BVK/02733/2022 ze dne 10.02.2022, 722/018884/2020/IBa ze dne 31.08.2020, 722/005956/2019/IBa ze dne 25.03.2019

GridServices s.r.o. – 5002215085 ze dne 11.09.2020

E.ON Distribuce, a.s. n. zn.: B6941-16312752 ze dne 28.03.2019

EG.D, a.s. n. zn.: B6941-26101890 ze dne 17.03.2021

Vodafone Czech Republic a.s. – 200827-0905204005 ze dne 30.08.2020, n. zn.: 211116-1208360113 ze dne 18.11.2021

SMART Comp, a.s. vyjádření č.: V-0315/2018 ze dne 08.12.2021

Vivo Connection spol. a.s. – 2205000692 ze dne 27.08.2020

SMART Comp. a.s., (netbox), V-0315/2018 ze dne 08.12.2021

Faster CZ spol. s.r.o. – ze dne 02.09.2020

Policie – spec. Pracoviště dopravního inženýrství - KRPB-66556-1/ČJ-2019-0600DI-SBI ze dne 01.04.2019

Starosta městské části Brno – Slatina MCBSLA/02078/18/MO/Hof ze dne 25.04.2018

Cetin a.s.- 596838/21 ze dne 25.03.2021

Itself s.r.o. 21/001409 ze dne 31.3.2021

Eg.d a.s. B6941-26101890 ze dne 17.03.2021

ČD – telematika - 1202108400 ze dne 27.04.2021

Policie – odbor správy majetku – KRPB-2542-166/ČJ-2018-0600MN-VOL ze dne 23.03.2018

Policie – Specializované pracoviště DI, KPPB-66556 1ČJ-2019-0600DI-SBI ze dne 01.04.2019

T-mobile Czech Republic a.s. – E36349/20 ze dne 27.08.2020

České Radiokomunikace a.s. – UPTS/OS/253935/2020 ze dne 26.08.2020, UPTS/OS/290294/2021 ze dne 16.11.2021

MUNI – MU-IS/76214/2019/905477/ÚVT-2/3325 ze dne 26.08.2020

NET4GAS s.r.o. - 8132/20/OVP/N ze dne 26.08.2020

Hasičský záchranný sbor – HSBM-73-1-570/1-OPST-2018 ze dne 04.04.2018

Teplárny Brno – 17457/2020/TB ze dne 27.08.2020

Veřejná zeleň města Brna – S/524/18 ze dne 23.3.2018

Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanovení okruhu účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka územního řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníky územního řízení tedy jsou:

Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

- Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Statutární město Brno, MČ Brno-Slatina, starosta, Tilhonova č.p. 450/59, 627 00 Brno

Účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Brno Eastgate I. s.r.o., U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 18
- STAVOS Brno, a.s., U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 18
- Společenství pro dům Šmahova 88, 90, 92, Brno, Šmahova č.p. 1430/90, Slatina, 627 00 Brno 27
- FLSmidth spol. s r.o., Řípská č.p. 1229/4a, Slatina, 627 00 Brno 27
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
- RENOCAR, a.s., Podolí č.p. 445, 664 03 Podolí u Brna
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
- PRO-DOMA, spol. s r.o., Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
- RENOCAR Real Estate, a.s., Řípská č.p. 1293/5c, Slatina, 627 00 Brno
- Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2
- Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, 601 67 Brno
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky č.p. 64/151, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3
- Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
- Teplárny Brno, a.s., Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- T-Mobile Czech Republic a.s., č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
- SMART Comp. a.s., (netbox), Kubíčková č.p. 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č.p. 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna
- Faster CZ spol. s r.o., Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno
- Statutární město Brno, ÚMČ Brno Slatina, Majetkový odbor, Tilhonova 59, Slatina, 627 00 Brno
- Československá obchodní banka, a. s., Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou) – Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (identifikováni podle §86 odst. 5 stavebního zákona):

Pozemky parc. č. 1775/1, 1775/10, 1875/1, 1927, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/7, 2002/8, 2002/9, 2002/11, 2002/12, 2002/18, 2002/70, 2002/72, 2002/76, 2002/78, 2002/85, 2002/86, 2002/87, 2002/92, 2002/93, 2002/94, 2002/95, 2002/96, 2002/97, 2002/98, 2002/99, 2002/100(P), 2002/101, 2002/102, 2002/120, 2002/122, 2002/123, 2002/124, 2002/141, 2002/142, 2002/143(P), 2002/144, 2002/145, 2002/146, 2002/147, 2002/148, 2002/149, 2002/151, 2002/152, 2002/154, 2002/160, 2002/162, 2002/168, 2002/170, 2002/171, 2002/172, 2010/1, 2010/4, 2010/7, 2010/12, 2010/14, 2010/15, 2010/16, 2011/1, 2012/54, 2012/56, 2012/57, 2012/70, 2013/4, 2058/1, 2058/6, 2058/13, 2058/15, 2058/37, 2195/1, 2195/13, 2195/16, 2195/17, 2195/18, 2195/19, 2195/31, 2195/48, 2195/49, 2195/51, 2196/6, 2196/7, 2196/16, 2197/4, 2197/23, 2197/62, 2200/3, 2200/4, 2202/6, 2202/21, 2204/1, 2205/1, 2205/2, 2205/12, 2205/14, 2205/18, 2205/24, 2207/2, 2211, 2212, 2214/8, 2214/9, 2215/2, 2215/3, 2216/1, 2218/5, 2221/3, 2221/7, 2224/2, 2231/1, 2231/17, 2941/2, 2941/6, 2941/14, 2944/1, 2946, 2947/7, vše k.ú. Slatina, obec Brno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno podáním učiněným na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení usnesení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, opatřený doložkou právní moci; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků oznámení doručuje podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

otisk úředního razítka

vedoucí odboru výstavby
a územního rozvoje

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměruje.

Doručí se:

Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)

Žadatel:

Statutární město Brno, IČO 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupení zmocněncem: **Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt, Renneská třída č.p. 787/1a, 639 00 Brno**

Účastník podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručuje se jednotlivě):

Statutární město Brno, MČ Brno-Slatina, starosta, Tilhonova č.p. 450/59, 627 00 Brno

Účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Brno Eastgate I. s.r.o., IDDS: 8zssutp, U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 18
STAVOS Brno, a.s., IDDS: gqpgf4m, U Svitavy č.p. 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 18
Společenství pro dům Šmahova 88, 90, 92, Brno, Šmahova č.p. 1430/90, Slatina, 627 00 Brno
FLSmidth spol. s r.o., IDDS: r2pn97b, Řípská č.p. 1229/4a, Slatina, 627 00 Brno 27
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
RENOCAR, a.s., IDDS: 4wnfz53, Podolí č.p. 445, 664 03 Podolí u Brna
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
PRO-DOMA, spol. s r.o., IDDS: uwkuwv5, Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha
RENOCAR Real Estate, a.s., IDDS: 9x3y6jc, Řípská č.p. 1293/5c, Slatina, 627 00 Brno

Vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury:

Magistrát města Brna, Odbor investiční, IDDS: a7kbrn, Kounicova č.p. 949/67, 601 67 Brno
Magistrát města Brna, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrn, Malinovského nám. č.p. 624/3, 601 67 Brno
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt, Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Dopravní podnik města Brna, a.s., IDDS: bj6cd4x, Hlinky č.p. 64/151, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb, Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf, Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5, Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, náměstí Junkových č.p. 2808/2, 155 00 Praha
Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt, Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Faster CZ spol. s r.o., IDDS: gyw5w8t, Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno
SMART Comp. a.s., (netbox), IDDS: imwgcd4, Kubíčková č.p. 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IDDS: 7zzawdd, Nádražní č.p. 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk, sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno 15
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Slatina, Majetkový odbor, IDDS: a7kbrn, sídlo: Tilhonova 59, Slatina, 627 00 Brno
Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdK3s, Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Účastníci podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (identifikováni podle §86 odst. 5 stavebního zákona):

Pozemky parc. č. 1775/1, 1775/10, 1875/1, 1927, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/7, 2002/8, 2002/9, 2002/11, 2002/12, 2002/18, 2002/70, 2002/72, 2002/76, 2002/78, 2002/85, 2002/86, 2002/87, 2002/92, 2002/93, 2002/94, 2002/95, 2002/96, 2002/97, 2002/98, 2002/99, 2002/100(P), 2002/101, 2002/102, 2002/120, 2002/122, 2002/123, 2002/124, 2002/141, 2002/142, 2002/143(P), 2002/144, 2002/145, 2002/146, 2002/147, 2002/148, 2002/149, 2002/151, 2002/152, 2002/154, 2002/160, 2002/162, 2002/168, 2002/170, 2002/171, 2002/172, 2010/1, 2010/4, 2010/7, 2010/12, 2010/14, 2010/15, 2010/16, 2011/1, 2012/54, 2012/56, 2012/57, 2012/70, 2013/4, 2058/1, 2058/6, 2058/13, 2058/15, 2058/37, 2195/1, 2195/13, 2195/16, 2195/17, 2195/18, 2195/19, 2195/31, 2195/48, 2195/49, 2195/51, 2196/6, 2196/7, 2196/16, 2197/4, 2197/23, 2197/62, 2200/3, 2200/4, 2202/6, 2202/21, 2204/1, 2205/1, 2205/2, 2205/12, 2205/14, 2205/18, 2205/24, 2207/2, 2211, 2212, 2214/8, 2214/9, 2215/2, 2215/3, 2216/1, 2218/5, 2221/3, 2221/7, 2224/2, 2231/1(P), 2231/17(P), 2941/2, 2941/6, 2941/14, 2944/1, 2946, 2947/7, vše k.ú. Slatina, obec Brno.

Dotčené orgány:

Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství MB a BO, IDDS: jydai6g, sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
Magistrát města Brna, MMB Odbor dopravy, IDDS: a7kbrn, sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, MMB Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrn, sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno

Statutární město Brno, Magistrát města Brna, OÚPR, IDDS: a7kbrn, sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

Spis – pověřená úřední osoba

Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů po dni vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-Slatina. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění umožňující dálkový přístup ukončeno dne:

Otisk razítka a podpisu orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto dokumentu a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
