

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 264/2023

číslo smlouvy zhotovitele: 35/2023

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

## SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

**Město Dačice**

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený: [redacted] - starostou města  
IČO: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[redacted] - starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: [redacted] - pracovník odboru správy majetku,

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[redacted] - pracovník odboru správy majetku,  
tel. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**SATES ČECHY, s.r.o.**

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099  
Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Datová schránka: hddy9rg

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 164 zákona 283/2021 Sb.)

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

### 1. PREAMBULE

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

## „Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a č. 3 a nedílnou součást této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

**Dílo se skládá z následujících částí – jednotlivých stavebních objektů (dále také „SO“):**

SO 01 – Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

SO 02 – Oprava chodníku v ul. Bezručova - pravá strana

**Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:**

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
- min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
- zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou geodetickou firmou (3x písemná forma, 1x digitální forma, s ohledem na potřeby předání geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje – vyhl. č. 393/2020 Sb.),
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- zajištění pěšího přístupu k nemovitostem majitelů sousedních pozemků.

2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.

2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

### 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel zahájí práce dne 3.7.2023.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.  
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 2820/1, p.č. 2817, p.č. 2815, p.č. 1171/1.
- 3.2 **Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 29.9.2023 a ukončení díla, jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 16.10.2023.**
- 3.3 **Zhotovitel nejprve provede úsek od křižovatky ul. Bezručova a ul. Třídař. 9. května po čp. 195. Tentu úsek bude zhotoven nejpozději do 30.8.2023.**
- 3.4 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.
- 3.5 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.6 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.8 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.9 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že realizaci díla dle této smlouvy předchází rekonstrukce plynovodu v předmětných pozemcích. Pokud nebude možno zahájit práce dle smlouvy z důvodu probíhajících prací na plynovodu, objednatel se zhotovitelem se zavazují uzavřít dodatek, kterým prodlouží termíny uvedené v tomto článku výše v bodě 3.1, 3.2 a 3.3 tak, aby práce dle této smlouvy co nejvhodněji navázaly na řádně ukončenou rekonstrukci plynovodu.



#### 4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla bez DPH činí 3 498 324,58 Kč**

- 4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
  - b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
  - c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 4.3 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 13 odst. 13.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla.

- 4.4 Postup ocenění změn díla:

**Vícepráce** – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

**Měněpráce** - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

### 5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.

- 5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
  - a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti;
  - b) mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce;
  - c) zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce;

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

- d) veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – změnovým listem – který bude odsouhlasen podle čl. 4. odstavce 4.3 této smlouvy;
- e) cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.5 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## 6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k provádění díla:
- Stavební povolení vydané odborem dopravy Městského úřadu v Dačicích dne 2.5.2022, č. spisu: 414-2022/PROM, č.j.: DACI/10808/22/ODO
  - Projektovou dokumentaci vyhotovenou projekční kanceláří PROfi Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, č. zakázky: 2021-000064
  - Územní rozhodnutí vydané stavebním odborem Městského úřadu v Dačicích dne 3.4.2023, č. spisu: OSÚ/582-2023/VRER, č.j.: DACI/5208/23/OSÚ
  - Projektovou dokumentaci vyhotovenou projekční kanceláří SETO, spol. s.r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, č. zakázky: 20/2022
- 6.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

6.7 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu aktuálních předpisů zákon prováděcích.).


Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.

6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

- 6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce.. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.14 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.16 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.19 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

## 7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu:  nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí řádně provedeného díla.



## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném objednatelem.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

## 8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **36 měsíců**.  
Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

- 8.4 Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.
- 8.6 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

### 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínech ujednaných v čl. 3. odstavci 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s čl. 5. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

### 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
  - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli (nedotýká se oprávnění zhotovitele, aby část díla byla prováděna poddodavatelem),
  - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
  - v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a požadavky a pokyny objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

## **12. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE**

- 12.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
- 12.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
- 12.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

## **13. VYŠŠÍ MOC**

- 12.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které objektivně brání v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto platí pouze po dobu existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvních strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.
- 12.2 Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho smluvních partnerů, výpadky produkce, vady materiálu, selhání technického vybavení zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence, předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele či jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele.
- 12.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání vyšší moci po dobu delší třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro

## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

- 13.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 13.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 13.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 14. zasedání konaném dne 26.4.2023 pod č. usnesení 331/14/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.



## Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice – II. etapa

13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na [www.dacice.cz](http://www.dacice.cz).

13.12 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb SO 01

Příloha č. 2 – koordinační situace stavby SO 01

Příloha č. 3 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb SO 02


Příloha č. 4 – koordinační situace stavby SO 02

V Dačicích dne 29.5.2023

V Telči dne 26.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
za město Dačice

starosta

.....  


za SATES ČECHY s.r.o.

jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000064  
Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	19.01.2022
Zadavatel: Město Dačice		IČ: DIČ:	00246476
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.		IČ: DIČ:	25172654 CZ25172654
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.		IČ: DIČ:	18198228 CZ18198228
Zpracovatel: Zbytovská		IČ: DIČ:	

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 520 555,17</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 520 555,17	529 316,59
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 049 871,76</b>
<b>v CZK</b>			

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000064

**Stavba:** OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE

Místo: Datum: 19.01.2022

Zadavatel: Město Dačice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Zbytovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 520 555,17</b>	<b>3 049 871,76</b>	
SO 00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	233 100,00	282 051,00	STA
SO 02	CHODNÍK PO PRAVÉ STRANĚ	2 287 455,17	2 767 820,76	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE  
Objekt:  
SO 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Město Dačice  
Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.  
Projektant:  
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:  
Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 19.01.2022  
IČ: 00246476  
DIČ:  
IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>233 100,00</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		233 100,00	21,00%	48 951,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>282 051,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE

Objekt: SO 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 19.01.2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s  
r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**233 100,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

233 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

104 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

60 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

27 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

23 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 600,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE  
 Objekt: SO 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 19.01.2022  
 Zadavatel: Město Dačice Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.  
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>233 100,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				233 100,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				104 500,00	
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich srávcům.					
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby, Geodetické měření v průběhu stavby, vytýčení stavby					
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na geodetické zaměření provedeného díla v systému Micro Station.					
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.					
D	VRN3		Zařízení staveniště				60 500,00	
5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
6	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.					
7	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<i>Online PSC</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000</a> <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN4		Inženýrská činnost				27 500,00	
8	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000</a> Poznámka k položce:					
	P		Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.					
9	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000</a> Poznámka k položce:					
	P		náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP					
D	VRN7		Provozní vlivy				23 000,00	
10	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002001</a> Poznámka k položce:					
	P		zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení					
D	VRN9		Ostatní náklady				17 600,00	
11	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	2,000	8 800,00	17 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000</a> Poznámka k položce:					
	P		Odvodnění staveniště po dobu stavby.					
	WV		"Odvodnění staveniště po dobu stavby"					
	WV		"SO 01" 1			1,000		
	WV		"SO 02" 1			1,000		
	WV		Součet			2,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE  
Objekt:  
**SO 02 - CHODNÍK PO PRAVÉ STRANĚ**

KSO:  
Misto:  
Zadavatel:  
Město Dačice  
Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.  
Projektant:  
PROfi Jihlava spol. s r.o.

CC-CZ:  
Datum: 19.01.2022  
IČ: 00246476  
DIČ:  
IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
IČ: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zbytovská

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 287 455,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 287 455,17	21,00%	480 365,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 767 820,76**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE

Objekt: **SO 02 - CHODNÍK PO PRAVÉ STRANĚ**

Místo:

Zadavatel: Město Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 19.01.2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s  
r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**2 287 455,17**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

2 234 450,57

1 - Zemní práce

457 487,74

5 - Komunikace pozemní

838 284,08

8 - Trubní vedení

183 001,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

501 840,41

997 - Přesun sutě

46 779,15

998 - Přesun hmot

207 057,45

#### M - Práce a dodávky M

53 004,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

53 004,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKU V UL. BEZRUČOVA, DAČICE  
 Objekt: SO 02 - CHODNÍK PO PRAVÉ STRANĚ

Místo:  
 Zadavatel: Město Dačice  
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 19.01.2022  
 Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.  
 Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 287 455,17</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 234 450,57	
D	1		Zemní práce				457 487,74	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	908,000	46,75	42 453,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121</a>					
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	95,000	64,74	6 150,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106162</a>					
		VV	"dvojřádek z žul. kostek" 95		95,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	495,000	47,28	23 404,79	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111</a>					
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	349,260	154,62	54 001,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351104</a>					
		VV	(625*0,32)+(208+60+15)*0,37+(314+48+133)*0,3*0,3		349,260			
5	K	16275113R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na skládku zhotovitele	m3	349,260	218,90	76 453,01	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	349,260	15,03	5 248,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201</a>					
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	593,742	30,00	17 812,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201221</a>					
		VV	349,26*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		593,742			
8	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	72,160	1 280,24	92 381,76	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131</a>					
		VV	0,4*0,4*451		72,160			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,160	157,67	11 377,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101</a>					
10	K	141720015	Neřízený zemní prolak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm	m	29,000	2 599,30	75 379,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/141720015</a>					
		VV	12*17		29,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	1 056,500	50,00	52 825,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302</a>					
D	5		Komunikace pozemní				838 284,08	
12	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	625,000	203,50	127 187,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111</a>					
13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	431,500	247,50	106 796,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111</a>					
14	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	908,000	341,00	309 628,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211213</a>					
		VV	625+208+15+60		908,000			
15	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	841,330	280,29	235 818,30	CS ÚRS 2022 01
		VV	625+208		833,000			
		VV	833*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		841,330			
16	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	61,800	627,29	38 766,62	CS ÚRS 2022 01
		VV	60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		61,800			
17	M	5924503R	dlažba reliéfní (drážky) betonová 200x200x80mm přírodní	m2	15,450	1 300,16	20 087,41	CS ÚRS 2022 01
		VV	15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,450			
D	8		Trubní vedení				183 001,74	
18	K	871254301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	33,000	2 599,30	85 776,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871254301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871254301</a>					
		VV	"chránička pro zemní protlak" 14+19		33,000			
19	M	28613415	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 90x5,4mm	m	33,000	2 599,30	85 776,90	CS ÚRS 2022 01
20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	1 635,42	11 447,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				501 840,41	
21	K	91611112R	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek ve dvou řadách s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m2	95,000	1 232,00	117 040,00	
		P	Poznámka k položce: použití stávajících kostek					
22	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	4,750	1 001,00	4 754,75	CS ÚRS 2022 01
		P	Poznámka k položce: doplnění kostek - ztratné 5%					
		VV	95*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,750			
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	495,000	360,00	178 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213</a>					
		VV	314+48+133		495,000			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	320,280	164,17	52 580,42	CS ÚRS 2022 01
		VV	314*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		320,280			
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	48,960	586,35	28 707,62	CS ÚRS 2022 01
		VV	48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		48,960			
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	135,660	207,13	28 098,71	CS ÚRS 2022 01
		VV	133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,660			
27	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	495,000	104,50	51 727,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122132</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	495,000	71,50	35 392,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111</a>					
29	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	95,000	56,20	5 338,91	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122</a>					
D	997		Přesun sutě				46 779,15	
30	K	99722157R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku zhotovitele	t	101,475	110,00	11 162,25	
		VV	"bet. obrubníky" 101,475		101,475			
31	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	101,475	100,00	10 147,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221615</a>					
32	K	99722157R.1	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku investora	t	231,540	110,00	25 469,40	
		VV	"bet. dlažba" 231,540		231,540			
D	998		Přesun hmot				207 057,45	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	904,181	229,00	207 057,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011</a>					
D	M		Práce a dodávky M				53 004,60	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				53 004,60	
34	K	460791112	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	480,000	52,80	25 344,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791112</a>					
35	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	504,000	54,88	27 660,60	CS ÚRS 2022 01
		VV	480*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		504,000			

# KAPITULACE STAVBY

Číslo: 20/2022  
Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

KSO:  
Místo: Dačice

CC-CZ:  
Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:  
Město Dačice, Krajčířova 27/I, 38001 Dačice

IČ: 00246476  
DIČ:

Uchazeč:  
SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654  
DIČ: CZ25172654

Projektant:  
SETO, spol. s.r.o., Hradecká 17, 380 01 Dačice

IČ: 46683461  
DIČ: CZ46683461

Zpracovatel:  
Matěj Distel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 977 769,41

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	977 769,41	205 331,58
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 183 100,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/2022

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Místo: Dačice

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajčírova 27/II, 38001 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s.r.o.,  
Hradecká 17, 380 01  
Matěj Distel

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>977 769,41</b>	<b>1 183 100,99</b>
01	Montáž VO	952 112,31	1 152 055,90
02	Demontáž VO	25 657,10	31 045,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Objekt:

**01 - Montáž VO**

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajiřova 27, 380 13 Dačice I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

SETO, spol s.r.o., Hradecká 17, 380 01 Dačice

IČ:

46683461

DIČ:

CZ46683461

Zpracovatel:

Matěj Distel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**952 112,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 112,31	21,00%	199 943,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 152 055,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Objekt: **01 - Montáž VO**

Místo: Dačice  
Zadavatel: Město Dačice, Krajčíkova 27, 380 13 Dačice I  
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Datum: 30. 6. 2022  
Projektant: SETO, spol s.r.o.,  
Hradecká 17, 380 01  
Dačice  
Zpracovatel: Matěj Distel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**952 112,31**

HSV - Práce a dodávky HSV	19 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 610,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 610,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
M - Práce a dodávky M	886 992,31
21-M - Elektromontáže	548 339,41
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 013,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	336 639,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 100,00
VRN5 - Finanční náklady	550,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 650,00

# SOUPIS PRACÍ

stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice  
 Objekt: **01 - Montáž VO**  
 Místo: Dačice Datum: 30. 6. 2022  
 Zadavatel: Město Dačice, Krajiřova 27, 380 13 Dačice I Projektant: SETO, spol s.r.o.,  
 Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Matěj Distel  
 Hradecká 17, 380 01  
 Dačice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**952 112,31**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 360,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				19 360,00
1	K	945421110.1	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	15,000	528,00	7 920,00
2	K	945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	13,000	880,00	11 440,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 610,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5 610,00
3	K	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm <sup>2</sup>	kus	3,000	946,00	2 838,00
4	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	3,000	924,00	2 772,00
D	746		Elektromontáže - soubory pro vodiče				0,00
D	M		Práce a dodávky M				886 992,31
D	21-M		Elektromontáže				548 339,41
5	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	kus	26,000	95,04	2 471,04
	vv		13*2		26,000		
6	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 25 mm <sup>2</sup>	kus	34,000	251,90	8 564,60
7	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	13,000	473,00	6 149,00
8	M	34774007	svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 40W, chromatičnosti 2700K, s možností dvouúrovňového stmívání	kus	13,000	8 855,00	115 115,00
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	13,000	1 694,00	22 022,00
10	M	31674069	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m	kus	13,000	12 875,50	167 381,50
11	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	13,000	748,00	9 724,00
12	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	13,000	2 233,00	29 029,00
13	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	625,90	6 259,00
14	M	1394456	EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	10,000	874,50	8 745,00
15	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	649,00	1 947,00
16	M	1394457	EL.VYZBROJ 2POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN	kus	3,000	907,50	2 722,50
17	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	546,000	56,32	30 750,72
	vv		546		546,000		
18	M	8500068040v	Drát zemnicí FeZn pr. 10mm (50kg/bal = 80,5bm)	kg	371,280	68,75	25 525,50
	vv		546*0,68 *Přepočtené koeficientem množství		371,280		
19	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	61,000	115,50	7 045,50
	vv		61		61,000		
20	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	48,000	15,18	728,64
21	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	13,000	63,80	829,40
22	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	300,00	300,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
23	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
24	K	210280542	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	715,00	715,00
25	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	130,000	25,08	3 260,40
	vv		13*10		130,000		
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	136,500	15,29	2 087,09
	vv		130*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,500		
27	K	210902012	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm <sup>2</sup>	m	687,000	29,48	20 252,76
28	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm <sup>2</sup>	m	721,350	102,19	73 714,76
	vv		687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		721,350		
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 013,00
29	K	220370023	Montáž ovládací soupravy venkovní OSR 3 na stožár	kus	1,000	2 013,00	2 013,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				336 639,90
30	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,622	2 035,00	1 265,77
	vv		0,687-(13*0,005)		0,622		
31	K	460080201	Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m <sup>2</sup>	6,240	343,20	2 141,57
	vv		13*(4*0,6*0,2)		6,240		
32	K	460080301	Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m <sup>2</sup>	6,240	76,12	474,99
33	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m <sup>3</sup>	4,680	1 067,00	4 993,56
	vv		13*(0,6*0,6*1)		4,680		
34	K	460161141	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	594,000	126,50	75 141,00
35	K	460161311	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	748,00	11 220,00
36	K	460211112	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení strojně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 2	kus	3,000	605,00	1 815,00
37	K	460242111	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem	kus	30,000	60,50	1 815,00
38	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	35,000	110,00	3 850,00
39	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	609,000	14,85	9 043,65
40	K	460260001	Zatažení kabelu do chráničky	m	661,000	9,35	6 180,35
	vv		(687-13*2)		661,000		
41	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m <sup>3</sup>	13,716	126,50	1 735,07
	vv		(4,68+0,35*0,5*594*0,08+0,5*1,2*15*0,08)		13,716		
42	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m <sup>3</sup>	68,580	27,50	1 885,95
	vv		13,716*5		68,580		
43	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,689	313,50	7 740,00
	vv		13,716*1,8		24,689		
77	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	13,716	147,40	2 021,74
45	K	460431151	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	594,000	41,80	24 829,20
46	K	460431331	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	15,000	181,50	2 722,50
47	K	460481111	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	2,000	28,05	56,10
48	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	3,900	3 509,00	13 685,10
	vv		0,3*13		3,900		
49	M	WVN.DP415500 W	Trubka kanalizační plastová KGEM-315x5000 SN4	kus	2,600	4 620,00	12 012,00
	vv		(1*13)/5		2,600		
50	K	460661111	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	594,000	71,50	42 471,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
51	K	460661112	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhuštění a urovňování povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	15,000	99,00	1 485,00
52	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	639,450	13,53	8 651,76
	vv				639,450		
53	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	661,000	26,40	17 450,40
	vv				661,000		
54	M	10.079.365	TRUBKA KOPOFLEX 75MM CERVENA KF 09075 BA	m	661,000	38,28	25 303,08
55	K	460762111	Křížovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez zášypu	kus	15,000	539,00	8 085,00
56	K	460871153	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhuštění, tloušťky do 20 cm	m2	10,500	217,80	2 286,90
	vv		15*0,7		10,500		
57	K	460881215	Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 8 cm	m2	10,500	1 045,00	10 972,50
	vv		15*0,7		10,500		
58	K	460891221	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového silničního stojatého, do lože z betonu prostého	m	4,000	308,00	1 232,00
59	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	4,000	220,00	880,00
60	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	10,500	193,60	2 032,80
61	K	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	4,000	74,80	299,20
62	K	468041123	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm	m	30,000	154,00	4 620,00
	vv		15*2		30,000		
63	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,060	495,00	1 019,70
64	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	10,300	16,50	169,95
	vv		2,06*5		10,300		
65	K	469973117	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,060	1 595,00	3 285,70
	vv		2,06		2,060		
66	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	106,960	203,50	21 766,36
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 950,00
68	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	10,000	495,00	4 950,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 200,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 300,00
69	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	3 850,00	3 850,00
70	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	19 250,00	19 250,00
71	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 200,00	2 200,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 600,00
72	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 500,00	5 500,00
73	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	1 100,00	1 100,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 100,00
74	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 100,00	1 100,00
	D	VRN5	Finanční náklady				550,00
75	K	053002000	Poplatky	...	1,000	550,00	550,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 650,00
76	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	1 650,00	1 650,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Objekt:

02 - Demontáž VO

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajčířova 27/I, 38001 Dačice

IČ: 00246476

DIČ:

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

Projektant:

SETO, spol. s.r.o., Hradecká 17, 380 01 Dačice

IČ: 46683461

DIČ: CZ46683461

Zpracovatel:

Matěj Distel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**25 657,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 657,10	21,00%	5 387,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 045,09**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Objekt: **02 - Demontáž VO**

Místo: **Dačice**

Datum: 30. 6. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajišova 27/I, 38001 Dačice

Projektant: SETO, spol. s.r.o.,  
Hradecká 17, 380 01  
Dačice

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Matěj Distel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>25 657,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 625,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 130,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 130,36
M - Práce a dodávky M	14 901,74
21-M - Elektromontáže	13 744,50
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	770,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	387,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bezručova, Dačice

Objekt:

**02 - Demontáž VO**

Místo:

Dačice

Datum:

30. 6. 2022

Zadavatel:

Město Dačice, Krajišova 27/I, 38001 Dačice

Projektant:

SETO, spol. s.r.o.,  
Hradecká 17, 380 01  
Dačice

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.


Zpracovatel:


Matěj Distel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 657,10</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 625,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 625,00
1	K	945421110.1	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	7,000	495,00	3 465,00
2	K	945421112	Hydraulický nakládací jeřáb na automobilovém podvozku do 5 t včetně obsluhy	hod	7,000	880,00	6 160,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 130,36
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 130,36
3	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 až 10 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 až 10 mm <sup>2</sup> , 5x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> , 7x1,5 až 4 mm <sup>2</sup> , 12x1,5 mm <sup>2</sup> uložený volně	m	70,000	11,66	816,20
	vv		7*10		70,000		
4	K	741126813	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm <sup>2</sup> uložený volně	m	21,000	14,96	314,16
	vv		7*3		21,000		
D	M		Práce a dodávky M				14 901,74
D	21-M		Elektromontáže				13 744,50
5	K	210100173-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm <sup>2</sup>	kus	14,000	22,00	308,00
	vv		2*7		14,000		
6	K	210100252-D	Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	14,000	66,00	924,00
7	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových na	kus	7,000	154,00	1 078,00
8	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000	968,00	6 776,00
9	K	210204100-D	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	385,00	2 695,00
10	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000	192,50	1 347,50
11	K	210220022-D	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	3,500	22,00	77,00
	vv		7*0,5		3,500		
12	K	210220301-D	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	14,000	38,50	539,00
	vv		7*2		14,000		
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				770,00
13	K	220370023-D	Montáž ovládací soupravy venkovní OSR 3 na stožár	kus	1,000	770,00	770,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				387,24
14	K	460361112	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) obsahující nebezpečné látky kód odpadu 17 05 03	t	0,038	9 900,00	376,20
	vv		0,019+0,0187		0,038		
15	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,038	235,40	8,95
16	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	0,190	11,00	2,09
	vv		0,038*5		0,190		




## Situační výkres širších vztahů

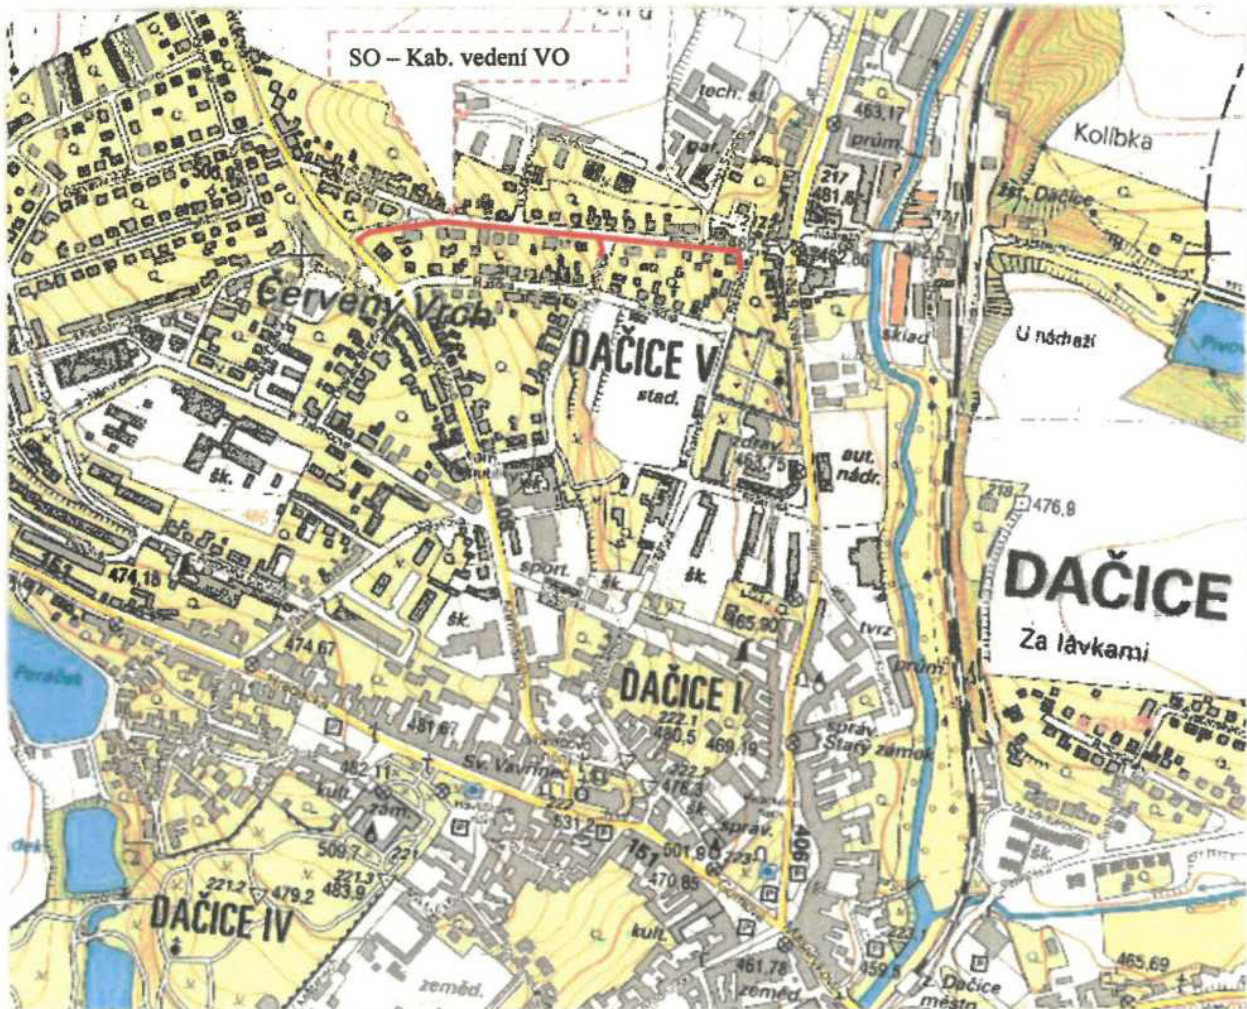

Nakreslil	Matěj Distel	Zodp. projektant	Ing. Milošlav Antoňů	 <b>SETO, spol. s r.o.</b> Hradecká 17/IV 380 01 Dačice tel: 384 420 665	
Místo stavby	Dačice	Kraj:	Jihočeský		
Investor	Město Dačice				
Název stavby	<b>Dačice, rekonstrukce veřejného osvětlení                  v ul. Bezručova, Dačice</b>			Číslo stavby	20/2022
				Název souboru	Širší vztahy
				Datum	06/2022
Druh přílohy	<b>Situace širších vztahů</b>			Formát výkresu	A4
				Měřítko	Číslo výkresu
				1:10000	1



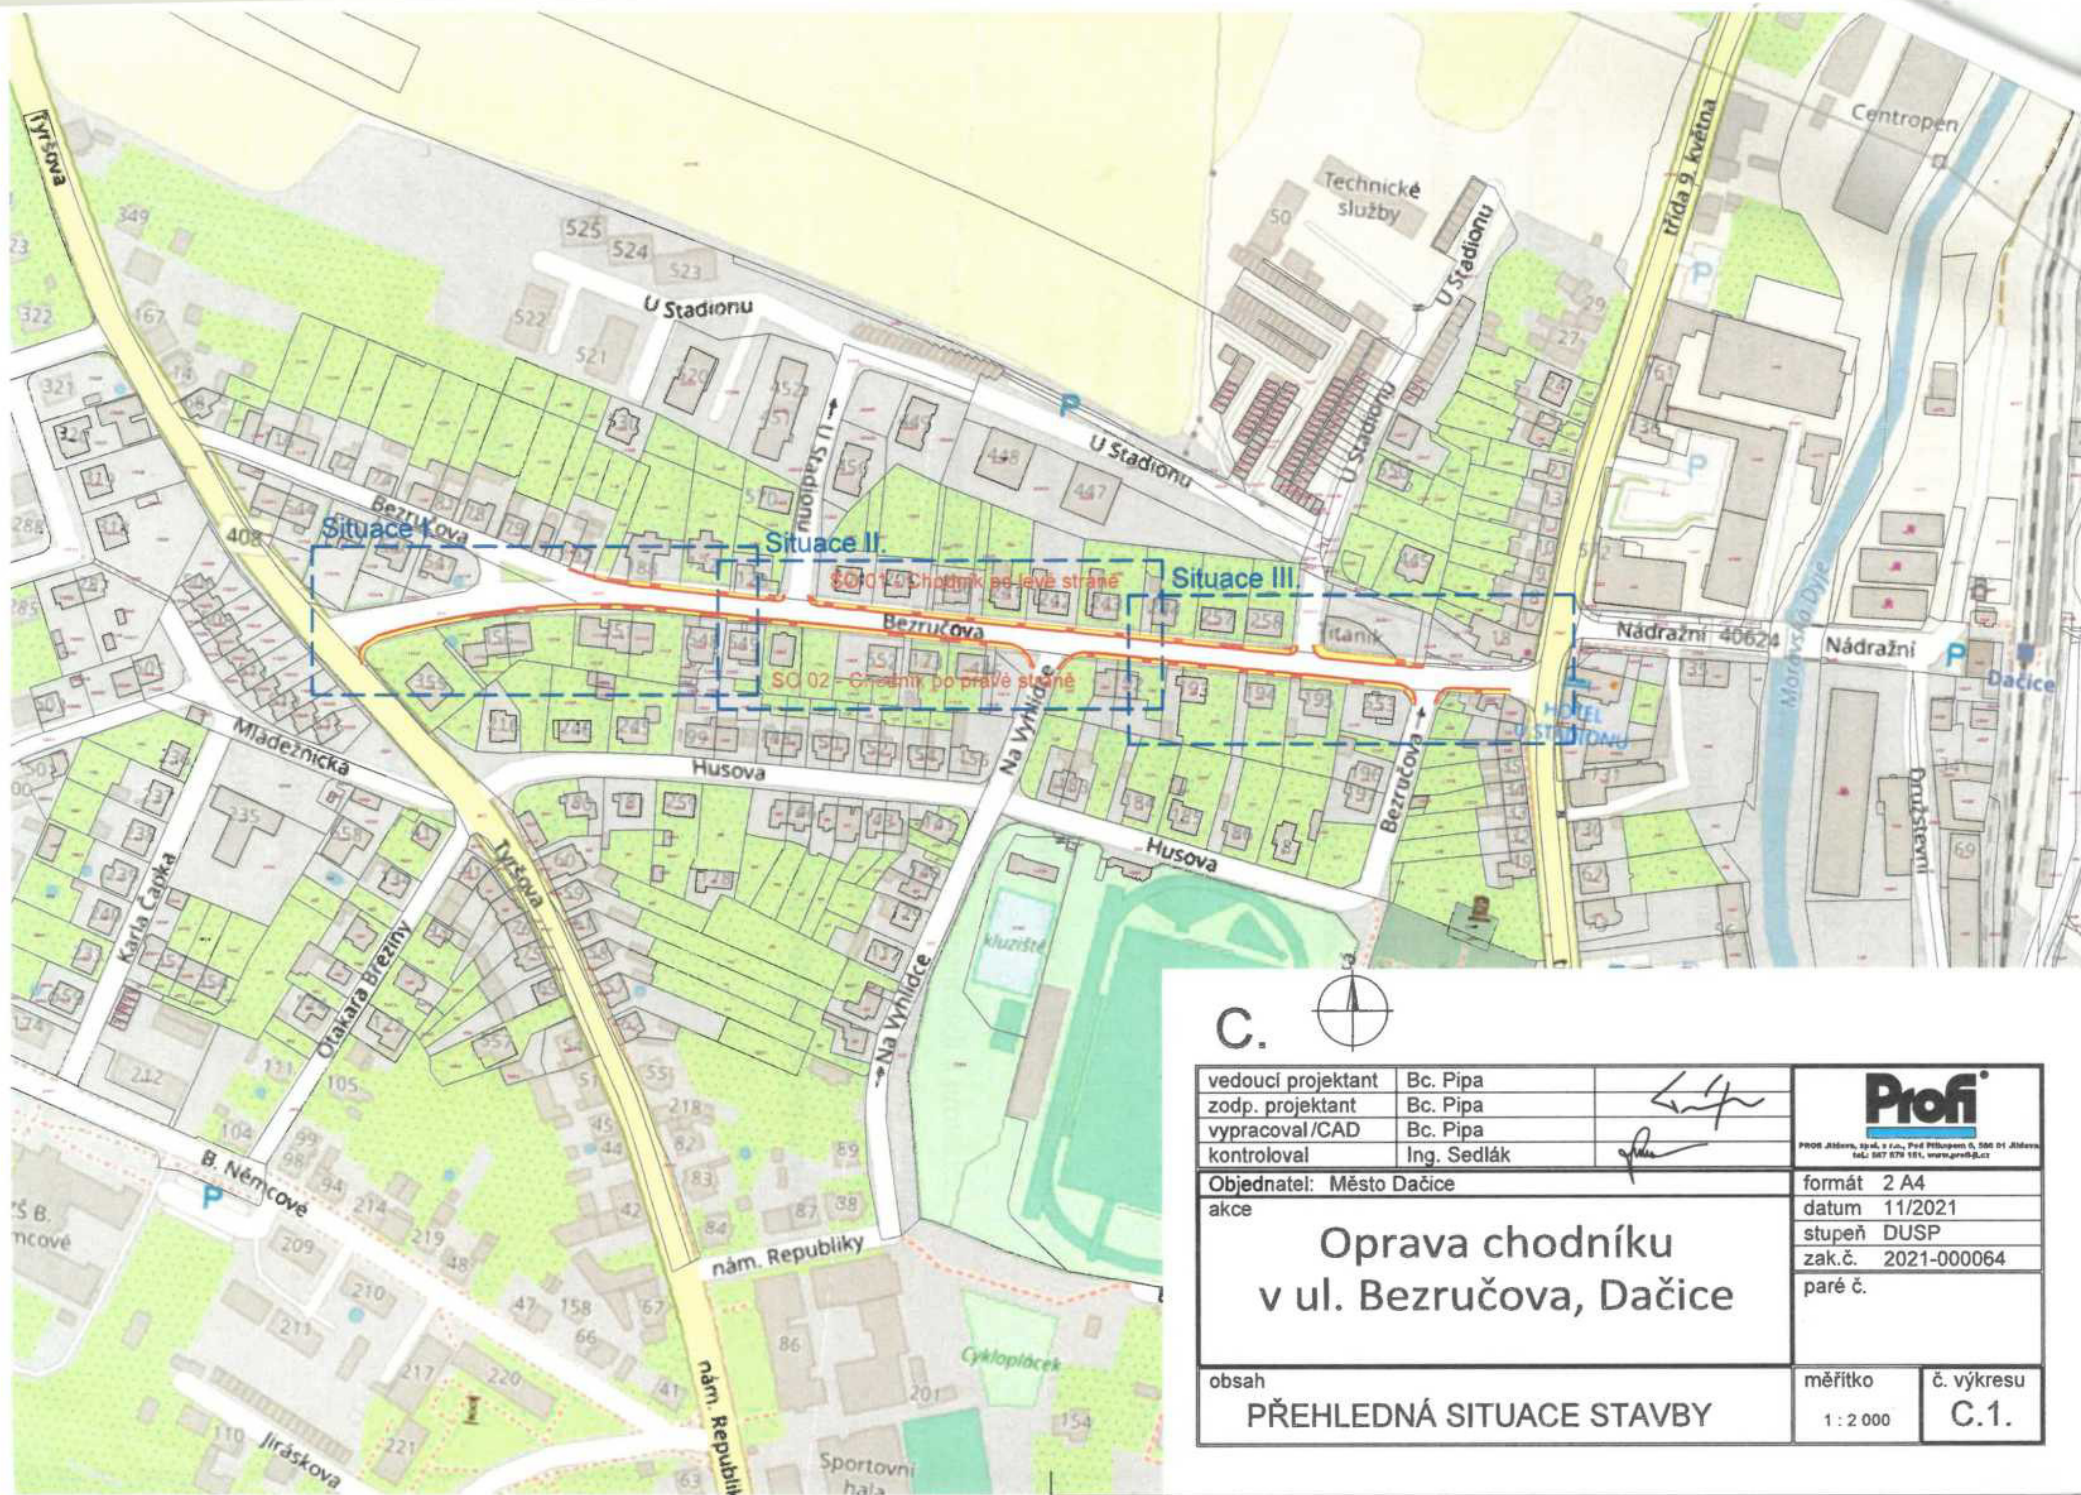

C.



vedoucí projektant	Bc. Pipa		
zodp. projektant	Bc. Pipa		
vypracoval/CAD	Bc. Pipa		
kontroloval	Ing. Sedlák		<small>PROFI s.r.o., v r.o., Pod Přibuzem 6, 500 01 Jihlava tel. 567 578 161, www.profi.cz</small>
Objednatel:	Město Dačice	formát 2 A4	
akce	<p align="center"><b>Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice</b></p>	datum 11/2021	
		stupeň DUSP	
		zak.č. 2021-000064	
		paré č.	
obsah	PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY	měřítko 1:2 000	č. výkresu C.1.
