

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 20.23
P23V00000192

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Název
VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený Václavem Košařem, ředitelem nebo Filipem Křenkem, obchodním zástupcem (na základě plné moci)

IČO: 29393728
DIČ: CZ29393728
Peněžní ústav: MONETA Money Bank a.s.

Č. účtu: 205189361/0600
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 38569.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18. 5. 2023 pod usn. 0906/RMOB-JIH/2226/20.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem: „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka“
 - etapa I – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, vymežujících hmotové, materiálové, stavebně-technické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost) včetně zajištění inženýrské činnosti a včetně soupisu prací – podklad pro fakturaci realizovaného díla (dále jen „etapa I“),
 - etapa II – realizace stavby (dále jen „etapa II“):
 - a) výměna výtahu 900 kg
 - b) výměna výtahu 1150 kg

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 20.23, „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

V obou stávajících výtazích jsou instalovány kamery se záznamem. Kamery budou ve výtazích demontovány a zpět namontovány do nových výtahů, provedení těchto prací musí zhotovitel konzultovat se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO: 28606582, kontaktní osoba: David Klíma, tel: 724 245 414.

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 17. 4. 2023, která je součástí realizační dokumentace stavby.

- Předmětem plnění etapy I – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (jednoduchý projekt určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, vymežujících hmotové, materiálové, stavebně-technické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost) včetně zajištění inženýrské činnosti a včetně soupisu prací je:
 - inženýrská činnost, zpracování projektové dokumentace v úrovni potřebné pro vydání stavebního povolení a zadání stavebních a montážních prací;

- dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření k realizaci stavby. V projektové dokumentaci budou zpracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky objednatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam všech příložených dokladů, doklady budou očíslovány;
 - projektová dokumentace bude před dokončením, prokazatelně projednána s objednatelem;
 - pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (pare). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažené;
 - zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v 5 vyhotoveních a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátech slučitelných s formáty .dwg, .pdf, .doc, .xls na CD ROM. Po provedení kontroly úplnosti bude vyhotoven dílčí protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel etapu I díla přebírá nebo nepřebírá, tj. dílčí předání díla – etapy I.
- V projektové dokumentaci bude zahrnuto:
- provedení opravy omítek a výmalba celé stěny při výměně výtahů
 - oprava podlahy a soklů u celé stěny výtahů
 - oprava omítek a výmalba strojovny
 - oprava a nátěr podlahy
- Předmětem plnění etapy II – realizace stavby:
- a) výměna výtahu 900 kg
 - b) výměna výtahu 1150 kg
- je samotná realizace stavby dle vypracované a schválené projektové dokumentace.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
- náklady na ostrahu;
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních a montážních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
- zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, .pdf, .doc, .xls; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplnou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlasného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 25, odst. 26 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplnou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: ul. Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství.

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Součástí projektové dokumentace bude zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1326/1, Ostrava-Hrabůvka“	Kč bez DPH
etapa I - projektová dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací	104.400,-
etapa II a) - realizace stavby výměna výtahu 900 kg	1.345.900,-
etapa II b) - realizace stavby výměna výtahu 1150 kg	1.471.600,-
Cena díla v Kč celkem	2.921.900,-

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny, případně cen jednotlivých částí může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 20.23; identifikátor: P23V00000192,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodářství),
 - j) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - k) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**, které bude provedeno následovně:
 1. faktura (dílčí faktura) 120.600,- Kč vč. DPH – etapa I, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí této části díla. K faktuře zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí projektové dokumentace
 2. faktura (dílčí faktura) 1.547.785,- Kč vč. DPH – etapa II – **a) výměna výtahu 900 kg** přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí této části díla. K faktuře zhotovitel přiloží protokol o předání a převzetí této části díla.
 3. faktura (závěrečná faktura) 1.692.340,- Kč vč. DPH – etapa II - **b) výměna výtahu 1150 kg** přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí této části díla.Po dokončení díla provede zhotovitel u 3. faktury závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány dílčí fakturace a vystaví fakturu doloženou celkovým soupisem provedených prací a protokolem o předání a převzetí této části díla. Závěrečná faktura bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky Objednatelem, musí být Objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
13. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
18. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1 této smlouvy:**

Etapa I:

- den následující po dni účinnosti této smlouvy

Etapa II:

- do 5 kalendářních dnů od předání staveniště. Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od výzvy objednatele. Termín předání staveniště bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“).

Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech:

- etapa I – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do 31 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

- etapa II
 - a) výměna výtahu 900 kg - do 40 kalendářních dnů (do doby realizace se nezapočítává lhůta nutná k objednání a výrobě komponentů potřebných k realizaci díla) od zahájení realizace této části díla.
Práce na druhém výtahu je nutno zahájit až po plném uvedení do provozu prvního výtahu, převzetí bude provedeno na základě předávacího protokolu.
 - b) Výměna výtahu 1150 kg – do 39 kalendářních dnů (do doby realizace se nezapočítává lhůta nutná k objednání a výrobě komponentů potřebných k realizaci díla) od řádného předání a převzetí etapy II a).

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla nebo jeho části dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla nebo jeho části (lhůty realizace) v souladu s harmonogramem dle čl. V. odst. 4, a to na základě ukončení realizace díla nebo jeho části a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla nebo jeho části. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla nebo jeho části v době vyhrazené pro předání a převzetí díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla nebo jeho části dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak. Přejímací řízení celého díla bude zahájeno souběžně s přejímacím řízením poslední části díla (etapy II b). O tomto přejímacím řízení bude sepsán souhrnný předávací protokol s uvedením seznamu předávacích protokolů dílčích částí.

3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány. U jednotlivých etap může dojít ke změnám následujícím způsobem:**

a) etapa I:

- odsouhlasením doby přerušení realizace této části díla kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních, přičemž doba přerušení se do lhůty realizace této části díla nezapočítává. **V těchto případech nebude uzavírán dodatek k smlouvě o dílo.** Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace této části díla s uvedením počtu dní přerušení a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace této části díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude přiložen k předávacímu protokolu.

b) etapa II:

- V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění této části díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která

brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

- V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
4. V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla nebo jeho části, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla
 5. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
 6. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
 7. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
 8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci etapy II, bude povinen zaplatit objednateli odstoupné ve výši 5 % z celkové ceny za etapu II bez DPH dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
 9. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo nebo jeho část jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru bytového a ostatního hospodářství. Dílo nebo jeho část se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo nebo jeho část možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezuje, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo nebo jeho část vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

10. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo jeho části, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
12. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepiše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla (části),
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
 - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, popř. že dílo nebo jeho část nepřejímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Po předání celého díla bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

13. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
14. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za příslušnou etapu za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním etapy I v termínu provedení této části díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny za etapu I dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním etapy II a) – výměna výtahu 900 kg v termínu provedení této části díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za etapu II a) dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním etapy II b) – výměna výtahu 1150 kg v termínu provedení této části díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za etapu II b) dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tyto smluvní pokuty budou počítány ode dne následujícího po dni, kdy mělo být provedeno a předáno dílo nebo jeho část dle časového harmonogramu
16. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 %, ze sjednané celkové ceny za etapu I bez DPH dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč, za každých 7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby dle projektové dokumentace.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se svolením zhotovitele.
2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný.
3. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací).
4. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
5. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
6. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
9. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě

předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

10. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
11. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
12. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
13. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
14. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
15. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
16. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
17. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
18. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
20. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
21. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
23. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
26. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
27. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace, a to včetně úhrady případných vzniklých škod.
2. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její části, bude objednatel uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z ceny za etapu I dle čl. III. odst. 1. této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezabavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto článku.
3. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na realizaci stavby nebo její části, bude objednatel uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny za etapu I dle čl. III. odst. 1. této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do výše max. 10 % z ceny za etapu I dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezabavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 1 a 2 tohoto článku.
4. V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za základ pro výpočet této smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden soupis prací projektanta nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektovat.
5. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla, zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
7. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - a) Etapa I – projektová dokumentace:
 - 60 měsíců
 - b) Etapa II – realizace stavby:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

8. Záruční doba u etapy I začíná plynout ode dne řádného převzetí projektové dokumentace objednatelem. Záruční doba u etapy II začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí příslušné části díla. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
9. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
12. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 14 tohoto článku.
13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 7 tohoto článku.
14. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
15. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 14 tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 9 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: p. Procházka
realizačních: p. Dluhoš
smluvních: p. Křenek
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Blanka Jalovicová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
pověření zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodářství.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:.....

Místo:


Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Filip Křenek

obchodní zástupce

Dokument je opatřen elektronickým podpisem



VÝTAHY A

Cenová nabídka provedení rekonstrukce výtahů


CENOVÁ NABÍDKA č. 22/2022

A



Zakázku vyřizuje: obchodní zástupce Filip Křenek
Výtahy Ostrava Servis s. r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přivoz
Tel. : 596 134 541 kl. 210, 777 076 223
Fax : 596 134 697
e-mail : f.krenek@vytahyostravaservis.cz

datum: 17.4.2023



Vážení obchodní přátelé.

Zasíláme Vám cenovou nabídku na rekonstrukce výtahu umístěného v obytném domě na Vybavení výtahu odpovídá provozu obytného domu. Provedení a vybavení výtahu odpovídá platným normám .

U tohoto výtahu dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) včetně jejího max.prodloužení a provedení jako neprůchozí s kabinovými dveřmi automatické čtyřpanelové teleskopické, šachetní jednokřídlové dveře budou vyměněny za nové ruční včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový jednorychlostní převodový , rozvaděč s frekvenčním měničem, novými přivolávači a tlačítkovou kazetou včetně TFT displejů ve všech stanicích a v kleci výtahu, omezovače rychlosti a koncového vypínače .

**Kotvy a vodítka kabiny budou nová.
Kotvy a vodítka protiváhy budou nová.**

**Původní protiváha bude vyměněna za novou v rámu
Nové nosné lana .**

Nosnost výtahu bude z 500 kg zvýšena na 900 kg tak, aby plocha výtahu odpovídala původní ploše výtahu a ČSN dle nákresu v příloze

Rychlost výtahu bude 1.0m/s.


Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumivací zařízení bude využito zařízení mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomocí bezdrátového telefonu GSM.

**Přepojení kamerového systému firmou Vítkovice IT Solution
Blokace suterénu provedením .**

Šachetní dveře s atestem EW 15(zdvih nad 30 metrů)

	OTKN 900 / 1,0- 13/ 13 – N/RE)
- typ výtahu	: osobní trakční
- výtahový stroj	: převodový stroj 9,6 Kw Sassi -Italie
- nosnost	: 900 kg
- dopravní rychlost	: 1,0 ms ⁻¹
- strojovna výtahu	: nad výtahovou šachtou
- rozměr šachty	: stávající
- rozměr prohlubně	: stávající
- výška posledního patra	: stávající
Počet stanic / nástupišť	: 13/13
- povrchová úprava	nová - neprůchozí kovová Tempo Pc -komaxit dle katalogu strana 8
- rozměr klece-rám	: šířka 1 200 x hloubka 1 900 mm
- rozměr klece-světlost	: šířka 1 150 mm, hloubka 1 870mm (přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)
- vybavení kabiny	ovl. panel madlo pod zrcadlem na zadní stěně : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci : digitální polohová signalizace LCD : hovorové zařízení bezdrátové GSM : zrcadlo nad madlem : okopový plech
- podlaha kabiny	: kovová, krytá protiskluznou hmotou
- osvětlení kabiny	: LED osvětlení -podhled

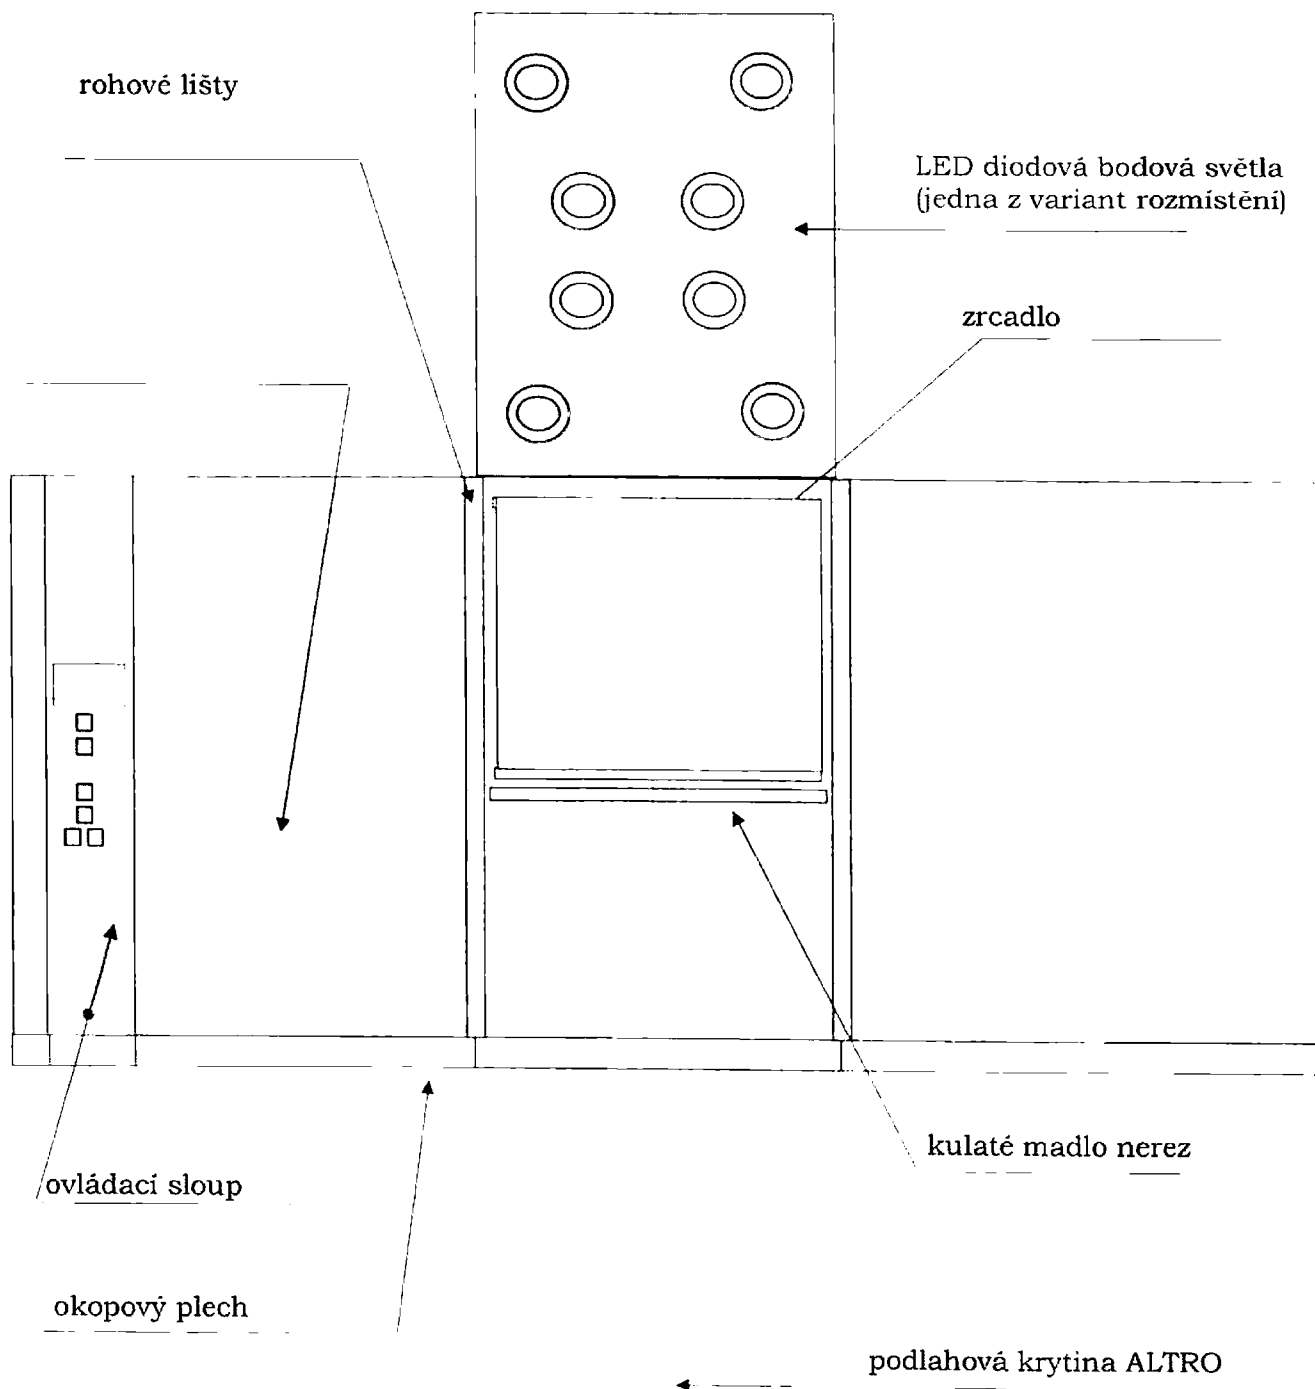

Velikost kabiny – hloubka 1870 mm x šířka 1150mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)

- povrchová úprava : **1 ks** automatické čtyřpanelové centrální **Komaxit**
- rozměr kabinových dveří : světlá šířka **850 mm**, výška 2 000 mm
- povrchová úprava : 13 ks ruční : **Komaxit**
- rozměr šachetních dveří : světlá šířka **850 mm**, výška 2 000 mm
- požární odolnost : EW 15
- : nový výtahový rozvaděč Amsoft (výrobce Ostrava) s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou(**neblokovaný**)
- : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
- : vážení pro signalizaci přetížení
- Vnější řízení : nové ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
- v provedení : kazeta s povrchovou úpravou NEREZ osazená prosvětlenými tlačítky, provedení antivandal s Braillo.písmem
- : polohová a směrová signalizace LCD ve všech stanicích
- Kabinové řízení : ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic, provedení antivandal s Braillovým písmem
- : ovladač nouzové signalizace
- : nouzové osvětlení
- : signalizace přetížení
- : hovorové zařízení GSM
- : polohová signalizace - TFT displej
- : Braillové písmo
- : tlačítko komunikace a zvonku
- provedení : ovladačový sloup osazený tlačítky
- : hlavní vypínač, osvětlení strojovny a šachty
- : dojde k úpravě původního rozvaděče
- : žebřík do prohlubně šachty s el.jištěním
- : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- : nové obousměrné zachycovače kabiny
- : nový rám protiváhy s výplní
- : nové kotvy a vodítka protiváhy a kabiny
- : omezovač rychlosti se zajištěním nekontrolovatelného pohybu klece dle ČSN EN 81-20 platná od 1.1.2012
- : propojení výtahu pro řízení DUPLEX
- : dorozumivací zařízení GSM
- : osvětlení nástupišť 50Lx
- : požární režim dle EN 81-73

Označení stanic 0,1...12

Demontáž původního výtahu	35 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	933 700,- Kč
Montáž výtahu:	195 000,- Kč
Zkoušky:	20 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	1 211 700,- Kč

Související práce :

Výpomocné práce..... 9 000,- Kč
(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta, zajištění staveniště, úklid staveniště)

Elektrikářské práce20 600,- Kč
(osvětlení šachty a strojovny, zásuvkový obvod v šachtě, nový hl. vypínač, osvětlení nástupišť)

Zednické práce 120 900,- Kč
(vybílání šachty a strojovny vč. celé čelní stěny mezi výtahy , nátěr podlahy strojovny a prohlubně, vybourání a zazdění 13 ks šachetních dveří včetně omítek a vymalování, demontáž dosedů a dodávka nových vč. nárazníků, demontáž původní protiváhy a podstavců pod výtahovým strojem, nové otvory pro lana a zpevnění podlahy (zvětšení klece výtahu), oprava omítky v prohlubni výtahu, úprava dlažby pro nové dveře)

Zámečnické práce.....3 600,-Kč
(kování na dveře dle ČSN, úprava nosníků)


Odvoz suti a odpadu, zařízení staveniště a doprava 5 000,- Kč

Natěračské práce:..... 3 100,- Kč
(nátěr vystrojení v šachtě výtahu)

Celkem za souv. práce bez DPH..... 186 400,- Kč

Celkem za pravý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 398 100 ,- Kč

		OTKN 1125 / 1,0– 13/ 13 – N/RE)
- typ výtahu	:	osobní trakční
- výtahový stroj	:	převodový stroj 11 Kw Sassi -Italie
- nosnost	:	1125 kg
- dopravní rychlost	:	1,0 ms ⁻¹
- strojovna výtahu	:	nad výtahovou šachtou
- rozměr šachty	:	stávající
- rozměr prohlubně	:	stávající
- výška posledního patra	:	stávající
 Počet stanic / nástupišť	:	 13/13
 - povrchová úprava	:	 nová - neprůchozí kovová Tempo Pc Komaxit katalog strana 8
- rozměr klece-rám	:	šířka 1 350 x hloubka 1 920 mm
- rozměr klece-světlost	:	šířka 1 300 mm, hloubka 1 870mm (přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti betonové konstrukce)
 - vybavení kabiny	:	 ovl. panel madlo pod zrcadlem na zadní stěně , nouzové osvětlení v ovl. kombinaci digitální polohová signalizace LCD(směr + patro) hovorové zařízení bezdrátové GSM zrcadlo nad madlem okopový plech
 - podlaha kabiny	:	 kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO(dle obj.)
- osvětlení kabiny	:	LED podhled

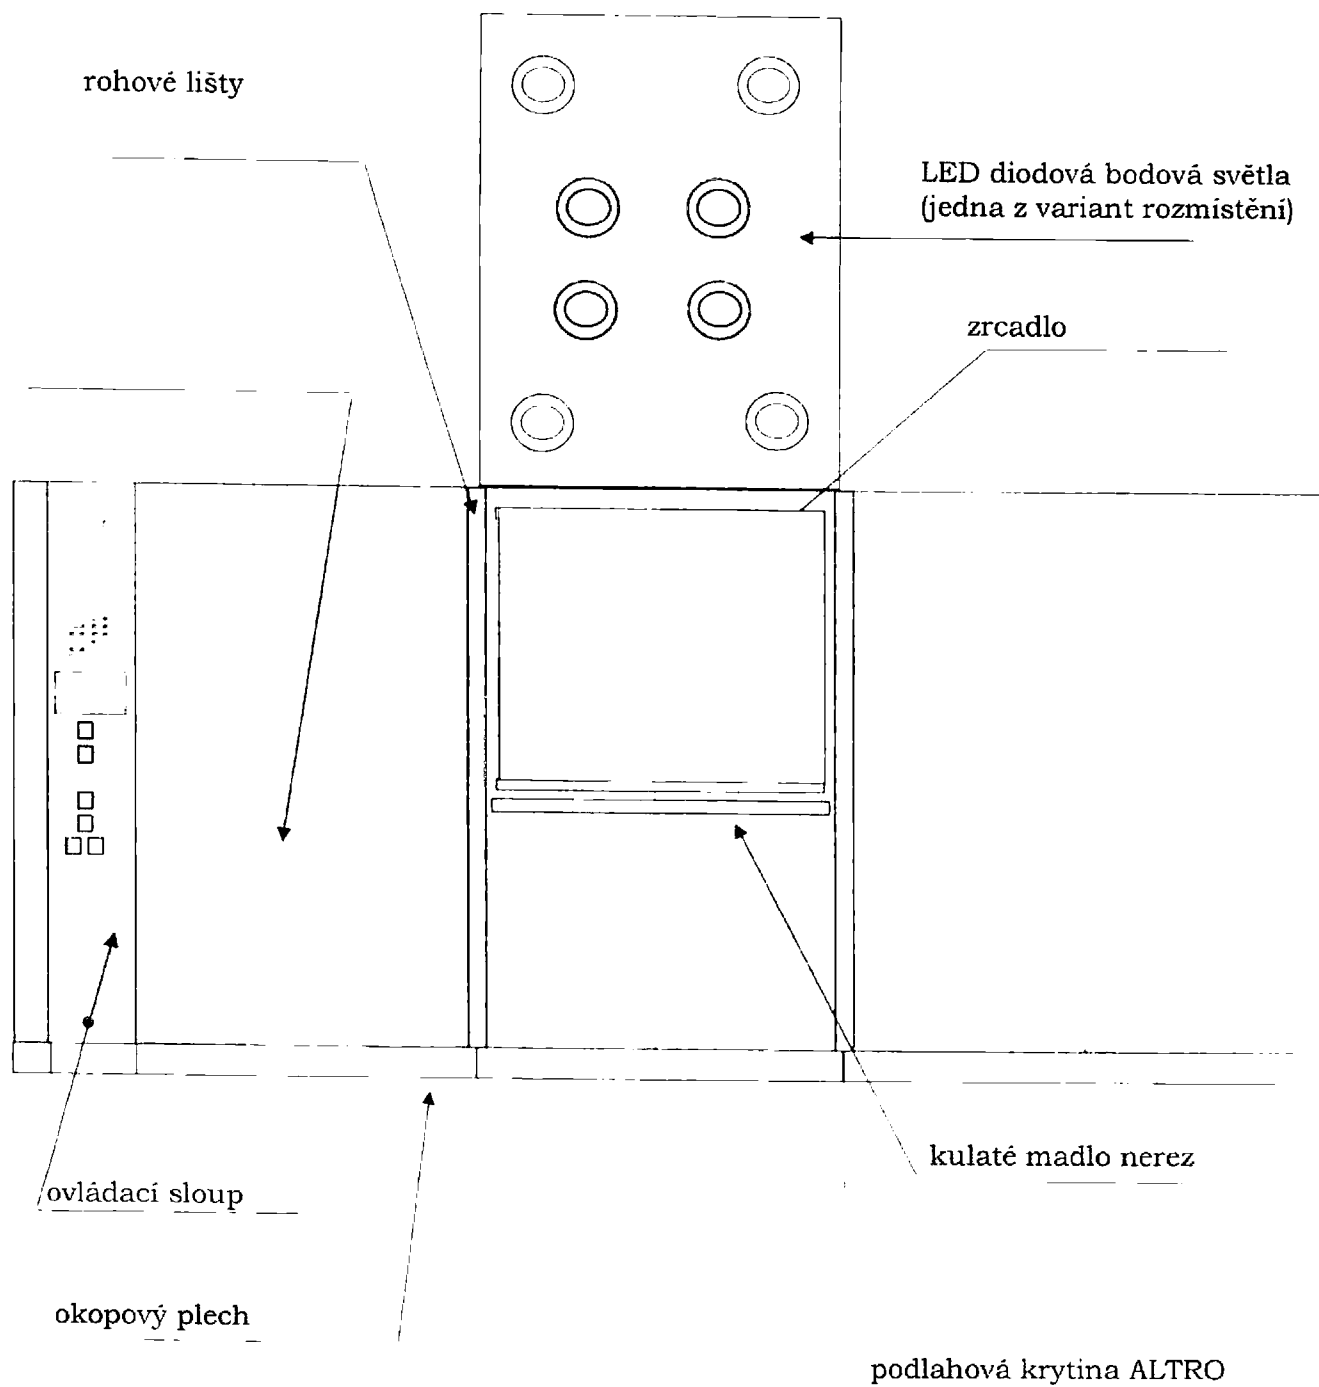

Velikost kabiny – hloubka 1870 mm x šířka 1350mm x výška 2 180mm.

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti šachty)

- povrchová úprava : 1ks automatické čtyřpanelové centrální **Komaxit**
- rozměr kabinových dveří : světlá šířka **850 mm**, výška 2 000 mm
- další : **celoplošná clona**

- povrchová úprava : 13ks ruční : **Komaxit**
- rozměr šachetních dveří : světlá šířka **850 mm**, výška 2 000 mm
- požární odolnost : EW 15

- : nový výtahový rozvaděč Amsoft (výrobce Ostrava)
s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou(**neblokovaný**)
- : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
- : vážení pro signalizaci přetížení

- Vnější řízení : nové ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece
- v provedení : kazeta s povrchovou úpravou NEREZ osazená
prosvětlenými tlačítky, provedení antivandal s Brail.písmem
- : polohová a směrová signalizace LCD ve všech stanicích

- Kabinové řízení : ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic, provedení
antivandal s Braillovým písmem
- : ovladač nouzové signalizace
- : nouzové osvětlení
- : signalizace přetížení
- : hovorové zařízení GSM
- : polohová signalizace - TFT displej
- : Braillové písmo
- : tlačítko komunikace a zvonku

- provedení : ovladačový sloup osazený tlačítky

- : hlavní vypínač, osvětlení strojovny a šachty
- : žebřík do prohlubně šachty s el.jištěním
- nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
- nové obousměrné zachycovače kabiny
- nový rám protiváhy s výplní
- nové kotvy protiváhy a kabiny
- nové vodítka kabiny a protiváhy
- : omezovač rychlosti se zajištěním nekontrolovatelného
pohybu klece dle ČSN EN 81-20 platná od 1.1.2012
- propojení výtahu pro řízení DUPLEX
- : dorozumivací zařízení GSM
- : osvětlení nástupišť 50 Lx
- : požární režim dle EN 81-73

Demontáž původního výtahu	35 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	1 059 400,- Kč
Montáž výtahu:	195 000,- Kč
Zkoušky:	20 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	1 337 400,- Kč

Související práce :

Výpomocné práce

(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta, zajištění staveniště, úklid staveniště)

Statické posouzení podlahy strojovny

(zpevnění podlahy strojovny - rošt, statické posouzení)

Elektrikářské práce

(osvětlení šachty a strojovny, zásuvkový obvod v šachtě, nový hl.vypínač, osvětlení nástupišť)

Zednické práce

(vybílání šachty a strojovny vč. celé čelní stěny mezi výtahy , nátěr podlahy strojovny a prohlubně, vybourání a zazdění 13 ks šachetních dveří včetně omítek a vymalování, demontáž dosedů a dodávka nových vč. nárazníků, demontáž původní protiváhy a podstavců pod výtahovým strojem, nové otvory pro lana a zpevnění podlahy (zvětšení klece výtahu),oprava omítky v prohlubni výtahu, úprava dlažby pro nové dveře)

Zámečnické práce.....

(kování na dveře dle ČSN, úprava nosníků)

Odvoz sutí a odpadu, zařízení staveniště a doprava

Natěračské práce:.....

(nátěr vystrojení v šachtě výtahu)

Celkem za souv. práce bez DPH..... 186 400,- Kč

Celkem za levý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 523 800 ,- Kč

Celkem za pravý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 398 100 ,- Kč

Celkem za levý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 523 800 ,- Kč

Celkem za 2 výtahy vč. souvisejících prací bez DPH2 921 900,- Kč

Celkem za 2 výtahy vč. 15% DPH3 360 185,- Kč

Dodávka a montáž

Termín realizace výtahu po vydání platného stavebního povolení by byl u levého výtahu 40 dní a u pravého výtahu 37 dní

Záruční doba

Záruční doba na dílo v délce **60 měsíců** po provedení úřední zkoušky výtahu. Výjimkou jsou komponenty podléhající opotřebení provozem a poškození cizím zásahem. Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení úřední zkoušky pracovníkem ITI Praha - pobočka Ostrava a předáním dokumentace objednateli,

Koordinace prací – požadavky na stavební připravenost

1. Objednatel zabezpečí platnou revizní zprávu od elektropřípojky po hlavní vypínač
2. Objednatel umožní přístup pracovníkům zhotovitele na staveniště za účelem měření.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli místnost pro uskladnění náradí, např. místnost ve sklepe.
4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení ručního náradí na el. síť 220 V
5. Objednatel zajistí podklady pro vyřízení stavebního povolení.
6. Zhotovitel zaplatí poměrnou část za odpady objednateli

**Firma VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s r.o. je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001.**

Zakázku vyřizuje: Filip Křenek

Výtahy Ostrava Servis s r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Tel. :596 134 541 kl.210, mobil: 777 076 223

Fax :596 134 695

e-mail: _____@vyt_y_____

V Ostravě dne 17.4.2023

***Filip Křenek
obchodní oddělení***


Platnost cenové nabídky do 7/2023

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 20.23 „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1150 kg v BD Oráčova 1, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:	Szotkowski Lukáš	Zednické práce	10%
Sídlo / místo podnikání:	Průběžná 1719/21, Ov-Poruba		
Tel., fax:	597578950		
E-mail:	VYTAHY@VYTAHYOSTRAVASERV IS CZ		
IČO:	88366031		
DIČ:	Cz 9110225993		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Fyzická osoba		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Václav Košář		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Filip Křenek		
2. Název:	Petr Krčma	Montáž výtahů	20%
Sídlo / místo podnikání:	Francouzská 6018/63, Ostrava-Poruba		
Tel., fax:	597578950		
E-mail:	VYTAHY@VYTAHYOSTRAVASERV IS CZ		
IČO:	75913615		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním	Fyzická osoba		
Osoba oprávněná jednat za	Václav košář		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Filip Křenek		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná j	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Václav Košář
Datum:	17.4.2023



VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přivoz

tel: 597 578 950

e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz, <http://www.vytahyostravaservis.cz>
IČO. 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



Věc: řádkový harmonogram prací „výměna osobních výtahů Oráčova 1 levý + pravý výtah „

Od podpisu smlouvy -smlouva podepsaná elektronicky do 30.5.2023

I etapa – 31 dnů(1.6.2023 do 1.7.2023)

- Při podpisu dojde k předání plné moci objednavatele pro vyřízení stanovisek potřebných pro stavebního povolení nebo posouzení dokumentace
- do 3 dnů zaměření obou výtahů vystavení dokumentace pro oba výtahy
- konzultace dokumentace ze stavebním úřadem Ostrava jih
- do 5 dnů odeslání kompletní dokumentace příslušným orgánům dle domluvy ze stavebním úřadem a to např. krajské hygieny Ostravě, Hasičů , Životnímu a odpadovému hospodářství Mu Ostrava (vyjádření tyto instituce posílají do 20 dnů a to přímo do datových schránek příslušného stavebního úřadu)
- 25 den odsouhlasení specifikace výtahu a dokumentace
- do 31 dnů předání kompletní dokumentace pro zahájení stavebního řízení UMO Jih
- Po odsouhlasení a předání dokumentace jdou výtahy do výroby. Výroba obou výtahů je cca 12 týdnů

II etapa


Levý výtah – 40 dní (14.8.2023 do 22.9.2023)

- 11.8.2023 předání staveniště
- 14.8.2023 započeti demontáže výtahu (odstavení výtahu)
- 20.8.2023 do 5.9.2023 zednické práce v rozsahu díla
- 17.9.2023 ukončení montáže výtahu+ provedení zkoušek ITI + vyklizení staveniště
- 18.9.2023 započeti 5 denní lhůta pro převzetí díla
- 22.9.2023 konec- předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

pravý výtah – 39 dnů (2.10.2023 do 9.11.2023)

- 29.9.2023 předání staveniště
- 2.10.2023 započeti demontáže výtahu (odstavení výtahu)
- 5.10.2023 do 25.10.2023 zednické práce v rozsahu díla
- 4.11.2023 ukončení montáže výtahu, provedení řádných zkoušek, vyklizení staveniště
- 5.11.2023 začíná běžet 5 denní lhůta na předání
- 9.11.2023 konec předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

V Ostravě dne 22.5.2023



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Ostrava

poř. č. legalizace 1404/II/2023

~~vlastnoručně podepsal*~~ - uznal podpis na listině za vlastní* - ~~uznal elektronický~~

~~podpis na elektronickém dokumentu za vlastní*~~

Filip Křeuek 02.11.1973 Ostrava

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Hlučín Bobrovniky , Na Důlkách č.p. 390/7

adresa místa trvalého pobytu žadatele* - ~~adresu místa pobytu žadatele~~

republiky* - ~~adresa bydliště mimo území České republiky*~~

OP 214492311

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvede

ověřovací doložce

V Ostravě dne 22.05.2023

Jméno a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby* - ~~Kvalifikovaný elektronický~~

~~podpis ověřující osoby a kvalifikované elektronické časové razítko*~~

* Nehodící se škrtněte
