

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 362/2023

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/HC/2023/29**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: [redacted] - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[redacted] - starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: [redacted] - pracovník odboru správy majetku,

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[redacted] pracovník odboru správy majetku,

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 892/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupený: na základě plné moci:
[redacted] - vedoucím PJ
[redacted] - ekonomkou PJ
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: [redacted]

Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

Číslo účtu:

[redacted]

Datová schránka:

8yuchp8

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[redacted]

tel.

[redacted]

tel.

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[redacted]

tel.

[redacted]

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 14 písm. f) a § 164 zákona 283/2021 Sb.)

[redacted]

tel.

[redacted]

zástupce stavbyvedoucího

[redacted]

tel.

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava ul. Učňovská v Dačicích a komunikací v Bílkově“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č.2 a nedílnou součást této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Dílo se skládá z následujících částí – jednotlivých stavebních objektů (dále také „SO“):

SO 01 – Oprava ulice Učňovská – I. etapa, Dačice

SO 02 – Oprava komunikací v Bílkově

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
 - prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
 - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
 - předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
 - min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
 - zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
 - zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
 - zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
 - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (4x písemná forma, 1x digitální forma),
 - zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
 - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění pěšího přístupu k nemovitým věcem vlastníků sousedních pozemků.
- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že materiály nespĺňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel zahájí práce dne 7.8.2023.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 2706/1, p.č. 2706/6, p.č. 1391 a v k.ú. Bílkov na pozemcích p.č. 592/32, 1270/1, 1254/4. Místo plnění je blíže specifikováno v příloze č.3 a příloze č.4 která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 3.2 **Zhotovitel provede část díla SO01 „Oprava ulice Učňovská – Letapa, Dačice“ v termínu od 10.8.2023 do 15.8.2023.**

Zhotovitel se zavazuje provést SO02 „Oprava komunikací v Bílkově“ od 7.8.2023 do 31.8.2023.

- 3.3 **Předání díla a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 15.9.2023.**

- 3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.

- 3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

- 3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.

- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.

- 3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.



4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena SO 01 bez DPH činí 1 292 064,84 Kč

Cena SO 02 bez DPH činí 568 941,67 Kč

Celková cena díla bez DPH činí 1 861 006,51 Kč

- 4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 4.3 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 13 odst. 13.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla.

- 4.4 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

- 4.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.
- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.

- 5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.
- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:
- a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti;
 - b) mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce;
 - c) zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce;



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

- d) veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – změnovým listem – který bude odsouhlasen podle čl. 4. odstavce 4.3 této smlouvy;
- e) cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.5 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k provádění díla:
- Projektová dokumentace s názvem „Oprava ulice Učňovská – I. etapa, Dačice“ zhotovená projektantem Ing. Vladimírem Zadákem, č. zakázky: 04/2023
- 6.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

- 6.7 Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

- 6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení příslušného předpisu o dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.

- 6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle




Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

- 6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.14 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.16 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.19 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu:  nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí řádně provedeného díla.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném objednatelem.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůtu k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **36 měsíců**.
Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstraní nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

objednatel, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.
- 8.6 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínech ujednaných v čl. 3. odstavci 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **4000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný, případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s čl. 5. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli (nedotýká se oprávnění zhotovitele, aby část díla byla prováděna poddodavatelem),



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
 - v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a požadavky a pokyny objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které



jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které objektivně brání v plnění povinností smluvních stran dle smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto platí pouze po dobu existence takové okolnosti vyšší moci nebo trvání jejich následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvních strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.

- 12.2 Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že za okolnost vyšší moci se nepovažuje prodlení s plněním povinností smluvních partnerů zhotovitele, stávka zaměstnanců zhotovitele a jeho smluvních partnerů, výpadky produkce, vady materiálu, selhání technického vybavení zhotovitele, následky nedodržování právních předpisů nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence, předlužení, konkurz, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se zhotovitele či jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního partnera zhotovitele.
- 12.3 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o tom, že nastala okolnost vyšší moci a okolnostech bránících mu v plnění smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě trvání vyšší moci po dobu delší třicet (30) dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 13.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 13.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.

- 13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 13.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 19. zasedání konaném dne 21.6.2023 pod č. usnesení 439/19/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.dacice.cz.



Oprava komunikací v Bílkově a oprava ul. Učňovská v Dačicích

13.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – SO 01 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – SO 02 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 3 – SO 01 – Přehledná situace stavby

Příloha č. 4 – SO 02 – Přehledná situace stavby

V Dačicích dne 3. 07. 2023


V Soběslavi dne 28 -06- 2023

Za objednatele:



starosta

Za zhotovitele (na základě plné moci):



vedoucí PJ

ekonomka PJ



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne: 26.04.2023

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Oprava ulice Učňovská Dačice - I. etapa

Investor:

101 Oprava ulice Učňovská Dačice - I. etapa					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	111625530(asfaltová kationaktivní emulze rychleštepná 2% 1050*1,02*0,3*2,3*0,02	14,78 t 0,0000 14,7798		6 132,88	90 642,74
2	113154224 Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 10 vjezdy 145	145,00 m2 145,0000		206,88	29 997,60
3	131312531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti II 3ks kopaných sond pro ověření hloubky uložení sítí - plyn, elektro, cetin 3*0,75	2,25 m3 2,2500		1 724,00	3 879,00
4	162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno Zemina z krajnic 55*0,1 Zemina od obrub 120*0,5*0,1	11,50 m3 5,5000 6,0000		191,07	2 197,31
5	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nánosy 11,5	11,50 m3 11,5000		57,32	659,18
6	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Nánosy 11,5	11,50 m3 11,5000		22,93	263,70
7	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojní Převornání recyklace 1050*1,02	1 071,00 m2 1 071,0000		13,75	14 726,25
8	567541121 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 250 c 1050*1,02	1 071,00 m2 1 071,0000		36,80	39 412,80
9	567543151 Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem,min pěnoasfaltu V ceně recyklace musí být započten odběr vzorku a stanovení přesné 1050*1,02	1 071,00 m2 1 071,0000		132,88	142 314,48
10	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm 120*0,5	60,00 m2 60,0000		150,88	9 052,80
11	573231108 Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 1195	1 195,00 m2 1 195,0000		19,42	23 206,90
12	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z ner hlavní trasa 1050 vjezdy 145	1 195,00 m2 1 050,0000 145,0000		275,40	329 103,00
13	577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifik hlavní trasa 1050*1,02 vjezdy 145	1 216,00 m2 1 071,0000 145,0000		330,14	401 450,24
14	585211130(cement portlandský CEM I 52.5 R VL 5% 1050*1,02*0,3*2,3*0,04	29,56 t 0,0000 29,5596		3 705,28	109 526,59
15	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hl 3	3,00 kus 3,0000		1 724,00	5 172,00
16	919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicř 85	85,00 m 85,0000 0,0000		114,93	9 769,05
17	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm 85	85,00 m 85,0000		86,20	7 327,00
18	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm 85	85,00 m 85,0000		86,20	7 327,00
19	938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Očištění krajnic 55 Nános u obrub 120*0,5	115,00 m2 55,0000 60,0000		68,96	7 930,40

20	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením : recyklát 145*0,1*2,35 zabourání 85*0,02	35,78 t 34,0750 1,7000	103,44	3 700,57
21	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 35,77*3	107,31 t 107,3100	10,34	1 109,59
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto 321,6	321,60 t 321,6000	38,21	12 288,34

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

1 251 056,54

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Tištěno dne: 26.04.2023

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Oprava ulice Učňovská Dačice - I. etapa

Investor:

999 Ostatní náklady					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
0	460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru <i>0,142*4</i>	0,57 km <i>0,5680</i>		11 493,36	6 528,23
1	072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy <i>Uzavírka a koordinace organizace výstavby s okolními závody</i>	1,00 kpl		34 480,07	34 480,07
Celkem					Odbytová cena bez DPH: 41 008,30
STAVBA CELKEM					1 292 064,84
Sazba DPH 21,00					DPH celkem 271 333,62
					Odbytová cena s DPH: 1 563 398,46

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: 08.06.2023

20

Tištěno dne: 10.04.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

101 Rekonstrukce MK k rybníku					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem 250	250,00 250,0000	m2	17,24	4 310,00
2	113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 10 20	20,00 20,0000	m2	206,88	4 137,60
3	162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno Zemina z krajnic 94*0,5*0,05*2 Nánosy 250*0,02	9,70 4,7000 5,0000	m3	191,07	1 853,38
4	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 94*0,5*2*0,05 Nánosy 250*0,02	9,70 4,7000 5,0000	m3	57,32	556,00
5	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 94*2*0,5*0,05 Nánosy 250*0,02	9,70 4,7000 5,0000	m3	22,93	222,42
6	181951112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojní 250	250,00 250,0000	m2	13,75	3 437,50
7	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm 94*0,3*2	56,40 56,4000	m2	150,88	8 509,63
8	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 250/2	125,00 125,0000	m2	238,86	29 857,50
9	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemc 250	250,00 250,0000	m2	358,29	89 572,50
10	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hr 1	1,00 1,0000	kus	1 724,00	1 724,00
11	919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicil 3	3,00 3,0000 0,0000	m	114,93	344,79
12	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 3	3,00 3,0000	m	86,20	258,60
13	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 3	3,00 3,0000	m	86,20	258,60
14	938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Očištění krajnic 94*0,5*2	94,00 0,0000 94,0000	m2	68,96	6 482,24
15	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením : recyklát 20*0,06*2,3	2,76 2,7600	t	103,44	285,49
16	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 2,76*4	11,04 11,0400	t	10,34	114,15
17	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto 64,4	64,40 64,4000	t	38,21	2 460,72
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	154 385,12

Tištěno dne: 10.04.2023

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

102 Rekonstrukce MK od rybníka ke kostelu

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem 572	572,00 572,0000	m2	17,24	9 861,28
2	162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno zemina z krajnic 196*2*0,5*0,05 Nánosy 572*0,02	21,24 9,8000 11,4400	m3	191,07	4 058,33
3	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 zemina z krajnic 196*2*0,5*0,05 nánosy 572*0,02	21,24 9,8000 11,4400	m3	57,32	1 217,48
4	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky zemina z krajnic 196*2*0,05*0,5 nánosy 572*0,02	21,24 9,8000 11,4400	m3	22,93	487,03
5	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojn 572	572,00 572,0000	m2	13,75	7 865,00
6	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm 196*2*0,3	117,60 117,6000	m2	150,88	17 743,49
7	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 572/2	286,00 286,0000	m2	238,86	68 313,96
8	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemc 572	572,00 572,0000	m2	358,29	204 941,88
9	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,00	kus	2 586,01	2 586,01
10	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hr	2,00	kus	1 724,00	3 448,00
11	919121212 Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicil 20	20,00 20,0000 0,0000	m	114,93	2 298,60
12	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 20	20,00 20,0000	m	86,20	1 724,00
13	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 20	20,00 20,0000	m	86,20	1 724,00
14	938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Očištění krajnic 196*0,5*2	196,00 0,0000 196,0000	m2	68,96	13 516,16
15	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto 146,1	146,10 146,1000	t	38,21	5 582,48
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	345 367,70

22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Tištěno dne: 10.04.2023

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací Bílkov

Investor:

103 Rekonstrukce MK u domu č. p. 68

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1C 80	80,00 m2 80,0000		206,88	16 550,40
2	162451106 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelno zemina z krajnic 10*0,5*2*0,05	0,50 m3 0,5000		191,07	95,54
3	167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 0,5	0,50 m3 0,5000		57,32	28,66
4	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 0,5	0,50 m3 0,5000		22,93	11,47
5	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojní 80 dobourání okrajů a zamezení	80,00 m2 80,0000 0,0000		13,75	1 100,00
6	569831111 Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm 10*2*0,3	6,00 m2 6,0000		150,88	905,28
7	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 80/2	40,00 m2 40,0000		238,86	9 554,40
8	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemc 80	80,00 m2 80,0000		358,29	28 663,20
9	895931111 oprava stávající vpusti vč. vyčištění přípojky	1,00 kus		6 896,01	6 896,01
10	919121212 Těsnění spár záhlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí 8	8,00 m 8,0000 0,0000		114,93	919,44
11	919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm 8	8,00 m 8,0000		86,20	689,60
12	919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 8	8,00 m 8,0000		86,20	689,60
13	938909611 Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm Očištění krajnic 10*0,5*2	10,00 m2 0,0000 10,0000		68,96	689,60
14	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 80*0,06*2,3	11,04 t 11,0400		103,44	1 141,98
15	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 11,04*4	44,16 t 44,1600		10,34	456,61
16	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto 20,86	20,86 t 20,8600		38,21	797,06
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	69 188,85

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	568 941,67
	21,00	119 477,76	Odbytová cena s DPH:	688 419,43

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

08-06-2023





HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Ochranné pásmo st. vedení
- zemní kabelové vedení do 110kV 3m od krajního kabelu na každou stranu
 - zemní kabelové vedení nad 110kV 3m od krajního kabelu na každou stranu
- Ochranné pásmo veřejného vedení je vymezeno zákonem č. 458/2009 Sb., v platném znění § 6 odst. 3 písm. a) stávající rozvody vedení na obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu:
- napětí nad 35kV do 110kV 7m
 - napětí nad 35kV do 110kV 12m
 - napětí 110kV do 220kV 15m
 - napětí nad 220kV do 440kV 28m
 - napětí nad 440kV 30m
- Ochranné pásmo el. stanic
- venkovní elektrická stanice a stanice s napětím větším než 50kV 20m
 - středně velké stanice a věškové stanice od 5kV do 50kV 10m
 - kompaktní a středně velké stanice od 5kV do 50kV 20m
 - venkovní elektrické stanice od obřadních 10m

- Ochranné pásmo telekomunikačních vedení vymezuje zákon č. 121/2009 Sb., v platném znění § 603
- ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení
 - ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je stanoveno příslušnými státními úřady v jeho rozmezí
- Ochranné pásmo plynovodů je vymezeno v zákoně č. 458/2009 Sb., v platném znění § 608 odst. 3
- středních a středně velkých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1,0m
 - ostatních plynovodů a přípojek na obě strany od přípojek 4,0m
 - technostopových objektů na všechny strany od přípojek 4,0m

VEŠKERÁ POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL JE POVINNÝ PŘED ZAPOČETÍM PRÁCI ZAJISTIT VYTVOŘENÍ SÍTÍ JEJICH SPRÁVČI!!

VEŠKERÁ NAPĚJENÍ A PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OŠETŘENY ASFALTOVOU ZÁKLINKOU!

LEGENDA :


- OPRAVA VJEZDŮ - ODFRÉZOVÁNÍ, POKLÁDKA ACO 50mm, ACL 60mm
- HLAVNÍ TRASA - STUDENÁ RECYKLACE 300mm, POKLÁDKA ACO 50mm, ACL 60mm
- ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTĚRKODRTÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NADZEMNÍ SĚŤOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- ZEMNÍ SĚŤOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- NADZEMNÍ VEDENÍ HN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ HN STÁVAJÍCÍ (E.ON)
- ZEMNÍ VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ (E.ON)

SO 10

Odpovědná osoba	Vypracoval	Kontroloval	ING. VLADIMÍR ZABÍL státní inženýr inženýringu		Ing. Vladimír Zábil ČZP 146044 IČO 0962201 IČS 00190000 IČS 00190000 www.dobak.cz
Investor	Město Dačice	Č. zak.		Č. skup.	
Obec	Dačice	Datum	04/2023		
Stavba	OPRAVA ULICE UČŇOVSKÁ - I. ETAPA DAČICE	Formát	A4		
		Měřítko	1:500		
		Stupeň PD	PDPS		
Příloha	SITUACE STAVBY	Číslo přílohy	D2		

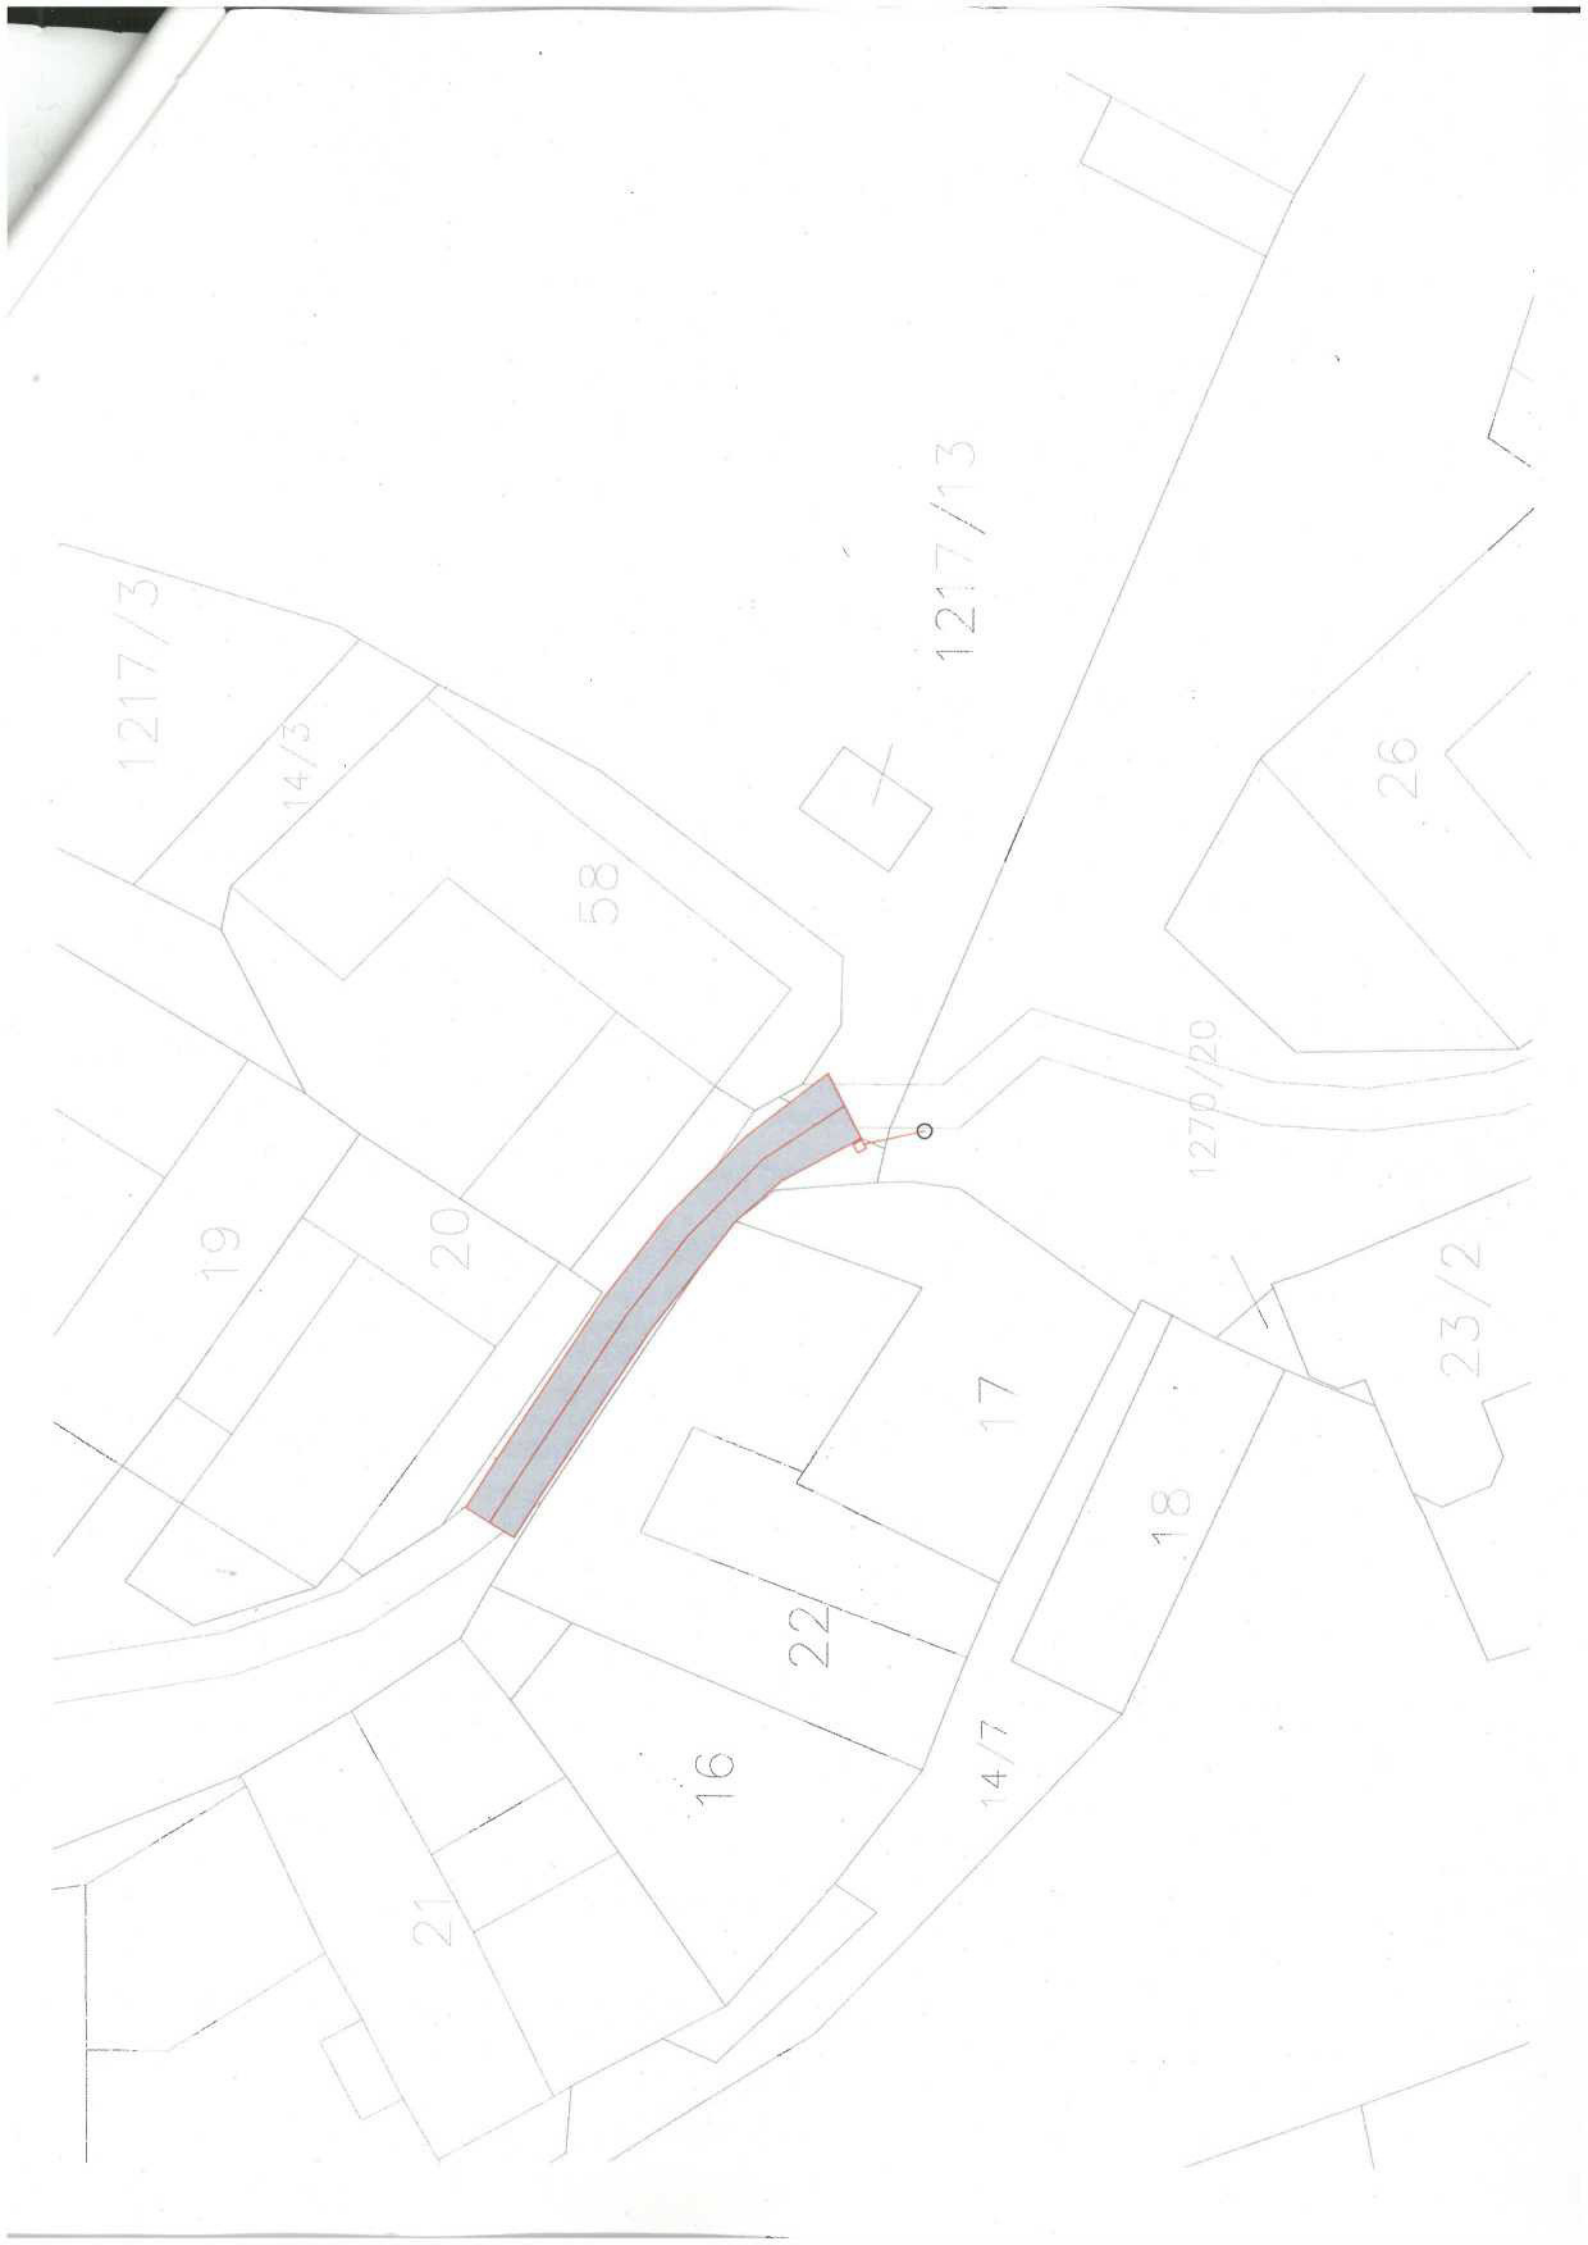

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744


se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená:  předsedou představenstva
nem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje



(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023.

V Praze dne 2. 11. 2022.

STRABAG a.s.

