

# Smlouva o dílo

## Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Střední škola řemesel Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sídlo: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 13644301

Zastoupená ředitelem školy Mgr. Petrem Solichem

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Zero Emission Consulting s.r.o.**

Sídlo: Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09399895

Zastoupená jednatelem Miroslavem Cejpkem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

## I.

### ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- I.1 Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek“ financovaného z veřejných zdrojů Moravskoslezského kraje.
- I.2 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem této smlouvy, povahou a účelem díla, a jsou mu známy veškeré podmínky vztahující se k realizaci.
- I.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že
  - a) je na základě autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorizační zákon**“), oprávněn vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb podle § 18 písm. a) autorizačního zákona (dále jen „**autorizovaná činnost**“);

- b) vykonává autorizovanou činnost samostatně jako svobodný autorizovaný inženýr nebo jiným způsobem dovoleným autorizačním zákonem prostřednictvím osob oprávněných vykonávat autorizovanou činnost;
  - c) má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem autorizované činnosti po celou dobu provádění díla;
  - d) je držitelem všech jiných podnikatelských oprávnění potřebných pro plnění této smlouvy;
  - e) má dostatečné technické, personální a finanční prostředky pro provedení díla, a
  - f) dílo bude provedeno v souladu s požadavky právních předpisů včetně příslušných předpisů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- I.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat kompletní dílo s přispěním subdodavatele, společnosti Anada HS s.r.o., Horní Stakory 77, 293 01 Kosmonosy, IČO: 03020762 (dále jen „subdodavatel“), s jejíž pomocí se zavazuje zajistit koordinaci profesí, kontrolu a autorizaci výkresů části elektro. Subdodavatel je oprávněný realizovat projektovou činnost ve výstavbě jako držitel příslušného živnostenského oprávnění, jak vyplývá z nabídky zhotovitele a jejích příloh (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje mít se subdodavatelem uzavřenou smlouvu o dílo zajišťující odpovědnost subdodavatele za včasné a řádné splnění všech závazků z této smlouvy a tudíž za řádné a včasné provedení celého díla, popřípadě kvalitu, tak, jako by plnil sám. Zhotovitel zejména odpovídá za to, že subdodavatel řádně zajistí tu část díla, pro kterou zhotovitel nedisponuje příslušným oprávněním. Změna subdodavatele, jehož oprávnění k realizaci zhotovitel objednateli prokázal, je možná jen se souhlasem objednatele.

## II.

### ÚČEL SMLOUVY

- II.1 Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování projektové dokumentace na střešní fotovoltaickou elektrárnu (dále jen „**FVE**“) zhotovitelem. Projektová dokumentace bude zhotovitelem zpracována tak, aby tato dokumentace mohla být součástí zadání veřejné zakázky na rekonstrukci střech a zhotovení FVE a aby na jejím základě mohla být následně FVE na střechách instalována.

## III.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

- III.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v čl. IV této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- III.2 Dílo bude provedeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především se stavebním zákonem, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „**vyhláška**“), a zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě o autorizovaných architektech. Dílo bude provedeno v souladu s platnými českými technickými normami.
- III.3 Zhotovitel se při provádění díla řídí podklady pro vytvoření díla předanými objednatelem, jakož i pokyny objednatele.
- III.4 Zhotovitel zpracuje dílo na základě vlastního zaměření a průzkumu.

## IV.

### SPECIFIKACE DÍLA

IV.1 Součástí díla budou následující dílčí etapy:

**a. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a související činnosti:**

- Zhotovitel zpracuje a odevzdá projektovou dokumentaci, která bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby, a bude poskytovat s tím související činnosti, konkrétně:
  - vyhotovení kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DSP či jiných částí s ní souvisejících;
  - projednání všech připomínek objednatele;
  - nedílnou součástí projektové dokumentace bude statické posouzení střech pro jejich osazení FVE;
  - požárně bezpečnostní řešení dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci;
  - soupis stavebních prací, dodávek a služeb, spolupráce při výběru zhotovitele – SP v souladu s požadavky ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k této vyhlášce; tj. souhrnného rozpočtu stavby v detailu odpovídajícímu stupni projektové dokumentace, vč. vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předmětného stupně dokumentace mohou mít vliv na propočtenou cenu;
  - zpracování dokumentace BOZP pro fázi instalace FVE na střeše zadavatele a dále pro fázi provozu FVE (bezpečnostní a záchytné systémy pro obsluhu instalované FVE);
  - písemné stanovisko objednateli s doporučeními a pokyny pro aktualizaci dokumentace objednatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP), v souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, kteroužto zpracuje objednatel v návaznosti na instalaci FVE;
  - výkon inženýrské činnosti v rozsahu potřebném pro řádnou přípravu stavby (tj. výkon činností při zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek, povolení, rozhodnutí, oznámení, ohlášení potřebných k řádné a včasné realizaci, předání, provozu a užívání FVE v souladu s právními předpisy; zajištění relevantních souhlasů (podpisů) na smlouvě o připojení či SOSB ze strany provozovatele distribuční soustavy;
  - vyhotovení kompletní dokumentace pro výběr zhotovitele, kterou objednatel použije pro zadání zakázky zhotoviteli, který zrekonstruuje a připraví střechy budov pro instalaci FVE, FVE instaluje a uvede do provozu.
- Termín: Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli kompletní a objednatelem odsouhlasenou dokumentaci dle předchozího výčtu a podat řádnou žádost o vydání stavebního příp. společného povolení stavby do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti, tj. uzavřením, této smlouvy. Pro splnění lhůty je rozhodný den podání řádné a kompletní žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu.

- 5 tištěných vyhotovení + 1 digitální vyhotovení na USB flash disku

#### **b. Odborná pomoc objednateli a navazující činnost pro objednatele**

- Zhotovitel dále poskytne objednateli následující služby, a to na vyzvu objednatele a v termínu s ním dohodnutým:
    - konzultace zadávací dokumentace a smlouvy pro výběr zhotovitele FVE, účast na hodnocení nabídek, pokud nebude zhotovitel ve střetu zájmů;
    - výkon autorského dozoru hlavního projektanta – AD; tím se rozumí zejména: dohled nad dodržением kvalitativních parametrů projektu při provádění stavby, poskytnutí součinnosti objednateli v průběhu stavby, účast na kontrolních dnech, účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby, poskytnutí potřebných údajů a podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude objednatelem vyzván; předmětem autorského dozoru není technický dozor stavebníka (TDS);
    - vyhotovení kompletní dokumentace provedení stavby v návaznosti na výkon autorského dozoru, rekonstrukce střech budov a provedení instalace FVE.
  - Termín: Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli odbornou pomoc specifikovanou pokyny objednatele na vyzvu objednatele, přičemž s poskytováním pomoci začne nejpozději 5 pracovních dnů po vyzvě objednatele.
- IV.2 V případě prodloužení dotčených orgánů nebo dotčených vlastníků infrastruktury při vydání potřebných vyjádření, stanovisek, povolení, rozhodnutí atd., které jsou nezbytnou součástí žádosti o vydání stavebního povolení, se doba prodloužení nad rámec zákonných lhůt nezapočítává do uvedené lhůty.
- IV.3 Projektová dokumentace bude zpracována pro instalaci FVE na střechách jedné nebo více z těchto budov:
- stavba s č. p. 2069, ulice Pionýrů, na parcele č. 1951/3 v k. ú. Místek (budova A v plánu přílohy č. 1);
  - stavba bez č. p., na parcele č. 1951/5 v k. ú. Místek (budova C v plánu přílohy č. 1);
  - stavba bez č. p., na parcele č. 1951/7 v k. ú. Místek (kuchyně a jídelna v plánu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo).
- Výběr konkrétní budovy nebo budov pro instalaci FVE provede zhotovitel po konzultaci s objednatelem.
- IV.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu využití ploch střech budov. Projektovou dokumentaci zpracuje na instalaci FVE o co nejvyšším instalovaném výkonu tak, aby FVE maximálně využívala plochy střech budov. Součástí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem bude návrh rekonstrukce či stavební úpravy předmětných střech tak, aby byly připraveny na instalaci FVE při zohlednění životnosti instalovaných panelů – tj. min. 25 let. Součástí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem bude statické posouzení střech pro instalaci FVE. Technické řešení FVE navržené v projektové dokumentaci bude splňovat požadavky dispečerského řízení. Zhotovitel je povinen konzultovat dokumentaci BOZP pro fázi instalace FVE a dále pro fázi provozu FVE (bezpečnostní a záchranné systémy pro obsluhu instalované FVE) se zadavatelem či externím subjektem, který pro zadavatele dokumentaci BOZP zpracovává.

- IV.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli výstupy ke každé dílčí etapě dle čl. IV.1 této smlouvy a projedná je s ním v dohodnutém termínu. Objednatel potvrdí předání a převzetí výsledku etapy podepsáním protokolu. Teprve následně je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu.
- IV.6 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s aktuálními českými technickými normami, stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. Projektová dokumentace bude obsahovat části:
- A Průvodní zpráva
  - B Souhrnná technická zpráva
  - C Situační výkresy
  - D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- K dokumentaci se přikládá dokladová část.

## V.

### PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- V.1 Objednatel zhotoviteli poskytne podklady potřebné pro provedení díla. Podklady se rozumí zejména mapové podklady (plán budov přílohou č. 1 této smlouvy) či výchozí požadavky objednatele na podobu díla a další dle požadavků zhotovitele. Objednatel zhotovitele informuje o svých záměrech a rovněž o tom, co od díla očekává a jaké požadavky má zhotovitel sledovat.
- V.2 Zhotovitel se zavazuje převzít podklady společně s podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. Předání podkladů zhotovitel objednateli písemně potvrdí.
- V.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat předané podklady bezodkladně po jejich předání a současně se zavazuje potvrdit objednateli, že převzal všechny podklady pro vypracování díla. Jsou-li předané podklady pro účely zhotovení díla nedostatečné (zejména co do jejich úplnosti a obsahu), je to zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit s odůvodněním nedostatečnosti objednateli, nejpozději však do 3 dnů od předání podkladů.
- V.4 Ukáží-li se předané podklady jako nedostatečné, postupují smluvní strany ve vzájemné součinnosti tak, aby tyto podklady mohly být objednatelem doplněny. Za den předání podkladů se v takovém případě považuje den předání doplněných podkladů.
- V.5 Nebyla-li nedostatečnost podkladů zhotovitelem oznámena podle V.3, odpovídá tento za prodlení při provádění díla, škodu či jiné právní následky.

## VI.

### POKYNY OBJEDNATELE

- VI.1 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele.
- VI.2 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynu objednatele a svůj názor o nevhodnosti pokynu odůvodnit. Bude-li objednatel přes písemné upozornění zhotovitele na provedení příslušného nevhodného pokynu trvat, je zhotovitel povinen dle tohoto pokynu postupovat.

## VII.

### HARMONOGRAM PLNĚNÍ

VII.1 Předmět plnění bude realizován dle následujícího harmonogramu provádění díla:

<b>Zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb</b>	do 150 dnů od uzavření této smlouvy o dílo
<b>Odborná pomoc objednateli a navazující činnost pro objednatele (čl. IV.1 písm. c)</b>	bez lhůty

## VIII.

### MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- VIII.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v souladu s touto smlouvou předáním jednotlivých součástí díla dle sjednaného harmonogramu v sídle objednatele.
- VIII.2 Počet listinných a elektronických paré k předání je stanoven v čl. IV.1 této smlouvy. Za okamžik předání se považuje podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- VIII.3 O předání se zavazují smluvní strany sepsat předávací protokol, ve kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je zhotovitel povinen takové vady odstranit. Podepsání předávacího protokolu se považuje za okamžik předání díla nebo jeho části.
- VIII.4 Objednatel se zavazuje převzít dílo dle sjednaného harmonogramu, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje zřejmé vady, logické chyby, vnitřní rozpory nebo nedodělky, které brání užití díla objednatelem.
- VIII.5 Vlastnické právo k hmotným nosičům obsahujícím dílo se převádí na objednatele dnem předání. Nebezpečí škody na těchto nosičích přechází na objednatele předáním.
- VIII.6 Objednatel je oprávněn dodatečně požadovat vyšší počet tištěných či elektronických vyhotovení jednotlivých součástí díla, zhotovitel však může požadovat přiměřenou náhradu nákladů za tato dodatečná vyhotovení.

## IX.

### CENA DÍLA

- IX.1 Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. IV této smlouvy je sjednaná jako cena maximální a jsou v ní zahrnuty veškeré práce ve smyslu této smlouvy. Cena je sjednaná dohodou obou smluvních stran a činí:

887 400 Kč bez DPH.

## X.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

- X.1 Fakturace bude probíhat vždy po ukončení dílčí etapy dle čl. IV.1 této smlouvy na základě vystavené faktury. Za dílčí etapu dle čl. IV.1 bod a) této Smlouvy náleží zhotoviteli nárok na odměnu ve výši 50 % z celkové ceny dle čl. IX této Smlouvy. Za dílčí etapu dle čl. IV.1 bod b)

této Smlouvy náleží zhotoviteli nárok na odměnu ve výši 50 % z celkové ceny dle čl. IX této Smlouvy.

- X.2 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou objednatele.
- X.3 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- X.4 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- X.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.

## **XI.**

### **AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA**

- XI.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že dílo, jak je definováno v čl. IV této smlouvy, je autorským dílem dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a požívá autorskoprávní ochrany v mezích díla zhotoveného v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- XI.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat projektovou dokumentaci včetně jejích dílčích výstupů a zároveň ji upravovat, doplňovat a vystavovat. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo poskytnout zpracovanou projektovou dokumentaci zcela nebo zčásti třetím osobám. Objednatel má zejména právo zpracovanou projektovou a související dokumentaci použít jako podklad v navazujícím zadávacím řízení na zhotovení FVE.

## **XII.**

### **VZÁJEMNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST**

- XII.1 Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění této smlouvy, zejména
  - a) vyrozumět druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, problémech a jiných okolnostech, které by mohly ovlivnit plnění této smlouvy (časově, věcně, nákladově nebo jinak);
  - b) objednatel se zavazuje v přiměřené době poskytovat na vyžádání zhotoviteli informace potřebné pro plnění této smlouvy nebo s plněním této smlouvy související.
- XII.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat informace a zprávy podle této smlouvy v přehledné a srozumitelné podobě tak, aby závěry v nich obsažené byly přezkoumatelné.

## **XIII.**

### **ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA**

- XIII.1 V případě, že dílo nebo jeho část vykazuje chyby, nedodělky, odchylky v obvyklé kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy či technickými normami (dále jen „vady díla“), zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného

plnění. Po předání má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením své povinnosti.

- XIII.2 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k nehmotné povaze díla se nemůže vada sama vyvinout užíváním či opotřebením. Pokud dílo má určitou vadu, pak ji má od samého počátku a ta má původ v činnosti zhotovitele, to neplatí, pokud objednatel dílo změnil.
- XIII.3 Dílo a jeho jednotlivé součásti musí mít všechny sjednané vlastnosti již při jeho předání.
- XIII.4 Zhotovitel výslovně odpovídá za to, že jednotlivé součásti díla mají ke dni podpisu předávacího protokolu vlastnosti popsané v této smlouvě a vyhlášce č. 499/2006 Sb.
- XIII.5 Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dnů poté, co byla vada zjištěna objednavatelem.
- XIII.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla nejpozději do 14 dnů ode dne jejich vytknutí ze strany objednatele. O době a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíše smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší.
- XIII.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vadami podkladů předaných objednatelem, jejichž existenci nemohl zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, a dále za vady, které vznikly v důsledku nevhodného pokynu objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem upozorněn, avšak na tomto pokynu trval.

#### **XIV.**

##### **SMLUVNÍ POKUTY**

- XIV.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení.
- XIV.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

#### **XV.**

##### **UKONČENÍ SMLOUVY**

- XV.1 Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:
  - a) dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením dle č. XV.2 této smlouvy.
- XV.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:
  - a) jestliže bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  - b) jestliže insolvenční návrh na druhou smluvní stranu byl zamítnut pro nedostatek majetku;
  - c) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní povinnost.
- XV.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doporučeným dopisem doručeným druhé smluvní straně a řádně odůvodněno.



- XV.4 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delším než 30 kalendářních dnů, popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delším než 30 kalendářních dní s výjimkou situací dle čl. X této smlouvy.
- XV.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, ochrany informací, vzájemné komunikace a řešení sporů nebo zákonných povinností některé ze smluvních stran.

## **XVI.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- XVI.1 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- XVI.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- XVI.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- XVI.4 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- XVI.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- XVI.6 V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této smlouvy bude smluvními stranami uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné, účinné nebo vykonatelné a bude nejlépe vyhovovat účelu této smlouvy.
- XVI.7 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a zároveň prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena ze svobodné a vážné vůle stran, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.

XVI.8 Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele.

XVI.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

Příloha č. 1: Plán budov

Příloha č. 2: Část nabídky zhotovitele týkající se splnění profesních předpokladů řešitelského týmu zhotovitele

Ve Frýdku-Místku dne .....



**Střední škola řemesel Frýdek-Místek**


**Mgr. Petr Solich, ředitel**

Ve Frýdku-Místku dne .....





**Zero Emission Consulting s.r.o.**

**Miroslav Cejpek, jednatel**

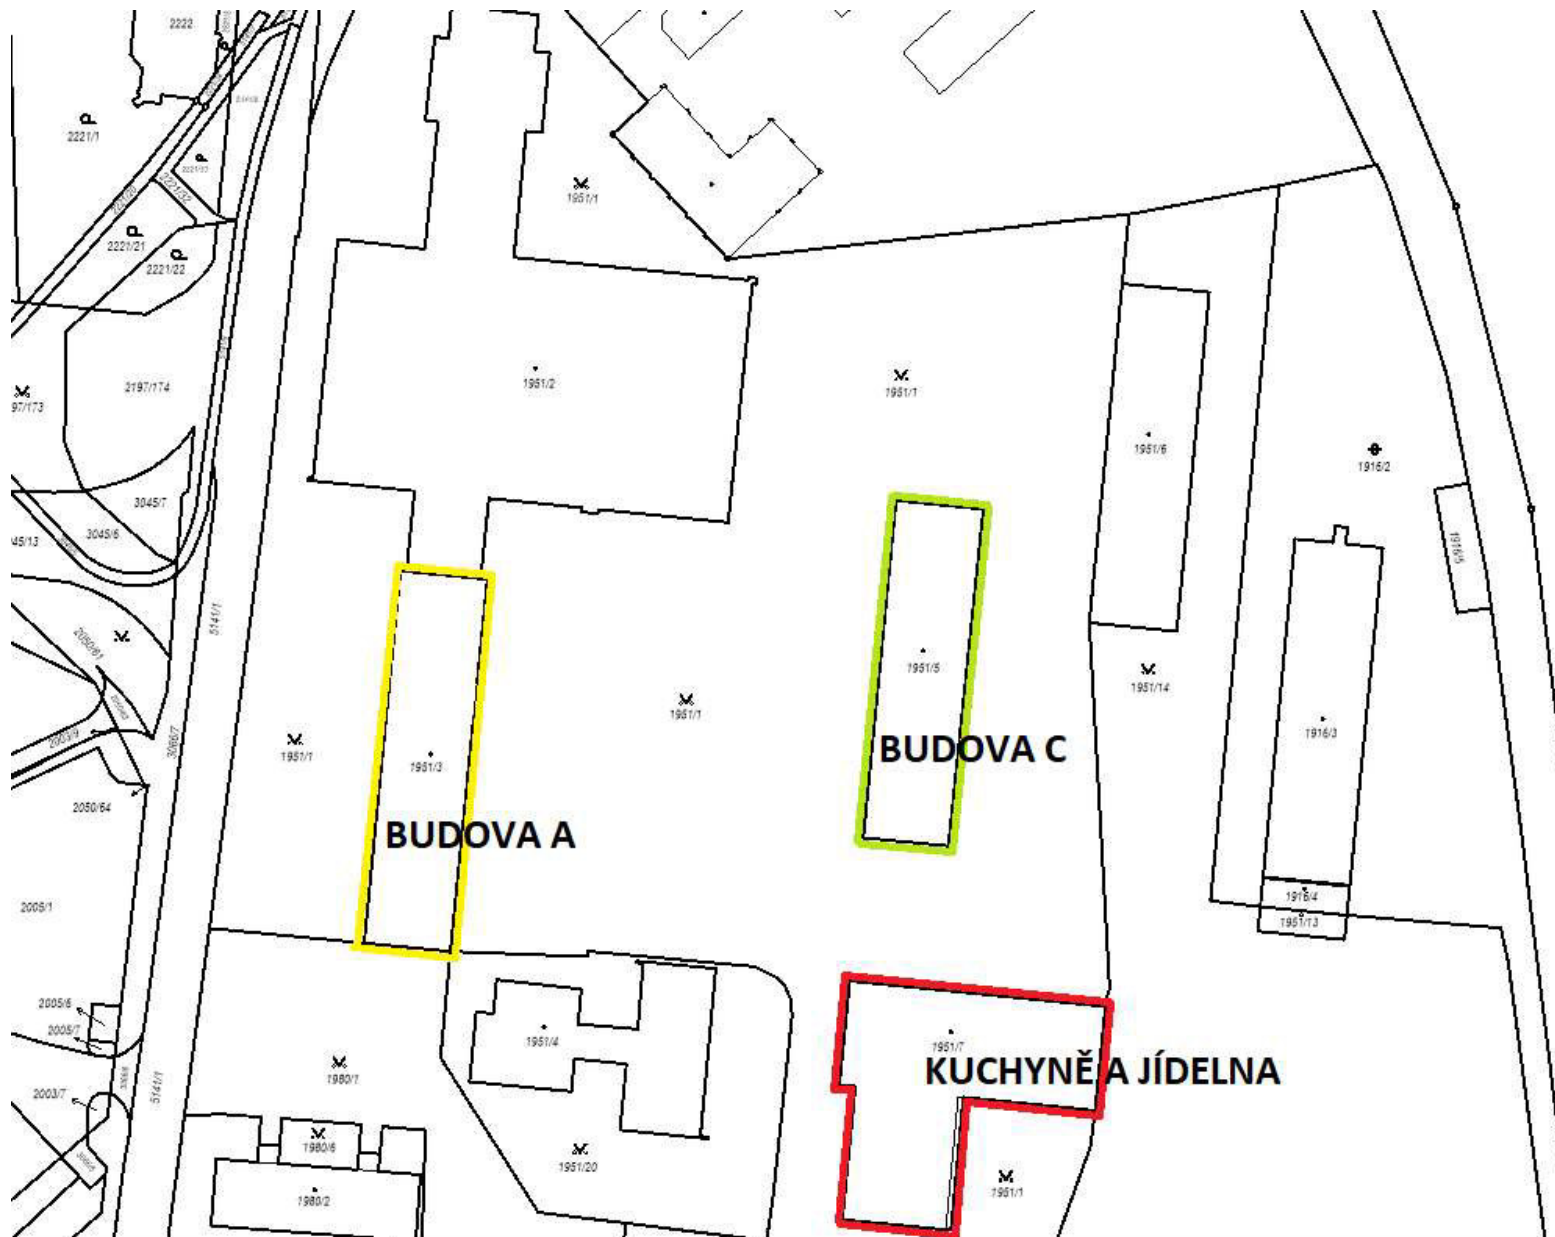

### Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek – vzor seznamu poddodavatelů

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek“

			Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli	Hodnota plnění veřejné zakázky, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (v Kč)
1.	<b>Název poddodavatele</b>	Anada HS s.r.o.	Koordinace profesí, kontrola a autorizace výkresů části elektro	35 000
	Sídlo / místo podnikání	Horní Stakory 77, 293 01 Kosmonosy	vyplní dodavatel	
	IČO	03020762	vyplní dodavatel	
	DIČ	CZ03020762	vyplní dodavatel	
	Telefon		vyplní dodavatel	
	E-mail		vyplní dodavatel	
2.	<b>Název poddodavatele</b>	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Sídlo / místo podnikání	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	IČO	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	DIČ	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Telefon	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	E-mail	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
3.	<b>Název poddodavatele</b>	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Sídlo / místo podnikání	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	IČO	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	DIČ	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Telefon	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	E-mail	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
4.	<b>Název poddodavatele</b>	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Sídlo / místo podnikání	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	IČO	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	DIČ	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	Telefon	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	
	E-mail	vyplní dodavatel	vyplní dodavatel	

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo



vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

jméno a příjmení



rodné číslo



je

**autorizovaným technikem**

v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 31.10.1997



předseda ČKAIT



# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo



vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**


v oboru

**technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde



Autorizace je udělena ke dni 27.6.2000



předseda ČKAIT

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo



vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**


v oboru

**požární bezpečnost staveb**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde



Autorizace je udělena ke dni 23.5.2017



předseda ČKAIT

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo



ZMĚNA TITULU

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů



jméno a příjmení



rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**

v oboru

**statika a dynamika staveb**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem



a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Osvědčení je vydáno ke dni 21. listopadu 2017,



předseda ČKAIT






## Čestné prohlášení:

V rámci zakázky „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek, zadávanou

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek**

IČO zadavatele: **13644301**

Sídlo zadavatele: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky je  v pracovně právním vztahu se společností Zero Emission Consulting, s.r.o.

V Praze dne: 18.7. 2023

 **S.r.o.**  
aha

Ing. Miroslav Cejpek, jednatel společnosti



## Čestné prohlášení:

V rámci zakázky „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek, zadávanou

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek**

IČO zadavatele: **13644301**

Sídlo zadavatele: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky je  pracovně právním vztahu se společností Zero Emission Consulting, s.r.o.

V Praze dne: 18.7. 2023



Ing. Miroslav Cejpek, jednatel společnosti



## Čestné prohlášení:

V rámci zakázky „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek, zadávanou

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek**

IČO zadavatele: **13644301**

Sídlo zadavatele: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky je [redacted] v pracovně právním vztahu se společností Zero Emission Consulting, s.r.o.

V Praze dne: 18.7. 2023

[redacted]

nosti




## Čestné prohlášení:

V rámci zakázky „Zpracování projektové dokumentace střešní FVE Střední školy řemesel Frýdek-Místek, zadávanou

**Střední škola řemesel Frýdek-Místek**

IČO zadavatele: **13644301**

Sídlo zadavatele: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Čestně prohlašuji, že ke dni podání nabídky je  v pracovně právním vztahu se společností Zero Emission Consulting, s.r.o.

V Praze dne: 18.7. 2023



Ing. Miroslav Cejpek, jednatel společnosti
