

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO



MURSP00FBKGS

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

č. VPI/MJ/2023/00053

mezi

CETIN a.s.

a

Město Rosice

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [redacted] manažerem, Výstavba a údržba
fixní sítě Morava jih

bankovní [redacted]

číslo účtu [redacted]

datová schránka : qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Rosice

se sídlem Palackého nám.13

IČO: 00282481

DIČ: CZ00282481

zastoupená Mgr. Andrea Trojanová, starostka

datová schránka:6abbzec

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Rosice u Brna spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 29.9.2022 vydané pod čj. 774526/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pět (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady za CTN Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **398.911,- Kč** (slovy: tři sta devadesát osm tisíc devět set jedenáct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **6.760,- Kč** (slovy: šest tisíc sedm set šedesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail [REDACTED]
- ve věcech technických [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail [REDACTED]
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Trojanová, starostka
funkce: starostka
e-mail [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese [REDAKCE]. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby [REDAKCE] ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [REDAKCE]

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053

SAP S/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00053

SAP S/4 Hana: 8030004391

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města usnesením číslo RM/2023/22/16 dne 21.08.2023.

CETIN:

Stavebník:

VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 75018/22/0040 na zpracování CTN: VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby parkovacího objektu v Rosicích, vedle ulice Trávníky, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN.

Jedná se o:

Trubku HDPE40 (oranžové barvy) se zafouknutým OK 644 011 060 _ SAMSUNG 24vl. + Cu pár.

Trubku HDPE40 (černé barvy) - v době zpracování CTN prázdná

Metalický kabel:

PFLE 300XN0,4

HDPE:

V místě překládky budou položeny nové trubky HDPE40. Barevné značení nových trubek bude zvoleno dle aktuálního barevného značení.

Trubky budou uloženy do kabelového lože. Na nově položených trubkách bude provedena kalibrace a hermetizace.

OK:

644 011 060 _ V RSU Rosice bude optický kabel přerušen a vyfouknut do místa překládky (cca 600m optického kabelu).

Trubka HDPE40 bude přespojovaná spojkami PLASSON do nového průběhu a do oranžové trubky bude zpětně zafouknut OK až do místa RSU Rosice. Aktuálně provařená vlákna budou v RSU opět provařena. Spojky na trubkách budou označeny markerem Ball dle předpisu TIMP.TD 000005 a TIMP. TD000008.

Ochrana proti přepětí, nadproudu a blesku:

Cu pár musí být znovu propojen, po provedení překládky bude na něm provedeno ss měření.

MK:

Metalický kabel PFLE 300XN0,4 bude na začátku a konci překládky přerušen a pomocí kabelových spojek XAGA se naspojuje na nový prvek spol. CETIN stejného typu i kapacity. Kabel bude přeložen mimo budoucí chodníkový obrubník.

Pod novými, případně rekonstruovanými pojízdnými plochami a výhybnou, budou stávající funkční prvky spol. CETIN uloženy do dělených trubek typu SYSPRO160/110mm.

Případně bude provedena revize, či prodloužení stávajících chrániček.

K těmto trubkám budou vždy připoloženy rezervní chráničky typu PE110mm.

Kabelové spojky a konce chrániček budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Měření:

metalický kabel = před provedením překládky bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelu.

optické kabely = jednostranné měření 1625 nm – předměření, měření přímou metodou na 1310, 1550 a 1625 nm + měření oboustranné OTDR 1310, 1550 a 1625 nm.

2.3 Popis tras

viz. příložené podklady

2.4 Použitá technologie:

HDPE trubka 40mm
Spojka HDPE Plasson
Metalický kabel TCEPKPFLE 0,4
Kabelová spojka XAGA
Minimarker Ball
SYSPRO160/110mm, PE110mm

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481, DIČ: CZ00282481, zastoupeno starostkou:
Mgr. Andrea Trojanová.

e-mail, na který se bude zasilat návrh překládky: [REDACTED]

[REDACTED] zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GP: pouze nová trasa SEK (zakresleno v KM)

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Případné překážky v nové trase SEK: odstraní investor

Koordinovat s překládkou VPIC_ŘSD_Rosice-Silnice I-23

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušeni optického kabelu) – min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2023.02

Položková 2023.02

Název stavby: **75018/22/0040 VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO: JMO

HOST: Brno - Bystrc

VUJ: Rosice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	80 154,67 Kč
MONTÁŽ	230 818,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 288,41 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	11 377,79 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	53 862,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 398 910,87 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 381 449,53 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 17 461,34 Kč


Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	32.00 m	837,76 Kč
954960 S		Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm	12.00 m	2 979,00 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	22.00 m	14 789,94 Kč
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	4.00 m	3 554,24 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	6.00 m	1 157,70 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	15.00 m	7 060,65 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	12.00 m	1 516,08 Kč
954962 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	12.00 m	6 135,12 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	15.00 m	39 321,90 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	56.00 m	826,00 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	6.00 m	1 681,32 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	294,96 Kč
MONTÁŽ				


958294 S	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	255,63 Kč
955117 S	Demontáž optického kabelu v budovách	20.00 m	676,00 Kč
955092 S	Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	693,16 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	16.00 m	438,56 Kč
952706 S	Instalace optického kabelu v budovách	20.00 m	946,40 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	18.00 m	79,74 Kč
958308 S	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks	4 630,80 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nr	24.00 ks	12 683,28 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm)	24.00 ks	2 268,24 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	593,61 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	330.00 ks	15 127,20 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	299.00 ks	9 113,52 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	106,92 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	197,87 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	300.00 ks	9 144,00 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	300.00 ks	11 466,00 Kč
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	35670.00 JV	35 670,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955260 S	Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	787,79 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	4 274,46 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	232,52 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	4920.00 JV	4 920,00 Kč
montáž SYSPRO			
952602 S	Montáž trubky úložné	18.00 m	358,38 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	11.00 m	504,24 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	16.00 m	513,28 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	32 347,28 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	290,04 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	20 171,58 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metro	24.00 ks	11 355,84 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE tru	1200.00 m	35 244,00 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	3 165,90 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5596.50 JV	5 596,50 Kč
Vytyčení nové trasy SEK			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 691,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 326,08 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	495.00 JV	495,00 Kč
náhrada za VBř odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 838,99 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks	3 717,72 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	51.00 ks 2 109,87 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m 125,70 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	55.00 m 263,45 Kč
300112 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 300x4x0,4	11.00 m 8 292,57 Kč
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	24.00 ks 101,52 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	10.00 ks 2 501,10 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	48.00 ks 2 417,28 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	24.00 ks 129,84 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks 105,12 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	3.00 ks 133,83 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks 2 694,92 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks 529,92 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	228.00 ks 8 322,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	38.00 m 21 987,18 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	9.00 m 292,23 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	9.00 m 292,23 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks 3 358,14 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	8.00 ks 205,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks 0,00 Kč



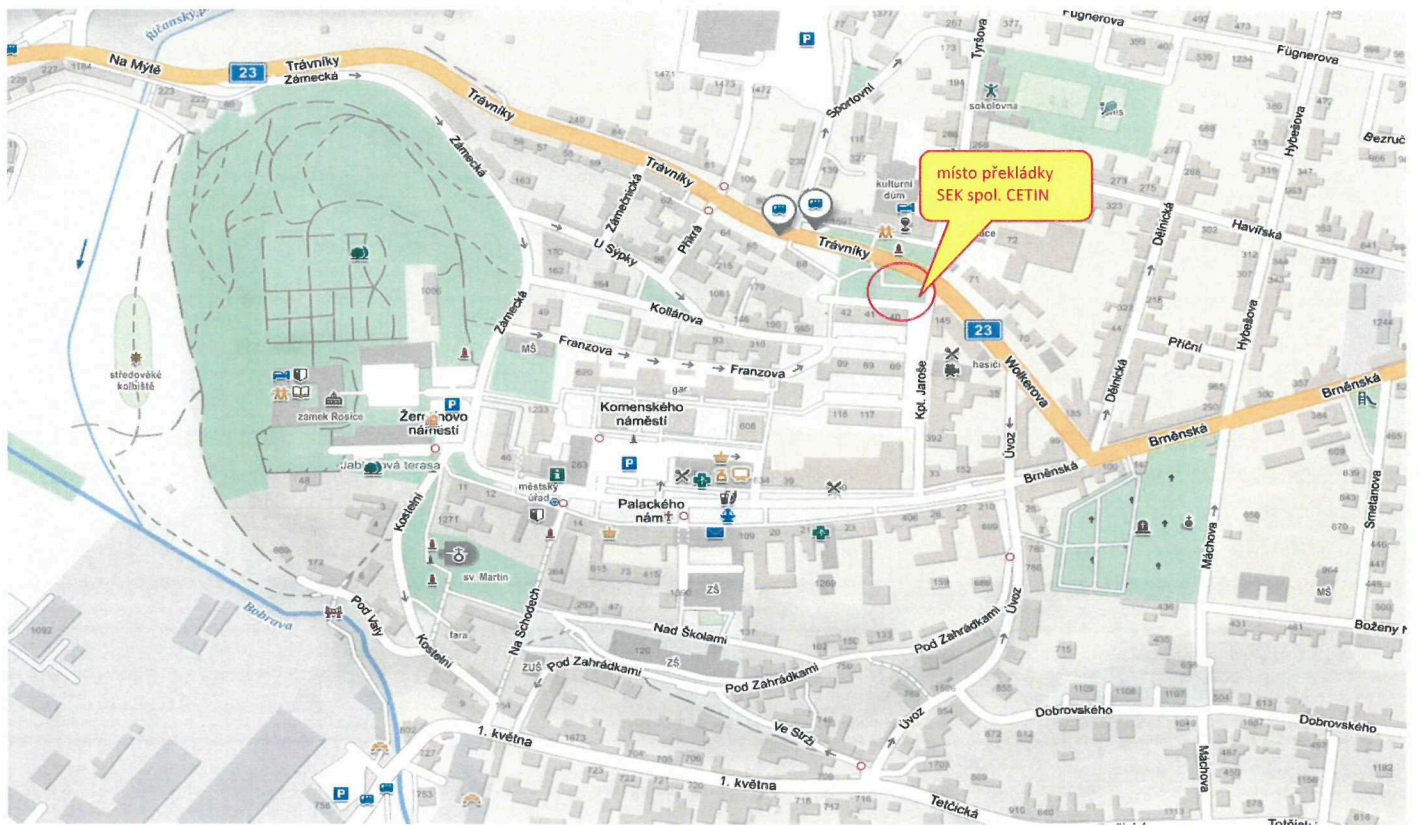


75018/22/0040 VPIC_Rosice-parkovací objekt Trávníky

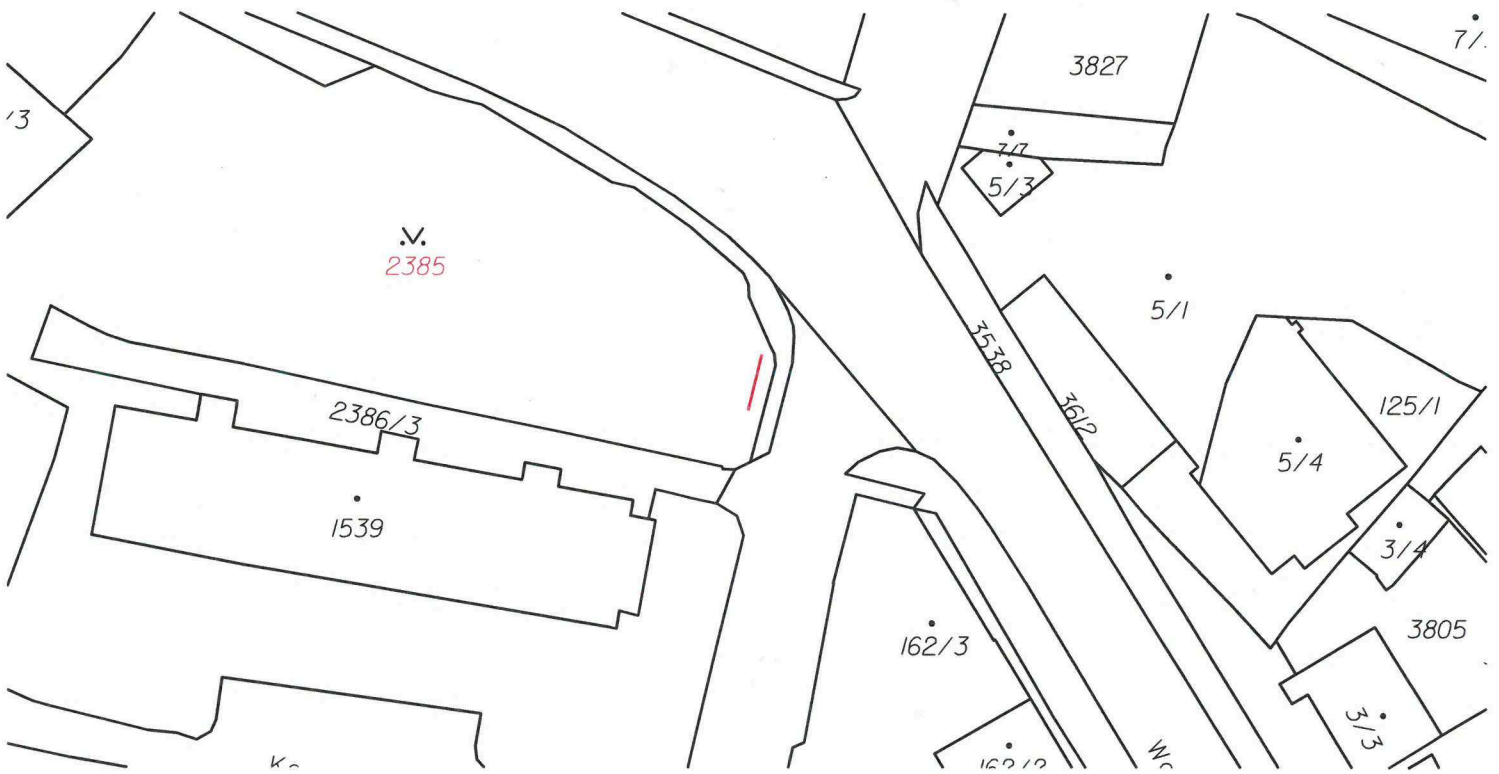

Informace o pozemku



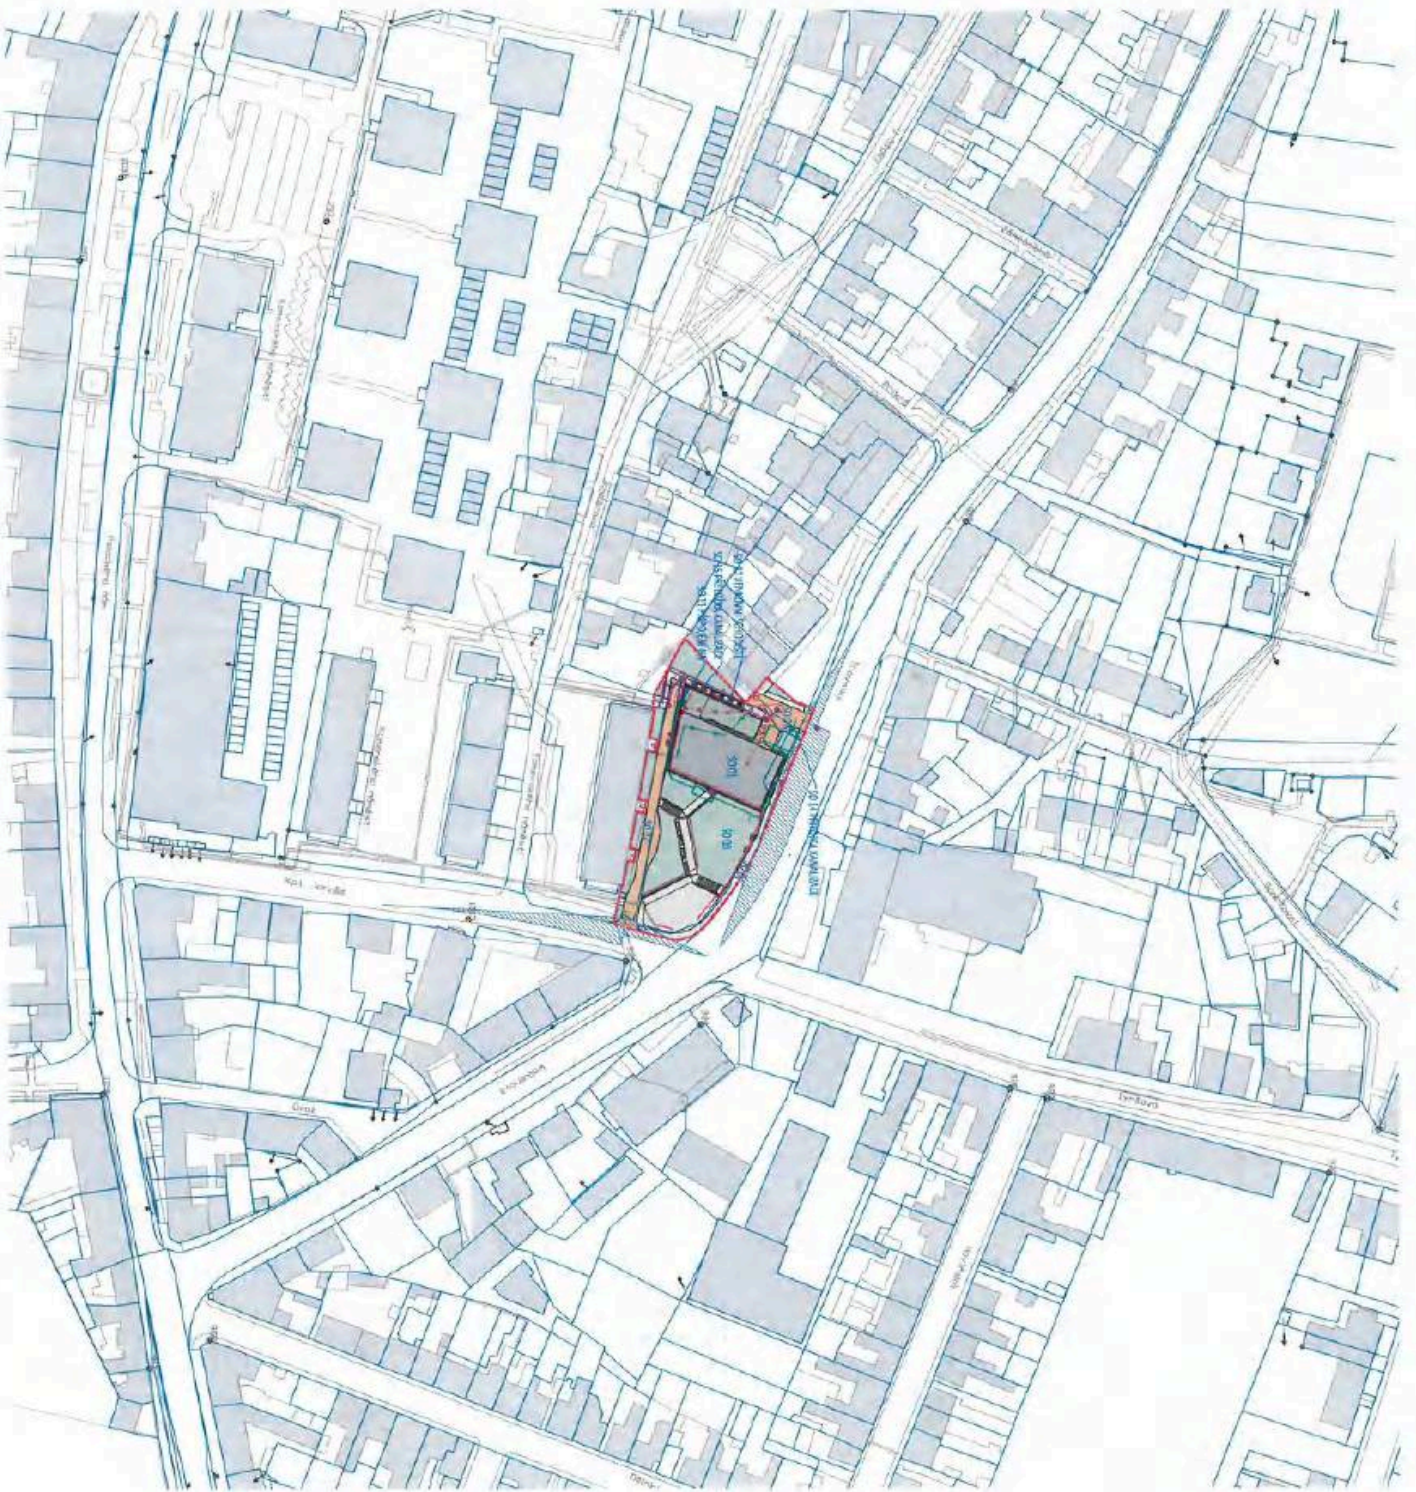

LEGENDA:
 — НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
 — РАЙОН ТЕКУЩЕГО РЕВИЗА
 500

НАИМ.

— НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

▲ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ


СЪСТАВ НА СТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

- S014 НАПРАВЛЕНИЕ
- S022 ОБЩАВАНЕ
- S023 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S024 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S025 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S026 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S027 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S028 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S029 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S030 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S031 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S032 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S033 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S034 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
- S035 НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ



LEGENDA:

- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —
- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —
- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —
- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —
- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —
- KANALIZACIJA (S) —
- KANALIZACIJA (N) —
- KANALIZACIJA (E) —
- KANALIZACIJA (Z) —

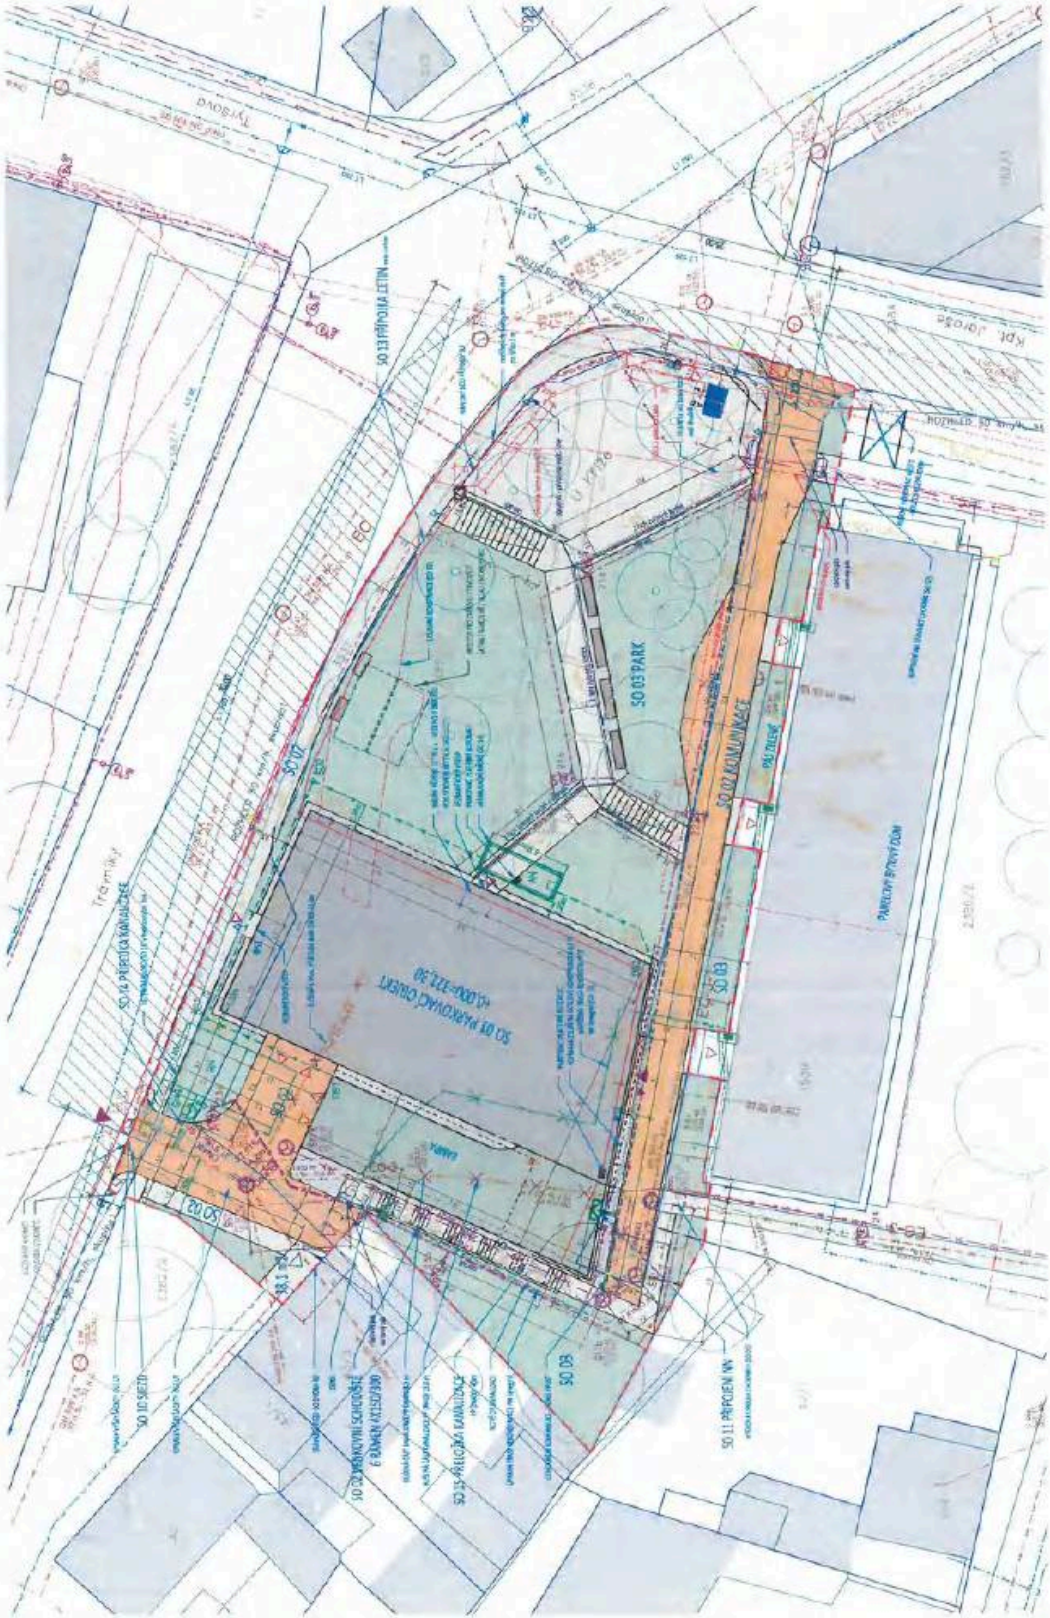

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„CETIN“)

a

[•]
(„Partner“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ („Dohoda“)

ČI. I PŘEDMĚT DOHODY

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit stavbu [•] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

ČI. II PŘEVOD PRÁV

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Praze dne _____ 20[•]

V _____ dne _____ 20[•]

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]
