

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta
tel.: +420 731 131 181

a

2. **Zhotovitel:** NDCon s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti
IČ: 64939511
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem rozpracování aktuálně pořízené studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCon s.r.o. do formy podrobného návrhu dopravně organizačního a stavebně technického řešení v dopravním prostoru pozemní komunikace, které bude mít vliv na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu s funkčními požadavky jak

1

komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města – Malšovice, Malšova Lhota a oblast Stříbrného rybníku.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2017/211 a výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„**Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové – etapa 1" (studie)**
(dále jen „dílo“)
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 22. 5. 2017, které jsou přílohami této smlouvy.
2. Dílo sestává z vypracování níže uvedených částí:
 - **návrh řešení ve formě podrobné studie**, jako podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.)
 - **návrh dopravního značení** pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 - **dokladová část** – projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty – odbor dopravy města Hradec Králové a DI Policie ČR
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li objednatelem osloven.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - zadání objednatele z dubna 2017
 - nabídka zhotovitele ze dne 22. 5. 2017 přijatá pod č. j. MMHK/091362/2017
 - rozsah řešeného území
 - digitální technická mapa města
 - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
 - ortofotomapa 2015
 - vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
 - platný územní plán města – odkaz na mapový projekt na internetu
 - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu
 - strategický plán rozvoje města Hradec Králové

- údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 (web + sčítací archy) a dopravního modelu města Hradec Králové
 - tematické mapy města – odkaz na mapové projekty na internetu
 - základní podklad inventarizace zeleně v řešeném území
 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
 - vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy V Hradci Králové
 - páteří cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
 - společné evropské indikátory ECI A1, A3, A4, B6
 - QUEST – závěrečná zpráva
 - vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do studie
 - studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od společnosti NDCON s.r.o.
 - informace o záměrech v území
 - specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP, SC 1.2 - ITI
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termin zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději ve lhůtě do 30. 9. 2017.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

316.000,- Kč (slovy: třistašestnácttisíkorunčeských) bez DPH

DPH 21% 66.360,-Kč

celková cena za dílo vč. DPH 382.360,-Kč

(slovy: třistaosmdesátdvatisícetřistašedesátkorunčeských)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

h

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

[REDACTED]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. arch. Petr Brůna (vedoucí odboru hlavního architekta), tel.: +420 731 131 181

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz

Ing. Petr Schiller, tel.: +420 495 707 578, email: petr.schiller@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu prací směřujících ke zhotovení díla v souladu s vymezeným předmětem díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 1 společné projednání každý měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín se bude konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná verze v tištěné i elektronické formě v počtu 1 paré. Pokud během konzultačních dnů vyjde požadavek prověřit některou z částí dokumentace v případných variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá dokumentace bude odkonzultovaná s objednatel. O tomto projednání bude zhotovitelem sepsán zápis, který bude odsouhlasen objednatel.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánů státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušné části díla k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu doložení požadovaného počtu 6 paré PD včetně digitální formy na CD nosiči zhotovitelem, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále v elektronické podobě u obou částí - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo *.dxf, případně také v GIS formátech *.shp, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textovou a tabulkovou část ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf. Dokladová část bude součástí jednoho odevzdaného paré díla.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 2 stejnopisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- *Zadání objednatele*
- *Nabídka zhotovitele*

- 8 -06- 2017

V *MAZU* dne *16. 10. 17*

V Hradci Králové dne



za zhotovitele

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

za objednatele


PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora



PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ

ETAPA 1

zadání pro zpracování studie návrhu řešení

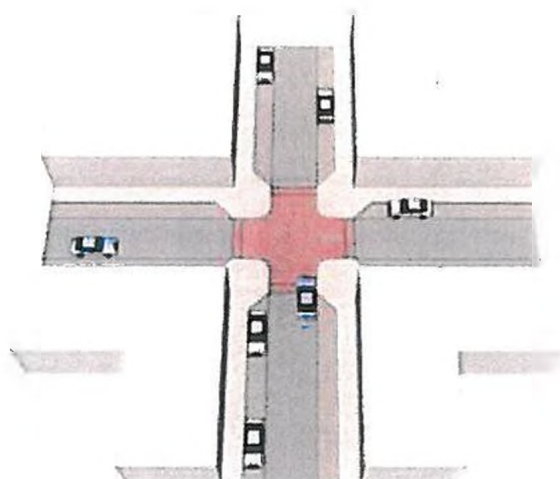

magistrát města Hradec Králové

odbor hlavního architekta

odbor strategického plánování a projektového řízení

04/2017



Obsah

1. Cíl a účel pořízení.....	3
2. Vymezení řešeného území	4
3. Požadavky na řešení studie	5
a) podrobnost návrhu.....	5
b) požadavky na základní koncepci řešení.....	5
c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.....	6
d) požadavky na řešení studie	6
e) další zvláštní požadavky.....	7
4. Požadavky na formu obsahu a předání	7
Obsah studie.....	7
Předání objednateli	8
5. Podklady	8
6. Projednání	9
7. Přílohy:.....	9



1. Cíl a účel pořízení

Důvodem pořízení díla je konkrétní rozpracování aktuálně pořízené studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON s.r.o. (dále studie proveditelnosti) do formy podrobného návrhu **dopravně organizačního a stavebně technického řešení** v dopravním prostoru pozemní komunikace, které bude mít vliv na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu s funkčními požadavky jak komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města – v tomto případě Malšovic, Malšovy Lhoty a oblasti Stříbrného rybníku.

Cílem sledovaného řešení je modernizace vzhledu komunikací s motivací řidičů k ohleduplnější jízdě a z toho vyplívající zlepšení životních podmínek místních obyvatel, jejich ochrana přes zbytnou dopravou, zvýšení bezpečnosti provozu, optimalizace (minimalizace) dopravního značení a zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.

Detailní návrh dopravně technického řešení plošného zklidnění vybrané oblasti bude řešen na základě principů vypracované studie proveditelnosti, která se tímto úkolem zabývala z pohledu celého kontextu správního území města – viz podklady. Tyto principy detailní návrh promítne do podobny konkrétního **dopravně organizačního a stavebně technického řešení**:


- **návrh řešení ve formě podrobné studie**, jako podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.),
případně pro zbytek řešeného území
- **návrh dopravního značení** pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Tyto jednotlivé úrovně se nesmí vzájemně vylučovat, naopak cílem je vzájemná funkční i časová kompatibilita obou úrovní navržených dopravních opatření.



2. Vymezení řešeného území

Řešené území tvoří městské části Malšovice u Hradce Králové a Malšova Lhota (resp. jejich zastavěné části) včetně rekreační chatové osady Stříbrný rybník. Do řešeného území tak nejsou zahrnovány volné nezastavěné plochy přírodního charakteru nebo velké uzavřené areály výrobního a obchodního charakteru viz. situační obrázek.

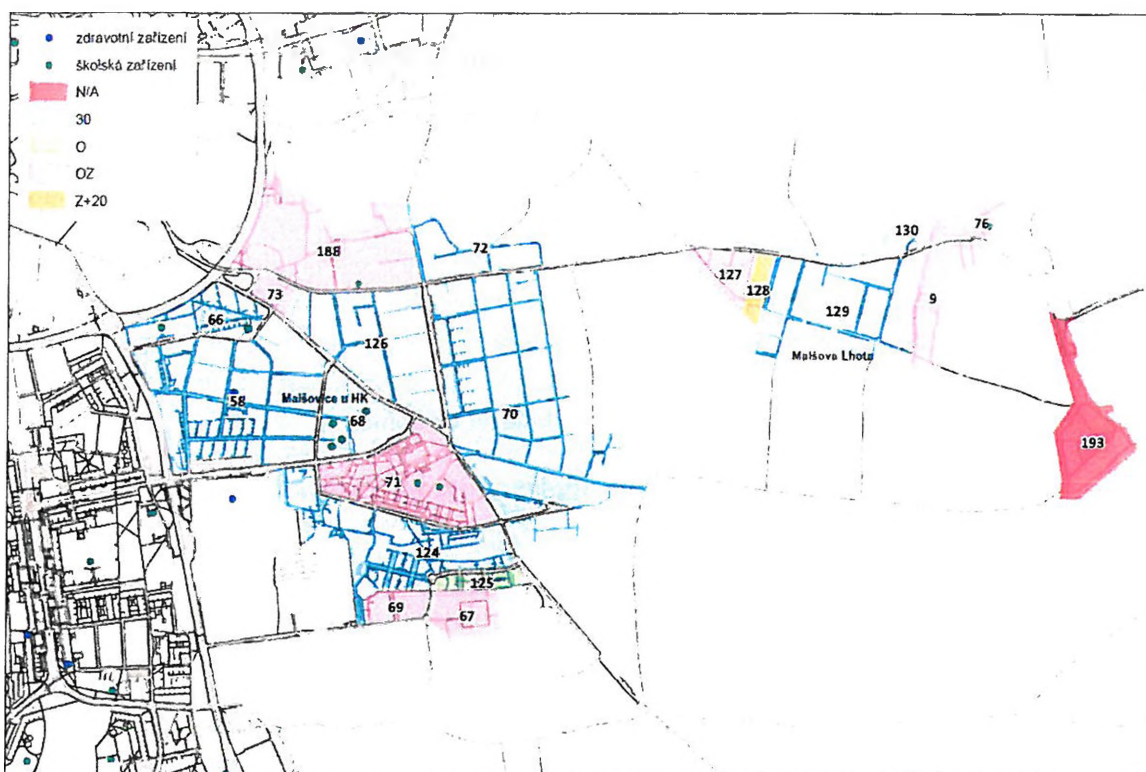

Jednotlivé zóny byly vymezeny studií proveditelnosti a jsou jednotlivě očíslovány. Pro detailní návrh jejich řešení je možné jejich hranice upravit s ohledem na konkrétní návrh.

Cílem je navrhnout systém plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové v městské části Malšovice u Hradce Králové a Malšova Lhota (vč. osady Stříbrný rybník) dle mapových podkladů (celkem 20 ploch).

katastrální území	výměra [km ²]
Malšova Lhota	1,94
Malšovice u Hradce Králové	2,37



3. Požadavky na řešení studie

a) podrobnost návrhu

Podrobnost díla předpokládá zpracování studie proveditelnosti s návrhem řešení **dopravně organizačních** (např. zóna TEMPO 30, obytné zóny, pěší zóny atp.) a **stavebně technických opatření** v částech dopravního prostoru pozemní komunikace (osazení technických prvků vyžadujících stavební řešení jako např. zúžení, zvýšené křižovatkové plochy, dlouhé zpomalovací prahy, ostrůvky, šikany atp.) zajišťující regulaci rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu zejména pro jeho nemotorové účastníky, odstranění zjištěných dopravních závad, zvýšení pohody užívání venkovního prostoru, apod. Jedná se především o zóny číslo: 58, 66, 70 (částečně), 71, 124 a 193.

V případě okrajových částí Hradce Králové s nižší intenzitou dopravy, bude zpracován návrh dopravního značení s případným osazením technických prvků bez stavebního řešení (např. prefabrikáty zpomalovacích polštářů atp.) pro stanovení místní úpravy provozu v souladu s principy plošného zklidňování dopravy. Jedná se například o zóny číslo: 70 (částečně), 72, 126, 127, 129 a 130.

V případě částí Hradce Králové, kde již v minulosti byla osazena určitá forma zklidnění dopravy nebo se počítá s jejich celkovou rekonstrukcí, žádáme o prověření ve spojitosti k celkovému konceptu plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové. Jedná se například o zóny číslo: 9, 67, 68, 69, 73, 76, 127, 128 a 188.

Koncepce a hranice vymezení zón (technický koncept) je základním rozsahem dána studií proveditelnosti, nicméně může být v rámci podrobnějšího řešení dále upřesněna dle detailu návrhu.

Návrh jednotlivých opatření studie bude sloužit pro navazující projektovou investiční přípravu (DUR, DSP, atd.), a proto bude obsahovat všechny potřebné náležitosti (např. přechody pro chodce, vysazené chodníkové plochy, výškové řešení, vjezdové prahy, posuny VO, apod.).

Reálnost návrhu řešení bude založena na souladu s příslušnou aktuálně platnou legislativou v této oblasti a následně ověřena v rámci projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty (např. odbor dopravy města Hradec Králové, DI Policie ČR atp.).

b) požadavky na základní koncepci řešení

Řešení bude sledovat soulad s **principy udržitelné městské mobility** evropských sektorových dokumentů (Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru, Akční plán pro městskou mobilitu), **národních dokumentů** (Dopravní politika ČR 2014-2020), **krajských dokumentů** (Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020) a **městských dokumentů** (Strategický plán rozvoje města HK do roku 2030, Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v HK).



Řešení bude navrženo v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové (ÚPmHK), zejména jeho závaznou částí se základními zásadami uspořádání území (urbanistická koncepce, funkční využití ploch, zásady uspořádání dopravního vybavení, atd.).

Návrh řešení bude dále koncipován v souladu s principy aktuálně připravovaného nového Územního plánu Hradce Králové (ÚPHK), kde se pořízení této studie časově shoduje s projednáním návrhu ÚPHK.

Řešení bude sledováno v souladu s principy studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON s.r.o.

Řešení bude v souladu s přijatou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové.

c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Řešené území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a architektonicky hodnotné oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská památková zóna a příp. další oblasti zvláštního zájmu.

d) požadavky na řešení studie

Předpokladem je zachování sítě nezklidněných sběrných komunikací s převažující dopravní funkcí, která bude základním dopravním skeletem města Hradec Králové. U místních komunikací mimo tuto síť se již předpokládá převaha jiné než dopravní funkce, především pobytové, a je vhodné na ně aplikovat opatření formu plošného zklidnění dopravy.

Návrh řešení konkrétních zón bude vycházet z významu pozemních komunikací dopravního systému města s rozdělením na jejich funkci **dopravní a pobytovou**. Při definování těchto funkcí bude řešitel vycházet z platného i aktuálně připravovaného nového územního plánu města, pasportu pozemních komunikací města, ČSN 73 6110 (funkční skupiny místních komunikací) a výsledků projednání s příslušnými subjekty.

Návrh řešení zón plošného zklidnění dopravy bude současně sloužit jako **významný nástroj podpory pěší a cyklistické dopravy**. Řešení proto nesmí nijak (i nepřímo) vyvolat případná omezení pro tyto druhy dopravy – naopak tyto módy dopravy zde významně podpořit a posílit (např. zprůjezdnění jednosměrných ulic).

Zvláštní pozornost bude věnována místům se zvýšenou frekvencí pohybu obyvatel a dětí, jako jsou například školská a zdravotní zařízení na území města apod.

Zvláštní pozornost bude věnována systému parkování s požadavkem na zvýšení nabídky parkovacích stání (např. návrh jednosměrných ulic) a potlačení živelného parkování, které má negativní vliv na bezpečnost dopravy i pobytovou kvalitu prostředí (např. omezující pohyb chodců a cyklistů).



Podpora optimalizace (minimalizace) svislého a vodorovného dopravního značení pomocí existence základního dopravního pravidla – přednosti zprava, jako podstatu zklidňování. Řešení případných negativních jevů „psychologické přednosti“. Případné osazení dopravního značení pomocí dopravních značek ve zmenšeném formátu.

Zajištění plnohodnotných rozhledových poměrů, kde organizace dopravy bude založena především na očním kontaktu mezi řidiči, chodci a cyklisty.

Řešení zón by nemělo omezovat provoz a plynulost veřejné hromadné dopravy (MHD a IREDO) a řešení zohlední vedení těchto linek.

Revize stávajícího dopravního značení dle 13/1997 Sb. a níže uvedených dokumentů s cílem zajistit snižování počtu dopravního značení s respektováním funkčnosti dopravního systému ve městě a zachováním bezpečnosti silničního provozu.

e) další zvláštní požadavky

Návrh řešení bude sledovat jeho **praktickou reálnost** – ve vztahu k platné legislativě, technickým předpisům, normovým požadavkům, apod. Především se pak jedná o Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška 30/2001 Sb., vyhláška 398/2009 Sb., technické podmínky TP218 navazující na příslušné české normy (zejména ČSN 73 6110) a tematicky příbuzné technické podmínky (zejména TP 145, TP 132, TP 103 a TP 179). Případně metodiky MD ČR – VL7 vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, MDČR – Tempo 30 Metodika plošného zklidňování dopravy a výše uvedená studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK.

4. Požadavky na formu obsahu a předání

Obsah studie

- a) Pro návrh stavebně technických řešení ve formě podrobné studie, jako podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.) požadujeme:
 - průvodní a technickou zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, samostatně pro jednotlivé plochy vyznačené v situaci
 - závěry a doporučení (vyhodnocení příp. variant, požadavky pro další projektovou přípravu, upozornění na rizika, apod.), samostatně pro jednotlivé plochy vyznačené v situaci
 - ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé plochy a celkových nákladů na realizaci díla
 - výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, technické situace (půdorysy, řezy) apod.
- b) Pro úpravy dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bez stavebního řešení požadujeme:



- průvodní zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, samostatně pro jednotlivé plochy vyznačené v situaci
- ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé plochy a celkových nákladů na realizaci díla bez stavebních úprav
- výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, situaci návrhu dopravního značení a technických prvků apod.

Předání objednateli

Pracovní návrh bude odevzdán po každém pracovním výboru v tištěné a digitální podobě (1x)

Finální dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána:

- v tištěné podobě – 6 paré
- v digitální podobě (na digitálním nosiči)

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:

- vektorová data v CAD formátech *.dwg, nebo *.dgn (případně GIS *.shp)
- rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.
- textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)
- vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

5. Podklady

- digitálně technická mapa města Hradec Králové
- katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
- strategický plán rozvoje města Hradec Králové
- platný územní plán města Hradec Králové
- návrh nového územního plánu města Hradec Králové
- vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do studie
- vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec Králové
- ortofotomapa 2015 města Hradec Králové
- údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové (2016)
- tématické mapy města – odkaz <http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy>
- studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON s.r.o.
- koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
- vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy v Hradci Králové
- páteřní cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
- společné evropské indikátory ECI A1, A3, A4, B6
- QUEST – závěrečná zpráva
- informace o záměrech v území



6. Projednání

Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelům dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

Návrh řešení **bude vždy projednán a schválen** všemi příslušnými dotčenými orgány a subjekty, zejm. odborem dopravy města Hradec Králové, DI Policie ČR, správcem komunikací, zástupcem odboru strategického plánování a projektového řízení města Hradec Králové, příp. provozovatelem městské hromadné dopravy (DPmHK), organizátorem regionální hromadné dopravy (Oddělení dopravní obslužnosti KÚ KHK) a všemi dalšími návrhem dotčenými subjekty (např. KMS).

Počet projednání (pracovních výborů) na MmHK OHA/OSP bude minimálně 2x (další případně dle potřeby):

1. koncept řešení, varianty, diskuze $\Rightarrow$ požadavky a podněty pro dopracování
2. čistopis řešení se zapracováním připomínek a podnětů, odsouhlasení

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. v poradních orgánech města, apod.).

7. Přílohy:

- příloha 1 - informace k plochám pro etapu I
- příloha 2 - databáze zklidňovaných oblastí
- příloha 3 - situace etapy I



Návrhové plochy - informace:

ID	TYP	Zóna ISP	Urbanistická koncepce	Kategorie komunikace	Chodníky	Parkování	Cyklostezky	Cyklotrasy	Zákaz vjezdu	Zákaz vjezdu nákladních aut.	Školská zařízení	Hřiště
58	30	N	6	2	1	2	N	N	N	A	N	A
66	30	N	4	2	1	1	N	N	N	N	A	A
68	30	N	4	5	2	1	N	A	N	N	A	A
70	30	N	6	2	2	2	N	A	N	N	A	A
72	30	N	6	2	1	3	N	A	N	N	N	N
124	30	N	4	2	1	1	N	A	N	U	N	A
126	30	N	6	2	2	3	N	N	N	A	N	N
129	30	N	6	2	1	2	N	A	N	N	N	A
130	30	N	6	2	1	2	N	N	N	N	N	N
193	N/A	N	4	2	3	3	A	A	N	N	N	A
125	O	N	6	2	1	2	N	N	N	N	N	N
9	OZ	N	6	4	3	3	N	A	N	N	N	N
67	OZ	N	2	4	3	3	N	N	N	N	N	N
69	OZ	N	4	4	3	3	N	N	N	N	N	N
71	OZ	N	4	2	4	1	N	A	N	A	A	A
73	OZ	N	6	2	3	2	N	N	N	N	N	N
76	OZ	N	6	2	3	3	N	N	N	N	A	N
127	OZ	N	6	4	3	3	N	A	N	N	N	N
188	OZ	N	6	2	3	3	N	A	N	N	A	A
128	Z+20	N	6	2	3	4	N	A	A	A	N	N

viz. NDCon - databáze zklidňovaných oblastí (příloha č.8)

Návrhové plochy – definice oblastí:

ID	TYP	popis
58	30	Problematika parkování u vysokopodlažní zástavby v ul. Fučíkova, Písečná a Moravská. Zvýšený pohyb chodců u zdravotního střediska. Problematické napojení ul. Pekařova na ul. Na Kotli. Požadavek na stavební fyzické prvky, možnost návrhu zjednosměrnění ulic = navýšení parkovacích míst.
66	30	Problematika parkování u vysokopodlažní zástavby v ul. Na Kotli.
68	30	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Škola – nová rekonstrukce příjezdové komunikace, školka.
70	30	Točna MHD v ul. Emy Destinnové. Zvýšený pohyb chodců, dětí (dětské hřiště u restaurace Na Hrázce) a cyklistů v návaznosti na městské lesy v ul. Na Hrázce = požadavek na stavební fyzické prvky.
72	30	Sportovní areál.
124	30	Nová výstavba v ul. Rybova. Zvýšený pohyb chodců, dětí (dětské hřiště) + Kino mladých a Prostor PRO v ul. Průběžná - požadavek na stavební fyzické prvky. Nový přechod pro chodce přes ul. Čajkovského z ul. Průběžná – vazba na školská zařízení (ZŠ a MŠ Štefcova) a výstavby v ul. Rybova + výše uvedené objekty.
126	30	Nová rekonstrukce ul. Dubová.
129	30	Cyklo propojení Malšovice u HK – Malšova Lhota – Stříbrný rybník v ul. Bělečská. Sportovní areál.
130	30	
193	N/A	Nevyhovující dopravní situace v ul. Stříbrný potok. Požadavek na návrh zóny, případně jiného omezení či stavebního řešení v ul. Stříbrný potok – velmi vysoký pohyb cyklistů (řešit napojení s Malšovou Lhotou), pěších, bruslařů atp. od MHD a parkoviště v ul. Lhotecká v návaznosti na městské lesy a v kolizi s obslužností kempu a chatové osady!
125	O	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
9	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
67	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
69	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
71	OZ	Zvýšený pohyb chodců v prostoru areálu Na Občinách + nová výstavba komunikací
73	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
76	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Škola.
127	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
188	OZ	Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Příprava kompletní rekonstrukce ul. Zámostí.
128	Z+20	Řešit návaznost na plochu č. 127. Cyklo propojení Malšovice u HK – Malšova Lhota – Stříbrný rybník v ul. Bělečská.

Příloha 8

Databáze zklidňovaných oblastí

Slouží jako legenda k výkresům koncepce vymezení zón plošného zklidňování dopravy - přílohy 4, 5 a 6

Typ navrhované zóny

30	Zóna 30
20	Zóna 20
OU	Obytná ulice
OZ	Obytná zóna
PZ	Pěší zóna
Z	Zákaz vjezdu motorových vozidel/max. rychlost 30
Z+20	Zákaz vjezdu motorových vozidel/max. rychlost 20
PZ+Z	Pěší zóna/zákaz vjezdu motorových vozidel
O	Neregulované/nezklidňované

Shoda se zónou ISP

A	Ano
N	Ne
C	Částečně

Urbanistická koncepce

1	Městská památková rezervace
2	Městská památková zóna
3	Kompaktní struktura
4	Otevřená struktura
5	Izolovaná struktura
6	Drobná kompaktní struktura
7	Areály
8	Volné monobloky

Parkování

0	Bez komunikací
1	Souvislé
2	Občasné
3	Téměř žádné
4	Žádné
5	Nemožné

Kategorie komunikace

0	Bez komunikací
1	Sběrné
2	Obslužné
3	Pěší zóny
4	Obytné zóny
5	Zóny 30 (20)
6	Parkoviště
7	Zákazy vjezdu
8	Obytné ulice
9	Pojížděné chodníky

Chodníky


0	Bez komunikací
1	Oboustranné
2	Jednostranné
3	Bez chodníků
4	Nedostatečné
5	Stezky pro pěší

Zákaz vjezdu

A	Ano
N	Ne
U	Zóna uvnitř zákazu vjezdu širšího rozsahu

Zákaz vjezdu NA

A	Ano
N	Ne
U	Zóna uvnitř zákazu vjezdu NA širšího rozsahu
7,5	Zákaz vjezdu NA nad 7,5 t

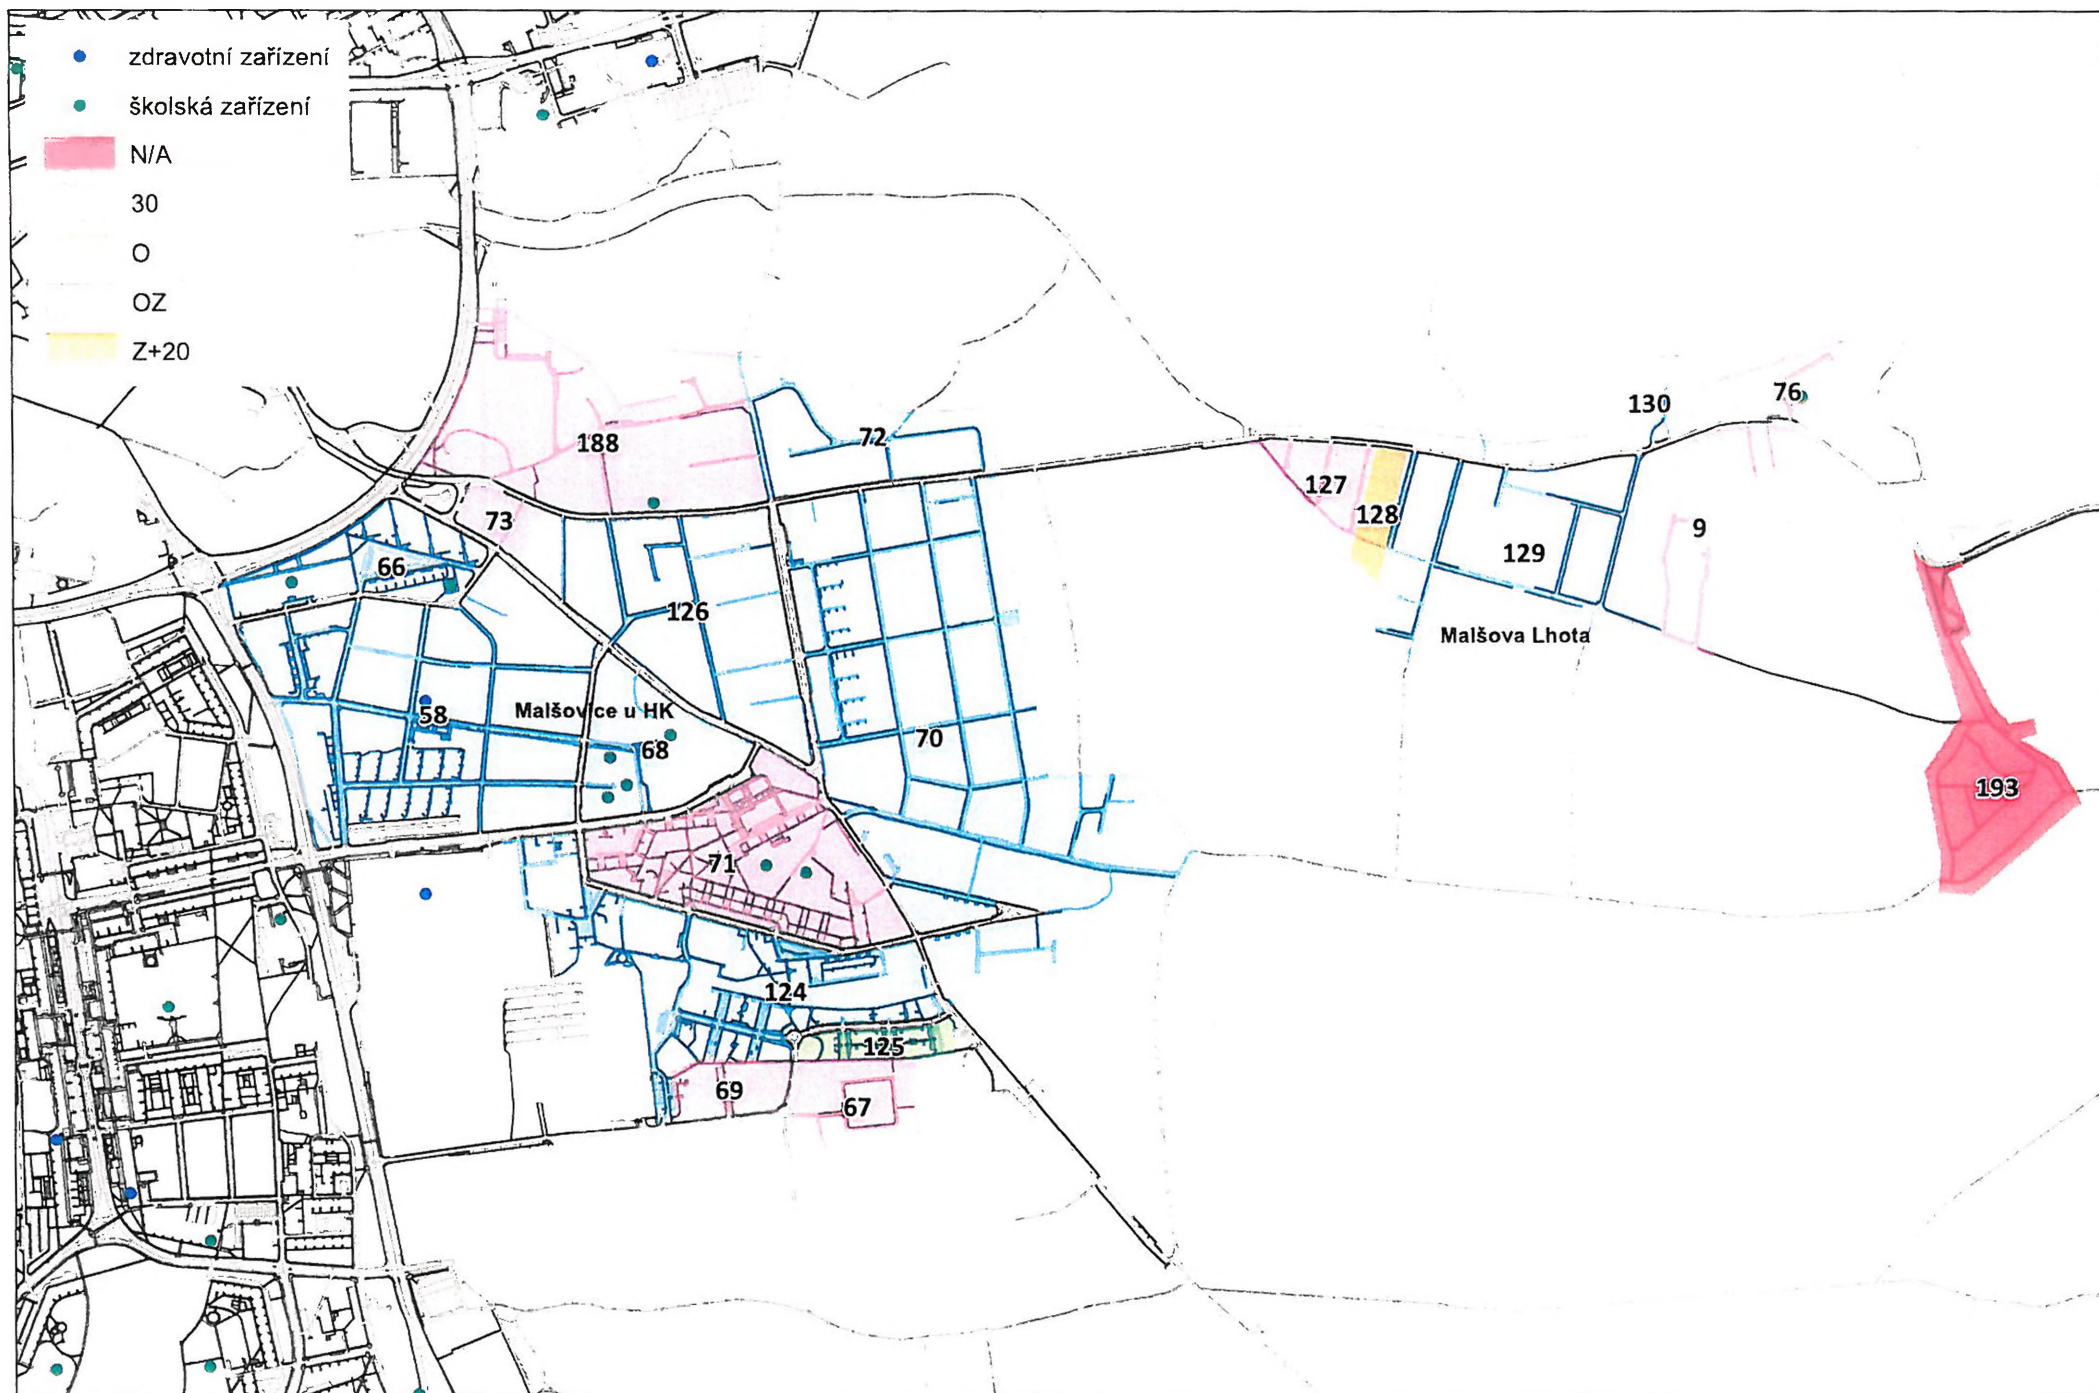

Nabídka

Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové - etapa 1 (studie)

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Uchazeč: NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Jednatel: Ing. Robert Michek
IČ 64939511, [redacted]
Název registru, v němž je uchazeč zapsán:

**Kontaktní
osoba:**

Květen 2017

OBSAH

1. Krycí list nabídky	3
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů	5
3. Návrh smlouvy o dílo	15
4. Kalkulace nabídkové ceny	25
5. Další dokumenty dle potřeby a požadavků zadávací dokumentace	26

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové – etapa 1 (studie)
2. Základní identifikační údaje	
2.1. Zadavatel	
Název	Statutární město Hradec Králové
Sídlo	Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO	00268810
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
2.2. Uchazeč	
Název	NDCon s.r.o.
Sídlo	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Tel./fax	
E-mail	
Datová schránka	
IČO	64939511
DIČ	
Bankovní spojení, č. účtu	
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče	Ing. Robert Michek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba	
Tel./fax	

E-mail	
3. Informace dle zadávací dokumentace (hodnotící kritéria)	
Nabídková cena bez DPH	316 000,- Kč
DPH	66 360,- Kč
Nabídková cena včetně DPH	382 360,- Kč
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat	
Ing. Robert Michek	
Jednatel	
V Praze dne 19.5.2017	

2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

I. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové – etapa 1**
 Veřejná zakázka číslo: **MMHKTA201700000027**
 Druh zadávacího řízení: **veřejná zakázka malého rozsahu**
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
 Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 IČ 00268810


Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: **NDC on s.r.o.**
 IČ: **64939511**
 Sídlo: **Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1**

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Praze dne 19.5.2017



II. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis ze živnostenského rejstříku
- Autorizace v oboru dopravních staveb
- Pojistný certifikát

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 42028

Datum zápisu:	11. ledna 1996
Spisová značka:	
Obchodní firma:	NDCON s.r.o.
Sídlo:	Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 11000
Identifikační číslo:	649 39 511
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě geologické práce provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. ROBERT MICHEK, 
Způsob jednání:	Jednání jménem společnosti: Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	Ing. ROBERT MICHEK, 
Podíl:	
Základní kapitál:	

ovnění pod pořadovým číslem V 21.4.2017, že tato
listina, která vznikla převodem výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z listů, odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě
v Praze dne 21.4.2017



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 21.04.2017 12:51:38

NDCON s.r.o.

Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo osoby: 64939511

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 12.03.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 11.01.1996

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 13.08.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 13.08.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Geologické práce

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 13.08.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 10.03.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 10.10.2012

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 01.10.2003

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Překladecká a tlumočnická činnost

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 13.08.2008

6 *Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 10.03.2010

7 *Výkon zeměměřických činností*

Adresa: Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464

Zahájení provozování dne: 10.10.2012

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Robert Michek (1)

Datum narození: [REDACTED]

Občanství: Česká republika

11

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti v živnostenském rejstříku.

Ověřuji pod pořadovým číslem V ... 989/2015 ... že tato
listina, která vznikla převodem výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 2 listů, odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě

V Praze dne 27. 4. 2015

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


0012886

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 28.3.2017





3. NÁVRH SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele:

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. arch. Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta
tel.: +420 731 131 181

a

2. **Zhotovitel:** NDCon s.r.o.
Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robert Michek, jednatel
IČ: 64939511
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem rozpracování aktuálně pořízené studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCon s.r.o. do formy podrobného návrhu dopravně organizačního a stavebně

technického řešení v dopravním prostoru pozemní komunikace, které bude mít vliv na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu s funkčními požadavky jak komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města – Mašovice, Mašova Lhota a oblast Stříbrného rybníku.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2017/211 a výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové – etapa 1“ (studie)
(dále jen „dílo“)
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne , které jsou přílohami této smlouvy.
2. Dílo sestává z vypracování níže uvedených částí:
 - **návrh řešení ve formě podrobné studie**, jako podkladu pro navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.)
 - **návrh dopravního značení** pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 - **dokladová část** – projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty – odbor dopravy města Hradec Králové a DI Policie ČR
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li objednatelem osloven.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - zadání objednatele z dubna 2017
 - nabídka zhotovitele ze dne *doplní objednatel* přijatá pod č.j. MMHKJ *doplní objednatel*
 - rozsah řešeného území
 - digitálně technická mapa města
 - katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
 - ortofotomapa 2015

- vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení
 - platný územní plán města – odkaz na mapový projekt na internetu
 - návrh nového územního plánu města – odkaz na mapový projekt na internetu
 - strategický plán rozvoje města Hradec Králové
 - údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 (web + sčítací archy) a dopravního modelu města Hradec Králové
 - tematické mapy města – odkaz na mapové projekty na internetu
 - základní podklad inventarizace zeleně v řešeném území
 - koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
 - vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy V Hradci Králové
 - pátevní cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
 - společné evropské indikátory ECI A1, A3, A4, B6
 - QUEST – závěrečná zpráva
 - vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do studie
 - studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od společnosti NDCON s.r.o.
 - informace o záměrech v území
 - specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP, SC 1.2 - ITI
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději ve lhůtě do 30. 9. 2017.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

316 000,- Kč (slovy: *třistašestnáctisickorunčeských*) bez DPH

DPH 21% 66 360,-Kč

celková cena za dílo vč. DPH 382 360,- Kč

(slovy: tři sta osmdesát dvacet tři sta šedesát korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou: [REDAKCE]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. arch. Petr Brůna (vedoucí odboru hlavního architekta), tel.: +420 731 131 181

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz

Ing. Petr Schiller, tel.: +420 495 707 578, email: petr.schiller@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
6. V průběhu prací směřujících ke zhotovení díla v souladu s vymezeným předmětem díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 1 společné projednání každý měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První konzultační termín se bude konat do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná verze v tištěné i elektronické formě v počtu 1 paré. Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace v případných variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá dokumentace bude odkonzultovaná s objednatel. O tomto projednání bude zhotovitelem sepsán zápis, který bude odsouhlasen objednatel.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánů státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušné části díla k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu doložení požadovaného počtu 6 paré PD včetně digitální formy na CD nosiči zhotovitelem, podepsat zápis o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále v elektronické podobě u obou částí - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo *.dxf, případně také v GIS formátech *.shp, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod. a textovou a tabulkovou část ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné exportované do formátu *.pdf. Dokladová část bude součástí jednoho odevzdaného paré díla.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 2 stejnopisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- *Zadání objednatele*
- *Nabídka zhotovitele*

V Praze dne 19.5.2017

V Hradci Králové dne



Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora

4. KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Cena bez DPH	316 000,-
DPH (21 %)	66 360,-
Cena včetně DPH	382 360,-

Nabídková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady a poplatky vynaložené v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.

V Praze dne 19.5.2017


 Ing. Robert Michek

Jednatel společnosti

5. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Dodavatel: (obchodní název): NDCon s.r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 64939511

DIČ:

Jméno osoby, která jedná jménem či za uchazeče-pozice: Ing. Robert Michek, jednatel

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami vč. příloh zadávací dokumentace, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

V Praze dne 19.5.2017

Ing. Robert Michek

Jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Dodavatel: (obchodní název): **NDCon s.r.o.**

Adresa, sídlo, místo podnikání: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 64939511

DIČ:

Jméno osoby, která jedná jménem či za uchazeče-pozice: Ing. Robert Michek, jednatel

Uchazeč NDCon s.r.o. prohlašuje, že nevyužije služeb subdodavatelů.

V Praze dne 19.5.2017


Ing. Robert Michek

Jednatel společnosti

**Čestné prohlášení – povinná součást nabídky dle §68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění**

Já, níže podepsaný statutární orgán:

Obchodní firmy: NDCon s.r.o.

se sídlem: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČ: 649 39 511

- předkládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

.....
.....
.....

- máme formu akciové společnosti a předkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

.....
.....
.....

- Čestně prohlašuji, že jsem neuzavřel, ani neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 19.5.2017



Ing. Robert Michek

Jednatel společnosti

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji v plném rozsahu kvalifikační předpoklady specifikované zadavatelem v zadávací dokumentaci,
- je připraven v případě, že má nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější doložit před uzavřením smlouvy ve smyslu §82 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku jsem si vědom důsledků plynoucích z nesplnění povinnosti,
- je vázán celým obsahem nabídky podané v rámci zadávacího řízení, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty stanovené v zadávací dokumentaci,
- v plném rozsahu se seznámil s podmínkami zadávacího řízení, s veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,
- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky po celou dobu provádění díla,
- nabídková cena je maximální a její překročení je nepřípustné
- souhlasí se zveřejněním podmínek a souvisejících informací se zadávacím řízením a realizací zakázky,
- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé a s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,
- nabídka na veřejnou zakázku obsahuje celkem ²⁷..... listů.

V Praze dne 19.5.2017

Ing. Robert Michek

Jednatel společnosti
