


Stavba: Výměna výplní otvorů včetně přidružených stavebních prací, Žerotínovo nám.  
211/36  
Místo stavby: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
Stavebník: Městská knihovna v Přerově, p.o., Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov

## **DOKUMENTACE STAVBY**

**Dokumentace pro provádění stavby v souladu a rozsahu s vyhláškou 405/2017 Sb.,  
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.  
62/2013 Sb.**

### **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

V Přerově, 08/2023

Vypracoval: 

.....  
**PRINTES – ATELIER s.r.o.**

## Obsah

### Obsah 2

A.	Průvodní zpráva .....	3
A.1	Identifikační údaje.....	3
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .....	3
A.3	Seznam vstupních podkladů.....	3
B.	Souhrnná technická zpráva .....	5
B.1	Popis území stavby.....	5
B.2	Celkový popis stavby .....	6
B.3	Zásady organizace výstavby .....	7

**A. Průvodní zpráva****A.1 Identifikační údaje****A.1.1 Údaje o stavbě**

NÁZEV STAVBY: Výměna výplní otvorů včetně přidružených stavebních prací,  
Žerotínovo nám. 211/36  
MÍSTO STAVBY: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
PŘEDMĚT PD: Dokumentace pro provádění stavby

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

JMÉNO/NÁZEV: Městská knihovna v Přerově, p.o.,  
ADRESA: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
IČ: 70887616  
ZASTOUPENÝ: Mgr. Edita Hausnerová

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

JMÉNO/NÁZEV: PRINTES – ATELIER s. r. o.  
ADRESA: Mostní 1876/11a, 75002 Přerov  
IČ, DIČ: 25391089, CZ25391089  
DATOVÁ SCHRÁNKA: kgeurw  
ZASTOUPENÝ: [redacted] jednatel společnosti,  
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
č. autorizace – ČKAIT 1202256

Oddíl	Zpracovatel	Kontakt
Řídící projektant	PRINTES – ATELIER s.r.o. [redacted]	[redacted]
Souhrnné části	PRINTES – ATELIER s.r.o. [redacted]	[redacted]
Architektonicko-stavební řešení	PRINTES – ATELIER s.r.o. [redacted]	[redacted]

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- [1] Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl zpracován, rozhodnutí stavebního úřadu není vyžadováno;
- [2] Dostupná dokumentace, předáno stavebníkem;
- [3] Prohlídka stavby, fotodokumentace;

[4] Požadavky a připomínky stavebníka;

<b>Členění projektové dokumentace</b>		
<b>Část</b>	<b>Název</b>	<b>Číslo</b>
<b>A.</b>	<b>Průvodní zpráva</b>	<b>007-2023-A</b>
<b>B.</b>	<b>Souhrnná technická zpráva</b>	<b>007-2023-B</b>
<b>C.</b>	<b>Situační výkresy</b>	<b>007-2023-C</b>
	Situační výkres širších vztahů	007-2023-C-001
	Koordinační situace	007-2023-C-002
<b>D</b>	<b>Dokumentace objektů</b>	
<b>D.1</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>	<b>007-2023-D.1</b>
	Technická zpráva	007-2023-D.1-01
	Výkresy	007-2023-D.1-02-00x

## **B. Souhrnná technická zpráva**

### **B.1 Popis území stavby**

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavební objekt se nachází v zastavěném území města Přerova, Žerotínovo nám., na pozemku p.č. 269, k.ú. Přerov.

Navržené stavební úpravy nemají vliv na charakter území.

Jedná se o objekt městské knihovny. Stavební úpravy jsou navrženy na obvodových konstrukcích budovy.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez zásadní změny základních rozměrů a charakteru budovy.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků využívání území nebyly vydány.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek jsou v dokumentaci zapracovány:

- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j.: MMPPr/147541/2023/STAV/ŽP/KoK
- f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Průzkumy nebyly prováděny.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v městské památkové zóně Přerov.

Řešená stavba není kulturní památkou, stavebně historický průzkum zde nebyl proveden. Zároveň stavbou nejsou dotčena chráněná území, kulturní památky ani památkové rezervace.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území  $Q_{100}$  vodního toku.

Zájmové území není poddolováno.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajících sousedních staveb.

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny.

**j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

V rámci výstavby nejsou navrženy asanace.

V rámci výstavby nedojde k demolícím.

V rámci výstavby nedojde ke kácení zeleně.

**k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Pozemky zemědělského půdního fondu nejsou stavbou dotčeny.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou stavbou dotčeny.

**l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě**

Navrhovaná stavba nevyžaduje nové dopravní napojení. Lokalita je přístupná místními komunikacemi z komunikace II/15 ulice tř. 17. listopadu / Komenského.

Navrhovaná stavba nevyžaduje nové napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

**m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Stavba nemá vazby na jiné investice.

**n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí**

Stav k 08/2023 dle <https://nahlizenidokn.cuzk.cz>

Katastrální území	Číslo parcely	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
Přerov [734713]	269	507	zastavěná plocha a nádvoří	-	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov

**o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne.

**B.2 Celkový popis stavby****B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání****a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí**

Jedná se o změnu dokončené stavby. Je navržena výměna části výplní otvorů dvorní fasády.

**b) Účel užívání stavby**

Jedná se o budovu městské knihovny. Stavebními úpravami se účel nemění.

**c) Trvalá nebo dočasná stavba**

Trvalá stavba.

**d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Výjimky na stavbu vydány nebyly. Navržené stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek jsou v dokumentaci zapracovány:

- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j.: MMP/147541/2023/STAV/ŽP/KoK

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Navrženými stavebními úpravami se parametry stavby nemění.

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Navrženými stavebními úpravami se základní bilance stavby nemění.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Tyto níže uvedené termíny jsou reálné v případě, že bude včas zajištěno pravomocné rozhodnutí – stavební povolení akce a bude vybrán zhotovitel stavby.

Zahájení stavby: ..... QIII/2023

Ukončení stavby: ..... QIII/2025

(bude upřesněno stavebníkem po rozhodnutí o zahájení akce)

j) Orientační náklady stavby

Náklady na tuto stavbu jsou stanoveny samostatným položkovým rozpočtem. Investiční náklady budou v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací upřesněny z nabídkových cen jednotlivých uchazečů ve výběrovém řízení na dodavatele stavby.

### **B.3 Zásady organizace výstavby**

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

#### **Elektrická energie**

Bude napojena kabelovou přípojkou na stávající rozvaděč v budově. Podmínky připojení budou dohodnuty se zástupcem provozovatele/vlastníka.

#### **Voda**

Bude provedeno dočasné a provizorní napojení hadicemi na nejbližší rozvod vody v budově. Na tomto připojení bude osazen podružný vodoměr pro fakturaci během stavby. Podmínky připojení budou dohodnuty se zástupcem provozovatele/vlastníka.

b) Odvodnění staveniště

Stavba nevyžaduje.

Splaškové odpadní vody mohou vznikat pouze na zařízení staveniště – předpokládá se použití chemických WC.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd i výjezd na staveniště je řešen z Žerotínovo nám. Do dopravního připojení není zasahováno. Lokalita je přístupná místními komunikacemi z komunikace II/15 ulice tř. 17. listopadu / Komenského.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní stavby bude minimalizován zvolenými technologickými postupy dodavatelem stavby.

**Ochrana staveb na sousedních pozemcích**

V případě výstavby stavebních objektů v blízkosti staveb na sousedních pozemcích zajistí stavebník, aby nedošlo ke statickému či mechanickému narušení těchto objektů vlivem předmětné výstavby.

**Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy**

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006Sb.

„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Podobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.

**Ochrana před prachem**

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby je eliminováno:

- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění – jedná se o provádění zemních prací;
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidla stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;
- Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.;
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště;

**Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů**

- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno

**Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob**

Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude dočasně ohrazen výstražnými pásy, tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Pracovníci budou umístěni v dočasně umístěných mobilních kontejnerech. Také budou protokolárně poučeni a seznámeni s prováděním stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Dodavatelská firma v součinnosti se stavebníkem zajistí, aby stavební práce co nejméně zatěžovali okolí stavby.

Asanace nejsou součástí stavby.

Demolice nejsou součástí stavby.

Kácení dřevin není součástí stavby.



Po dobu stavebních prací bude staveniště řádně oploceno a označeno.

Bude nutno zajistit následující podmínky při těchto pracích:

- Označit řádně staveniště výstražnými tabulkami, mobilními zábranami a vyznačením zákazu pohybu třetích osob;
- Zajistit vstupy stříškami chránícími před pádem předmětu ze stavby;
- Zajistit eliminaci negativních vlivů stavebních prací na vlastní okolí. Jedná se především o snížení hluku a prašnosti. Poučit pracovníky zhotovitele o pracovních činnostech při pohybu osob v okolí ploch vymezených pro stavební práce. Za tímto účelem používat atestované pracovní stroje a nářadí, odsávat aktivně prach při jeho případném vývinu. Dále kropit plochy s prašným povrchem, provádět úklid při ukončení pracovní směny. Úzce spolupracovat s pověřenými pracovníky správce a majitele.
- Zajistit trvalý přístup IZS k objektu. Zajistit trvalý průjezd IZS na dotčených komunikacích.
- Zajistit trvalý přístup firmám komunálního charakteru zajišťujících služby pro občany. Zajistit trvalý průjezd firmám komunálního charakteru zajišťujících služby pro občany na dotčených komunikacích.
- V ochranných pásmech inženýrských sítí nebudou bez souhlasu správce zřizovány dočasné a trvalé stavby, oplocení, podpěrné konstrukce nadzemních vedení, výkopy zemin a jiné konstrukce zamezující přístup k sítím.

#### f) Maximální dočasné a trvalé zábery pro staveniště

Rozsah staveniště bude stanoven dodavatelem stavby po dohodě se stavebníkem.

Stav k 08/2023 dle <https://nahlizenidokn.cuzk.cz>

Katastrální území	Číslo parcely	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
Přerov [734713]	269	507	zastavěná plocha a nádvoří	-	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov

#### g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy nebudou zřizovány.

#### h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě předmětné stavby budou vznikat odpady, které se dle zákona č. 541/2020 O odpadech, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

1. předcházení vzniku odpadů,
2. příprava k opětovnému použití,
3. recyklace odpadů,
4. jiné využití odpadů, například energetické využití,
5. odstranění odpadů.

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Na základě Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018) budou dodržovány doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku a využívání stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi.

#### **Odpady vzniklé při stavebních pracích:**

Kód	Druh odpadu	Kategorie	Nakládání
17 01 01	Beton	O	1
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	1

Kód	Druh odpadu	Kategorie	Nakládání
17 02 02	Sklo	O	1
17 02 03	Plasty	O	1
17 02 01	Dřevo	O	1
17 04 05	Železo a ocel	O	3
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O	1
20 03 01	Směsný komunální odpad	O	2

Odpady jsou zařazeny dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021, Katalog odpadů. Zařazování je dle číselného kódu odpadů (šestimístné číslo) a kategorií odpadu (nebezpečný odpad – označení hvězdičkou, odpad).

S nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nebude nakládat jako s odpadem (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

S výrobky s ukončenou životností se nakládá dle zákona č. 542/2020 Sb.

Legenda návrhu nakládání:

- 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/;
- 2 – skládka (dle možnosti např. KO);
- 3 – provozovna sběrných surovin, sběrné dvory;
- 4 – skládka nebezpečných odpadů;
- 5 – zpětný odběr

Dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o dopadech, pro stavební a demoliční odpady, které původce odpadů sám nezpracuje, musí mít zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (výjimka pro fyzické osoby viz zákon).

Množství odpadů vzniklé při stavbě není stanoveno. Je v zájmu zhotovitele stavby, aby řádnou stavební činností omezil tato množství na minimum.

#### i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytváření deponií zeminy mimo staveniště se nepředpokládá.

#### j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Zajištění ochrany životního prostředí při provádění stavebních prací (jedná se v rozhodující míře o nakládání s odpady) bude smluvně zajištěno mezi stavebníkem a dodavatelem stavby.

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány odbornou firmou způsobem stanoveným zákonem o odpadech. Dodavatelská firma při kolaudaci předloží doklady o likvidaci odpadů a za asistence stavebníka musí dbát zejména na to, aby:

- během stavby nedošlo ke znečištění odpadních vod;
- při stavbě byly používány mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, zejména se musí zabránit úkapům, či únikům ropných látek;
- mimo hranici záboru nevjíždět do ploch veřejné zeleně ani nepoužívat tyto plochy k žádným jiným účelům souvisejících s předmětem záboru;

#### **Ochrana proti hluku během provádění stavebních prací**

Hluk bude eliminován řádnou činností dodavatele stavby.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanoví v § 3 přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci:

- ekvivalentní hladinou akustického tlaku  $A L_{Aeq,8h}$  se rovná 85 dB, nebo
- expozicí zvuku  $A E_{A,8h}$  se rovná  $3640 Pa^2s$ , pokud dále není stanoveno jinak.

V §8 stanovuje hygienický limit expozice hluku, infrazvuku a ultrazvuku vyjádřený hladinou akustického tlaku  $A$  pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu:

$$L_{Aeq,8h} + K_T$$

$$K_T = 10 \cdot \lg(480/T), [\text{dB}].$$

**Předpoklad projektanta o pracovní době je v časovém období od 7<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> hod. – tj. 9 hodin.**

$$K_T = 10 \cdot \lg(480/T) = 10 \cdot \lg(480/540) = -0,51 [\text{dB}].$$

$$L_{Aeq,8h} + K_T = 85 - 0,51 = 84,49 [\text{dB}]$$

**Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku  $A$  ze stavební činnosti (§12, odst. 6):**

$$L_{Aeq,T} = 50 \text{ dB}$$

**Přípustná korekce (příloha č. 3, část B):**

$$+ 15 \text{ dB}$$

**Nejvyšší hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku  $A$ :**

$$65 \text{ dB}$$

#### k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během přípravy a provádění stavby budou dodrženy požadavky stanovené vyhláškou 309/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v návaznosti na § 18 ods. 1, písmeno a, bod 7 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Bude zajištěna bezpečnost práce i technických zařízení pro výstavbu a budoucí provoz dle § 18 ods. 1, písmeno a, bod 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Před zahájením stavby předloží dodavatel stavby v souladu se zákonem 309/2006 Sb. v rámci své dodavatelské dokumentace technologický nebo pracovní postup jednotlivých prací na stavbě. Tento postup bude po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

Technologický a pracovní postup stavby bude v souladu se všemi ustanoveními zákona 309/2006 Sb.

Pracovníci na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s pracovními a technologickými postupy v jejich působnosti v rámci dodavatelské dokumentace.

V návaznosti na ustanovení 4, odstavce 3, vyhlášky 309/2006 Sb. jsou projektovou dokumentací řešeny, specifikovány a předepsány technologickým postupem.

Zákon 309/2006 Sb. stanovuje základní povinnosti:

- zadavatele stavebních prací v § 14 a § 15,
- zhotovitele v § 16, jiné osoby (OSVČ) v § 17
- koordinátora BOZP na staveništi v § 18

Další povinnosti všech účastníků výstavby jsou uvedeny v Nařízení vlády 591/2006 Sb., a ostatních předpisů.

#### **V případech, kdy při realizaci stavby**

**a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo**

**b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,**

**je zadavatel stavby (stavebník) povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (podle § 5 a přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné**



**nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby zadavateli stavby (stavebníkovi) k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.**

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem (podle § 6 a přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. a § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebník) zajistí, aby (podle odst. 1 písm. a, b § 15 zákona č. 309/2006 Sb.) před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (díla).

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

### **Hlavní zásady bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích**

Při stavební činnosti musí být hlavními zhotoviteli a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména tyto zásady:

- veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám,
- po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi,
- při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení,
- před odevzdáním staveniště investor (stavebník) písemně odevzdá a každý hlavní zhotovitel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení apod.),
- před započítím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem hlavního zhotovitele zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činnostmi narušeny,
- před započítím každé práce se zvýšenou mírou rizika dle Plánu BOZP musí zhotovitel zpracovat technologický postup zejména upozornění na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; zakládání stavby; montážních prací těžkých dřevěných vazníků; práce ve výškách; betonářských prací, zednických prací, prací souvisejících ze stavebních činností atd.); odpovídá hlavní zhotovitel; technologický/pracovní postup musí být vždy předán v kopii koordinátorovi BOZP stavby, který jej připomínkuje před zahájením prací,
- výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hany výkopu, považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká,
- výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé,
- přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce neméně 0,75 m (na veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou tyčovým zábradlím o výšce 1,1 m se zarážkou,
- pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup,

- okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hany výkopu,
- stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území,
- zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá hlavní zhotovitel, který musí obsahovat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu,
- při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé,
- podpěry musí být umístěny tak, aby stály v ose nad sebou,
- bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí,
- podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení,
- před započítím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně zkontrolovány,
- při odebrání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti překlopení nebo sesutí
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací na stavbě, skladovací plochy musí být urovnané, odvodněné, zpevněné a označeny bezpečnostními tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám,
- rozmístění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané mechanizaci,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací,
- na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa odběru,
- mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak,
- upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m,
- jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti - nejedná se o souvislou práci, dále viz NV č. 361/2007 Sb., v platném znění.

### **Shrnutí zásadních povinností každého zhotovitele - účastníka výstavby**

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky,
- seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovostí prací (podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a podle Plánu BOZP), dále s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká, – koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky,
- přerušit práci při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutečnost neprodleně nahlásit koordinátorovi BOZP
- při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky,
- při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi BOZP další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, -školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami,
- zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky,
- bezpečnostními značkami a tabulemi,

- na vnitro staveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.,
- jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti,
- před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek,
- při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod.,
- nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn výkopu,
- před započítím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění se zápisem do stavebního deníku,
- provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku vést záznamy,
- příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném zatvrdnutí,
- před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu se zápisem do stavebního deníku,
- pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky, – seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách, stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění,
- provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném dokončení a vybavení,
- vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu,
- pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze,
- před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce,
- seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.

**l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Výstavba dotčené stavby nevyžaduje bezbariérové úpravy během výstavby.

**m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření**

Stavba nevyžaduje.

Stavba zajistí trvalý přístup IZS k objektu.

**n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu**

Dle sdělení stavebníka stavební práce budou prováděny za provozu v budově.

Další speciální podmínky nejsou známy.

**o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Tyto níže uvedené termíny jsou reálné v případě, že bude včas zajištěno pravomocné rozhodnutí – stavební povolení akce a bude vybrán zhotovitel stavby.

Zahájení stavby: ..... QIII/2023


Ukončení stavby: ..... QIII/2025


(bude upřesněno stavebníkem po rozhodnutí o zahájení akce)



# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


M 1: 10000

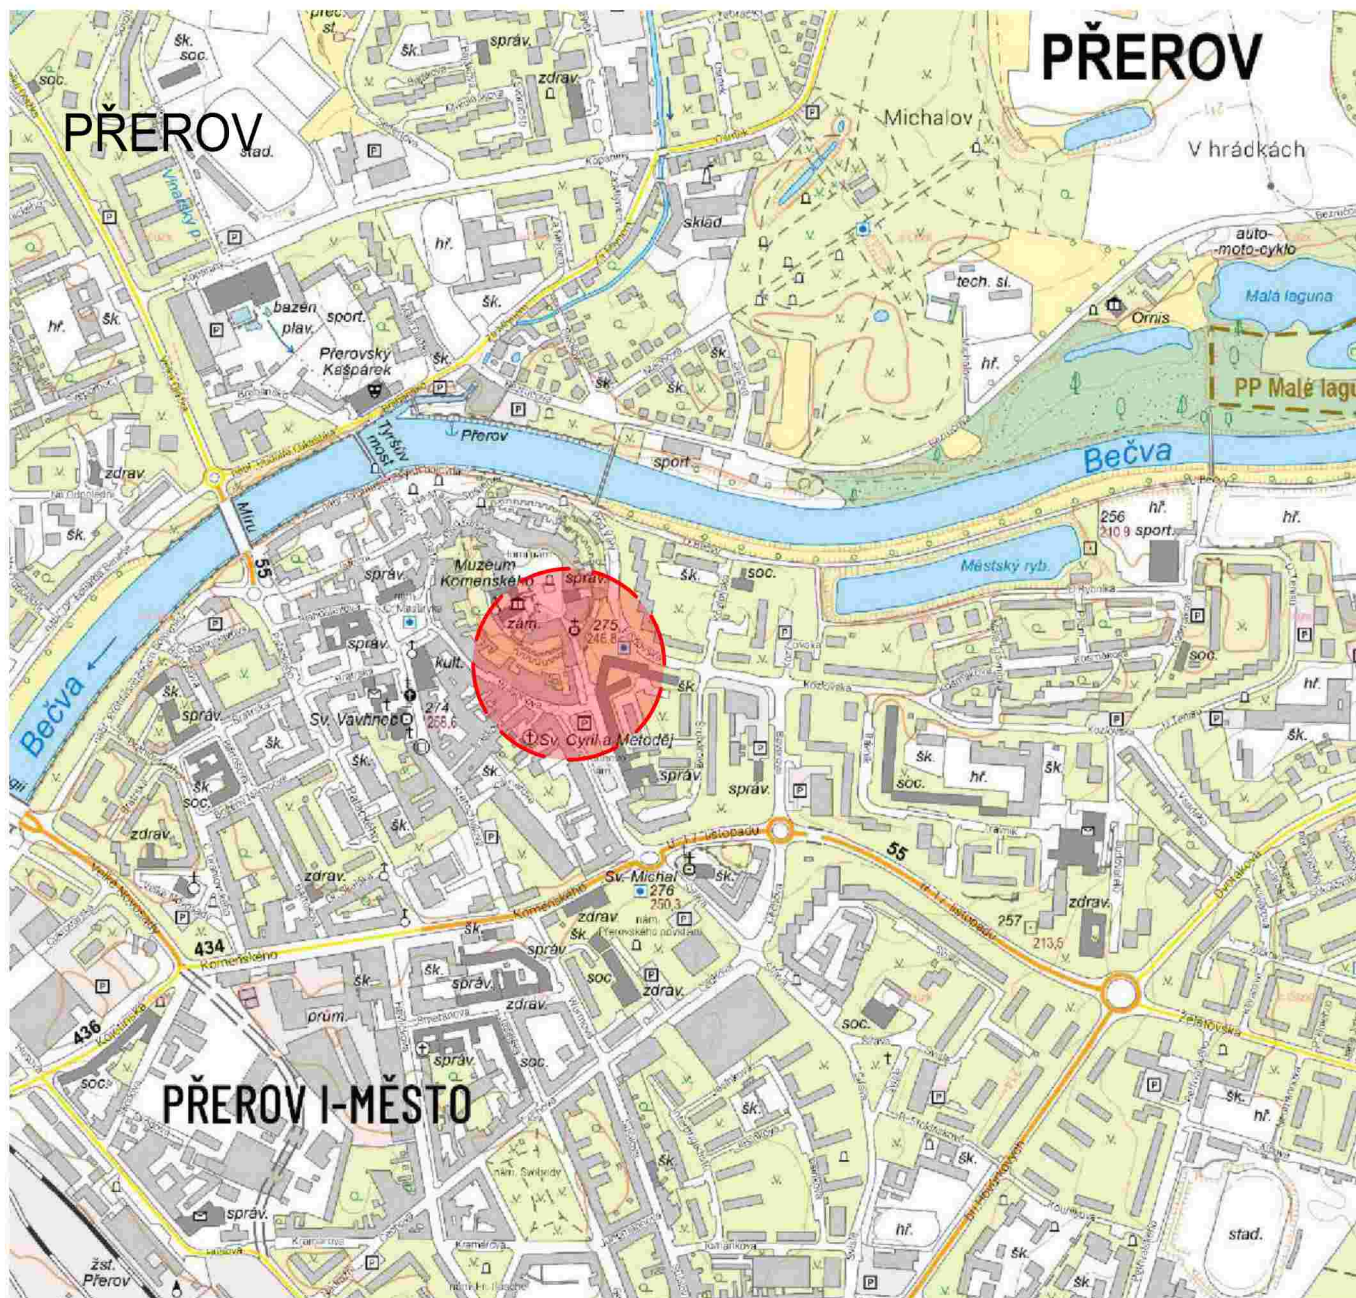





<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	 <p><b>PRINTES ATELIER</b> DIČ CZ 25391089 s.r.o. Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV</p>
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>
<p>VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 211/36</p>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>
<p>SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</p>	<p>C-001</p>

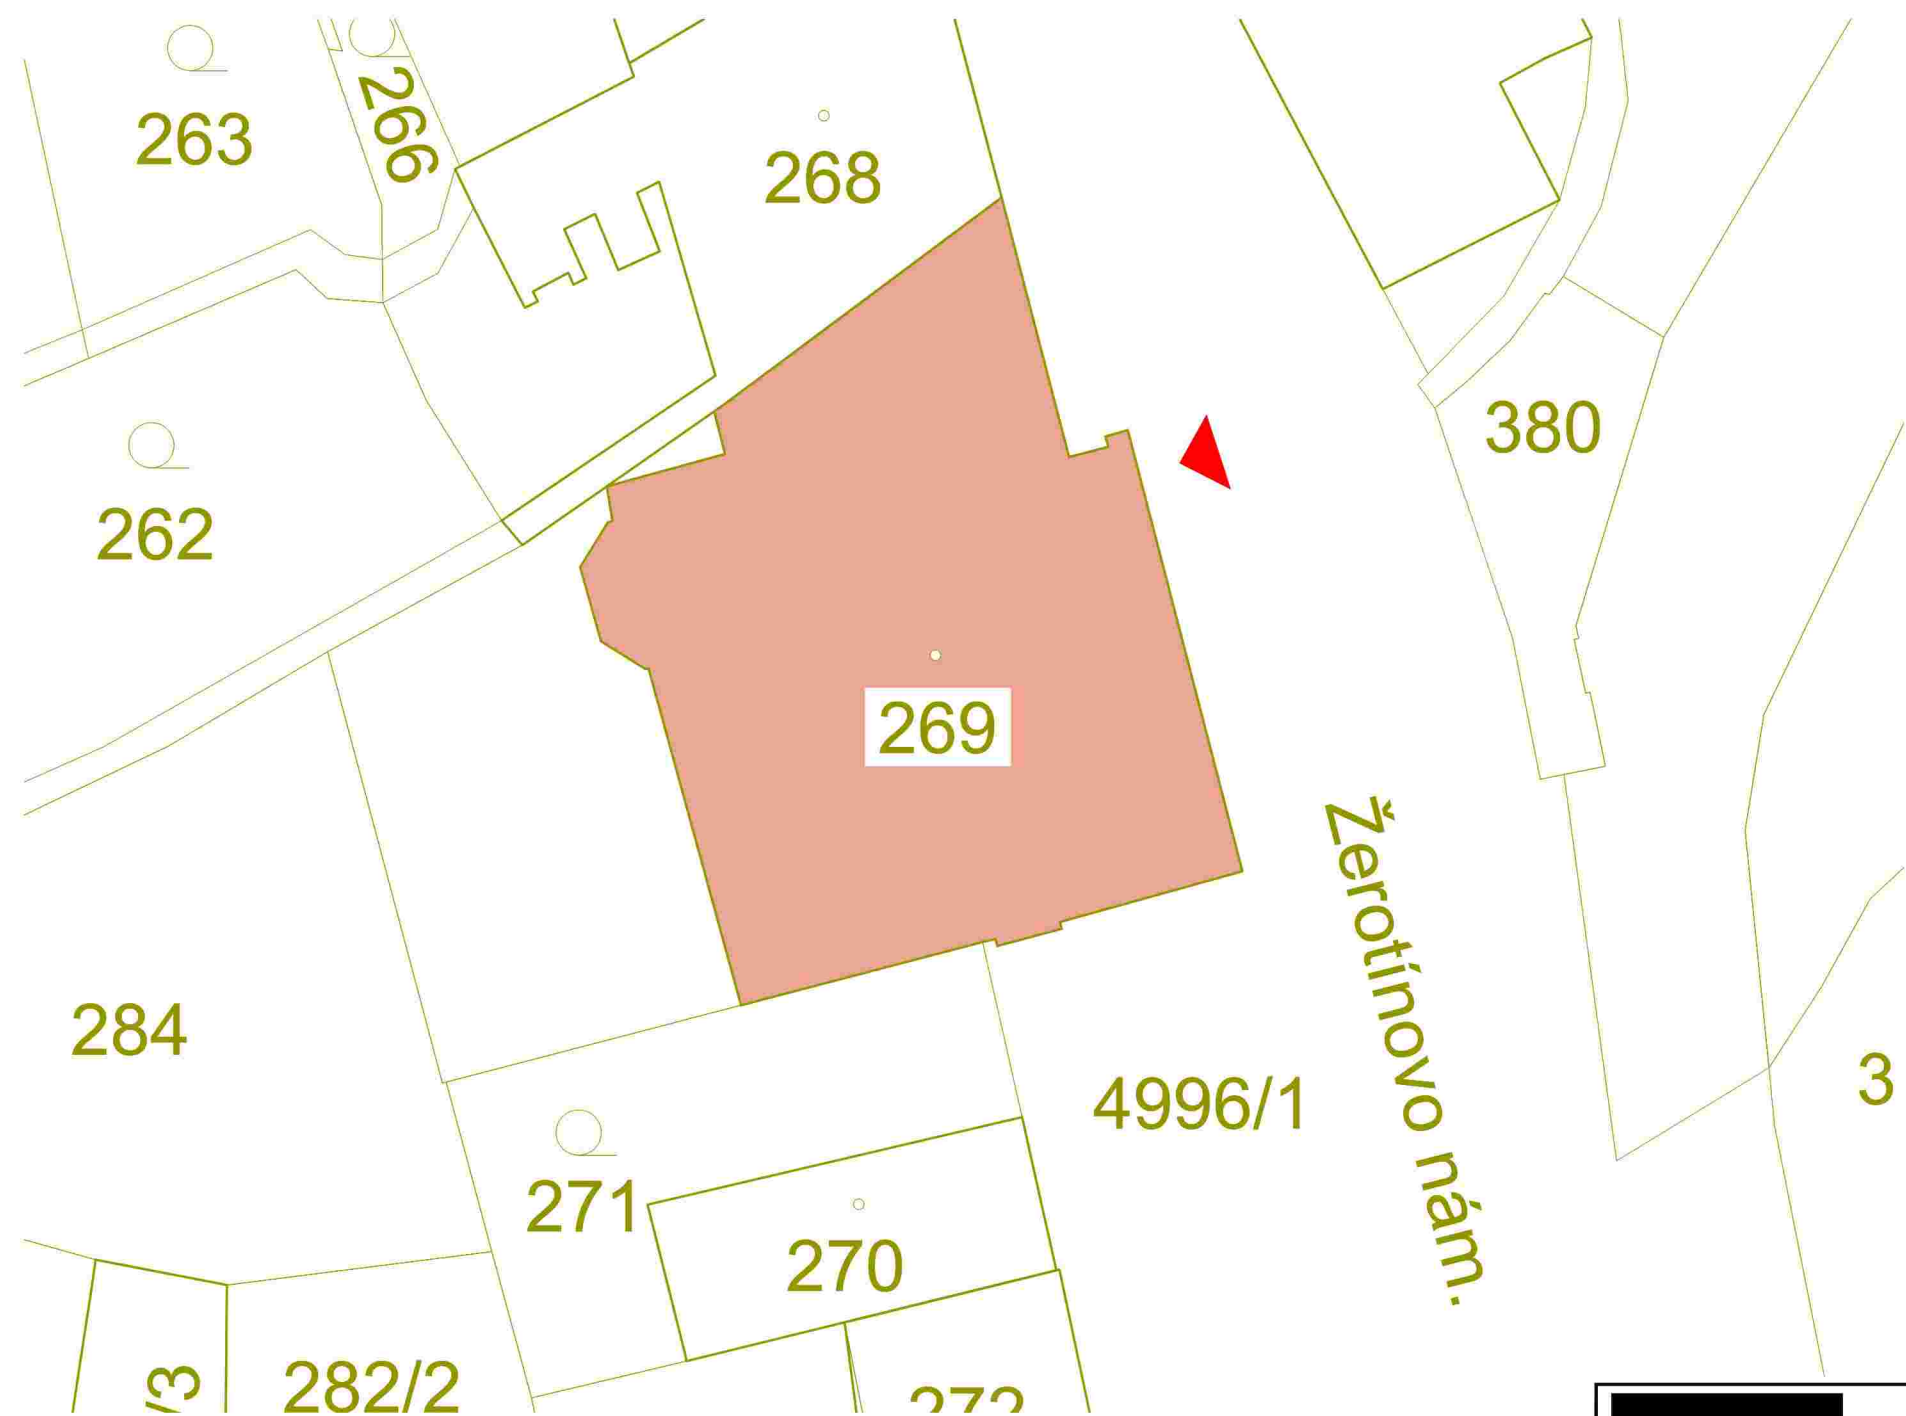

















# KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:250



## LEGENDA

-  ŘEŠENÝ OBJEKT
  -  VSTUP DO OBJEKTU
  -  HRANICE PARCEL DLE K.Ú.
  -  PARCELNÍ ČÍSLO DLE K.Ú
- KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PŘEROV

		
		
		
	VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 211/36	
		
	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
		
		

C-002



# POHLED DVORNÍ


M 1:75



<p><b>PRINTES</b> <b>ATELIER</b> DIČ CZ 25391089 s.r.o. Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV</p>	
	<p>VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 211/36</p> <p>POHLED DVORNÍ</p> <p>D.1-02-001</p>

# VÝPIS VÝROBKŮ












M 1: -

[REDACTED]	[REDACTED]	 <b>PRINTES ATELIER</b> DIČ CZ 25391089 s.r.o. Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV	
[REDACTED]	[REDACTED]		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ PŘIDRUŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 211/36	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	VÝPIS VÝROBKŮ	[REDACTED]	[REDACTED]
		D.1-02-002	[REDACTED]

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS	
				CELKEM KS

--	--	--	--	--	--

































OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
T 1						
T 2						
T 3						
T 4						



OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
T 5						
T 6						
T 7						



OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
T 8						
T 9						
T 10						
T 11						
T 12						



# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T/05

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
T 13		■	■	■	■	■
T 14		■	■	■	■	■
T 15		■	■	■	■	■
T 16		■	■	■	■	■
T 17		■	■	■	■	■



# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

K/01

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
K 1						
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
K 6						
K 7						
K 8						
K 9						





# ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z/01

OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS			
						CELKEM KS
$\frac{Z}{1}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{2}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{3}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{4}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{5}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{6}$	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
$\frac{Z}{7}$	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

Stavba: Výměna výplní otvorů včetně přidružených stavebních prací, Žerotínovo nám. 211/36  
Místo stavby: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
Stavebník: Městská knihovna v Přerově, p.o., Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov

## DOKUMENTACE STAVBY

Dokumentace pro provádění stavby v souladu a rozsahu s vyhláškou 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

### D.1-01 Technická zpráva

#### Obsah technické zprávy:

A.	Identifikační údaje .....	2
B.	Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného řešení, užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace .....	2
C.	Technické a konstrukční řešení .....	2
D.	Bezpečnost práce .....	3
E.	Nakládání s odpady .....	3

#### Seznam výkresů:

1. Stavební úpravy	D.1-02-001
2. Výpis výrobků	-002

V Přerově, 08/2023

Vypracoval:



.....  
**PRINTES ATELIER s.r.o.**

## **A. Identifikační údaje**

### **A.1 Údaje o stavbě**

NÁZEV STAVBY: Výměna výplní otvorů včetně přidružených stavebních prací,  
Žerotínovo nám. 211/36  
MÍSTO STAVBY: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
PŘEDMĚT PD: Dokumentace pro provádění stavby

### **A.2 Údaje o stavebníkovi**

JMÉNO/NÁZEV: Městská knihovna v Přerově, p.o.,  
ADRESA: Žerotínovo nám. 211/36, 75002 Přerov  
IČ: 70887616  
ZASTOUPENÝ: Mgr. Edita Hausnerová

### **A.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

JMÉNO/NÁZEV: PRINTES – ATELIER s. r. o.  
ADRESA: Mostní 1876/11a, 75002 Přerov  
IČ, DIČ: 25391089, CZ 25391089  
DATOVÁ SCHRÁNKA: kgeurw  
ZASTOUPENÝ: [redacted] jednatel společnosti,  
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
č. autorizace – ČKAIT 1202256

## **B. Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného řešení, užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace**

Stavební objekt se nachází v zastavěném území města Přerova, Žerotínovo nám., na pozemku p.č. 269, k.ú. Přerov. Jedná se o objekt městské knihovny. Stavební úpravy jsou navrženy na obvodových konstrukcích budovy. Jedná se o výměnu části výplní otvorů dvorní fasády s navazujícími stavebními úpravami.

### **Podklady pro PD:**

- Dostupná dokumentace, předáno stavebníkem;
- Prohlídka stavby, fotodokumentace;
- Požadavky a připomínky stavebníka;

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není obsahem PD opatření dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## **C. Technické a konstrukční řešení**

### **Bourací a přípravné práce**

- Demontáž stávajících oken;
- Demontáž parapetů;
- Demontáž mříží (repase, zpětná montáž);

### **Stavební úpravy**

Budou vyměněna vyznačená okna a dveře dvorní fasády budovy. Stávající dřevěná zdvojená okna a dveře budou nahrazena novými výrobky dřevěnými, v odstínu lomená bílá – 9013 perlová bílá. Souběžně bude provedena repase (oprava, nový nátěr) stávajících mříže. Nové výrobky budou

osazeny ve shodné poloze se stávajícími výplněmi, vnitřní parapety budou vyměněny. Okenní otvory budou po osazení výrobků zapraveny. Nové okenní a dveřní výplně v obvodovém zdivu budou mít celkový součinitel prostupu tepla  $U_w \leq 1,0 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ .

Je doporučeno použití ráků s dvoustupňovým těsněním funkční spáry. Nové výplně otvorů budou osazeny ve shodné poloze s osazením původních.

Okenní výplně budou vybaveny zastíňujícími horizontálními lamelovými žaluziemi.

Při výměně oken je třeba dbát na správné osazení okna a systémové řešení tzv. připojovací spáry v rovině exteriéru, interiéru i v rovině středové (viz. ČSN 73 0540-2). Projektant proto požaduje použití certifikovaných těsnících systémů pro ochranu kritických míst připojovací spáry po obvodu okenního rámu.

- Exteriérová zóna – flexitěsnící okenní pás (páska s funkční otevřenou difúzní polypropylénovou membránou a netkanou textilií)
- Izolační zóna – montážní PUR pěna
- Interiérová zóna – flexitěsnící okenní pás (páska s uzavřenou PE membránou a netkanou textilií – parotěsná zábrana)

**Zhotovitel je povinen provést vlastní zaměření a ověření počtu kusů okenních a dveřních otvorů před výrobou výplní!!!**

#### **D. Bezpečnost práce**

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podrobněji viz popis v souhrnných částech.

#### **E. Nakládání s odpady**

Při výstavbě předmětné stavby budou vznikat odpady, které se dle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky 8/2021 Katalog odpadů, musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

1. předcházení vzniku odpadů,
2. příprava k opětovnému použití,
3. recyklace odpadů,
4. jiné využití odpadů, například energetické využití,
5. odstranění odpadů.

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možno se odchýlit, pokud se na základě posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné.

Na základě Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018) budou dodržovány doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k řízení předcházení vzniku a využívání stavebních a demoličních odpadů a k nakládání s nimi.
