

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/PH/2022/168  
č. E618-S-4156/2022, čj. 24854/2022-SŽ-SSZ-OMV1**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Správa železnic, státní organizace**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupená níže podepsanými členy představenstva

(„**CETIN**“)

a

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

bankovní spojení: ██████

číslo účtu: ██████████ 0

Adresa pro zasílání korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

[ePodatelnaSSZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaSSZ@spravazeleznic.cz)

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

- A) Stavebník Stavbou a dle Vyjádření vyvolal Překládku;
- B) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN provedla Překládku nebo zajistila provedení Překládky;
- C) společnost CETIN má zájem a přeje si provést nebo zajistit provedení Překládky jen jsou-li splněny předpoklady pro realizaci Překládky a splní-li Stavebník všechny povinnosti dle Smlouvy a dle Vyjádření;
- D) Stavebník je srozuměn s tím a souhlasí, že společnost CETIN Překládku provede nebo zajistí provedení Překládky, jen splní-li Stavebník všechny povinnosti dle Smlouvy a dle Vyjádření, a jsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky;
- E) Stavebník souhlasí, že společnosti CETIN uhradí Náklad Překládky,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZEK**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(„**Smlouva**“)

**1. Definice**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

1.1 Pro účely Smlouvy:

**CTN** znamená cenový a technický návrh v Příloze č. 1 Smlouvy;

**Den** znamená kalendářní den;

**Dočasná překládka** znamená dočasné přemístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyvolané Stavbou, z Kolektoru do kolektoru spravovaného Správcem kolektoru a užívání kolektoru spravovaného Správcem kolektoru na základě Smlouvy o poskytnutí práva užívat kolektor;

**DPH** znamená daň z přidané hodnoty;

**Faktura** znamená daňový doklad s náležitostmi dle ustanovení § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

**GDPR** znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

**Etapa Překládky** znamená jakoukoliv část Překládky, v CTN označenou za etapu, v CTN vymezenou a co do rozsahu určenou položkami tamtéž; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

**Harmonogram** znamená harmonogram, který koordinuje, zejména z časového hlediska jednotlivé úkony Stavby s jednotlivými úkony Překládky;

**Kolektor** znamená věc nemovitou, ve vlastnictví společnosti CETIN, specifikovanou v CTN a v Projektu;

**Náklad Překládky** znamená jakýkoliv a každý náklad vzniklý společnosti CETIN, který by společnosti CETIN nevznikl, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal, a to zejména, nikoliv však výlučně (i) náklad určený v CTN a v Projektu, (ii) náklad skutečně provedených prací a skutečně provedených činností na Překládce, (iii) náklad na Dočasnou překládku, zejména nikoliv však výlučně náklad na přemístění Vedení a zařízení společnosti CETIN z Kolektoru do kolektoru spravovaného Správcem kolektoru, úplatu za užívání kolektoru uhrazenou společností CETIN dle Smlouvy o poskytnutí práva užívat kolektor, (iv) jakýkoliv další náklad, vzniklý společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou;

**Nový Kolektor** znamená věc nemovitou, ve vlastnictví společnosti CETIN, specifikovanou v CTN a v Projektu;

**Pracovní den** znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;

**Projekt** znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

**Překládka** znamená stavbu spočívající (i) ve zrušení Kolektoru, (ii) vybudování Nového Kolektoru, (iii) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

**Předpoklady pro realizaci Překládky** znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

**Příloha** znamená společně s příslušným označením číslicí některou z příloh Smlouvy;

**Příprava Překládky** znamená přípravné činnosti s Překládkou související, zpracování CTN, zpracování Projektu, a další činnosti určené v odst. 4.1 písm. a) bod (i) Smlouvy;

**Smlouva o poskytnutí práva užívat kolektor** znamená smlouvu mezi Správcem kolektoru a společností CETIN, jejímž předmětem je dočasné užívání kolektoru umístěním Vedení a zařízení společnosti CETIN za úplatu;

**Správce kolektoru** znamená společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112;

**Stavba** znamená stavbu, pod označením „*Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží*“

A) povolenou správními rozhodnutím:

- (i) územní rozhodnutí, vydané Odborem stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy pod spis. zn. S-MHMP 899930/2020/STR, č.j. MHMP 1492724/2021 ze dne 04.10.2021, které nabylo právní moci dne 06. 11. 2021;
- (ii) stavební povolení (stavby dráhy – tzn. hlavní část stavby), vydané Drážním úřadem pod sp. zn. MP-SDP0561/22-10/Lj ze dne 21.11.2022, které nabylo právní moci dne 28.12.2022;
- (iii) stavební povolení (překládka kabelového kolektoru CETIN), vydané Stavebním úřadem, ÚMČ Praha1 pod sp. zn. S UMCP1/292467/2022/VÝS-Hd-2/p.č.2537/1,189,162, č.j. UMCP1 462114/2022 ze dne 21.10.2022, které nabylo právní moci dne 9.11.2022,

B) jejímž investorem je Stavebník,

C) sestávající mimo jiné ze dvou (2) stavebních objektů, přičemž tyto objekty jsou v dokumentaci pro územní rozhodnutí označené jako:

- SO 01-15-08 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přeložky kabelů CETIN
- SO 01-19-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN

a v dokumentaci skutečného provedení označené jako:

- SO 11-30-01 ŽST Praha Masarykovo nádraží, přeložky kabelů CETIN
- SO 11-60-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelový kolektor CETIN,

D) jejíž příprava, umístování a povolování se řídí mimo jiné i zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů;

**Vedení a zařízení společnosti CETIN** znamená vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN umístěné v Kolektoru;

**Vyjádření o existenci SEK** znamená „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 19.7.2023. vydané pod č.j. 206353/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

**Výzva** znamená povinnost Stavebníka po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Etapy Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost Stavebníka na provedení Etapy Překládky;

**Záloha na Náklady Překládky** znamená ■■■■■ Kč (slovy: ■■■■■ korun českých);

**Zákon o registru smluv** znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

**Zákon o vyvlastnění** znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů;

**ZDPH** znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## 2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek (i) společnosti CETIN provést nebo zajistit provedení Překládky a s ní související záležitosti za podmínek ujednaných Smlouvou, (ii) Stavebníka uhradit společnosti CETIN Náklad Překládky.
- 2.2 Překládka je společností CETIN evidována pod označením „VPI,PHA 1, Modern.ŽST Masarykovo nádraží“.

## 3. Překládka a podmínky Překládky

- 3.1 Rozsah Překládky (územní a stavebnětechnický) je určen v CTN, případně v Projektu, a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění všech následujících podmínek:
- a) Smlouva o poskytnutí práva užívat kolektor je uzavřena;
  - b) územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky nabylo právní moci a pravomocné územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky bylo, včetně jeho dokladové části, předáno společnosti CETIN;
  - c) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo k užívání každé Překládkou dotčené nemovitosti, (i) uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle ustanovení § 104 ZEK s každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené Novým kolektorem a Vedením a zařízením společnosti CETIN, a/nebo (ii) vyvlastněním práva dle Zákona o vyvlastnění;
  - d) správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba Nového Kolektoru nabylo právní moci;
  - e) schválení Harmonogramu společností CETIN.
- 3.3 Společnost CETIN nezačíná provedení Překládky dříve, než jsou splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; provedení Překládky bez splnění Předpokladů pro realizaci Překládky je vyloučeno.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- 3.4 Vlastníkem Vedení a zařízení společnosti CETIN přeloženého dle Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN má právo provedením Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. Závazky Smluvních stran

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

###### a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit Přípravu Překládky;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s každým vlastníkem každé Překládkou dotčené nemovitostí, tzn. společnost CETIN prokazatelně učiní každému vlastníkovi každé Překládkou dotčené nemovitosti návrh na uzavření takové smlouvy.

###### b) po realizaci Překládky zajistit:

- (i) pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- (ii) vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) uzavření smluv o zřízení služebnosti s každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené Překládkou a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) nejpozději do čtrnácti (14) Dnů po uzavření Smlouvy předložit společnosti CETIN zasláním na adresu elektronické pošty kontaktní osoby společnosti CETIN určené v odst. 7.1 Smlouvy Harmonogram;
- (iii) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou;
- (iv) učinit Výzvu pro každou Etapu Překládky;
- (v) pro každou Etapu Překládky samostatně, písemně vyzvat společnost CETIN k převzetí staveniště, včetně určení termínu, kdy staveniště má být převzato, a to zasláním na adresu elektronické pošty kontaktní osoby společnosti CETIN určené v odst. 7.1 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN Harmonogram nebo na pokyn společnosti CETIN Harmonogram Stavebníkem upravený schválí potvrzením, zasláním na adresu elektronické pošty Stavebníka učenou v odst. 7.2 Smlouvy, nejpozději do deseti (10) Dnů po obdržení Harmonogramu nebo na pokyn společnosti CETIN Stavebníkem upraveného Harmonogramu. Harmonogram je společností CETIN rovněž schválen, neučinila-li společnost CETIN ve lhůtě dle předchozí věty tohoto odst. 4.3 Smlouvy ve vztahu k Harmonogramu žádné jednání.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- 4.4 Stavebník je povinen, nejpozději do třiceti (30) Dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž závazný vzor Smluvní strany ujednávají v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
- 4.5 Společnost CETIN provede Etapu Překládky nebo provedení Etapy Překládky zajistí do devíti (9) měsíců ode Dne, ve kterém jsou splněny všechny následující podmínky:
- a) společnosti CETIN byla doručena Výzva;
  - b) Stavebník uhradil Fakturu za Přípravu Překládky;
  - c) Stavebník uhradil Zálohu na Náklad Překládky;
  - d) Stavebník splnil povinnosti určené v odst. 4.2 Smlouvy;
  - e) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.
- 4.6 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé Překládkou dotčené nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 ZEK k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, případně ke zřízení práva dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, je Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazené správní poplatky za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením vedeným dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.7 Stavebník je povinen (i) plnit Harmonogram a řídit se Harmonogramem, (ii) poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.8 Lhůta dle odst. 4.5 Smlouvy se prodlouží o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.9 Dnem ukončení provedení Etapy Překládky je Den, kdy je Stavebníkovi na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou Stavebníkem v odst. 7.2 Smlouvy odesláno oznámení o dokončení provedení Etapy Překládky.

## **5. Náklad Překládky a další náklady spojené s Překládkou**

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 ZEK povinen nést Náklad Překládky a Náklad Překládky společnosti CETIN uhradit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- 5.2 Předběžná výše Nákladu Překládky stanoveného na základě CTN, jehož specifikace je uvedena tamtéž, činí ke dni uzavření Smlouvy **86.409.987 Kč** (slovy: osmdesát šest milionů čtyři sta devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých).
- 5.3 Výše Nákladu Překládky bude upřesněna na základě Projektu. Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladu Překládky stanoveného na základě Projektu, a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 Vzniknou-li společnosti CETIN vedle Nákladu Překládky, na Překládku další náklady, je Stavebník povinen je společnosti CETIN uhradit. Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
  - b) náklady na zpracování znaleckého posudku na určení výše náhrady za omezení vlastnického práva,
  - c) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti z veřejného seznamu,
  - d) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
  - e) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky,
  - f) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření,
  - g) náklady na identifikaci parcel,
  - h) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  - i) náklady na poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s provedením Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
  - j) náklady na poplatky za zvláštní užívání komunikace dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  - k) náklady na nájemné z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné a nezbytné pro provedení Překládky,
  - l) náklady na majetkovou újmu, způsobenou na zemědělských plodinách v souvislosti s provedením Překládky,
  - m) náklady na ochranu komunikačního vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
  - n) náklady na záchranný archeologický dohled.

## 6. Platební podmínky

- 6.1 Překládka je mimo předmět DPH.
- 6.2 Náklad Překládky Stavebník uhradí na základě Faktury.
- 6.3 Fakturu
- (i) za Přípravu Překládky vystaví společnost CETIN do patnácti (15) Dnů po uzavření Smlouvy;
  - (ii) na Zálohu na Náklad Překládky, jako zálohovou fakturu, vystaví společnost CETIN do patnácti (15) Dnů po předložení Projektu Stavebníkovi;



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- (iii) na Náklad Překládky za Etapu Překládky, se zúčtováním Zálohy na Náklad Překládky, vystaví společnost CETIN jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do patnácti (15) Dnů po odeslání oznámení dle odst. 4.9 Smlouvy;
- (iv) na Náklad Překládky za Etapu Překládky, byla-li vyčerpána Záloha na Náklad Překládky, vystaví společnost CETIN do patnácti (15) Dnů po odeslání oznámení dle odst. 4.9 Smlouvy.
- 6.4 Náklady vzniklé společnosti CETIN dle odst. 5.4 Smlouvy a náklad na Dočasnou překládku je Stavebník povinen uhradit oddělně na základě samostatné Faktury.
- 6.5 Splatnost každé Faktury vystavené společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou činí šedesát (60) Dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.6 Fakturu odešle společnost CETIN Stavebníkovi na adresu Stavebníka určenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.7 Fakturou účtovanou částku je Stavebník povinen hradit na účet společnosti CETIN určený v hlavičce Smlouvy, není-li Fakturou vystavenou společností CETIN určen účet jiný.
- 6.8 Stavebník je v prodlení s úhradou Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka není nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. Kontaktní a odpovědné osoby Smluvních stran

- 7.1 Za společnost CETIN:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: Specialista pro výstavbu sítí  
e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: Specialista pro výstavbu sítí  
e-mail: [REDACTED]
- 7.2 Za Stavebníka:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: podnikový právník  
e-mail: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: manažer projektu  
e-mail: [REDACTED]
- 7.3 Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

## 8. Zrušení Smlouvy

- 8.1 Smlouvu lze zrušit a) písemnou dohodou Smluvních stran; b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 8.2 Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky *ex nunc*:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů,
  - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- 8.3 Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určenou pozdější datum jeho účinnosti.
- 8.4 Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 8.5 Odstoupila-li společnost CETIN od Smlouvy:
- a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy;
  - b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní činností dotčené části Vedení a zařízení společnosti CETIN a dále veškeré činnosti a právní jednání, která budou nezbytná k zajištění souladnosti umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k Vedení a zařízení společnosti CETIN. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do šedesáti (60) Dnů od vystavení Faktury.
- 8.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

## 9. Rozvazovací podmínka

- 9.1 Výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Smlouva pozbude účinnosti Den následující po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena Výzva.
- 9.2 Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou:
- a) je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- b) souhlasí Stavebník s tím, že společnost CETIN provede na Stavebníkův náklad veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu Překládkou či dosavadní činností dotčené části Vedení a zařízení společnosti CETIN a dále veškeré činnosti a právní jednání, která budou nezbytná k zajištění souladnosti umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k Vedení a zařízení společnosti CETIN. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do šedesáti (60) Dnů od vystavení Faktury.

- 9.3 Pozbytím účinnosti Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, na náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle Zákona o registru smluv. Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (24) Dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku ve výši 0,025 % z dlužné částky za Den prodlení.
- 10.3 S odkazem na ustanovení § 1895 Občanského zákoníku Stavebník nemá právo převést (jako postupitel) kterékoliv své právo nebo povinnost ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN s výjimkou zhotovitele stavby, který byl vybrán Stavebníkem v zadávacím řízení na zhotovení Stavby.
- 10.4 Stavebník nemá právo jednostranně započítat svou pohledávku vzniklou na základě Smlouvy vůči pohledávce společnosti CETIN vzniklé na základě Smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami.
- 10.5 Smlouva může být měněna pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně.
- 10.6 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- d) e-mailovou zprávou zaslou z adresy kontaktní osoby na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany určenou v čl. 7 Smlouvy.

10.7 Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních určenou v čl. 7 Smlouvy a, je-li právní jednání způsobující zánik Smlouvy doručované společnosti CETIN, současně na adresu [contract\\_termination@cetin.cz](mailto:contract_termination@cetin.cz)).

10.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
- § 1743;
- § 2002;
- §2003.

10.9 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.

Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména zajištění dodání Předmětu plnění dle Smlouvy, či jiné úkony týkající se předmětu Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

- 10.10 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací Smlouvy jakýkoli platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 10.11 Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 10.12 Vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/168  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004352  
Registr smluv: Ano

- 10.13 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími Přílohami, převáží text Smlouvy.
- 10.14 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 10.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 – CTN

Příloha č. 2 – závazný vzor Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí



CETIN:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Stavebník:

V Praze dne \_\_\_\_\_

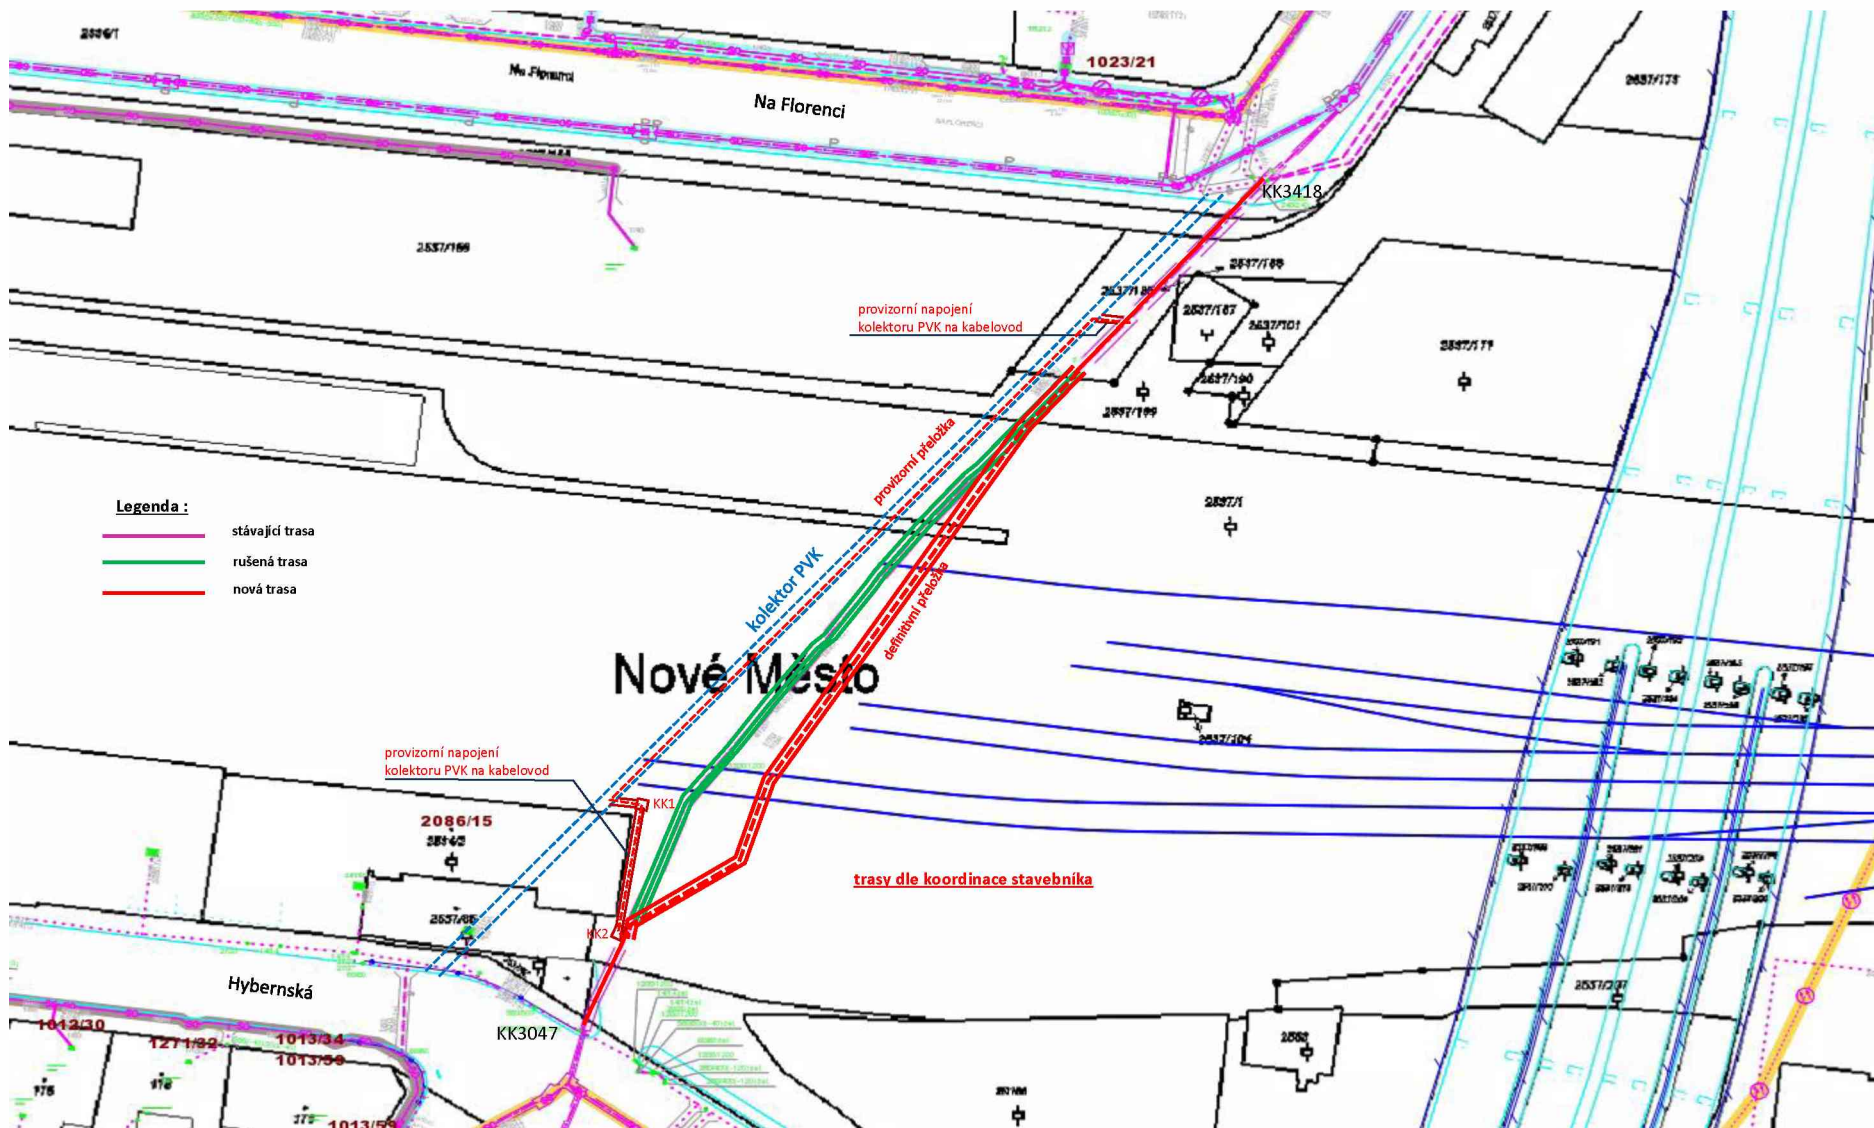
 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.12  
11:17:56 +02'00'

   
20.11.2023 14:04  
Podepsáno elektronicky

za **Správa železnic, státní organizace**  
Bc. Jiří Svoboda, MBA  
generální ředitel

  
 Digitální podpis:  
12.10.2023 14:25





180 m prov.mezi KK  
176m mezi KK





## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958084		Návrh cenový a technický	██████
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	██████████
		projekt kolektoru provizorního řešení + definitivní	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	██████████
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové uvedení kolektoru PVK do pův.stavu	██████████
<b>MONTÁŽ</b>			
955035	S	Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kol.	██████████
955034	S	Demontáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150 v kab.	██████████
955011	S	Demontáž trubky v kolektoru	██████████
952604	S	Instalace trubky do kolektoru	██████████
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	██████████
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk.	██████████
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk.	██████████
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	██████████
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	██████████
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	██████████
954994	S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	██████████
954996	S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kol.	██████████
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	██████████
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	██████████
955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové - vys. kvalifikovan. koordinace	██████████
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické podpůrné konstrukce v kolektoru	██████████
955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	██████████
955266	S	Montáž trubky ochranné	██████████
		realizace kolektoru provizorního řešení + definitivní	
952603	S	Montáž trubky závlačné-4 ks	██████████
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	██████████
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou doprava, manipulace s kabel.bubny, pronájem jeřábu	██████████
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	██████████
955252	S	Vypichování žil z kab.do 300 XN-1 čtyř.	██████████
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	██████████
955067	S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	██████████
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>			
958597	S	Zabezpečení vstupu do kab. komory svárem	██████████
957740		Zpřístupnění kabel.komor pro údržbu	██████████
957741	S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	██████████
<b>POPLATKY</b>			
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. zábory	██████████

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
300598 S		Kabel plastový TCEKFLHZH 200x4x0,6	████████
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	████████
320879 S		Materiál pro tratě síťové	██████████
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	████████
410636 S		Souprava čistící metallic. kabelů - velká	████████
320313 S		Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	████████
320303 S		Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720	████████
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	████████
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	████████
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	████████
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	████████



Příloha č. 2 Smlouvy – závazný vzor Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
IČO: 04084063  
zastoupená [•]  
(„**CETIN**“)

a

[•]

se sídlem [•]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]  
IČO: [•]  
zastoupena [•]  
(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO  
ROZHODNUTÍ  
(„Dohoda“)**

**Čl. I**

**Předmět Dohody**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**Čl. II**

**Převod práv**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
  - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek

- určených Správním rozhodnutím,
- b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

### **Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda být měněna pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky k Dohodě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Dohody a vypovědět ji lze pouze písemně.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
  - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Dohoda vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Praze dne \_\_\_\_\_ 20[•]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 20[•]

---

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

---

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]
