

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2021\_0007\_1**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [redacted] supervizorem, VFS Čechy jih

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „CETIN“)

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 162

zastoupená [redacted]

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**Překládka** je stavba v k.ú. Blížňovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 31.3.2023 vydané pod čj. 156748/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Blížňovice(CR)\_rek\_mostu č\_32265\_1**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Smluvní strany si potvrzují, že na společnost CETIN byla převedena práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Chrudim – rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavby Rekonstrukce mostu ev. Č. 32265-1 Blížňovice č.j. CR 027919/2022 STO/Št ze dne 6.4.2022, které nabylo právní moci dne 5.5.2022 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. Práva a povinnosti z Územního rozhodnutí specifikovaná v první větě tohoto odst. 4.2 Smlouvy byla na společnost CETIN převedena dohodou o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení (dále jen „**Dohoda o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení**“), Dohoda o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení je Přílohou č. 3 Smlouvy. Prokáže-li se, že Stavebník nebyl za oprávněného ze Společného povolení oprávněn uzavřít Dohodu o převodu některých práv a povinností ze Společného povolení, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškerou škodu tím způsobenou.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne,

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (c) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **196 122,00 Kč**, (slovy: jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto dvacet dva korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník

se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.



- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
  - datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
  - e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Chrudim – schválení stavebního záměru č.j. CR 027919/2022 STO/Št ze dne 6.4.2022

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností ze schváleného stavebního záměru

CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Pardubicích dne

**Jiří**  
**Syrový**  
Digitálně podepsal  
Jiří Syrový  
Datum: 2024.01.10  
10:53:17 +01'00'

**Ing. Zdeněk**  
**Vašák**  
Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.01.12  
07:13:17 +01'00'


za CETIN a.s.

za Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Supervisor, VFS Čechy jih  
(podepsáno elektronicky)


ředitel  
(podepsáno elektronicky)



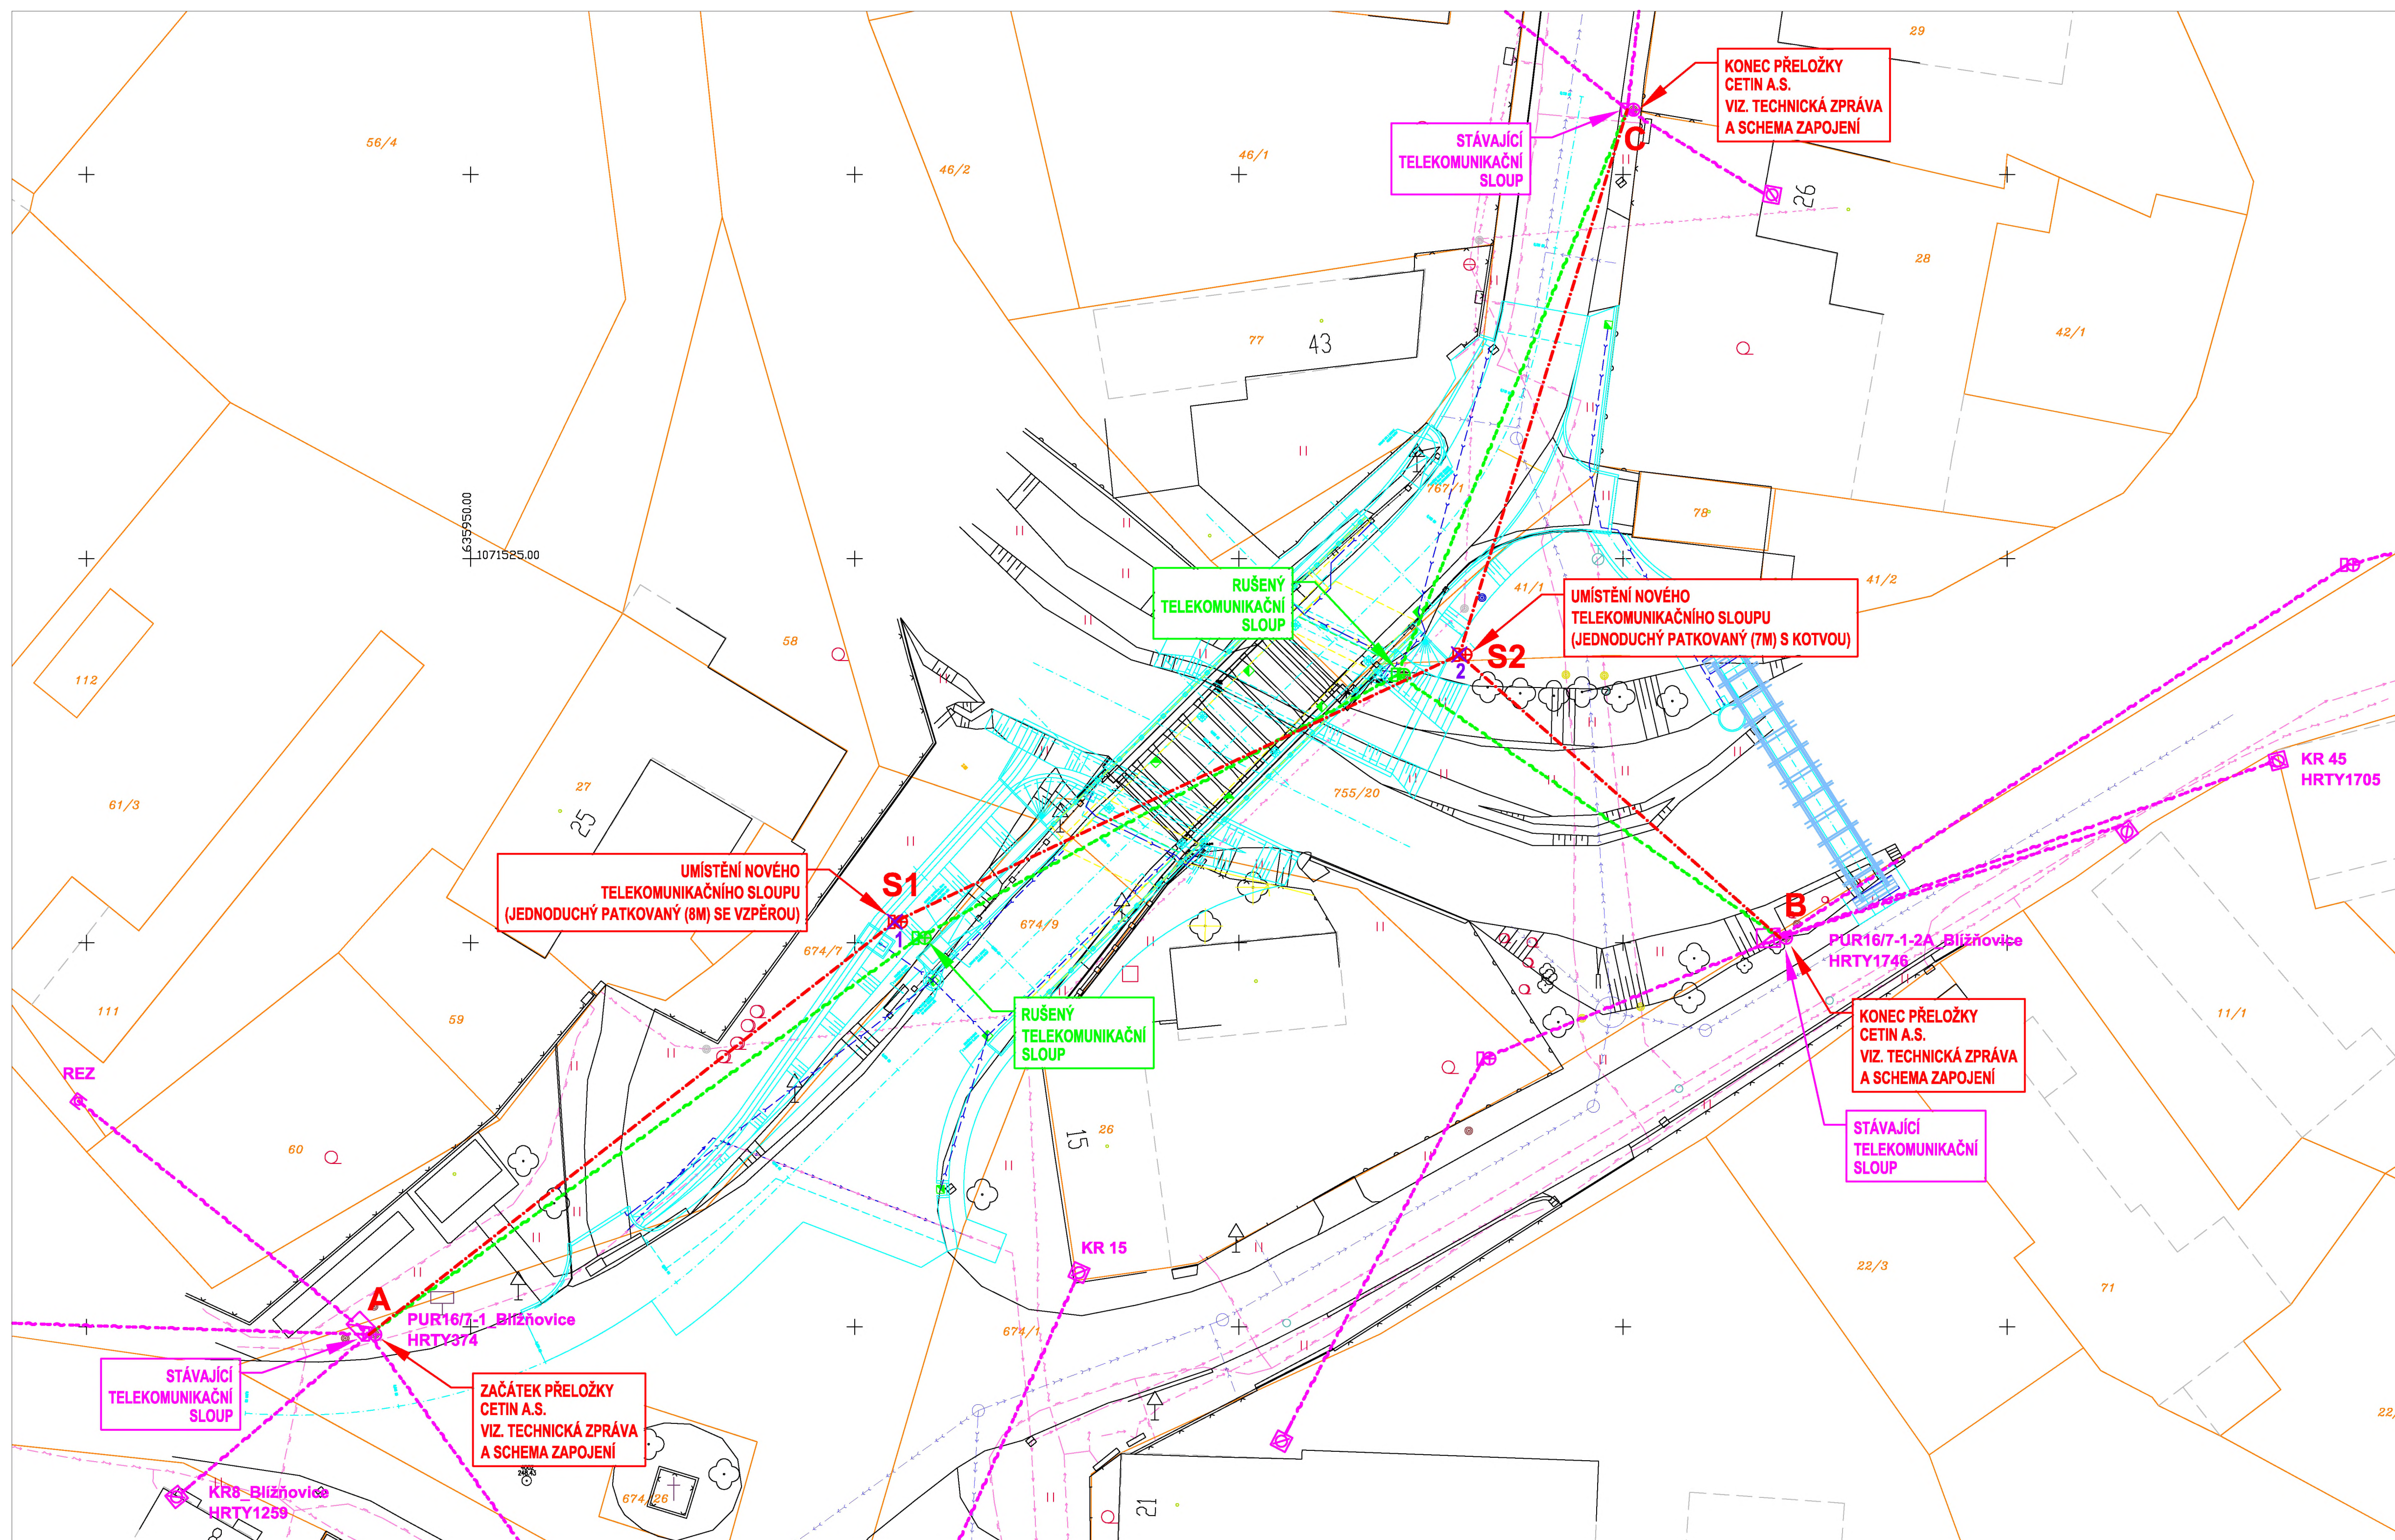

**SEZNAM LOMOVÝCH BODŮ (VÝKOP)**  
**PŘESNÁ TRASA BUDE URČENA PO PROVEDENÉ KOORDINACI S OSTATNÍMI SÍTĚMI V RÁMCI STAVBY**

	X	Y
1	-635922387.7184	-1071548636.9984
2	-635885654.2213	-1071531244.3148

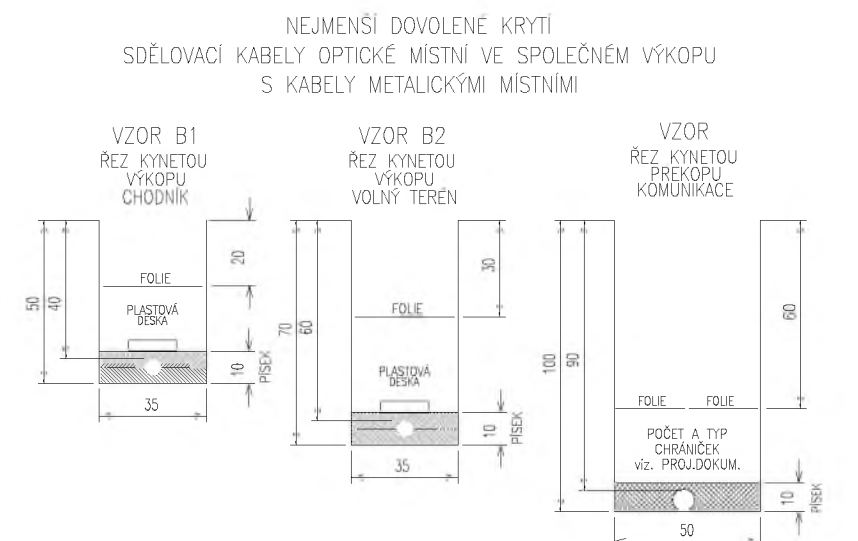

**LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**

- VODOVOD
- ODVODNĚNÍ A KANALIZACE

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- STL PODZEMNÍ PLYNOVOD - GRID SERVICES, s.r.o.
- VODOVOD - MĚSTO HROCHŮV TÝNEC

**LEGENDA:**

- NOVOSTAVBA

**LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETIN a.s.:**

- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK SAMONOSNÉHO VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SAMONOSNÉ
- PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SAMONOSNÉ

**POZNÁMKA: VÝSTAVBA NOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VÝSTAVBOU OSTATNÍCH NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ SPOJENOU S VÝSTAVBOU MOSTU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR.**

**POZNÁMKA:**  
 PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDELOVACÍCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZÍCÍ SE V ZÁJMĚVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDELOVACÍCH KABELŮ - SONDAŽNÍ A VYTÝČENÍM.  
 NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HOPE V PŘEKOPECH A VÝKOPĚCH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESU.

**ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVĚNA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Generální projektant:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záměslavův Zámeček 229/15 100 00 Praha 10 - Záběhovice IČ: 25246253 tel: +420 272 790 055, email: tempo@tempo.cz	 Ing. Stanislav Marhold <b>CTI PROJEKT</b> V. Nezvalův 1329, 565 01 Choceň IČO: 44462948 tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz
Zpracoval:	BULENÁ PETR	
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD	Stupeň: RDS Zak. č.: 881 Arch. č.: 881 Datum: 03/2021 Formát: A4
Technická kontrola:	ING. STANISLAV MARHOLD	
Kraj:	PARDOBICKÝ	Obsah: <b>SITUACE TRASY</b> Měř: 1:250 Kódy: M
Investor:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE	
Ákce:	<b>VPIC Blížňovice(CR), rek.mostu č.32265_1 číslo stavby 16010-060602</b>	Číslo příl. výkresu: <b>P01</b>



SMĚR  
PUR16/7-1-3\_Blížňovice  
HRTY377  
xHRTY374/1.2.2/1-5  
lxVZIO  
lxZAU-20;lxZAU-40;23xkab.forma lp.;  
:::;PUR16/7-1+3  
Hrochův Týnec  
Blížňovice

STÁVAJÍCÍ  
TELEKOMUNIKAČNÍ  
SLOUP

SMĚR  
KR26\_Blížňovice  
HRTY1635  
xHRTY374/1.LUK.5/1-2  
lxMRK 2;  
lxzdrf.sv.2p.;  
:26 ;;  
Hrochův Týnec  
Blížňovice

PUR16/7-1\_Blížňovice  
HRTY374  
xHRTY378/1.LU/31-50  
lxKJSS 20;  
lxZAU-20;lxZAU-40;23xkab.forma lp.;  
:::;PUR16/7-1  
Hrochův Týnec  
Blížňovice


SLOUP JEDNODUCHÝ  
PATKOVANÝ (8M)  
SE VZPĚROU  
POSTAVIT V ZELENÉM  
PROSTRANSTVÍ

SLOUP JEDNODUCHÝ  
PATKOVANÝ (7M)  
S KOTVOU  
POSTAVIT V ZELENÉM  
PROSTRANSTVÍ

DEMONTÁŽ  
TELEKOMUNIKAČNÍ  
SLOUPU



DEMONTÁŽ  
TELEKOMUNIKAČNÍ  
SLOUPU

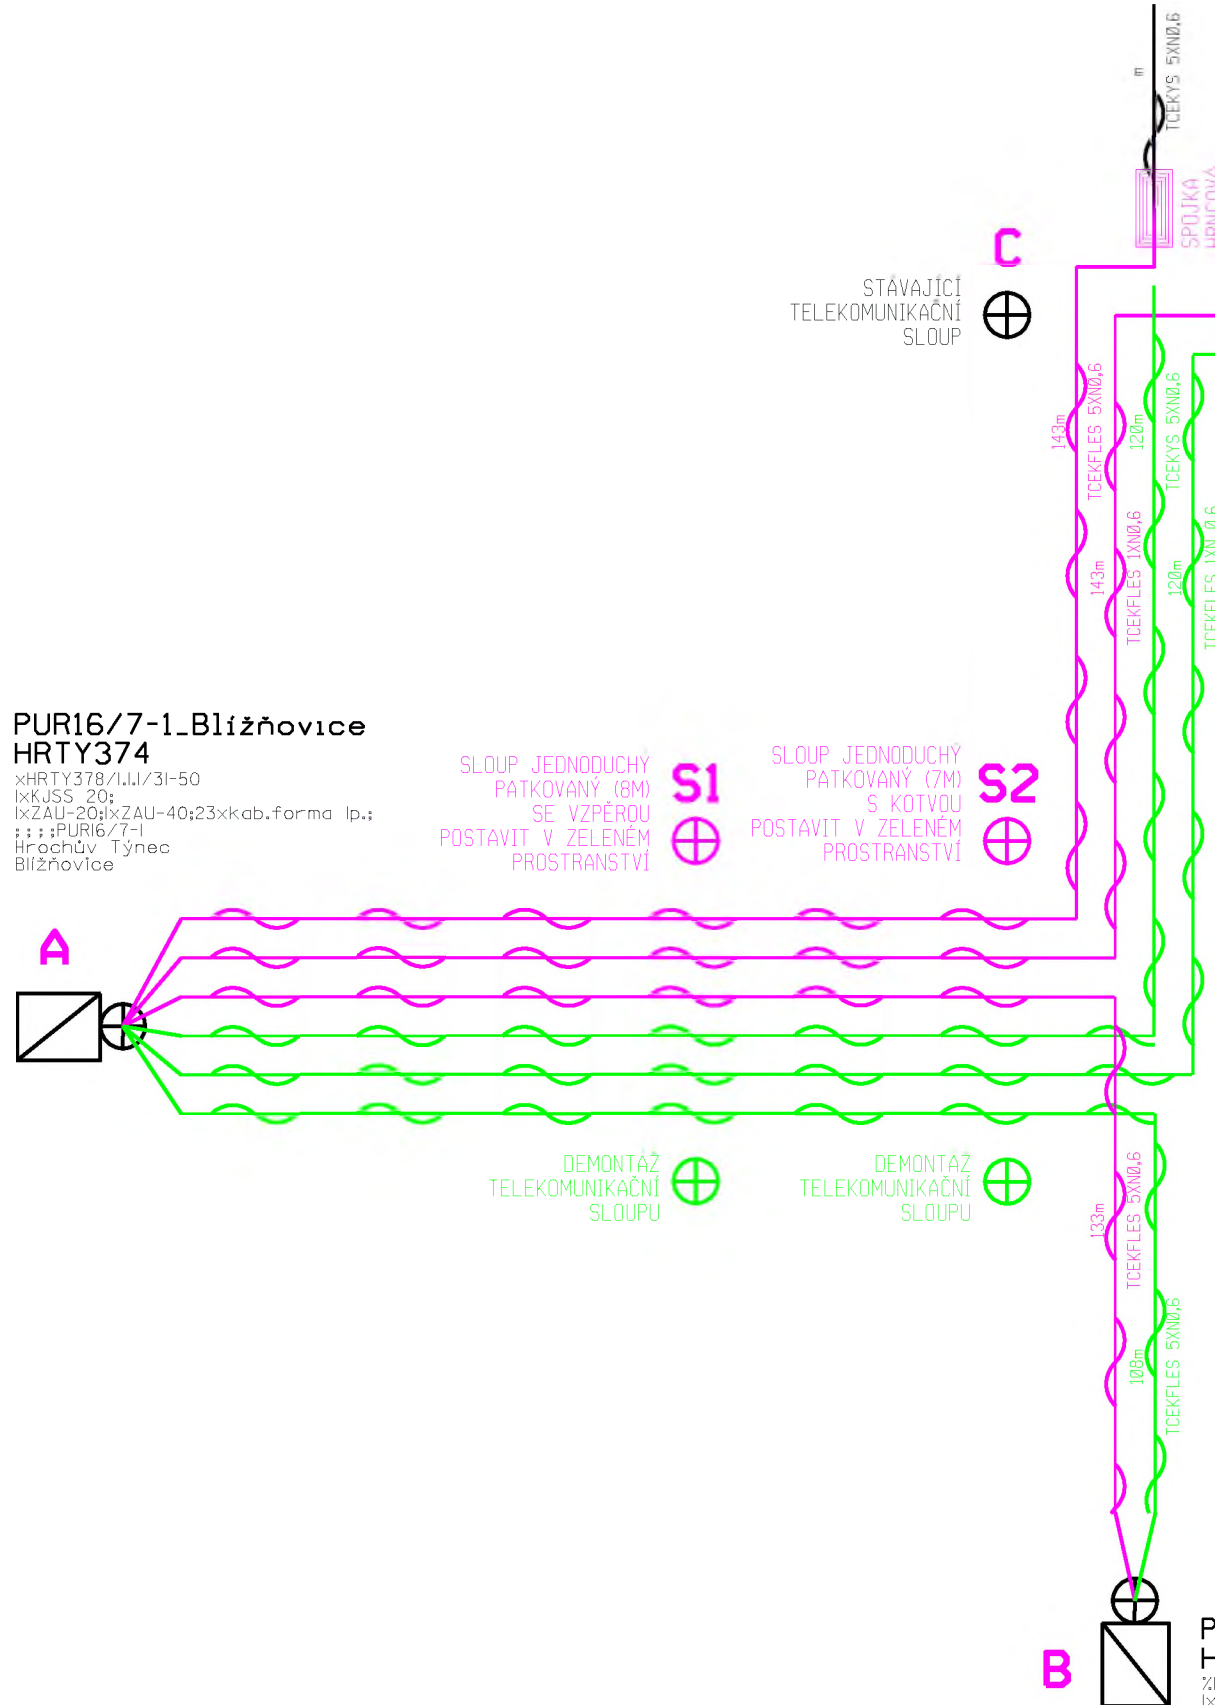PUR16/7-1-2A\_Blížňovice  
HRTY1746  
xHRTY374/1.2.1/1-10  
lxMRS 10/20 - OT;  
2xSID-C 10xl;6xkab.forma lp.;  
:::;rozváděč, PUR na stožáru  
Hrochův Týnec  
Blížňovice



LEGENDA :

- projektované telekomunikační kabely samonosné
- přeložené telekomunikační kabely samonosné
- překládané telekomunikační kabely samonosné
- stávající telekomunikační kabely samonosné
- zrušené telekomunikační kabely samonosné

Generální projektant:	TEMO-TELEKOMUNIKACE o.s. U Záběhlického Zámku 233/15 106 00 Praha 10 - Záběhlice IČ: 25740253 tel.: +420 272 760 095, email: temo@temo.cz	 <b>Sítě k Vašim službám</b>			
Zpracoval:	BULENA PETR				
Technické kontroloval:	ING. STANISLAV MARHOLD	 <b>Ing. Stanislav Marhold</b> <b>CTI PROJEKT</b> V. Nezvala 1329, 565 01 Chocebř IČO: 44462948 tel: 604 234 069, e-mail: projekty@ctiprojekt.cz			
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD				
Kraj:	PARDOBICKÝ	Okres:	PARDOBICE	Obec:	PŘELOUČ
Investor:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE				
Stupeň:	RDS				
Čak. č.:	881				
Arch. č.:	881				
Datum:	03/2021				
Formát:	8 A4				
Obsah:	SCHEMA ZAPOJENÍ				
Měr.:	Číslo příl. výkresu				
Kótys:	M				
	S01				



954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	3.20 m	397,22 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	150.00 m	2 083,50 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955019 S	Demontáž jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	6 754,58 Kč
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	348.00 m	11 932,92 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	3.00 ks	597,30 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	412,56 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	275,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	321,51 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	6.00 ks	229,32 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	419.00 m	17 610,57 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové	2.00 ks	1 231,46 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	16.00 ks	483,68 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 774,68 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5292.69 JV	5 292,69 Kč
954987 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	3 956,15 Kč
954986 S	Vystrojení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	1.00 ks	3 790,24 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks	1 248,66 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	16.00 ks	318,56 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	732,52 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 570,23 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	7 570,64 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 494,04 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	8000.00 JV	8 000,00 Kč
	Náhrada vlastníkům za VBŘ - 8000,-		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 503,06 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 648,05 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
	Správní poplatek - 2000,-		

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>				
407578 S	Souprava čistící 4413L		2.00 ks	1 225,62 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
305463 S	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem		2.00 ks	482,02 Kč
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm		4.00 ks	83,12 Kč
305745 S	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm		1.00 kg	97,70 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.60 kg	46,90 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		4.00 m	16,16 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		4.00 m	8,76 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6		143.00 m	4 106,96 Kč
300176 S	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6		276.00 m	17 766,12 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný		7.00 ks	12,46 Kč
306358 S	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m		2.20 kg	352,51 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		7325.00 ks	7 325,00 Kč
306610 S	Matice napínače M 16 ČSN 021682		1.00 ks	62,41 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		1.00 ks	65,13 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		2.00 ks	5 263,08 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		1.00 ks	2 579,42 Kč
301357 S	Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK		1.00 ks	3 061,44 Kč

314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	2.00 ks	2 029,68 Kč
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	4.00 ks	713,92 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,28 Kč
306789 S	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	1.00 ks	149,82 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	1.00 ks	56,01 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	234,48 Kč
306457 S	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	1.00 ks	49,50 Kč
301518 S	Trubička smršť. SD 127F 12,7/6,4mm černá	0.10 m	10,57 Kč
301537 S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.20 m	26,46 Kč
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks	62,89 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	267,90 Kč
301411 S	Vzpěra dřevěná 7m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	2 266,77 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	5.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	10.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	6.00 ks	0,00 Kč
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740	4.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	10.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	4.00 ks	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	3.00 ks	0,00 Kč



Stavební odbor

Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 027919/2022 STO/Št  
Spis. Zn.: CR 016131/2022 STO/Št  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarma Jaroslav  
Tel: 469657262  
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 6. 4. 2022



**MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 5.5.2022

V Chrudimi dne: 10.5.2022 Podpis: Štarma

-2-

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

**Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Město Hrochův Týnec, Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec  
Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec  
Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec  
Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec  
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec  
Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec  
Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec  
Luboš Kabrhel, Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec  
Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec  
Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec  
Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec  
Zuzana Hamerníková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec  
Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec  
Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec  
Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Markéta Bykova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
CETIN a. s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28. 2. 2022 podal

**Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice** (dále jen "stavba") na stavebních parcelách číslo 26 (zastavěná plocha a nádvoří) a 77 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 41/1 (ostatní plocha), 46/1 (zahrada), 674/1 (ostatní plocha), 674/7 (ostatní plocha), 674/9 (ostatní plocha), 674/30 (ostatní plocha), 714/1 (ostatní plocha), 755/20 (vodní plocha) a 767/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Blížňovice.

Stavba obsahuje:

- **SO 180 DIO - dopravně inženýrská opatření během výstavby** - na řešení objízdných tras, osazení přechodného dopravního značení a uzávěry v prostoru staveniště bude vydáno rozhodnutí MěÚ Chrudim - Odborem dopravy. Součástí tohoto stavebního objektu je také provizorní stezka a lávka pro pěší po dobu výstavby přes řeku Novohradku, která bude zřízena cca 40 m proti proudu od stávajícího mostu. Provizorní stezka bude začínat u vjezdu před hasičárnou, bude plynule navazovat na lávku přes řeku a dále bude ukončena napojením na slepou místní komunikaci. V prostoru stezky budou sejmuty humózní vrstvy, na zeminu bude uložena geotextilie a následně položena hutněná vrstva štěrkodrti o šířce min. 1,5 m. Přesný typ lávky bude upřesněn v realizační dokumentaci. Její délka bude 18,4 m a šířka 3,0 m a bude uložena na betonových silničních panelech. Po dokončení celé stavby bude lávka odstraněna a terén v místě stezky bude uveden do původního stavu a osazen travním semenem.
- **SO 201 - Most ev. č. 32265-1** - po odstranění stavby stávajícího nevyhovujícího mostu bude na jeho místě proveden nový monolitický železobetonový most z předpjaté konstrukce. Založení nového mostu bude řešeno hlubinnými mikropilotami v délce 6,0 m a v celkovém počtu 32 ks, které budou vetknuty do železobetonových základových pasů v tl. 0,8 m. Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton v tl. 0,15 m. Na těchto základových pasech bude vybudována na každé straně mostu železobetonová rámová stojka, které budou mít proměnnou tloušťku. V patě bude tloušťka 1,1 m a v místě vetknutí do rámové příčle bude tloušťka 1,425 m. Výška rámových stojek bude 1,65 m a jejich délka bude 6,997 m. Rámové stojky budou monoliticky spojeny s rámovou příčlí, která bude v podélném směru s klenutým podhledem a náběhy. V příčném směru se jedná o jednorámový průřez s vyloženými konzolami. Do konstrukce rámových stojek budou vetknuta rovnoběžná zavěšená křídla mostu o délce 4,0 m a tloušťce 0,55 m, které budou betonována současně s rámovými stojkami ze stejného betonu. V konstrukci křídel budou provedeny prostupy rubové drenáže. Součástí mostu jsou prodloužená křídla vpravo před mostem a vlevo za mostem ve směru na Čankovice, která budou navazovat na zavěšená křídla mostu a budou dilatačně oddělená. Křídlo vpravo před mostem bude tvořit dvojici samostatných dílů v délce 6,0 m. Základy křídla budou mít šířku 1,5 m a výšku 0,4 m. Dříky o šířce 0,55 m budou mít proměnnou výšku podle výšky silnice. Křídlo vlevo za mostem bude mít délku 5,0 m. Základ bude mít šířku 1,2 m a výšku 0,3 m. Dřík o šířce 0,4 m bude mít také proměnnou výšku podle výšky silnice. Na pravé straně mostu je navržena železobetonová římsa šířky 0,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Na levé straně mostu je navržen chodník ze železobetonu šířky 1,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Římsa i chodník budou mít odraznou hranu 0,15 m nad povrchem vozovky. Na mostě je navrženo oboustranné zábradlí o výšce 1,1 m, které bude kotveno do římsy a do chodníku. Vpravo ve směru do zahrady bude zábradlí s plnou neprůsvitnou výplní, ostatní části budou provedeny se svislou výplní. Na chodník na mostě budou navazovat chodníky před a za mostem v celkové délce 48,6 m a šířce 1,5 m. Na obou koncích bude ukončen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,02 m a varovným pásem šíře 0,4 m. Dále dojde k úpravě silnice

před a za mostem v celkové délce 96,0 m. Šířka vozovky na mostě bude mezi obrubníky 5,5 m. Odvodnění silnice a mostu je řešeno příčným a podélným spádem do stávajících, nebo nových uličních vpustí a dále do šterbinového žlabu D400, který bude osazen ve sjezdech. Uliční vpusti a šterbinové žlaby budou přípojkami napojeny do šachty s nátokovou mříží a dále do vodního toku. Současně dojde k úpravě koryta vodního toku. Pod mostem a v částech koryta před a za mostem bude provedeno odláždění svahů koryta a svahových kuželů před křídly z kamene do betonu jako ochrana základů mostu.

- **SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení** - dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení veřejného osvětlení přes most, včetně demontáže dvou svítidel z demontovaného stožáru ČEZ u mostu a z ponechaného stožáru ČEZ v předzahrádce. Následně dojde k instalaci dvou kusů provizorních betonových sloupů pro provizorní přeložku vedení VO, včetně natažení provizorního závěsného kabelu VO a napojení na stávající zemní kabel a pokračující venkovní vedení VO na konec obce. Po dokončení nového mostu bude instalováno 5 ks osvětlovacích stožárů o výšce 8 m, na které budou osazeny svítidla LED s barevnou teplotou 3000K bez výložníku. Dále bude provedeno nové položení napájecího kabelu CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>, který bude napojen ze stávajícího rozvaděče RVO u budovy Koloniálu. Kabel bude smyčkován k jednotlivým stožárům VO č. 1 - 5. Ze stožáru č. 5 bude kabel pokračovat ke stávajícímu stožáru ČEZ na pozemkové parcele číslo 46/1, kde bude napojen na stávající venkovní vedení VO pokračující na konec obce. V zemní trase a na mostě bude kabel veden v chrániče. Současně po dokončení stavby mostu budou dva provizorní betonové sloupy demontovány a terén uveden do původního stavu.
- **SO 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace** - v souvislosti s výše uvedenou stavbou bude provedena přeložka kabelového nadzemního vedení společnosti CETIN a. s. Stávající 2 telekomunikační sloupy před a za mostem, včetně vedení, budou zrušeny a nahrazeny novými sloupy S1 a S2. Dále dojde k propojení mezi stávajícími telekomunikačními sloupy, které jsou osazeny u autobusové zastávky, dále u slepé místní komunikace naproti č. p. 41 a naproti č. p. 26.
- **SO 470 - Přeložka místního rozhlasu** - na začátku a na konci mostu se nachází jeden stožár. Ze stožáru za mostem ve směru k silnici č. I/17 je provedena odbočka na samostatný stožár s rozhlasovým amplionem, přičemž hlavní vedení pokračuje na konec obce, kde nejsou napojeny žádné další ampliony. Vzhledem k tomu, že stožáry ČEZ na obou koncích mostu a samostatný stožár s amplionem jsou v kolizi se stavbou mostu a budou před zahájením stavby odstraněny, je nutné zajistit přeložení vedení místního rozhlasu a vlastního amplionu do provizorní polohy, aby bylo zajištěno napojení amplionu za mostem ve směru k silnici č. I/17 po dobu stavby. Nové kabelové vedení místního rozhlasu bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení napojeno na stávající. V konečném stavu budou zároveň osazeny 3 rozhlasové ampliony na nových osvětlovacích stožárech.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 26 a 77 a na pozemkových parcelách číslo 41/1, 46/1, 674/1, 674/7, 674/9, 674/30, 714/1, 755/20 a 767/1 v katastrálním území Blížňovice a to v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **SO 430 – Přeložka veřejného osvětlení, SO 460 – Přeložka sítě elektronické komunikace a SO 470 – Přeložka místního rozhlasu** jsou stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4, 5, 6, 8 a 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. **Tyto stavby vyžadují vydání kolaudačního souhlasu a současně stavební úřad dále stanovuje podmínky k jejich provedení.**

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MDS Projekt, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto a orazítkoval Ing. František Černík, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006077.

2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 2 let po právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - **1. Kontrolní prohlídka** – po provedení výkopových prací.
  - **2. Kontrolní prohlídka** – po provedení skruže příčle před betonáží příčle.
  - **3. Kontrolní prohlídka** – po dokončení stavebních prací (kolaudace mostu).
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení
9. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující tyto služby.
10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
11. V místech ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku a varovný pás v barvě červené.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR – DI Chrudim ze dne 2. 9. 2020 pod č. j. KRPE-54188-1/ČJ-2020-170306.
13. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru dopravy ze dne 3. 12. 2020 pod č. j. CR 068234/2020 ODP/Ši.
14. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru ŽP, odd. ekologie prostředí ze dne 6. 8. 2020 pod č. j. CR 045276/2020 OŽP/Fr a to:
  - Vznikající stavební a demoliční odpady budou tříděny podle druhů a kategorií s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předány oprávněným osobám přednostně k materiálovému využití.
  - V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 130/1019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
  - Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních a demoličních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačující.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru ŽP, odd. vodního hospodářství ze dne 9. 10. 2020 pod spis. zn. CR 043839/2020 Ve a to:

- Souhlas je platný 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska. Nepozbývá však platnosti, jestliže bude do 2 let ode dne vydání tohoto závazného stanoviska pro předmětnou stavbu vydáno pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení, anebo společné povolení.
  - Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby, kterou v červnu 2019 vypracoval MDS projekt s. r. o., Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto – Ing. František Černík.
  - Při demoličních pracích a vlastní výstavbě nesmí dojít ke znečištění říčního koryta a vody vodního toku. Stavební suť a stavební materiály nesmí být ukládány v bezprostřední blízkosti vodního toku z důvodu zhoršení odtokových poměrů nebo negativního ovlivnění kvality vody. Stavební rum, stavební materiály a použitá technologická zařízení smí zasahovat do průtočného profilu vodního toku jen po nezbytně nutnou dobu. Mimo pracovní dobu musí být všechna mobilní zařízení a technologie z vodního toku odstraněna.
  - Prostor mezi opevněním mostu a stávající zídka na levém břehu před vtokem do mostu je třeba vyřešit tak, aby opevnění mostu navazovalo na opětnou zeď. Návrh řešení bude předložen k odsouhlasení Povodí Labe, státní podnik – PS Vysoké Mýto.
  - Nově navržená opevnění dna a břehů v prostoru nově budovaného mostu musí plynule navazovat na stávající stav stavbě technické úpravy.
  - Případná nová vyústění dešťových stok a jiných odvodnění do koryta vodního toku, budou zakončena výústními (stavebními) objekty. Jejich případné umístění a technické parametry budou konzultovány se správcem vodního toku – PS Vysoké Mýto (Václavská 169, 465 420 426 nebo 602 177 216, Bc. L. Petřek, [petrekl@pla.cz](mailto:petrekl@pla.cz)).
  - Na předání staveniště a ke kolaudačnímu řízení bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Vysoké Mýto.
  - Povodňový plán stavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osoba – Ing. Pavel Jansa, tel. číslo 495 088 708, [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz). Následně pak vodoprávní úřad k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Chrudim.
16. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nepůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
  17. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
  18. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
  19. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
  20. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
  21. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
  22. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).

23. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
24. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnicí zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

### Odůvodnění

Dne 28. 2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor dopravy, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, Policie ČR – DI Chrudim, Ministerstvo obrany, sekce s nakládání s majetkem Ministerstva obrany, MěÚ Chrast – Odbor výstavby a životního prostředí, stavební úřad, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Povodí Labe státní podnik Hradec Králové.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 97k písm. e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dále stavebník v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Souhlas je vyznačen na koordinačním situačním výkresu a to včetně podpisu.



**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Město Hrochův Týnec, Povodí Labe, státní podnik, Jan Zápotocký, Helena Zápotocká, Marie Yonová, Vojtěch Velínský, Jiří Novotný, Ivana Novotná, Radek Drahoš, Luboš Kabrhel, Lucie Nováková, Anežka Ondráčková, Jaromír Sviták, Zuzana Hamerníková Lašková, Lukáš Hamerník, Cyril Dvořák, Jana Riedlingerová, Markéta Bykova, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s. a GasNet Služby, s. r. o.

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 roků. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Štarman Jaroslav  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice  
č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny

Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z sídlo: Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové 3

Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec

Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec

Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec

Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec

Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec

Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec

Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec

Luboš Kabrhel, IDDS: vsas2yg trvalý pobyt: Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec

Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec

Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec

Zuzana Hamerníková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec

Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec

Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec

Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Markéta Bykova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:  
ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p.  
1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního  
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, IDDS: gtrbrq5 sídlo: Náměstí  
č. p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě



## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

### CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČO: 04084063  
DIČ: CZ04084063  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Theodorem Valentou, Specialistou výstavby sítě - smlouvy,  
Překládky, smlouvy VFS  
(dále jen „Nabyvatel“)

a

### Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
zastoupený:

### Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
zastoupená: Ing. Zdeněk Vašák, ředitelem společnosti  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
zapsanou v obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. Pr.162  
zastoupenou Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

## DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda“)

### 1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavby „**Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice**“, které bylo vydáno dne 6.4.2022, Městským úřadem Chrudim pod čj. CR 027919/2022 STO/Št a nabylo právní moci dne 5.5.2022 (dále jen „**Společné povolení**“) oprávněn k umístění **Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice** (dále jen „**Stavba**“). Společné povolení stavby je Přílohou č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

## 2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby  
č. 2 – Zřizovací listina

Číslo Dohody společnosti CETIN: HK 2021\_0007\_2  
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: NE  
Registr smluv: NE

Nabyvatel:

Převodce:

V Praze dne

V Pardubicích dne

**Theodor  
Valenta** Digitálně podepsal  
Theodor Valenta  
Datum: 2024.01.06  
21:25:23 +01'00'

**Ing. Zdeněk  
Vašák** Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.01.09  
12:11:41 +01'00'

---

za **CETIN a.s.**  
Theodor Valenta  
Specialista výstavby sítě - smlouvy  
(podepsáno elektronicky)

---

za **Správu a údržbu silnic Pardubického kraje**  
Ing. Zdeněk Vašák  
ředitel  
(podepsáno elektronicky)

Stavební odbor

Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 027919/2022 STO/Št  
Spis. Zn.: CR 016131/2022 STO/Št  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štorman Jaroslav  
Tel: 469657262  
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 6. 4. 2022



**MĚSTSKÝ ÚŘAD Chrudim - Stavební odbor**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 10.5.2022

V Chrudimi dne: 10.5.2022 Podpis: Štorman

-2-

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou):

**Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Město Hrochův Týnec, Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec  
Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec  
Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec  
Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec  
Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec  
Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec  
Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec  
Luboš Kabrhel, Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec  
Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec  
Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec  
Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec  
Zuzana Hamerníková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec  
Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec  
Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec  
Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Markéta Bykova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
CETIN a. s., Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28. 2. 2022 podal

**Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

**Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice** (dále jen "stavba") na stavebních parcelách číslo 26 (zastavěná plocha a nádvoří) a 77 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 41/1 (ostatní plocha), 46/1 (zahrada), 674/1 (ostatní plocha), 674/7 (ostatní plocha), 674/9 (ostatní plocha), 674/30 (ostatní plocha), 714/1 (ostatní plocha), 755/20 (vodní plocha) a 767/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Blížňovice.

Stavba obsahuje:

- **SO 180 DIO - dopravně inženýrská opatření během výstavby** - na řešení objízdných tras, osazení přechodného dopravního značení a uzávěry v prostoru staveniště bude vydáno rozhodnutí MěÚ Chrudim - Odborem dopravy. Součástí tohoto stavebního objektu je také provizorní stezka a lávka pro pěší po dobu výstavby přes řeku Novohradku, která bude zřízena cca 40 m proti proudu od stávajícího mostu. Provizorní stezka bude začínat u vjezdu před hasičárnou, bude plynule navazovat na lávku přes řeku a dále bude ukončena napojením na slepou místní komunikaci. V prostoru stezky budou sejmuty humózní vrstvy, na zeminu bude uložena geotextilie a následně položena hutněná vrstva štěrkodrti o šířce min. 1,5 m. Přesný typ lávky bude upřesněn v realizační dokumentaci. Její délka bude 18,4 m a šířka 3,0 m a bude uložena na betonových silničních panelech. Po dokončení celé stavby bude lávka odstraněna a terén v místě stezky bude uveden do původního stavu a osazen travním semenem.
- **SO 201 - Most ev. č. 32265-1** - po odstranění stavby stávajícího nevyhovujícího mostu bude na jeho místě proveden nový monolitický železobetonový most z předpjaté konstrukce. Založení nového mostu bude řešeno hlubinnými mikropilotami v délce 6,0 m a v celkovém počtu 32 ks, které budou vetknuty do železobetonových základových pasů v tl. 0,8 m. Pod základovými pasy bude proveden podkladní beton v tl. 0,15 m. Na těchto základových pasech bude vybudována na každé straně mostu železobetonová rámová stojka, které budou mít proměnnou tloušťku. V patě bude tloušťka 1,1 m a v místě vetknutí do rámové příčle bude tloušťka 1,425 m. Výška rámových stojek bude 1,65 m a jejich délka bude 6,997 m. Rámové stojky budou monoliticky spojeny s rámovou příčlí, která bude v podélném směru s klenutým podhledem a náběhy. V příčném směru se jedná o jednorámový průřez s vyloženými konzolami. Do konstrukce rámových stojek budou vetknuta rovnoběžná zavěšená křídla mostu o délce 4,0 m a tloušťce 0,55 m, které budou betonována současně s rámovými stojkami ze stejného betonu. V konstrukci křídel budou provedeny prostupy rubové drenáže. Součástí mostu jsou prodloužená křídla vpravo před mostem a vlevo za mostem ve směru na Čankovice, která budou navazovat na zavěšená křídla mostu a budou dilatačně oddělená. Křídlo vpravo před mostem bude tvořit dvojici samostatných dílů v délce 6,0 m. Základy křídla budou mít šířku 1,5 m a výšku 0,4 m. Dříky o šířce 0,55 m budou mít proměnnou výšku podle výšky silnice. Křídlo vlevo za mostem bude mít délku 5,0 m. Základ bude mít šířku 1,2 m a výšku 0,3 m. Dřík o šířce 0,4 m bude mít také proměnnou výšku podle výšky silnice. Na pravé straně mostu je navržena železobetonová římsa šířky 0,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Na levé straně mostu je navržen chodník ze železobetonu šířky 1,8 m a převislé části výšky 0,55 m. Římsa i chodník budou mít odraznou hranu 0,15 m nad povrchem vozovky. Na mostě je navrženo oboustranné zábradlí o výšce 1,1 m, které bude kotveno do římsy a do chodníku. Vpravo ve směru do zahrady bude zábradlí s plnou neprůsvitnou výplní, ostatní části budou provedeny se svislou výplní. Na chodník na mostě budou navazovat chodníky před a za mostem v celkové délce 48,6 m a šířce 1,5 m. Na obou koncích bude ukončen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,02 m a varovným pásem šíře 0,4 m. Dále dojde k úpravě silnice



před a za mostem v celkové délce 96,0 m. Šířka vozovky na mostě bude mezi obrubníky 5,5 m. Odvodnění silnice a mostu je řešeno příčným a podélným spádem do stávajících, nebo nových uličních vpustí a dále do šterbinového žlabu D400, který bude osazen ve sjezdech. Uliční vpusti a šterbinové žlaby budou přípojkami napojeny do šachty s nátokovou mříží a dále do vodního toku. Současně dojde k úpravě koryta vodního toku. Pod mostem a v částech koryta před a za mostem bude provedeno odláždění svahů koryta a svahových kuželů před křídly z kamene do betonu jako ochrana základů mostu.

- **SO 430 - Přeložka veřejného osvětlení** - dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení veřejného osvětlení přes most, včetně demontáže dvou svítidel z demontovaného stožáru ČEZ u mostu a z ponechaného stožáru ČEZ v předzahrádce. Následně dojde k instalaci dvou kusů provizorních betonových sloupů pro provizorní přeložku vedení VO, včetně natažení provizorního závěsného kabelu VO a napojení na stávající zemní kabel a pokračující venkovní vedení VO na konec obce. Po dokončení nového mostu bude instalováno 5 ks osvětlovacích stožárů o výšce 8 m, na které budou osazeny svítidla LED s barevnou teplotou 3000K bez výložníku. Dále bude provedeno nové položení napájecího kabelu CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>, který bude napojen ze stávajícího rozvaděče RVO u budovy Koloniálu. Kabel bude smyčkován k jednotlivým stožárům VO č. 1 - 5. Ze stožáru č. 5 bude kabel pokračovat ke stávajícímu stožáru ČEZ na pozemkové parcele číslo 46/1, kde bude napojen na stávající venkovní vedení VO pokračující na konec obce. V zemní trase a na mostě bude kabel veden v chrániče. Současně po dokončení stavby mostu budou dva provizorní betonové sloupy demontovány a terén uveden do původního stavu.
- **SO 460 - Přeložka sítě elektronické komunikace** - v souvislosti s výše uvedenou stavbou bude provedena přeložka kabelového nadzemního vedení společnosti CETIN a. s. Stávající 2 telekomunikační sloupy před a za mostem, včetně vedení, budou zrušeny a nahrazeny novými sloupy S1 a S2. Dále dojde k propojení mezi stávajícími telekomunikačními sloupy, které jsou osazeny u autobusové zastávky, dále u slepé místní komunikace naproti č. p. 41 a naproti č. p. 26.
- **SO 470 - Přeložka místního rozhlasu** - na začátku a na konci mostu se nachází jeden stožár. Ze stožáru za mostem ve směru k silnici č. I/17 je provedena odbočka na samostatný stožár s rozhlasovým amplionem, přičemž hlavní vedení pokračuje na konec obce, kde nejsou napojeny žádné další ampliony. Vzhledem k tomu, že stožáry ČEZ na obou koncích mostu a samostatný stožár s amplionem jsou v kolizi se stavbou mostu a budou před zahájením stavby odstraněny, je nutné zajistit přeložení vedení místního rozhlasu a vlastního amplionu do provizorní polohy, aby bylo zajištěno napojení amplionu za mostem ve směru k silnici č. I/17 po dobu stavby. Nové kabelové vedení místního rozhlasu bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení napojeno na stávající. V konečném stavu budou zároveň osazeny 3 rozhlasové ampliony na nových osvětlovacích stožárech.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 26 a 77 a na pozemkových parcelách číslo 41/1, 46/1, 674/1, 674/7, 674/9, 674/30, 714/1, 755/20 a 767/1 v katastrálním území Blížňovice a to v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační výkres současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **SO 430 – Přeložka veřejného osvětlení, SO 460 – Přeložka sítě elektronické komunikace a SO 470 – Přeložka místního rozhlasu** jsou stavby, které podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4, 5, 6, 8 a 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. **Tyto stavby vyžadují vydání kolaudačního souhlasu a současně stavební úřad dále stanovuje podmínky k jejich provedení.**

## III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost MDS Projekt, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto a orazítkoval Ing. František Černík, Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006077.

2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 2 let po právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - **1. Kontrolní prohlídka** – po provedení výkopových prací.
  - **2. Kontrolní prohlídka** – po provedení skruže příčle před betonáží příčle.
  - **3. Kontrolní prohlídka** – po dokončení stavebních prací (kolaudace mostu).
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
8. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení
9. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující tyto služby.
10. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
11. V místech ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku a varovný pás v barvě červené.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR – DI Chrudim ze dne 2. 9. 2020 pod č. j. KRPE-54188-1/ČJ-2020-170306.
13. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru dopravy ze dne 3. 12. 2020 pod č. j. CR 068234/2020 ODP/Ši.
14. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru ŽP, odd. ekologie prostředí ze dne 6. 8. 2020 pod č. j. CR 045276/2020 OŽP/Fr a to:
  - Vznikající stavební a demoliční budou tříděny podle druhů a kategorií s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předány oprávněným osobám přednostně k materiálovému využití.
  - V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 130/1019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
  - Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních a demoličních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačující.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru ŽP, odd. vodního hospodářství ze dne 9. 10. 2020 pod spis. zn. CR 043839/2020 Ve a to:



- Souhlas je platný 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska. Nepozbývá však platnosti, jestliže bude do 2 let ode dne vydání tohoto závazného stanoviska pro předmětnou stavbu vydáno pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení, anebo společné povolení.
  - Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby, kterou v červnu 2019 vypracoval MDS projekt s. r. o., Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto – Ing. František Černík.
  - Při demoličních pracích a vlastní výstavbě nesmí dojít ke znečištění říčního koryta a vody vodního toku. Stavební suť a stavební materiály nesmí být ukládány v bezprostřední blízkosti vodního toku z důvodu zhoršení odtokových poměrů nebo negativního ovlivnění kvality vody. Stavební rum, stavební materiály a použitá technologická zařízení smí zasahovat do průtočného profilu vodního toku jen po nezbytně nutnou dobu. Mimo pracovní dobu musí být všechna mobilní zařízení a technologie z vodního toku odstraněna.
  - Prostor mezi opevněním mostu a stávající zídka na levém břehu před vtokem do mostu je třeba vyřešit tak, aby opevnění mostu navazovalo na opětnou zed'. Návrh řešení bude předložen k odsouhlasení Povodí Labe, státní podnik – PS Vysoké Mýto.
  - Nově navržená opevnění dna a břehů v prostoru nově budovaného mostu musí plynule navazovat na stávající stav stavbě technické úpravy.
  - Případná nová vyústění dešťových stok a jiných odvodnění do koryta vodního toku, budou zakončena výústními (stavebními) objekty. Jejich případné umístění a technické parametry budou konzultovány se správcem vodního toku – PS Vysoké Mýto (Václavská 169, 465 420 426 nebo 602 177 216, Bc. L. Petřek, [petrekl@pla.cz](mailto:petrekl@pla.cz)).
  - Na předání staveniště a ke kolaudačnímu řízení bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Vysoké Mýto.
  - Povodňový plán stavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osoba – Ing. Pavel Jansa, tel. číslo 495 088 708, [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz). Následně pak vodoprávní úřad k potvrzení souladu s povodňovým plánem města Chrudim.
16. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
  17. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
  18. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
  19. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
  20. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
  21. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
  22. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápisem do stavebního deníku).



23. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
24. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutní zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

### Odůvodnění

Dne 28. 2. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor dopravy, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, Policie ČR – DI Chrudim, Ministerstvo obrany, sekce s nakládání s majetkem Ministerstva obrany, MěÚ Chrast – Odbor výstavby a životního prostředí, stavební úřad, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Povodí Labe státní podnik Hradec Králové.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 97k písm. e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dále stavebník v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona doložil souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Souhlas je vyznačen na koordinačním situačním výkresu a to včetně podpisu.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Město Hrochův Týnec, Povodí Labe, státní podnik, Jan Zápotocký, Helena Zápotocká, Marie Yonová, Vojtěch Velínský, Jiří Novotný, Ivana Novotná, Radek Drahoš, Luboš Kabrhel, Lucie Nováková, Anežka Ondráčková, Jaromír Sviták, Zuzana Hamerníková Lašková, Lukáš Hamerník, Cyril Dvořák, Jana Riedlingerová, Markéta Bykova, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a. s. a GasNet Služby, s. r. o.

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 roků. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Štarman Jaroslav  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměruje.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny

Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z sídlo: Smetanova č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Jan Zápotocký, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec

Helena Zápotocká, Blížňovice č. p. 15, 538 62 Hrochův Týnec

Marie Yonová, Blížňovice č. p. 43, 538 62 Hrochův Týnec

Vojtěch Velínský, Blížňovice č. p. 12, 538 62 Hrochův Týnec

Jiří Novotný, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec

Ivana Novotná, Blížňovice č. p. 8, 538 62 Hrochův Týnec

Radek Drahoš, Blížňovice č. p. 22, 538 62 Hrochův Týnec

Luboš Kabrhel, IDDS: vsas2yg trvalý pobyt: Blížňovice č. p. 9, 538 62 Hrochův Týnec

Lucie Nováková, Blížňovice č. p. 10, 538 62 Hrochův Týnec

Anežka Ondráčková, Blížňovice č. p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Jaromír Sviták, Sídliště č. p. 277, 538 62 Hrochův Týnec

Zuzana Hamerníková Lašková, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec

Lukáš Hamerník, Blížňovice č. p. 45, 538 62 Hrochův Týnec

Cyril Dvořák, Blížňovice č. p. 26, 538 62 Hrochův Týnec

Jana Riedlingerová, Píškova č. p. 1957/34, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Markéta Bykova, Píškova č. p. 1954/28, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 sídlo: Teplého č. p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, IDDS: gtrbrq5 sídlo: Náměstí č. p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

### **Theodora Valentu**

Specialista pro výstavbu sítě - smlouvy

os. č. 3249, nar. dne 6.2.1962, bytem Haškovcova Lhota čp.42, Bechyně, PSČ 391 65  
(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,



- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukci) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.5.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*

Elektronicky podepsáno  
Martin Škop, člen představenstva  
CETIN a.s.  
12:53 01.06.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno  
Michal Frankl, člen představenstva  
CETIN a.s.  
17:56 31.05.2023  
RSA/4096

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl Pr, vložka 162

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	28. srpna 2002
<b>Spisová značka:</b>	Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Název:</b>	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
<b>Sídlo:</b>	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
<b>Identifikační číslo:</b>	000 85 031
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Předmět činnosti:</b>	<p>výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti Pardubického kraje,</p> <p>správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace,</p> <p>opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.</p> <p>Doplňková činnost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,</li><li>- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování</li><li>- silniční doprava nákladní,</li><li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li><li>- ubytovací činnost.</li></ul>
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Ředitel:</b>	<p>Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 č.p. 111, 537 01 Tuněchody Den vzniku funkce: 1. září 2023</p>
<b>Způsob jednání:</b>	<p>Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace</p>

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

### **Theodora Valentu**

Specialista pro výstavbu sítě - smlouvy

os. č. 3249, nar. dne 6.2.1962, bytem Haškovcova Lhota čp.42, Bechyně, PSČ 391 65  
(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,



- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.5.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*

Elektronicky podepsáno  
Martin Škop, člen představenstva  
CETIN a.s.  
12:53 01.06.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno  
Michal Frankl, člen představenstva  
CETIN a.s.  
17:56 31.05.2023  
RSA/4096

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl Pr, vložka 162

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	28. srpna 2002
<b>Spisová značka:</b>	Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Název:</b>	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
<b>Sídlo:</b>	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
<b>Identifikační číslo:</b>	000 85 031
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Předmět činnosti:</b>	<p>výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti Pardubického kraje,</p> <p>správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace,</p> <p>opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.</p> <p>Doplňková činnost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,</li><li>- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování</li><li>- silniční doprava nákladní,</li><li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li><li>- ubytovací činnost.</li></ul>
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Ředitel:</b>	<p>Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 č.p. 111, 537 01 Tuněchody Den vzniku funkce: 1. září 2023</p>
<b>Způsob jednání:</b>	<p>Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace</p>

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

### **Jiřího Syrového**

Supervizor, VFS Čechy jih

os. č. 75374, nar. dne 20.04.1970, bytem Topolová 806, Prachatice, PSČ 383 01  
(„**Zaměstnanec**“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích v rámci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*

\*\*\*

Elektronicky podepsáno  
Martin Škop, člen představenstva  
CETIN a.s.  
12:18 14.11.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno  
Michal Frankl, člen představenstva  
CETIN a.s.  
12:09 14.11.2023  
RSA/4096

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl Pr, vložka 162

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	28. srpna 2002
<b>Spisová značka:</b>	Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Název:</b>	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
<b>Sídlo:</b>	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
<b>Identifikační číslo:</b>	000 85 031
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Předmět činnosti:</b>	<p>výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti Pardubického kraje,</p> <p>správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace,</p> <p>opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.</p> <p>Doplňková činnost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,</li><li>- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování</li><li>- silniční doprava nákladní,</li><li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li><li>- ubytovací činnost.</li></ul>
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Ředitel:</b>	<p>Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 č.p. 111, 537 01 Tuněchody Den vzniku funkce: 1. září 2023</p>
<b>Způsob jednání:</b>	<p>Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace</p>
