
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2023_0049
E618-S-29/2024; 291/2024-SŽ-SSZ-OMV1**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [REDAKCE], supervizorem, VFS Čechy jih
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „CETIN“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
ID DS: uccchjm
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384
zastoupená [REDAKCE], náměstkem ředitele OJ Stavební správy západ, na
základě pověření č. 40/2021 ze dne 12.11.2021 a 40-3/2021 ze dne 14.2.2022

Adresa pro zaslání korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ,
Budova Diamond Point
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zaslání daňového dokladu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Blatná spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze dne 26. 12. 2023 vydané pod čj. 350270/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Blatná(ST),žel.přejezd P1352“.
- 1.4 Stavebník eviduje stavbu pod názvem „**Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Drážního úřadu, Škroupova 11, 301 36 Plzeň– stavebního povolení stavby Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P 1352 v km 24,254. č.j. DUCR-59564/22/Kom ze dne 3.10.2022, které nabylo právní moci dne 7. 11. 2022(dále jen „Stavební povolení“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a

správce inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v e Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **178 364,00 Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na email adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy (ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz) .
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: podnikový právník
tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: systémový inženýr ŽDC
tel. [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Drážního úřadu, Škroupova 11, 301 36 Plzeň– stavební povolení stavby č.j. DUCR-59564/22/Kom ze dne 3.10.2022

Příloha č. 3 - Opravné rozhodnutí Drážního úřadu, Škroupova 11, 301 36 Plzeň–č.j. DUCR-71829/22/Kom ze dne 23.11.2022

Příloha č. 4 - Pověření Správy železnic, státní organizace

Příloha č. 5 - Pověření CETIN

CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Plzni dne

██████████

Digitálně podepsal

██████████

Datum: 2024.01.10

10:52:29 +01'00'

██████████

██████████

22.01.2024 14:38

Na základě pověření

za CETIN a.s.

██████████

Supervizor, VFS Čechy jih
(podepsáno elektronicky)

za Správu železnic, státní organizace

██████████

náměstek ředitele OJ Stavební správy západ
(podepsáno elektronicky)

SO 11-30-01
PZS přejezdu P1352
Přeložka CETIN

TK 0.081966
KT 0.081292

Přeložka kabelové
žláby 30cm pod
krajnicí.

TRUBNÍ PROPUSTEK
DN 600 DL. 9M
TK 0.055227

Trubní propustek evid. km 24,282

KT 0.023291

Přejezd P1352 evid. km 24,251

VB1
R 15

1479

0.004307
0.0000
108
Sražnice III. tř. Strakonice - Blatná

1651/5

PBS67

2396

PBS412

152

1478

1522

243
1477

R=219m

KÚ 0.031979


KT 0.024745

IK 0.011103

VB1
80

KT 0.0

ZU c

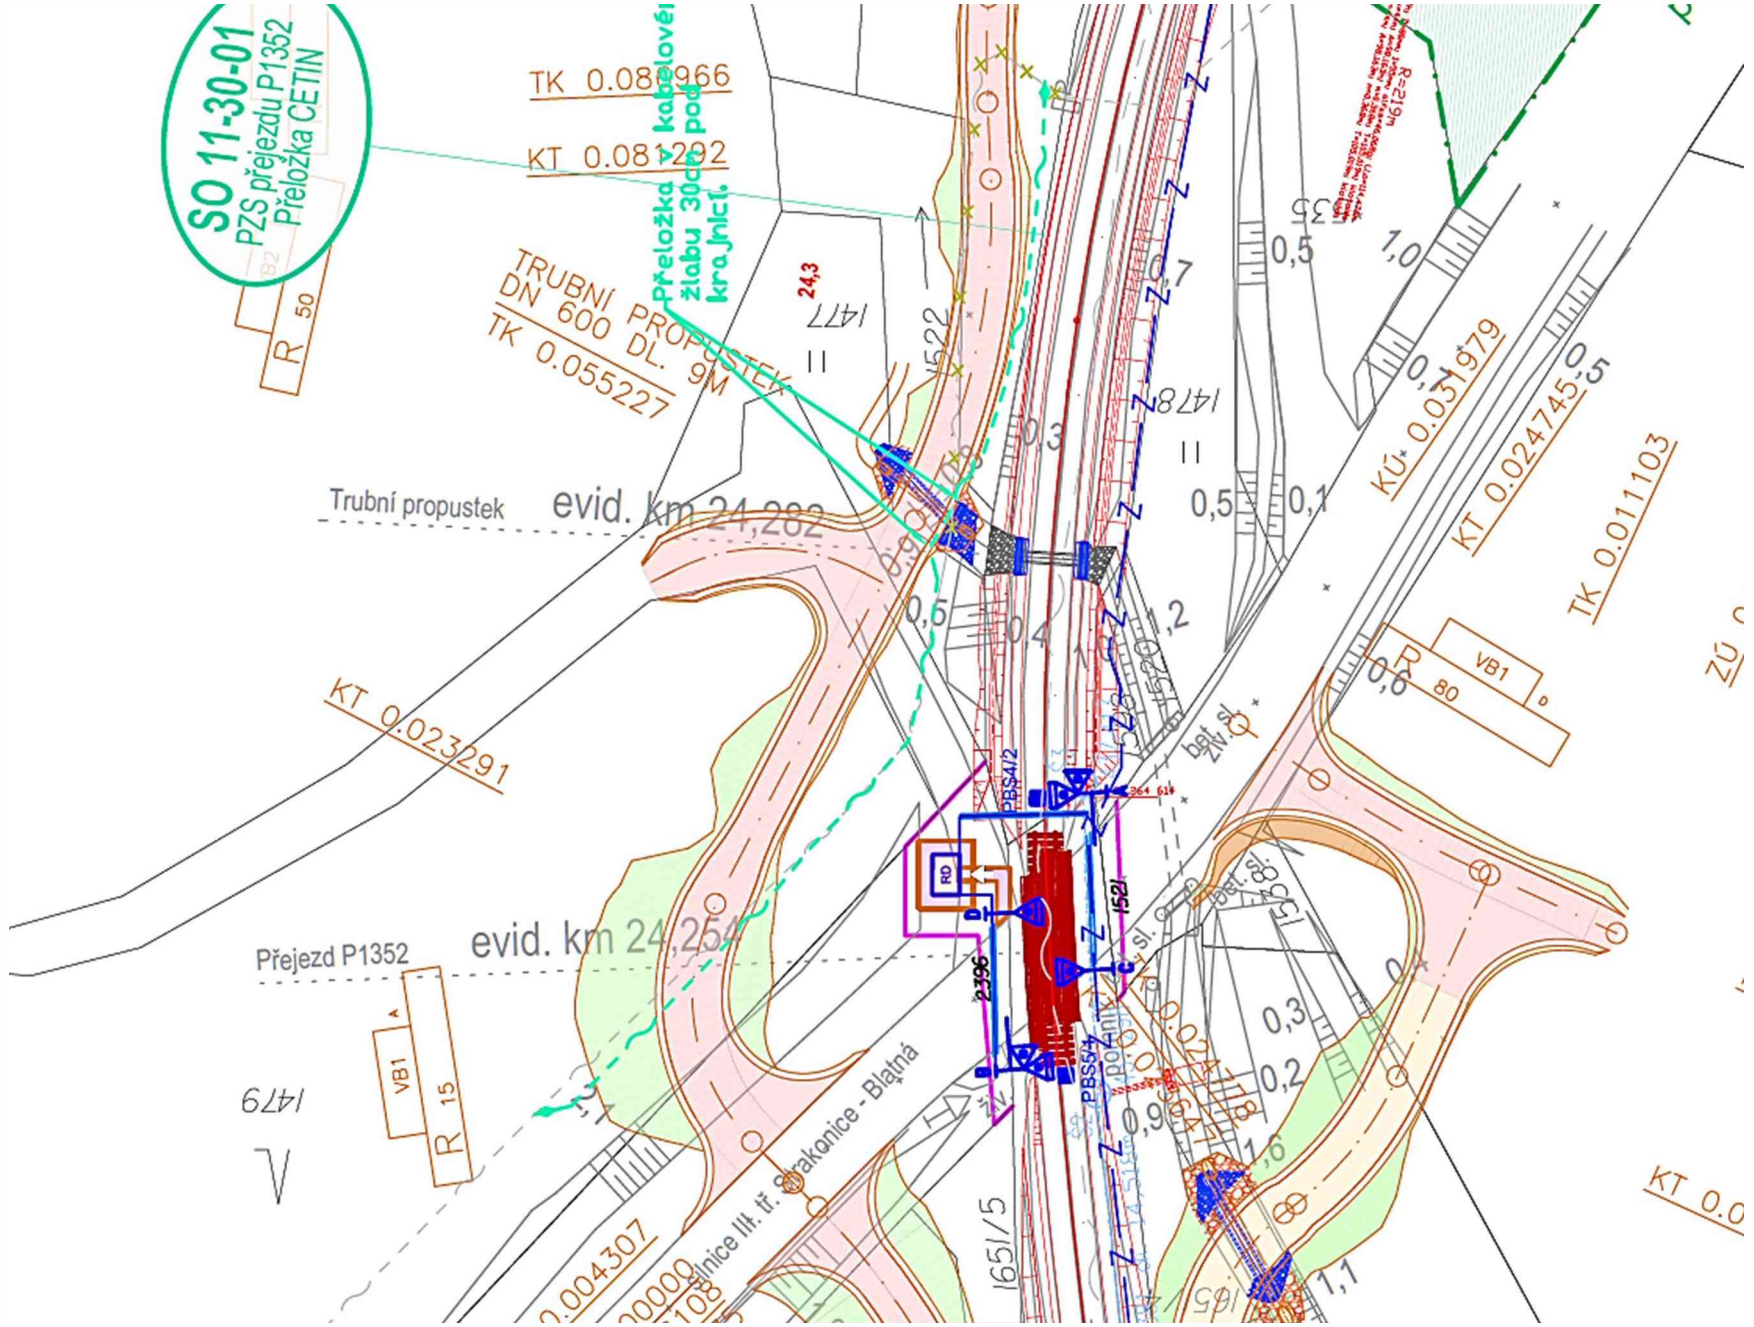



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	07.04.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	


Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	


Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:

Název stavby/akce:	Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice		Označení (S-kód): S 632000131
Název části:	Železniční přejezdy		Označení zhotovitele: 120081
Název objektu:	Přeložka CETIN		Označení části: D.2.1.5.1
Název přílohy:	Situační		Označení objektu/komplexu: SO 11-30-01
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: 2 001
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Jihočeský	Blatná, Sedlice	043108	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	06/2021	2xA4	1:500

S-kód: S 6 3 2 0 0 0 1 3 1 - D U S P - Část: D 2 1 5 1 - Objekt: S 0 1 1 3 0 0 1 - Podobjekt: X X - Příloha: 2 - 0 0 1 - Revize: 0 0 0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

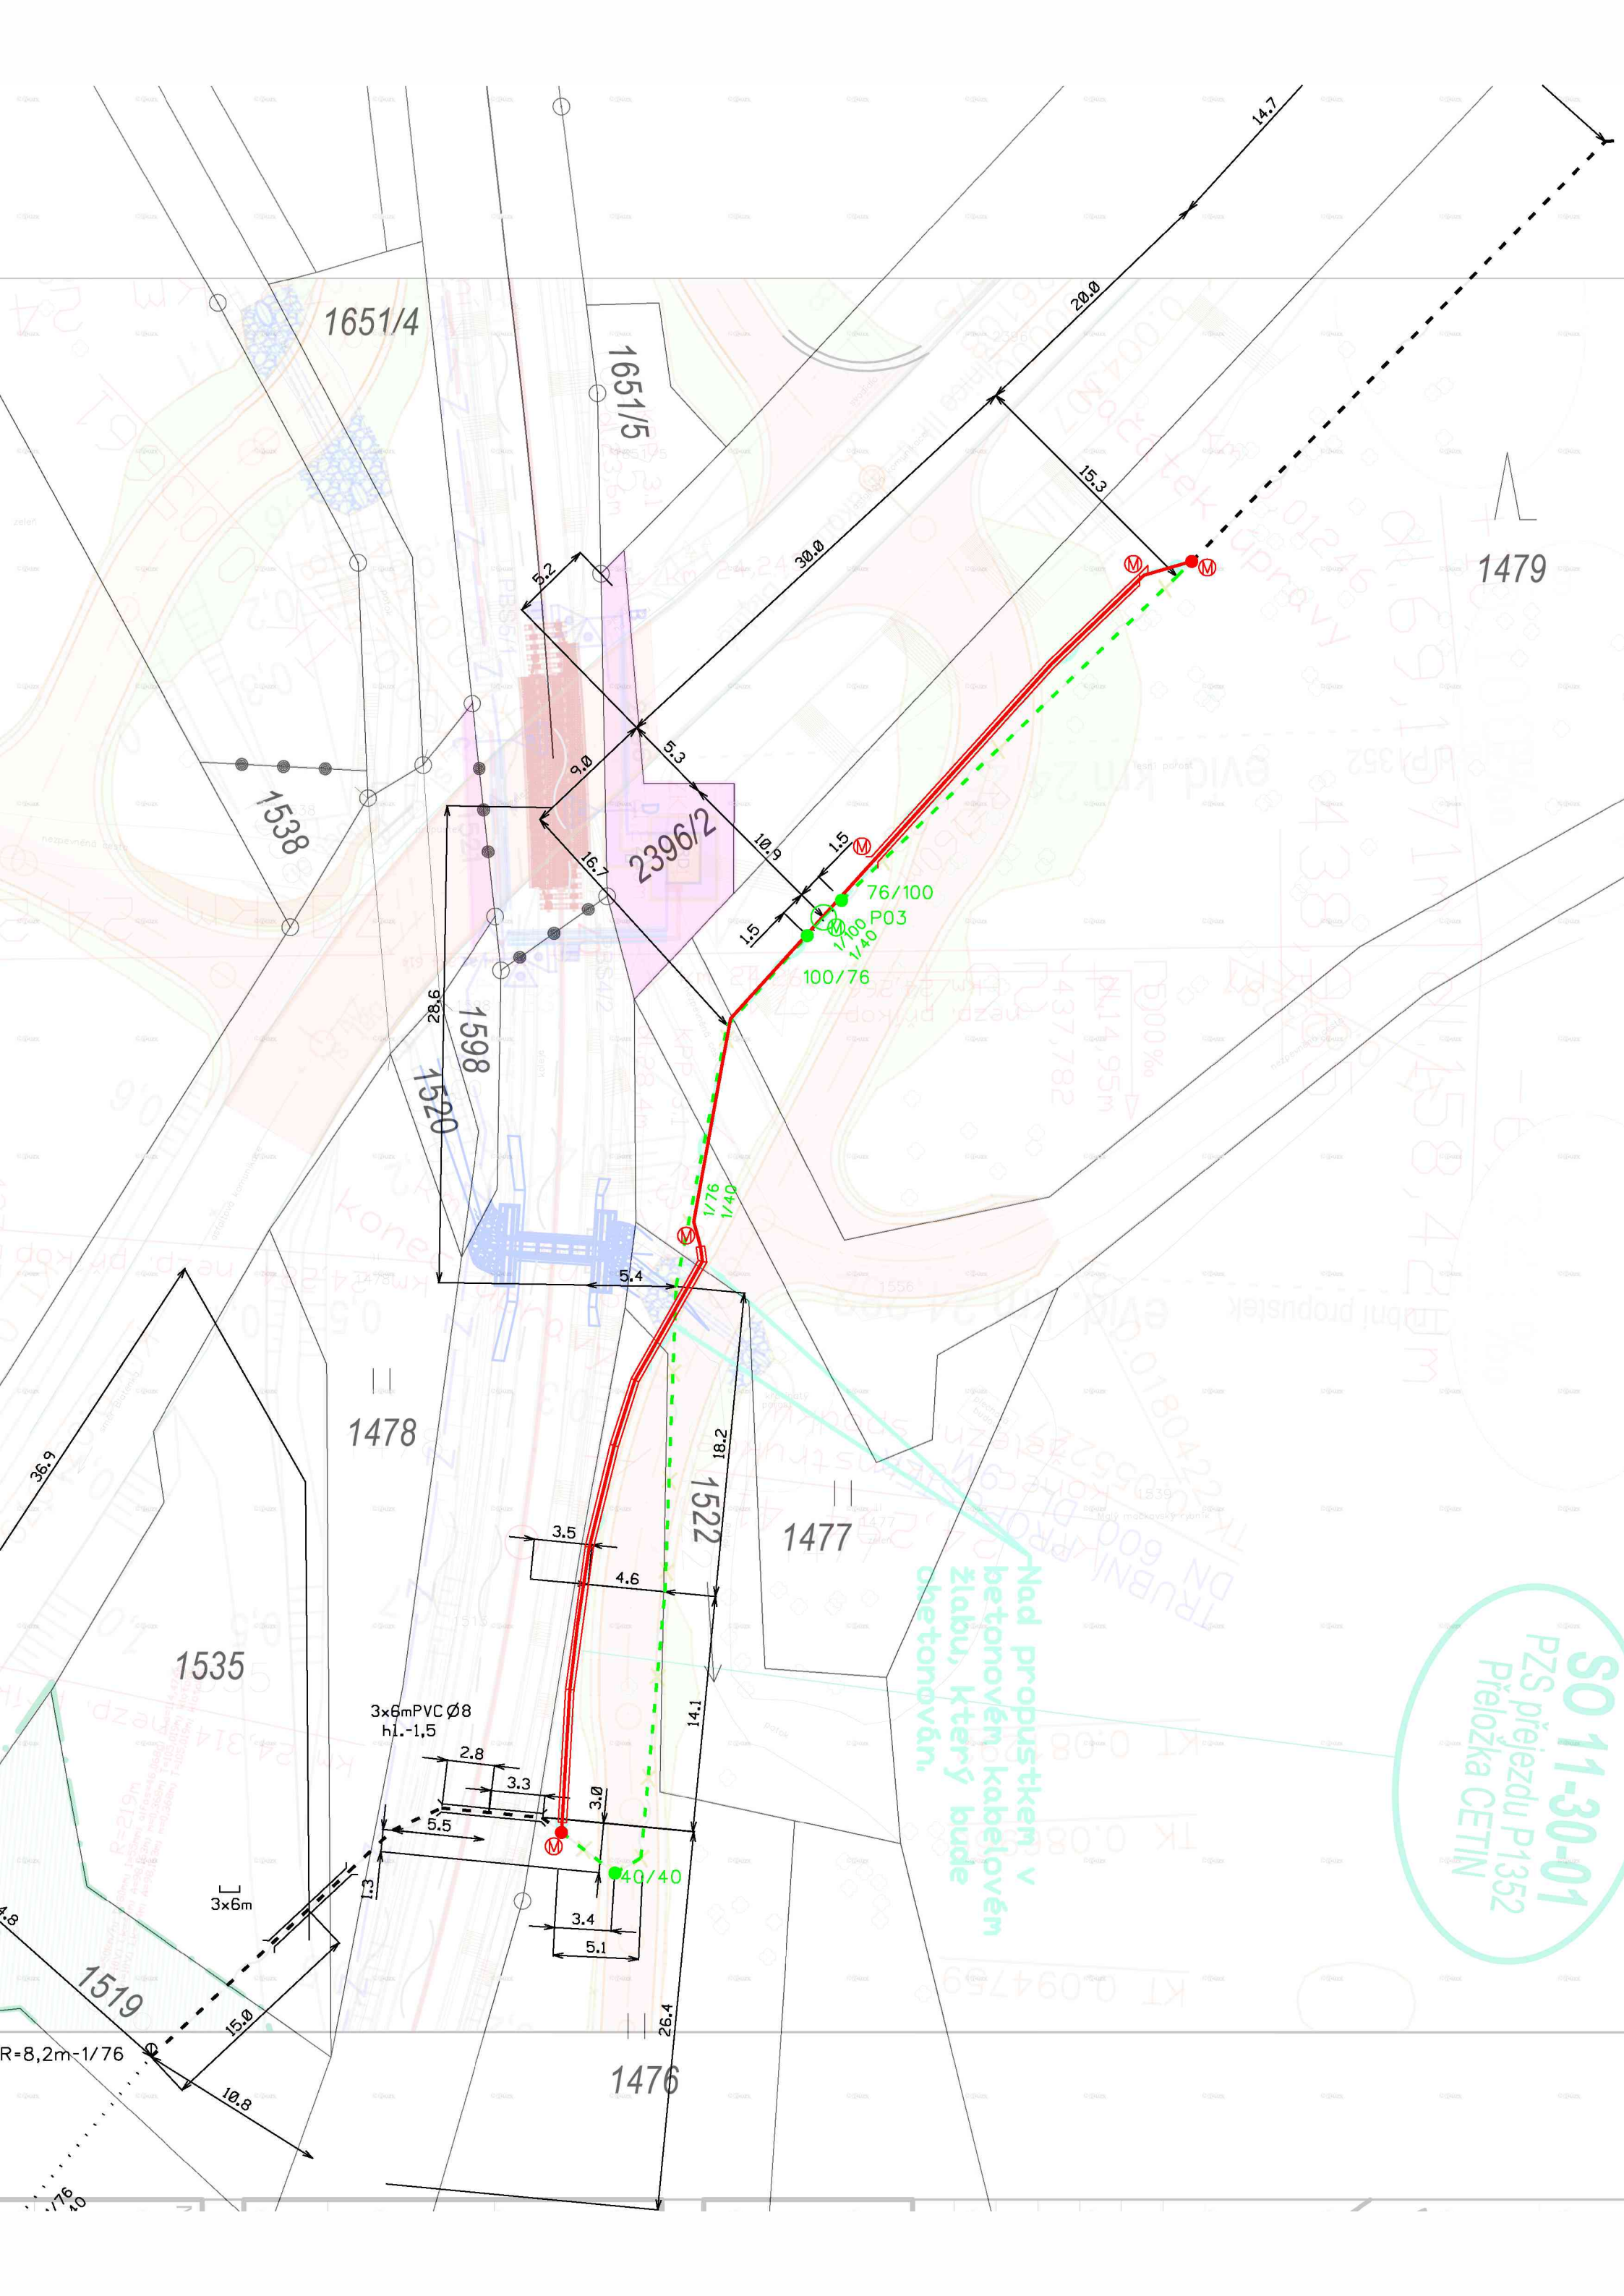

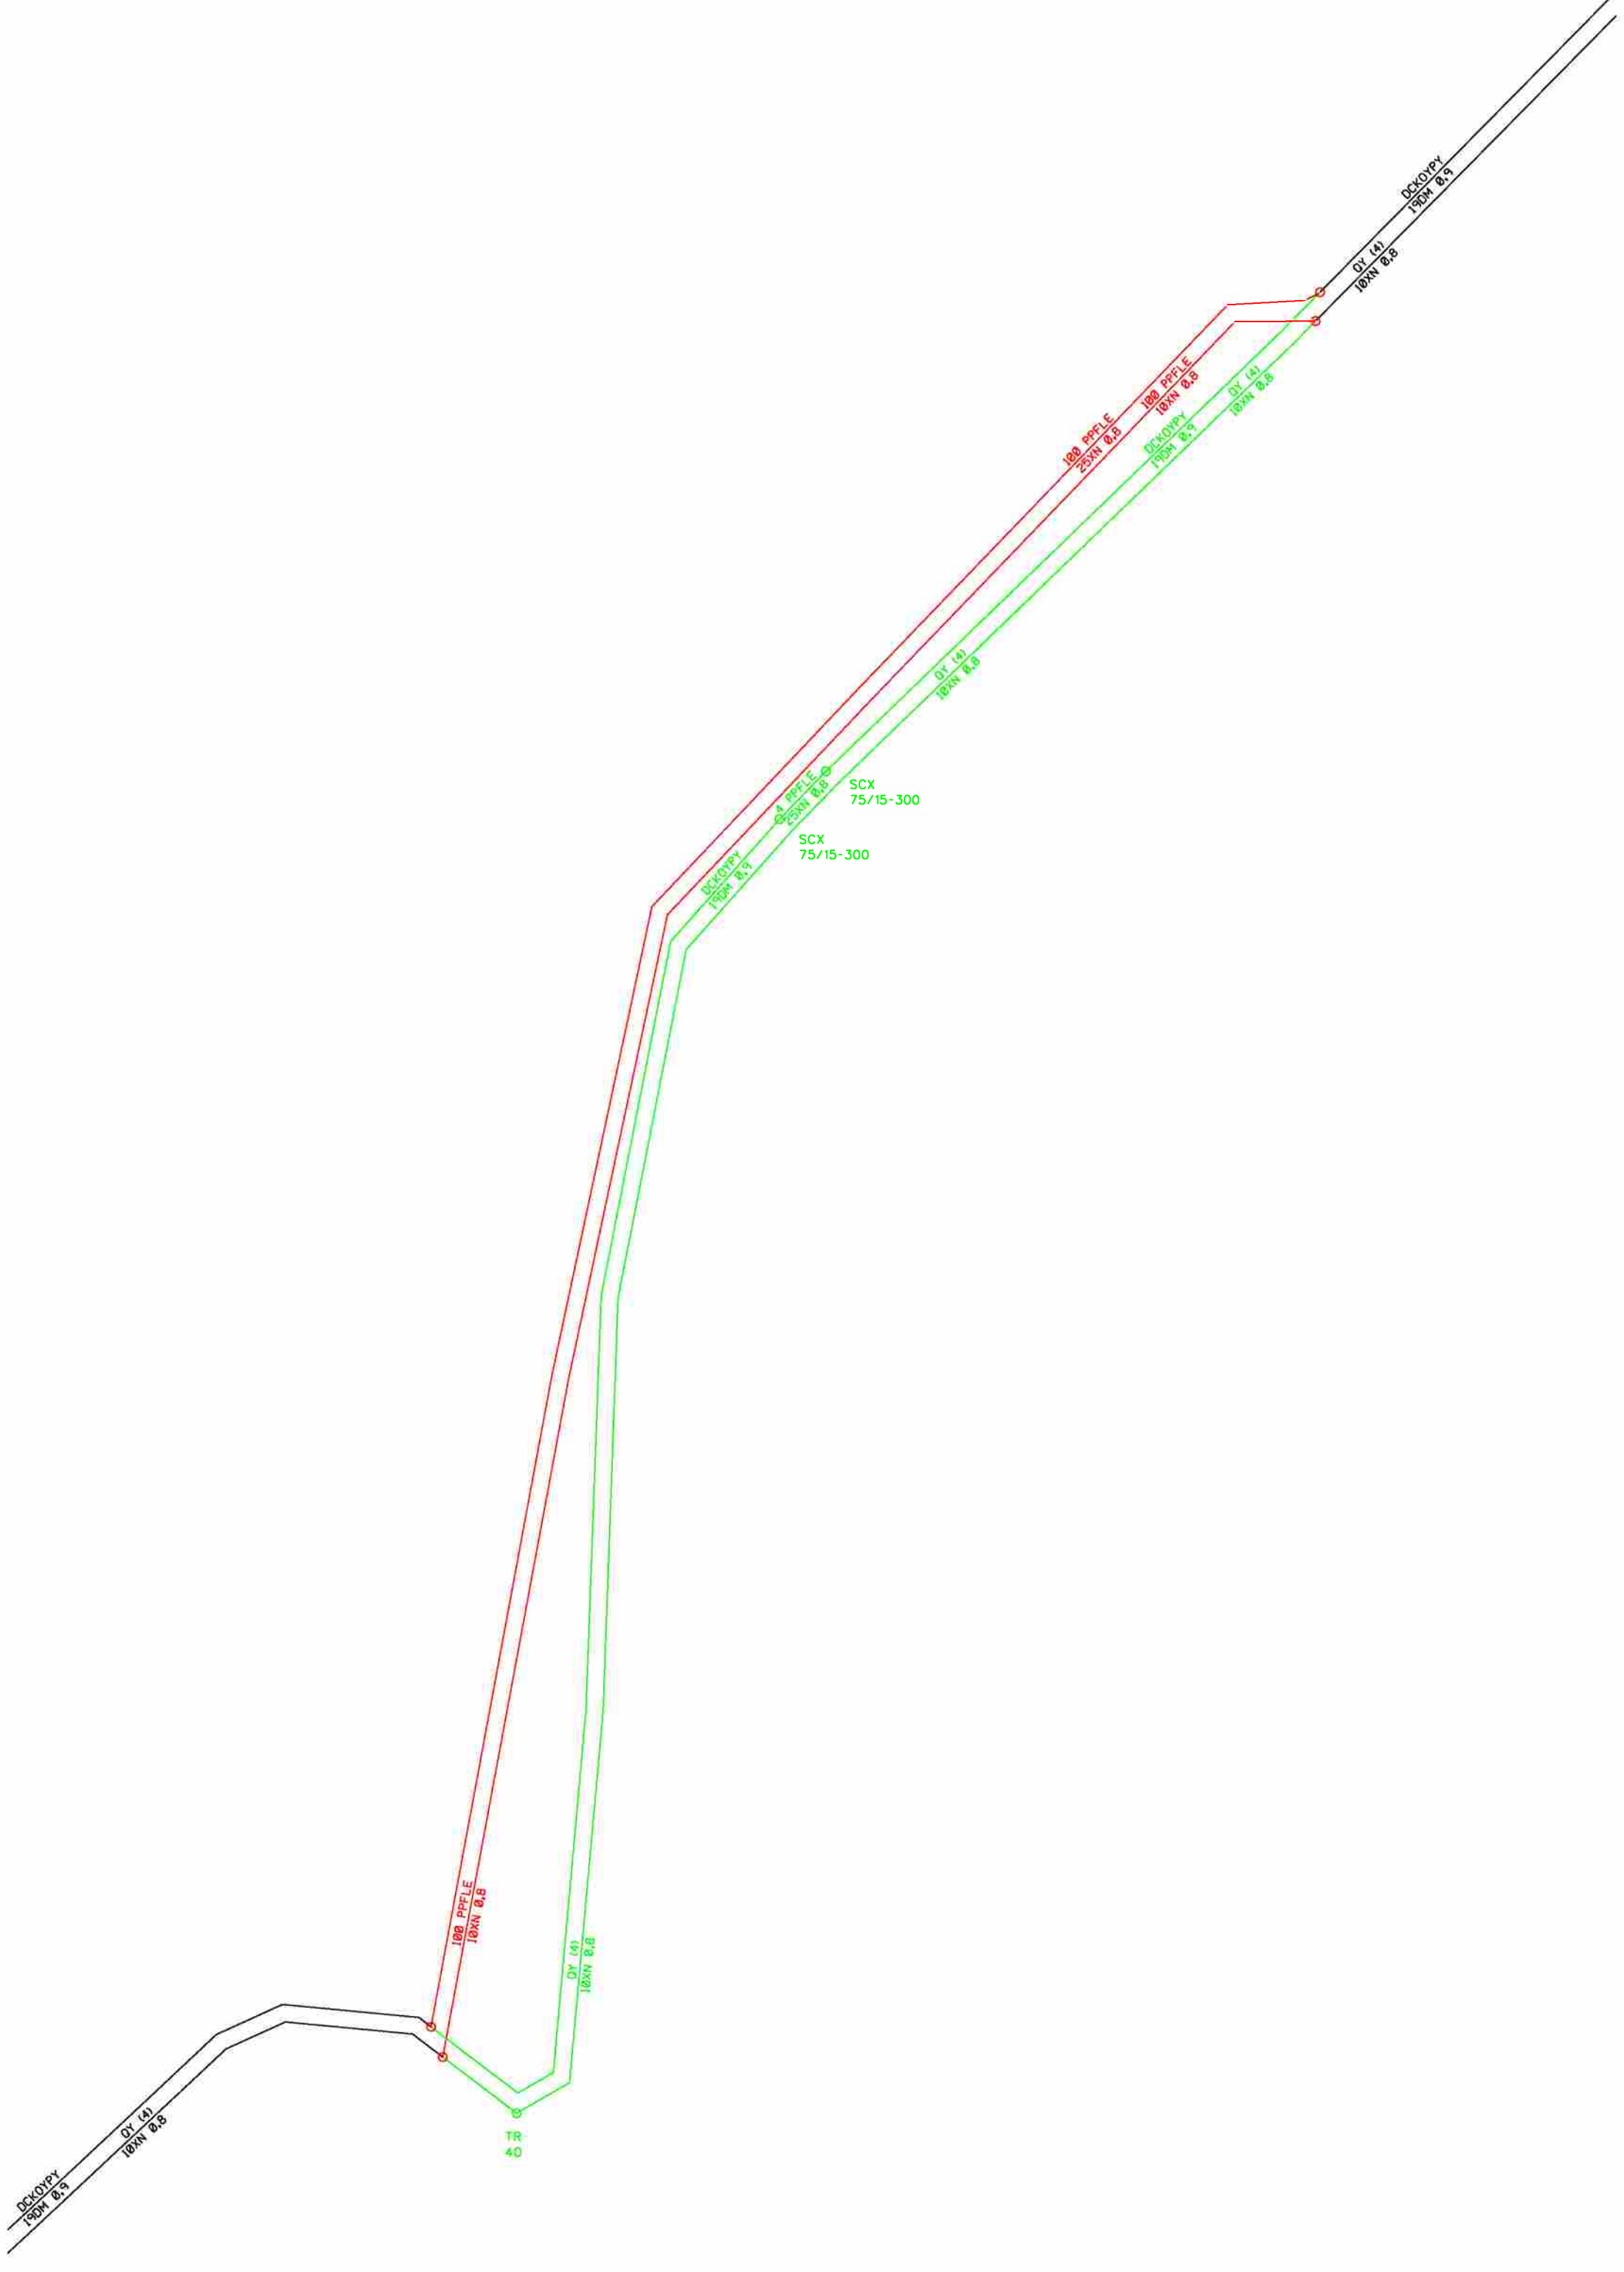

Název stavby: VPIC SŽ-Blatná(ST),žel.přejezd P1352
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Jiří Syrový
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.101	KMP:	7.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.200	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	██████████
ZEMNÍ PRÁCE	██████████
MONTÁŽ	██████████
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	██████████
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	██████████
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	██████████
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	██████████
PROVOZNÍ PRÁCE	██████████
MATERIÁL DOD. CETIN	██████████
MATERIÁL VYŘAZENÝ	██████████
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovan	██████████
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov	██████████
POPLATKY	██████████

Celkové náklady: ██████████

STAVEBNÍ ČINNOST ██████████
NESTAVEBNÍ ČINNOST ██████████

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	██████████	██████████
	ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	██████████	██████████
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	██████████	██████████
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	██████████	██████████
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	██████████	██████████
	MONTÁŽ			

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	██████	██████
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	██████	██████
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	██████	██████
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	██████	██████
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	██████	██████
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	██████	██████
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	██████	██████
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	██████	██████
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	██████	██████
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	██████	██████
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	██████	██████
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	██████	██████
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	██████	██████
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	██████	██████
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	██████	██████
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	██████	██████
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	██████	██████

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	██████	██████
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	██████	██████
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	██████	██████
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	██████	██████
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	██████	██████
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	██████	██████
410636 S		Souprava čistící metallic. kabelů - velká	██████	██████
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	██████	██████
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	██████	██████
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	██████	██████



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne:	2. 11. 2022
Vyznačeno dne:	7. 11. 2022
Vyznačil:	[redacted]



CRDUX00JLZPH

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0044/22-10/Kom

V Plzni dne 3. října 2022

Č. j.: DUCR-59564/22/Kom

Telefon: [redacted]

Oprávněná úřední osoba: [redacted]

E-mail: [redacted]

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"R e k o n s t r u k c e a d o p l n ě n í z á v o r n a p ř e j e z d u P 1 3 5 2 v
k m 2 4 , 2 5 4 "**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO:70994234

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555

Stavba je členěna na:

PS 11-01-31 Zabezpečení přejezdu P1352 v km 24,254

PS 11-01-32 Úprava přejezdu P1348 v km 23,017

SO 11-10-01 Železniční svršek

SO 11-11-01 Železniční spodek

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce

SO 11-21-01 Trubní propustek v ev. km 24,282

SO 11-30-01 Přeložka CETIN

SO 11-50-01 Pozemní komunikace

SO 11-86-01 Přípojka NN pro napájení RD

Pozemky pro realizaci stavby:

na pozemcích parc. č. 1651/4, 2088/7, 2385, 1651/5, 1651/128, 2396, 1651/38, 1651/121 a 2119/1 v k.ú. Blatná,

na pozemcích parc. č. 695, 1521, 1520, 1598, 1478, 1479, 1556, 1477, 1522, 1476, 1523, 1519 a 1538 v k.ú. Mačkov.

Stručný popis stavby:

Cílem stavby je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P1352 a zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu na uvedeném přejezdu.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.

14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
 - Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 1706/2022 ze dne 31.1.2022,
 - Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, č.j.: MUBL 7429/2021 ze dne 20.5.2021,
 - Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, č.j.: MUBL 12326/2022 ze dne 19.7.2022,
 - Městský úřad Blatná, odbor dopravy, č.j.: MUBL 9963/2022 ze dne 13.6.2022 a č.j.: MUBL 8962/2022 ze dne 23.6.2022,
 - Obecní úřad Mačkov, č.j.: OUM 159/2022 ze dne 24.6.2022,
 - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, č.j.: KRPC-146080-2/ČJ-2021-020706 ze dne 10.1.2022,
 - Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn.: 119961/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 8.11.2021,
 - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j.: KHSJC 40437/2021/HOK.PI-PT-ST ze dne 6.12.2021.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření účastníků řízení:
 - CETIN a.s., č.j.: 817266/21 ze dne 17.11.2021,
 - ČD-Telematika a.s., č.j.: 1202204281 ze dne 24.2.2022,
 - EG.D, a.s., č.j.: I12394-27046254 ze dne 11.11.2021,
 - EG.D, a.s., č.j.: F5285-27046253 ze dne 15.10.2021,
 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zn.: SÚS JČK 23297/2021 ze dne 7.1.2022,
 - Archeologický ústav AV ČR, č.j.: ARUP-4387/2022 ze dne 22.6.2022.
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
22. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena

předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.10.2024**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO:70994234 zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555
- Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná, IČO:00250996
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294/, 38611 Strakonice, IČO:70971641
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1, IČO:67985912
- Obec Mačkov, 75/, 38801 Mačkov, IČO:00667684
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha, IČO:61459445
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5/, 37001 České Budějovice, IČO:70889953
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Hildprandt Jan, Svážná 939/, 25229 Dobřichovice, nar. 17.3.1957
- Fojtík Petr, Mačkov 64/, 38801 Blatná, nar. 17.6.1984
- Dlouhý Josef, Blatenka 13/, 38801 Blatná, nar. 20.6.1980
- Philippos Germenis Hildprandt Stephanos, Betlémská 267/9, 11000 Praha, nar. 3.8.1981
- Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32/, 38801 Blatná, IČO:25168568

O d ů v o d n ě n í

Zástupce stavebníka SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555 podal dne 12. října 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-9658/22/Kom ze dne 16.2.2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-9639/22/Kom ze dne 16.2.2022. Přerušeno společného územního a stavebního řízení bylo prodlouženo usnesením č.j.: DUCR-24775/22/Kom ze dne 28.4.2022. Všechny nedostatky žádosti byly následně odstraněny.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Blatná, odborem výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 1706/2022 ze dne 31.1.2022. Drážní úřad oznámil (oznámení č. j.: DUCR-48831/22/Kom ze dne 26.8.2022) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námítky mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů od obdržení uvedeného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů,
- stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- plná moc zmocnitele Správa železnic, s.o. pro zmocněnce Sagasta s.r.o.,

- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Sagasta s.r.o, Ing. Stanislav Rýznar, ČKAIT 0013660.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.


ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:


Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4
- Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294/, 38611 Strakonice
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
- Obec Mačkov, 75/, 38801 Mačkov
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5/, 37001 České Budějovice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- E.G.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno
- Hildprandt Jan, Svážná 939/, 25229 Dobřichovice
- Fojtík Petr, Mačkov 64/, 38801 Blatná
- Dlouhý Josef, Blatenka 13/, 38801 Blatná
- Philippos Germenis Hildprandt Stephanos, Betlémská 267/9, 11000 Praha
- Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32/, 38801 Blatná

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, obvodní oddělení Strakonice, Na Ohradě 1067/, 38601 Strakonice I
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice
- Městský úřad Blatná, odbor majetku města, investic a rozvoje, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Městský úřad Blatná, odbor dopravy, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Obecní úřad Mačkov, 75/, 38801 Mačkov
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Spis



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0044/22-13/Kom

V Plzni dne 23. listopadu 2022

Č. j.: DUCR-71829/22/Kom

Telefon: [REDACTED]

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

rozhodl

na žádost žadatele **SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555** ze dne **14.11.2022** o opravě zřejmých nesprávností v názvu stavby ve společném povolení pro stavbu dráhy č.j. **DUCR-59564/22/Kom ze dne 3.10.2022**.

Byl chybně uveden název stavby

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P1352 v km 24,254.

Správně měl být uveden název stavby

Výstavba PZS (P1352) v km 24,254 trati Březnice - Strakonice.

Účastníci řízení (§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO:70994234 zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná, IČO:00250996

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294/, 38611 Strakonice, IČO:70971641

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1, IČO:67985912

Obec Mačkov, 75/, 38801 Mačkov, IČO:00667684

ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha, IČO:61459445

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5/, 37001 České Budějovice, IČO:70889953

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400

Hildprandt Jan, Svážná 939/, 25229 Dobřichovice, nar. 17.3.1957

Fojtík Petr, Mačkov 64/, 38801 Blatná, nar. 17.6.1984

Dlouhý Josef, Blatenka 13/, 38801 Blatná, nar. 20.6.1980

Philippos Germenis Hildprandt Stephanos, Betlémská 267/9, 11000 Praha, nar. 3.8.1981

Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32/, 38801 Blatná, IČO:25168568

Odůvodnění

V daném případě se jedná o zjevný administrativní omyl ohledně názvu stavby. Opravou této chyby nedochází ke změně obsahu rozhodnutí o společném povolení.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

[Redacted]
Ředitel územního odboru Plzeň

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294/, 38611 Strakonice

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1

Obec Mačkov, 75/, 38801 Mačkov

ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Táborem 369/8a, 19000 Praha

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní vltava, Litvínovická 5/, 37001 České Budějovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno

Hildprandt Jan, Svážná 939/, 25229 Dobřichovice

Fojtík Petr, Mačkov 64/, 38801 Blatná

Dlouhý Josef, Blatenka 13/, 38801 Blatná

Philippos Germenis Hildprandt Stephanos, Betlémská 267/9, 11000 Praha

Zemědělství Blatná, a.s., Čechova 32/, 38801 Blatná

Dotčené orgány:

Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, obvodní oddělení Strakonice, Na Ohradě 1067/, 38601 Strakonice 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice

Městský úřad Blatná, odbor majetku města, investic a rozvoje, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná

Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná

Obecní úřad Mačkov, 75/, 38801 Mačkov

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Spis

POVĚŘENÍ Č. 40/2021

Pověřuji

████████████████████

narozeného dne ██████████, zaměstnance Správy železnic, státní organizace, v pozici náměstka ředitele OJ, v souladu s ustanovením čl. 3.4 a 3.5 Podpisového řádu, Správy železnic, státní organizace a § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, k podepisování písemností odpovídajícím pravomocem ředitele Stavební správy západ, a to **ve své územní působnosti** v následujících věcech:

- plných mocí zhotovitelům pro plnění povinností zastupovat Správu železnic, státní organizaci z již uzavřených smluv o dílo při jednání s dotčenými úřady a vlastníky pozemků a staveb, případně s jinými dotčenými subjekty ve správních řízeních včetně jejich odvolání;
- smluv o zřízení věcného břemene, smluv o plnění majícím povahu věcného břemene, smluv o právu stavby (dle OZ) - vše na cizím majetku do 500 000,- Kč včetně smluv o smlouvách budoucích dle bodu 20. přílohy A podpisového řádu, a to včetně podepsání návrhu na vklad;
- smluv včetně smluv o smlouvách budoucích na přeložky inženýrských sítí včetně jejich změn a ukončení (např. smlouvy s ČEZ, ČEVAK, CETIN) do 100 000,- Kč;
- bezúplatných smluv k převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebních povolení včetně jejich změn a ukončení;
- dohod o předčasném užívání staveb mezi zhotovitelem a stavebníkem;
- objednávek v souvislosti s investičními akcemi v působnosti SSZ až do výše plnění 50 000,- Kč (zejména nákup materiálu, prací a služeb hrazených ze zdrojů Plánu investiční výstavby);
- dokumentace obsahující dodatečné vysvětlení k zadávací dokumentaci např. vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace,

a to vše v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy.

Pro vyloučení pochybností konstatuji, že tímto pověřením zrušuji veškerá dříve vydaná pověření.

Pověření je uděleno na dobu platnosti jmenovacího dekretu, kterým byl pověřený zaměstnanec jmenován do funkce náměstka ředitele OJ. Odvoláním zaměstnance z výše uvedené funkce pověření zaniká.

V Praze:

████████████████████
.....

ředitel OJ
Stavební správa západ

Toto pověření v plném rozsahu přijímám:

V Praze:

████████████████████
.....

náměstek ředitele OJ
Stavební správa západ

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Praha

Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 1889/11004/18

vlastnoručně podepsal

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

adresa místa trvalého pobytu

občanský průkaz

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny Legalizaci provedl/a:

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

V Praze dne 12.11.2021

Podpis:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **143990605-231969-211208100535**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Menclerová Markéta - notářka**

Pracoviště: **Menclerová Markéta - notářka**

V Praze dne 08.12.2021



143990605-231969-211208100535

Rozšíření pověření č. 40/2021

(č. 40-3/2021)

Pověřuji

██████████
narozeného dne ██████████, zaměstnance Správy železnic, státní organizace, v pozici náměstka ředitele OJ, v souladu s ustanovením čl. 3.4 a 3.5 Podpisového řádu, Správy železnic, státní organizace a § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, k podepisování písemností odpovídajícím pravomocem ředitele Stavební správy západ, a to ve své územní působnosti v následujících věcech:

- smluv včetně smluv o smlouvách budoucích na přeložky inženýrských sítí včetně jejich změn a ukončení (např. smlouvy s ČEZ, ČEVAK, CETIN) do 2 000 000,- Kč,

a to vše v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy.

Pro vyloučení pochybností konstatuji, že tímto pověřením rozšiřuji dříve vydané pověření s č. 40/2021, a to včetně jeho rozšíření č. 40-1/2021 a 40-2/2021, které nadále zůstává v platnosti.

Pověření je uděleno na dobu platnosti jmenovacího dekretu, kterým byl pověřený zaměstnanec jmenován do funkce náměstka ředitele OJ. Odvoláním zaměstnance z výše uvedené funkce pověření zaniká.

V Praze:

Toto pověření v plném rozsahu přijímám:
V Praze:

██████████
10.02.2022 09:17
Podepsáno elektronicky
██████████
Stavební správa západ
Digitálně podepsal ██████████
Datum: 2022.02.14
10:36:10 +01'00'
██████████
náměstek ředitele OJ
Stavební správa západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2485467

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 865808d6-b267-4c9d-8066-dc9b897e38f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.02.2022 16:24:04



e9754228-0795-4301-813d-492f77cc73fe

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana


Supervizor, VFS Čechy jih

os. č. 

(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích a rozhodnutí odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.
