

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2023/00217**

mezi

CETIN a.s.

a

město Tišnov

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená xxx, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření

ev.č. PŘ/3892/2023

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, Tišnov 666 01

IČO: 00282707

DIČ: 00282707

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

datová schránka: qzjbhat

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Tišnov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 10.8.2023 vydané pod čj. 227192/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.364.098,- Kč** (slovy: jeden milion tři sta šedesát čtyři tisíc devadesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
 Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **6.760,- Kč** (slovy: šest tisíc sedm set šedesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: xxx
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: xxx ,tel.: xxx

ve věcech technických: xxx
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxx, tel.: xxx

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
funkce: starosta města
e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz, tel.: 549439811

ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková
funkce: vedoucí Odboru investic a projektové podpory
e-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz, tel.: 549439816

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2023/00217
Číslo smlouvy Stavebníka: OIPP/0025/24/SML

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 1/2024 dne 10. 1. 2024.

CETIN:

Stavebník:

V Brně 24. 1. 2024

V Tišnově 29. 1. 2024

CETIN a.s.

xxx

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

město Tišnov

Bc. Jiří Dospíšil
Starosta města

CETIN a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 69356/23/0003

Název

VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru

Budoucí uživatel

GMO-BO Vašák Pavel
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Petr Švestka
Petr Švestka

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	Bez určení
Číslo interní:	69356/23/0003
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	VÚJ 2 - Tišnov(Bezručova)-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	36.154 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.365 km	kmk mk	2832.877 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	2779.57 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	28.6 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.372 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříň SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříň SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříň SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.240	0 ks		
Sloupek rozdělovací ODF rDSLAM hl.350	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák.	0 ks		
Sestava 900D + měření vč. základny	0 ks		
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny	0 ks		
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák.	0 ks		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	18.10.2023
Plánované ukončení přípravy:	15.12.2023
Plánované zahájení realizace:	15.06.2024
Plánované ukončení realizace:	15.12.2024
Nabídka k přejímce (Plán):	15.10.2024

1.2 Účel stavby:

Požadavek IPMS int.č. 69356/23/0003 na zpracování CTN: VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru
--

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 69356/23/0003 na zpracování CTN: VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru

2.2 Navrhované řešení:

Cenový a technický návrh (CTN) řeší překládku SEK spol. CETIN v Tišnově, z důvodu revitalizace náměstí Míru. Pro předmětný CTN bylo využito podkladů z předložené PD od Bc. Petra Vítka. Jedná se o stavební objekt SO 10. Kompletní Technická zpráva je obsažena v předložené PD.

Doplnění CTN:

- Nebude-li možné ukončit nové kabely PFLE ve stávajících rozvaděcích TISN2568, TISN2574, TISN2576, TISN2575 a TISN2578, bude použito kabelových spojek XAGA500. Kabely budou před RD naspojovány na kabely stávající.
- Délka nového kabelu PFLE 35XN0,4 z děličky XAGA, umístěné v KK5 na kabelu PFLE 400XN0,4, byla navýšena na 120m. Kabel bude vyveden až z KK5, viz. SO10_02_situace CETIN.dwg.
- V tomto CTN je, pro případ potřeby, kalkulováno se stavebními úpravami KK4 a KK5.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu PFLE 0,4

Spojky XAGA500

Mini Markér Ball

PE160, SYSPRO160/110

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Městský úřad Tišnov; nám. Míru 111; 666 01 Tišnov 1. IČ: 00282707. V zastoupení: Bc. Jiřím Dospíšilem - starosta, tel.: 549439811, e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz

Žadatelka o překládku: Ing. Miroslava Vyhňáková; Odbor investic a projektové podpory; Městský úřad Tišnov. Mob.: 732500862; E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Michal Novotný, MT: 725 743 505 _ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: stavebník zajistil PD pro překládku

ÚR: Stavební titul zajistí stavebník

VBR: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom (pouze na novou trasu PVSEK)

GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

SoUZ: NE

PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušeni metalických kabelů) min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkům provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy


5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Podklady od stavebníka.zip	SD
Zadávací podklady.xlsx	SD
Vyjádření o existenci SEK včetně DP POS.zip	SD

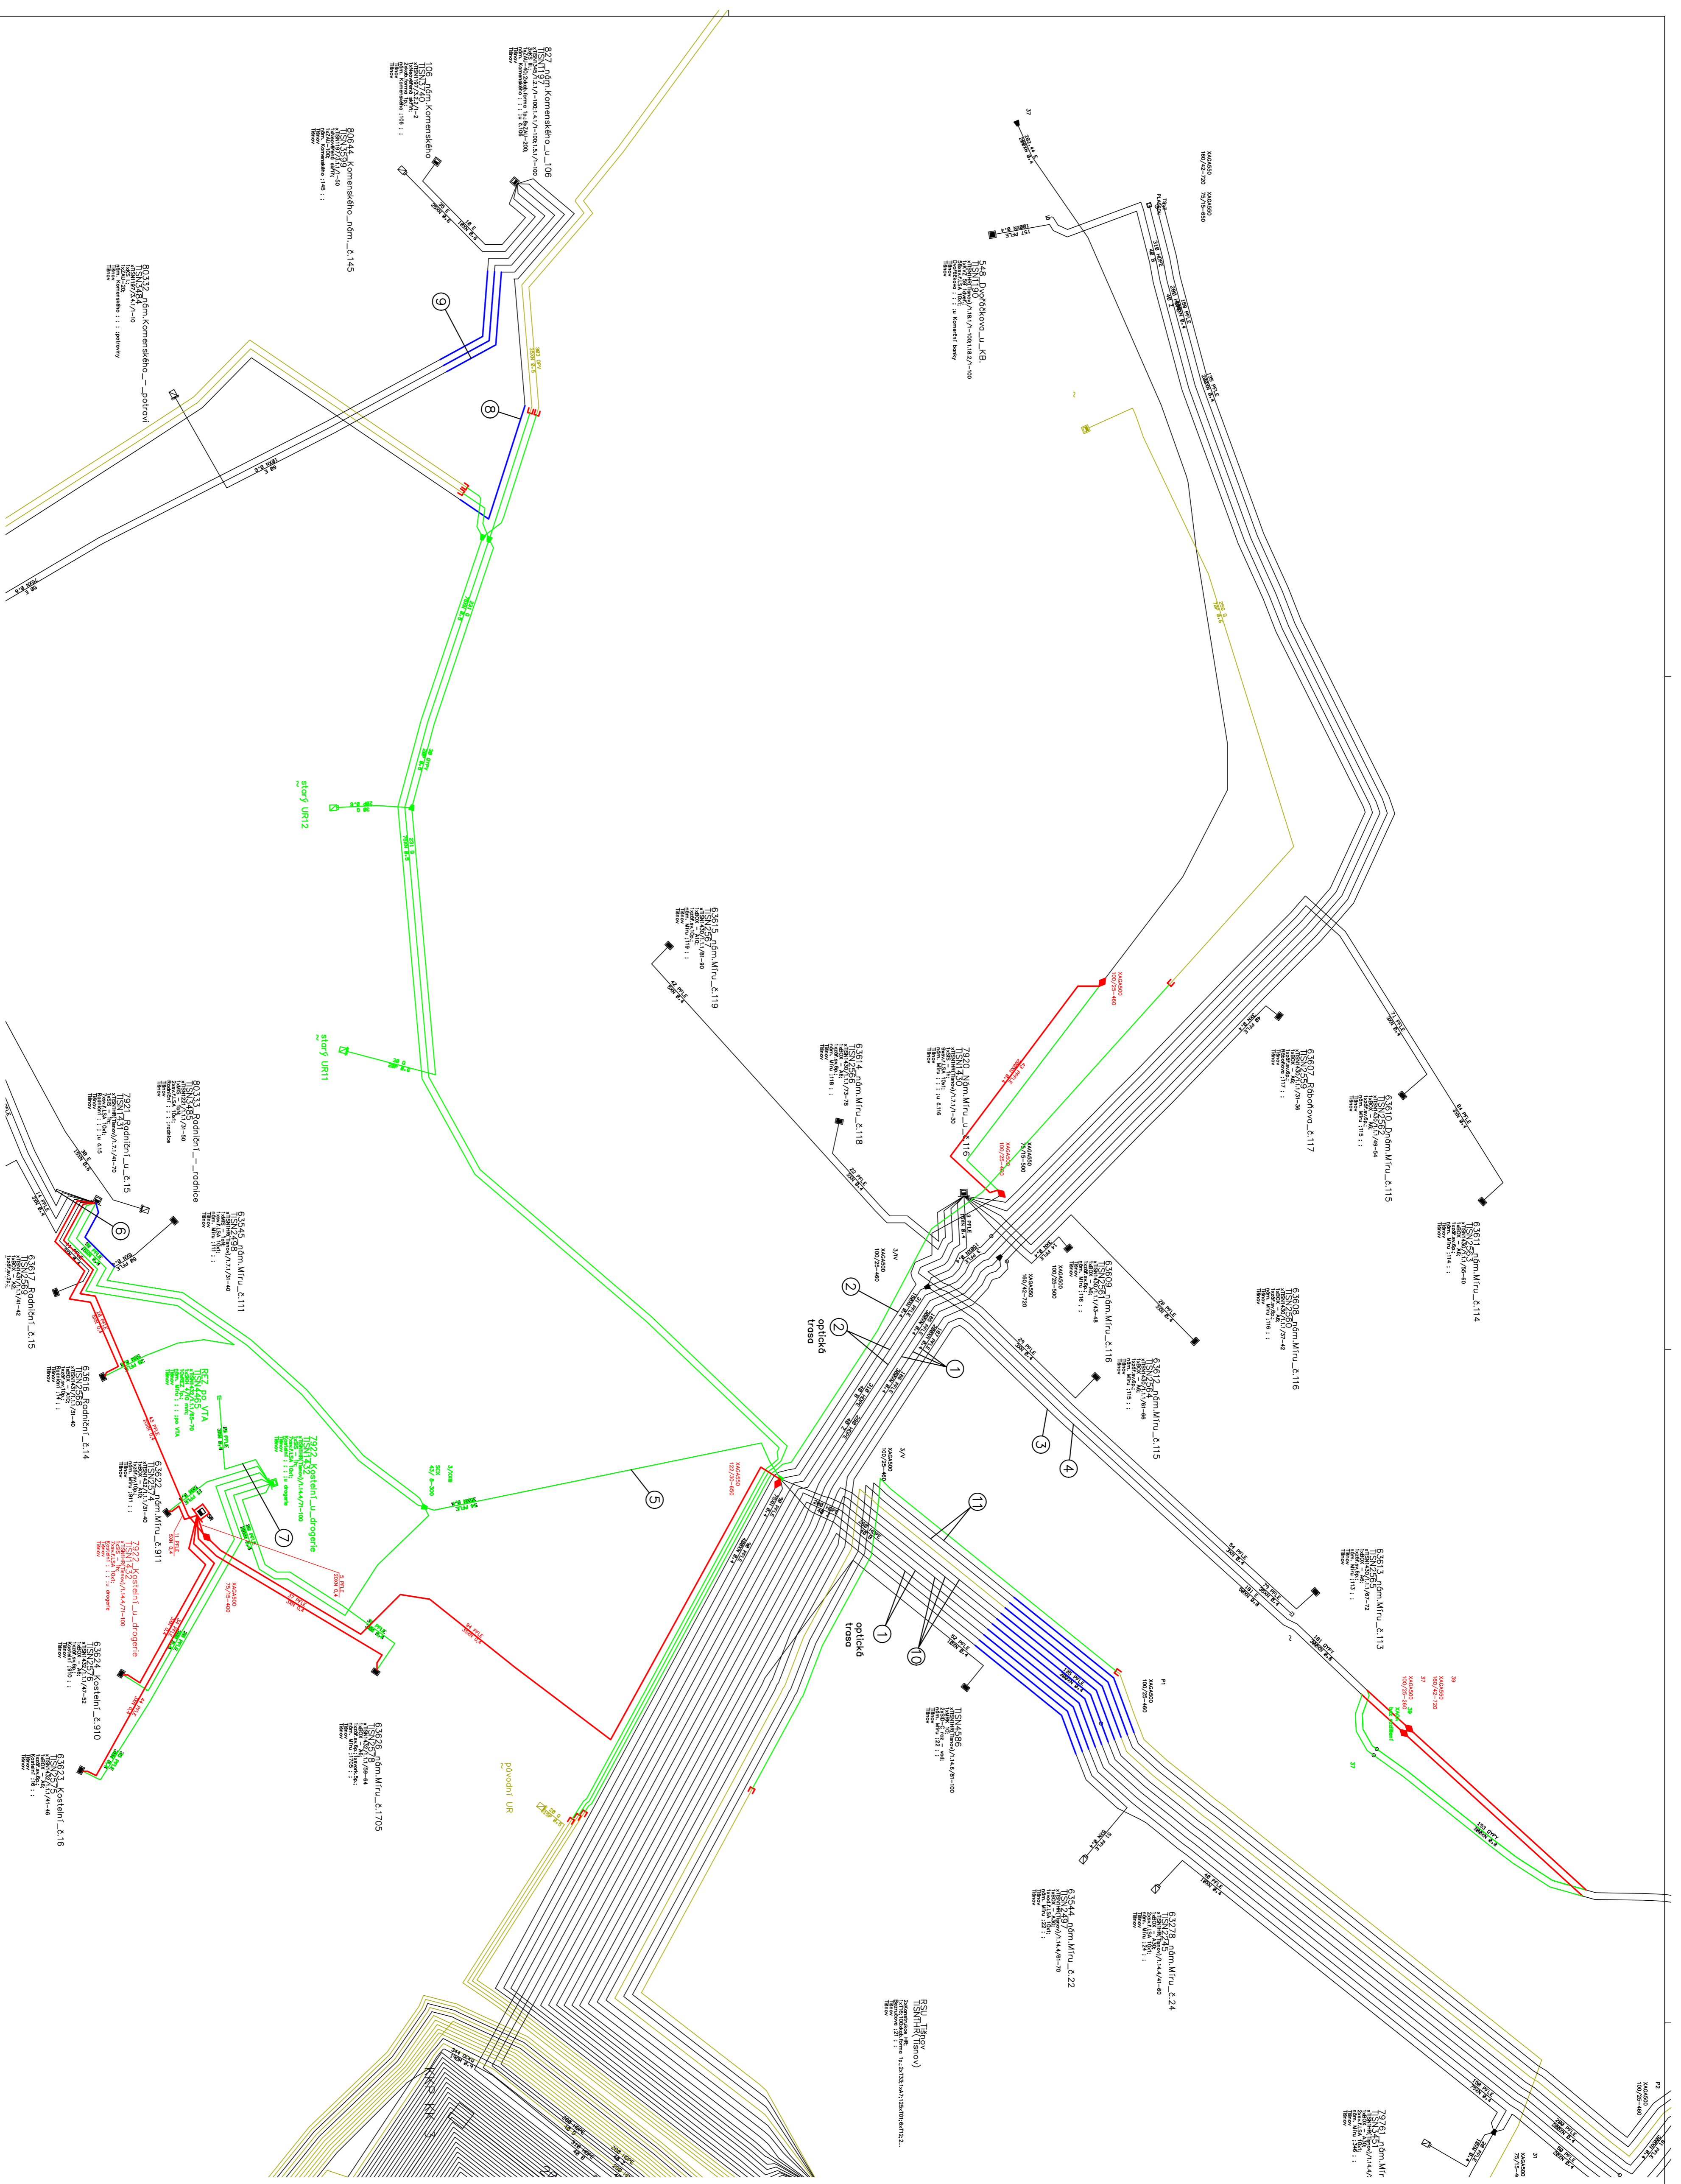

Algora projektová s.r.o.	
VED. PROJEKTANT:	Ing. Karel Algora
VYPRACOVAVL:	Bc. Petr Vitek
INVESTOR:	Město Tisnov, náměstí Míra 111 666 01 Tisnov
ADRESA:	Revitalizace náměstí míru v Tisnově Přeložky PVSEK CETIIN
DATA:	14.4.2023
STRANA:	1/1
SLABOPROUD:	ČÍSLO VYKRESU: 03

ŘEZ KOMUNIKACÍ
M 1:10

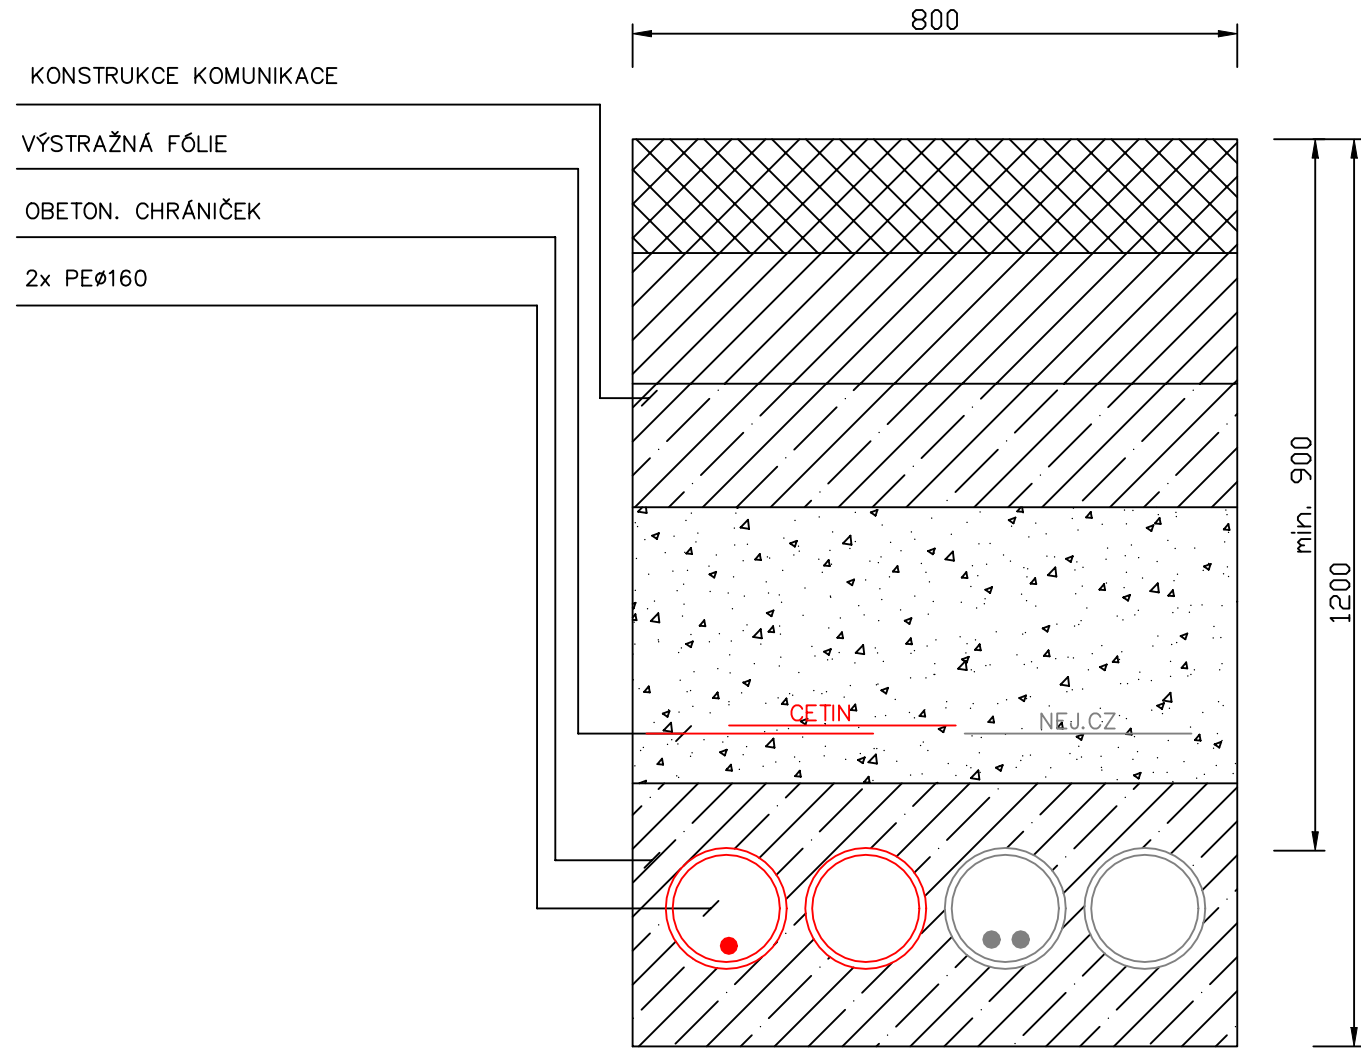

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
OBETON. CHRÁNIČEK
2x PEØ160


TCEPKPFLE 35XN0,4
v PEØ160

REZ. PEØ160

2x COAX 6
v PEØ160

rez. chr. PEØ160

ŘEZ CHODNÍKEM, TERÉNEM
M 1:10

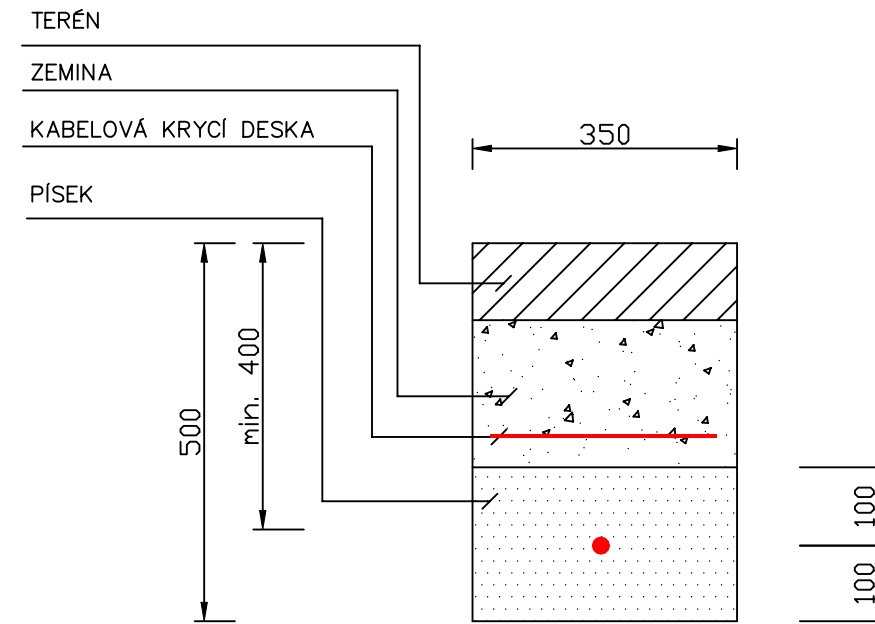

TERÉN
ZEMINA
KABELOVÁ KRYCÍ DESKA
PISEK

TCEPKPFLE 35XN0,4

VED.PROJEKTANT: Ing. Karel Alexa	ZODP.PROJEKTANT: ing. Karel Alexa <i>K.Alexa</i>	VYPRACOVAL: Bc. Petr Vítek <i>P.Vitek</i>	Alexa-projekce s.r.o. Projekce sdělovacích rozvodů Sídlo: Mikšíčkova 1060/9, Židenice, 615 00 Brno Kancelář: Minská 27a, 616 00 Brno tel.: 608 770 745, 737 760 440	
INVESTOR: Město Tišnov, náměstí Míru 111 666 01 Tišnov			FORMÁT:	A4
AKCE: Revitalizace náměstí míru v Tišnově Přeložky PVSEK CETIN			DATUM:	06/2023
VÝKRES: Vzorové řezy			STUPEŇ:	PSP
			ZAK.ČÍSLO:	4496-01-23
			SLABOPROUD	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
				04



- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - STAVAJÍCÍ
- ~ — sdělovací kabel podzemní CETIN
 - ~ — sdělovací kabel podzemní CETIN - úsek ke zrušení
 - ~ — sdělovací kabel podzemní CETIN - přeložka - nová trasa
 - ~ — sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ
 - ~ — sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ - úsek ke zrušení
 - ~ — sdělovací kabel podzemní NEJ.CZ - přeložka - nová trasa
 - ~ — sdělovací kabel podzemní metropolitní síť
 - ~ — sdělovací kabel podzemní metropolitní síť - nová trasa

VED. PROJEKTANT: Ing. Karel Alexa	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Karel Alexa <i>K.Alexa</i>	VYPRACOVAL: Bc. Petr Víták	Alexa-projekce s.r.o. Projekce sdělovacích rozvodů Právní ústav: 150/9, Dvůr, 65 00 Brno Kontak: Mladá 24, 602 00 Brno tel.: 602 775 745, 777 900 440
INVESTOR: Město Třebov, náměstí Míru 111 666 01 Třebov	AKCE: Revitalizace náměstí Míru v Tišnově SO 10 Přeložka sdělovacího vedení sítě CETIN	FORMÁT: 12 A4 DATUM: 06/2023 STUPEŇ: DÚR ZAK. ČÍSLO: 4496-01-23 SLABOPROUD	MĚŘITKO: 1:250 ČÍSLO VÝKR.: C.2
VÝKRES: Katastrální situace			

k. ú. Tišnov	Parcelní číslo:	Výměra [m2]:	Způsob využití:	Druh pozemku:	Vlastnické právo	Číslo LV	Způsob ochrany nemovitosti
SO 10	2308	932	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2321/3	2175	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2763/2	147	manipulační plocha	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2318/1	4375	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2323/13	1265	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2311/1	389	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	nemovitá kulturní památka
	2322/4	1637	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2313	824	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
SO 11	2308	932	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2321/3	2175	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2322/4	1637	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2318/1	1637	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	
	2313	824	ostatní komunikace	ostatní plocha	Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov	1	

Specifikace nákladů dle CTN_VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2023.12

Položková 2023.12

Název stavby: **69356/23/0003 VPIC Tišnov-Revitalizace nám. Míru**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Kr. Pole

VUJ: Tišnov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	625 213,57 Kč
MONTÁŽ	503 324,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 197,31 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 650,13 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 657,23 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	546,41 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	181 749,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 1 364 098,07 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	1 346 631,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	17 466,34 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 759,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
951623 S		Čištění stáv.kab.prost.s kom. - stavba	20.00 m	1 324,80 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	102.00 m	2 670,36 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	7380.00 JV	7 380,00 Kč
Nový prostup z KK 4				
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	50.00 m	4 565,50 Kč
954944 S		Průvrt zdivem smíšeným tl. nad 600 mm včetně	5.00 ks	1 868,05 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	5.00 ks	220,60 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	128.00 m	86 050,56 Kč
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	55.00 m	48 870,80 Kč
952357 S		Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm	45.00 m	15 817,05 Kč
958765 S		Rýha v chodníku moz.50/130 rozš.o 10cm	138.00 m	66 314,52 Kč
952361 S		Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	26.00 m	31 378,88 Kč
958764 S		Rýha v chodníku mozaika 50/130	46.00 m	108 884,76 Kč

952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	22.00 m	19 548,32 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	5.00 m	2 353,55 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	15.00 m	1 895,10 Kč
954953 S	Rýha ve vozovce kostky 50/130	64.00 m	128 602,88 Kč
954963 S	Rýha ve vozovce kostky 50/130rozš.o 10cm	60.00 m	24 112,80 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	22.00 m	57 672,12 Kč
954956 S	Rýha vjezd kostky 35/70-90	4.00 m	4 975,00 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	372.00 m	5 487,00 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových	16.00 m	4 483,52 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	5.00 ks	737,40 Kč
MONTÁŽ			
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	295.00 m	11 708,55 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	135.00 m	3 700,35 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	3 165,92 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	749.00 ks	34 334,16 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	539.00 ks	16 428,72 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	320,76 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	593,61 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	604.00 ks	18 409,92 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	235.00 ks	8 981,70 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	10.00 ks	610,80 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 316,26 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifiko'	10.00 hod.	6 784,00 Kč
Odčerpání vody z KK			
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	124230.00 J	124 230,00 Kč
Rozpočtová rezerva			
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	172200.00 J	172 200,00 Kč
Úprava KK4 a KK5, viz. poznámky k PPD			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	5.00 ks	10 686,15 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	6.00 ks	8 701,32 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné - kvalifikovaná	5.00 hod.	3 392,00 Kč
Montáž SYSPRO			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	254.00 m	6 616,70 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	338.00 m	15 493,92 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	203.00 m	6 512,24 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 392,46 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	100.00 m	1 929,00 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	9594.00 JV	9 594,00 Kč
Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí			
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	83.00 ks	2 529,84 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks	5 751,72 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	5 446,92 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
955109 S	Zrušení objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	900,86 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	1 007,78 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks	2 991,38 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	79.00 ks	1 689,02 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	13.00 ks	2 380,69 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	962,31 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	7662.90 JV	7 662,90 Kč
	Vytyčení nové trasy SEK		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	230.00 m	6 842,50 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná	1.00 ks	6 691,91 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 650,13 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks	14 600,52 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	500.00 JV	500,00 Kč

Náhrada za VBř odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 838,99 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 717,72 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	228,59 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	6.00 ks	317,82 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	221.00 ks	10 068,76 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	3.00 kg	283,92 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	248.00 m	1 039,12 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	291.00 m	1 393,89 Kč
300111 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	43.00 m	20 571,20 Kč
300263 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 20x4x0,4	48.00 m	3 018,24 Kč
300264 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 35x4x0,4	120.00 m	11 578,80 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	115.00 m	2 239,05 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	39.00 m	940,29 Kč
316547 S		Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	10.00 ks	1 668,40 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	44514.00 ks	44 514,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	16.00 ks	4 001,76 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	57.00 ks	3 275,22 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	70.00 ks	1 888,60 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 656,00 Kč
308869 S		Rám montážní SID-CS 50P 22225-050 CZ	1.00 ks	257,13 Kč
325655 S		Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek LSA	1.00 ks	7 521,97 Kč
315066 S		Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	4.00 ks	1 145,64 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	161,87 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	5.00 ks	2 289,75 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	794,99 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	799,38 Kč
312907 S		Spojka kabelová XAGA 550 122/30- 650-CZ	1.00 ks	2 126,93 Kč
303607 S		Spojka plastová 160/137mm	9.00 ks	705,69 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 762,20 Kč

320295 S	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	1.00 ks	1 323,51 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	144.00 ks	5 256,00 Kč
309992 S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	45,97 Kč
309290 S	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	7.00 ks	867,65 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	24.00 m	13 886,64 Kč
302699 S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	17.00 ks	33 783,93 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	7.00 ks	648,69 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	1.00 ks	233,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená [•]
(„**CETIN**“)

a

[•]
(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**Čl. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne

uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; (i) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); (ii) Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Praze dne _____ 20[•]

V _____ dne _____ 20[•]

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.01.2024 7:56:38.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 26.01.2024 7:56:38. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015DEA0F, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Josef Slovák, CETIN a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: E88849C5DC6DADE48B2DC504256E04E0488A7314899684D0A6A629691A85D2F8

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov, epodatelna@tisnov.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

26.1.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Svída Viktor
