
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 20200_0016_1**

mezi

CETIN a.s.

a

Jihočeský kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Gabrielem Peškem, manažerem, VFS
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 71 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
ID DS: kdib3rr
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Boršov nad Vltavou spočívající v dočasné změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Dočasná překládka je část Překládky v Projektu označená za dočasnou překládku anebo též za 1. Etapu, co do rozsahu určená položkami v Projektu; Dočasná překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena konečnou změnou trasy SEK; Dočasná překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Konečná překládka je část Překládky v Projektu označená za konečnou překládku anebo též za 2. Etapu, co do rozsahu určená položkami v Projektu, je navrácením SEK do původní trasy, a nahrazuje Dočasnou překládku; Konečnou překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Dočasné překládky; Konečná překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 10.8.2023 vydané pod čj. 228263/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Boršov n/Vlt., most 14325 – 5a, přel. SEK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty

ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

- 3.3 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.4 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

(i) před realizací Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);

(ii) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Dočasné překládky, tak i k realizaci Konečné překládky, každou z nich samostatně.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.

4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.5 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **863 411,00 Kč** (slovy: osm set šedesát tři tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
 - (f) náklady na identifikaci parcel;
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury za Etapu Překládky budou společností CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.5 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických: Karel Vojč
funkce: specialista koordinace výstavby sítě

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba
funkce: hejtman

ve věcech technických: Ivana Schwarzová

funkce: technik, odbor dopravy a silničního hospodářství

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Konečnou překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do dvanácti (12) měsíců ode dne ukončení realizace Dočasné překládky dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro Dočasnou překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Dočasnou překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran

na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností

CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

nebezpečí změny okolností.

- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoliv jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.14 Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Číslo smlouvy společnosti CETIN: .CB 2020_0016_1
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4/Hana: 8030004709
Registr smluv: ANO

Příloha č. 1 - Projekt

Doložka

Rozhodování o uzavření Smlouvy bylo svěřeno hejtmanovi Jihočeského kraje usnesením rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.

CETIN
V Praze dne


Stavebník
V Českých Budějovicích dne

Gabriel Pešek

Digitálně podepsal Gabriel
Pešek
Datum: 2024.01.30 10:28:50
+01'00'

.....
za **CETIN a.s.**


Gabriel Pešek
manažer, VFS
(podepsáno elektronicky)



Elektronický podpis : 5.2.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.1.2025 14:41:53+01:00

.....
za **Jihočeský kraj**

MUDr. Martin Kuba
hejtman
(podepsáno elektronicky)

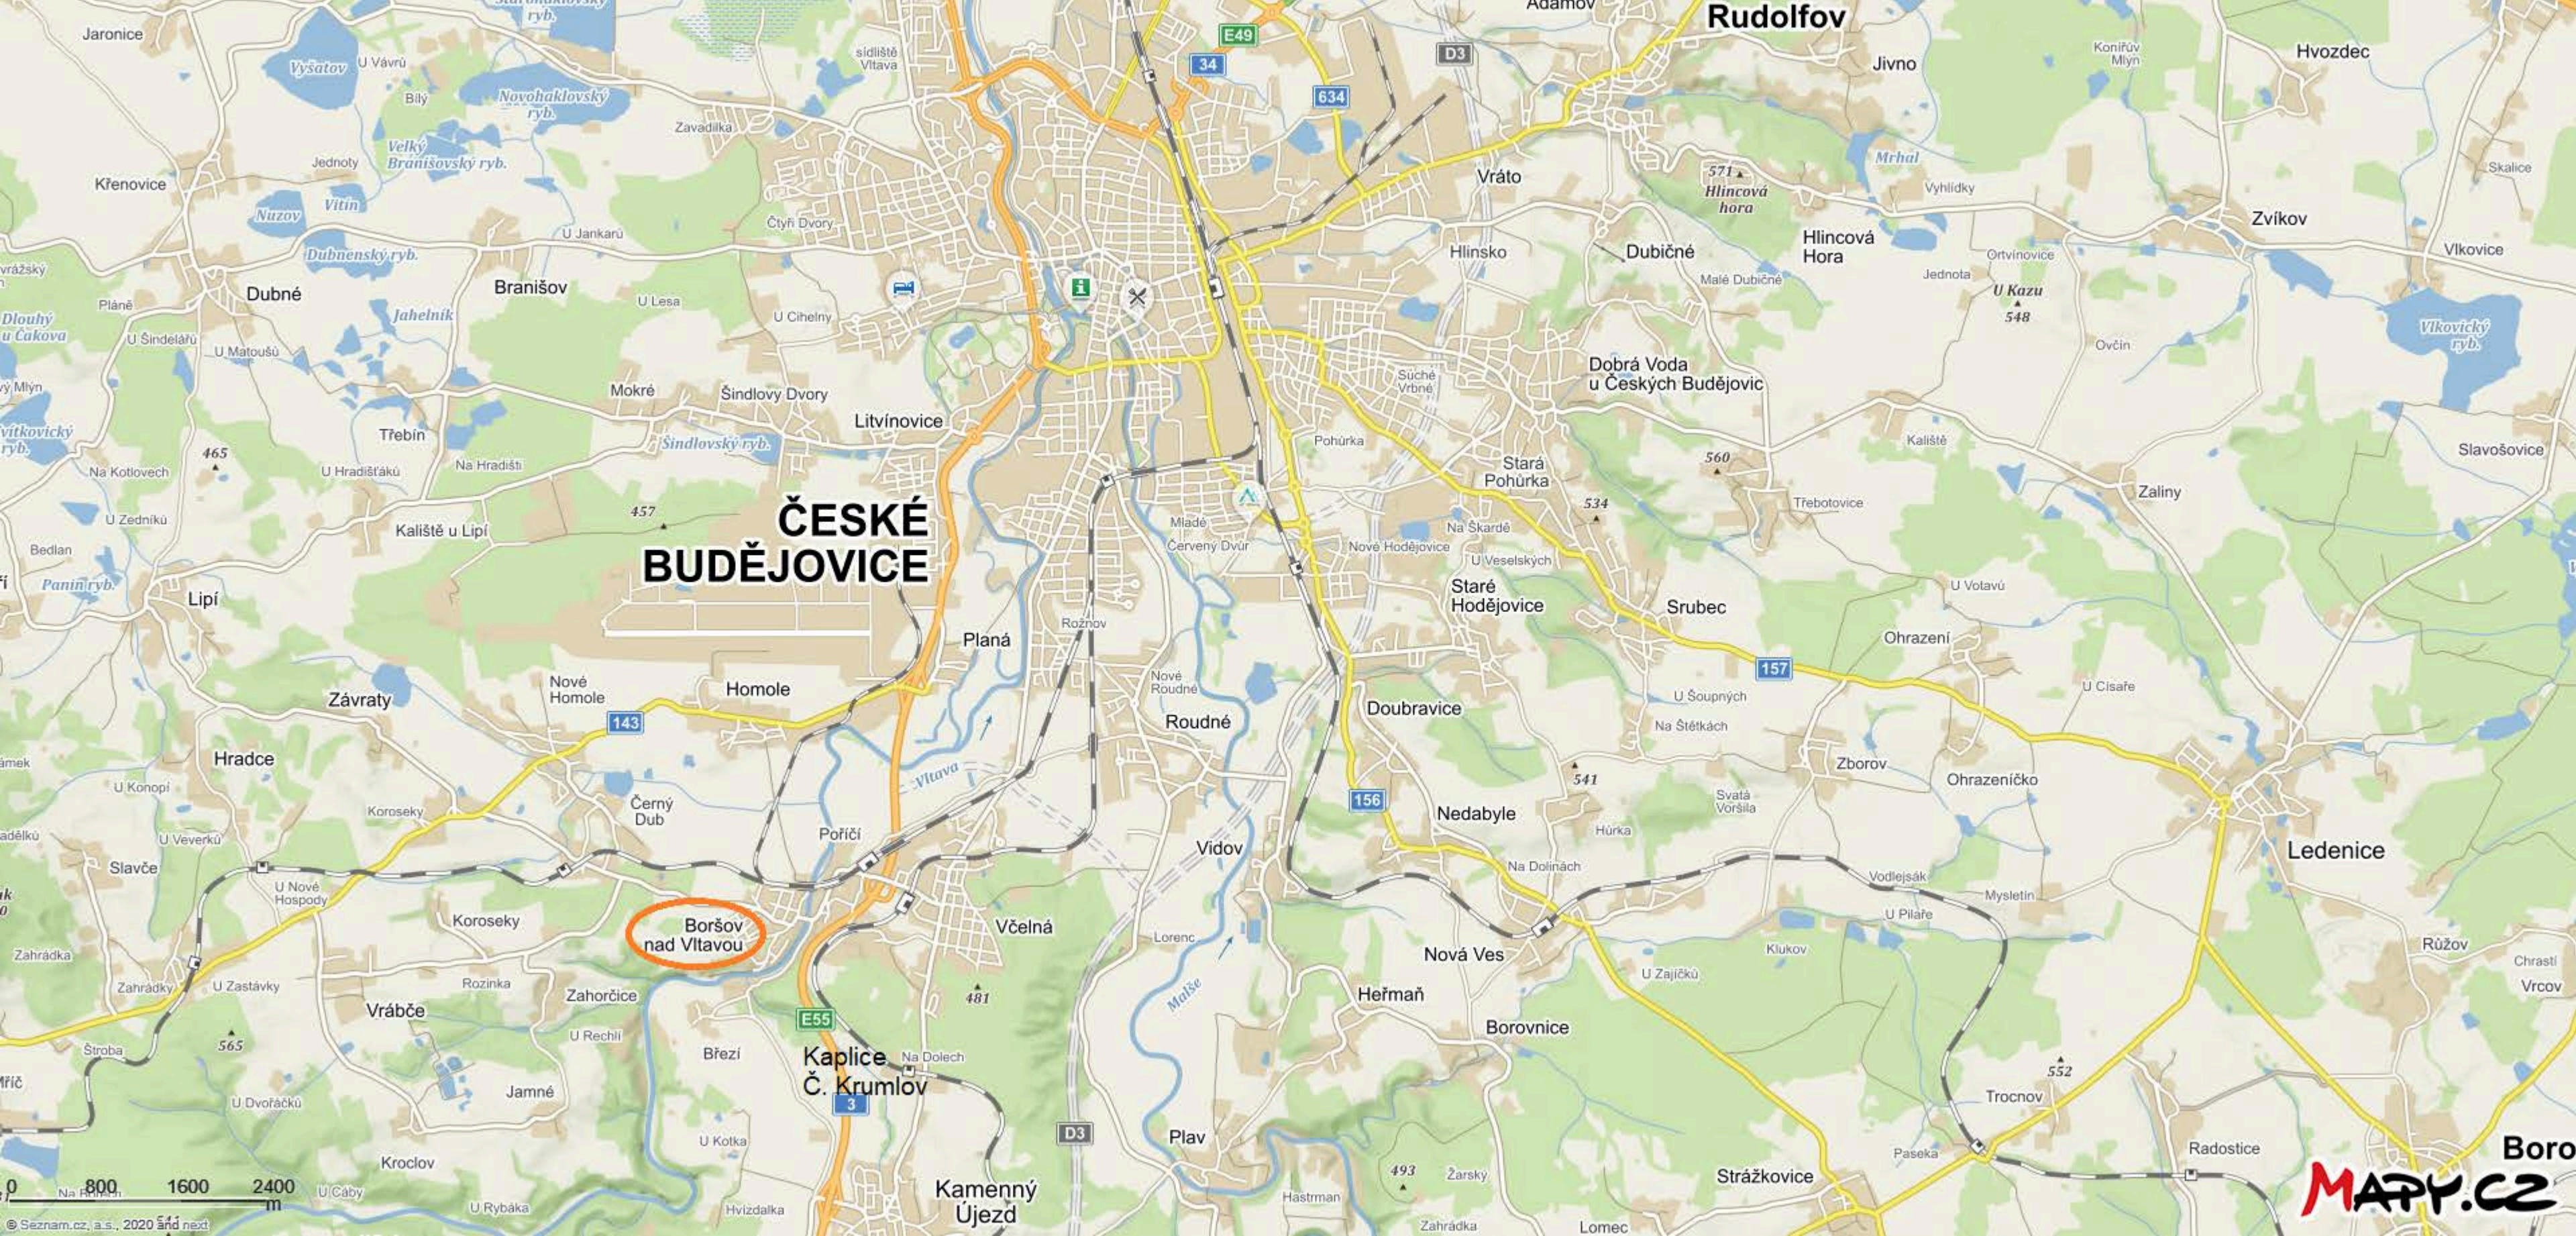


ČESKÉ BUDĚJOVICE

Boršov
nad Vltavou

0 800 1600 2400 m

MAPY.CZ

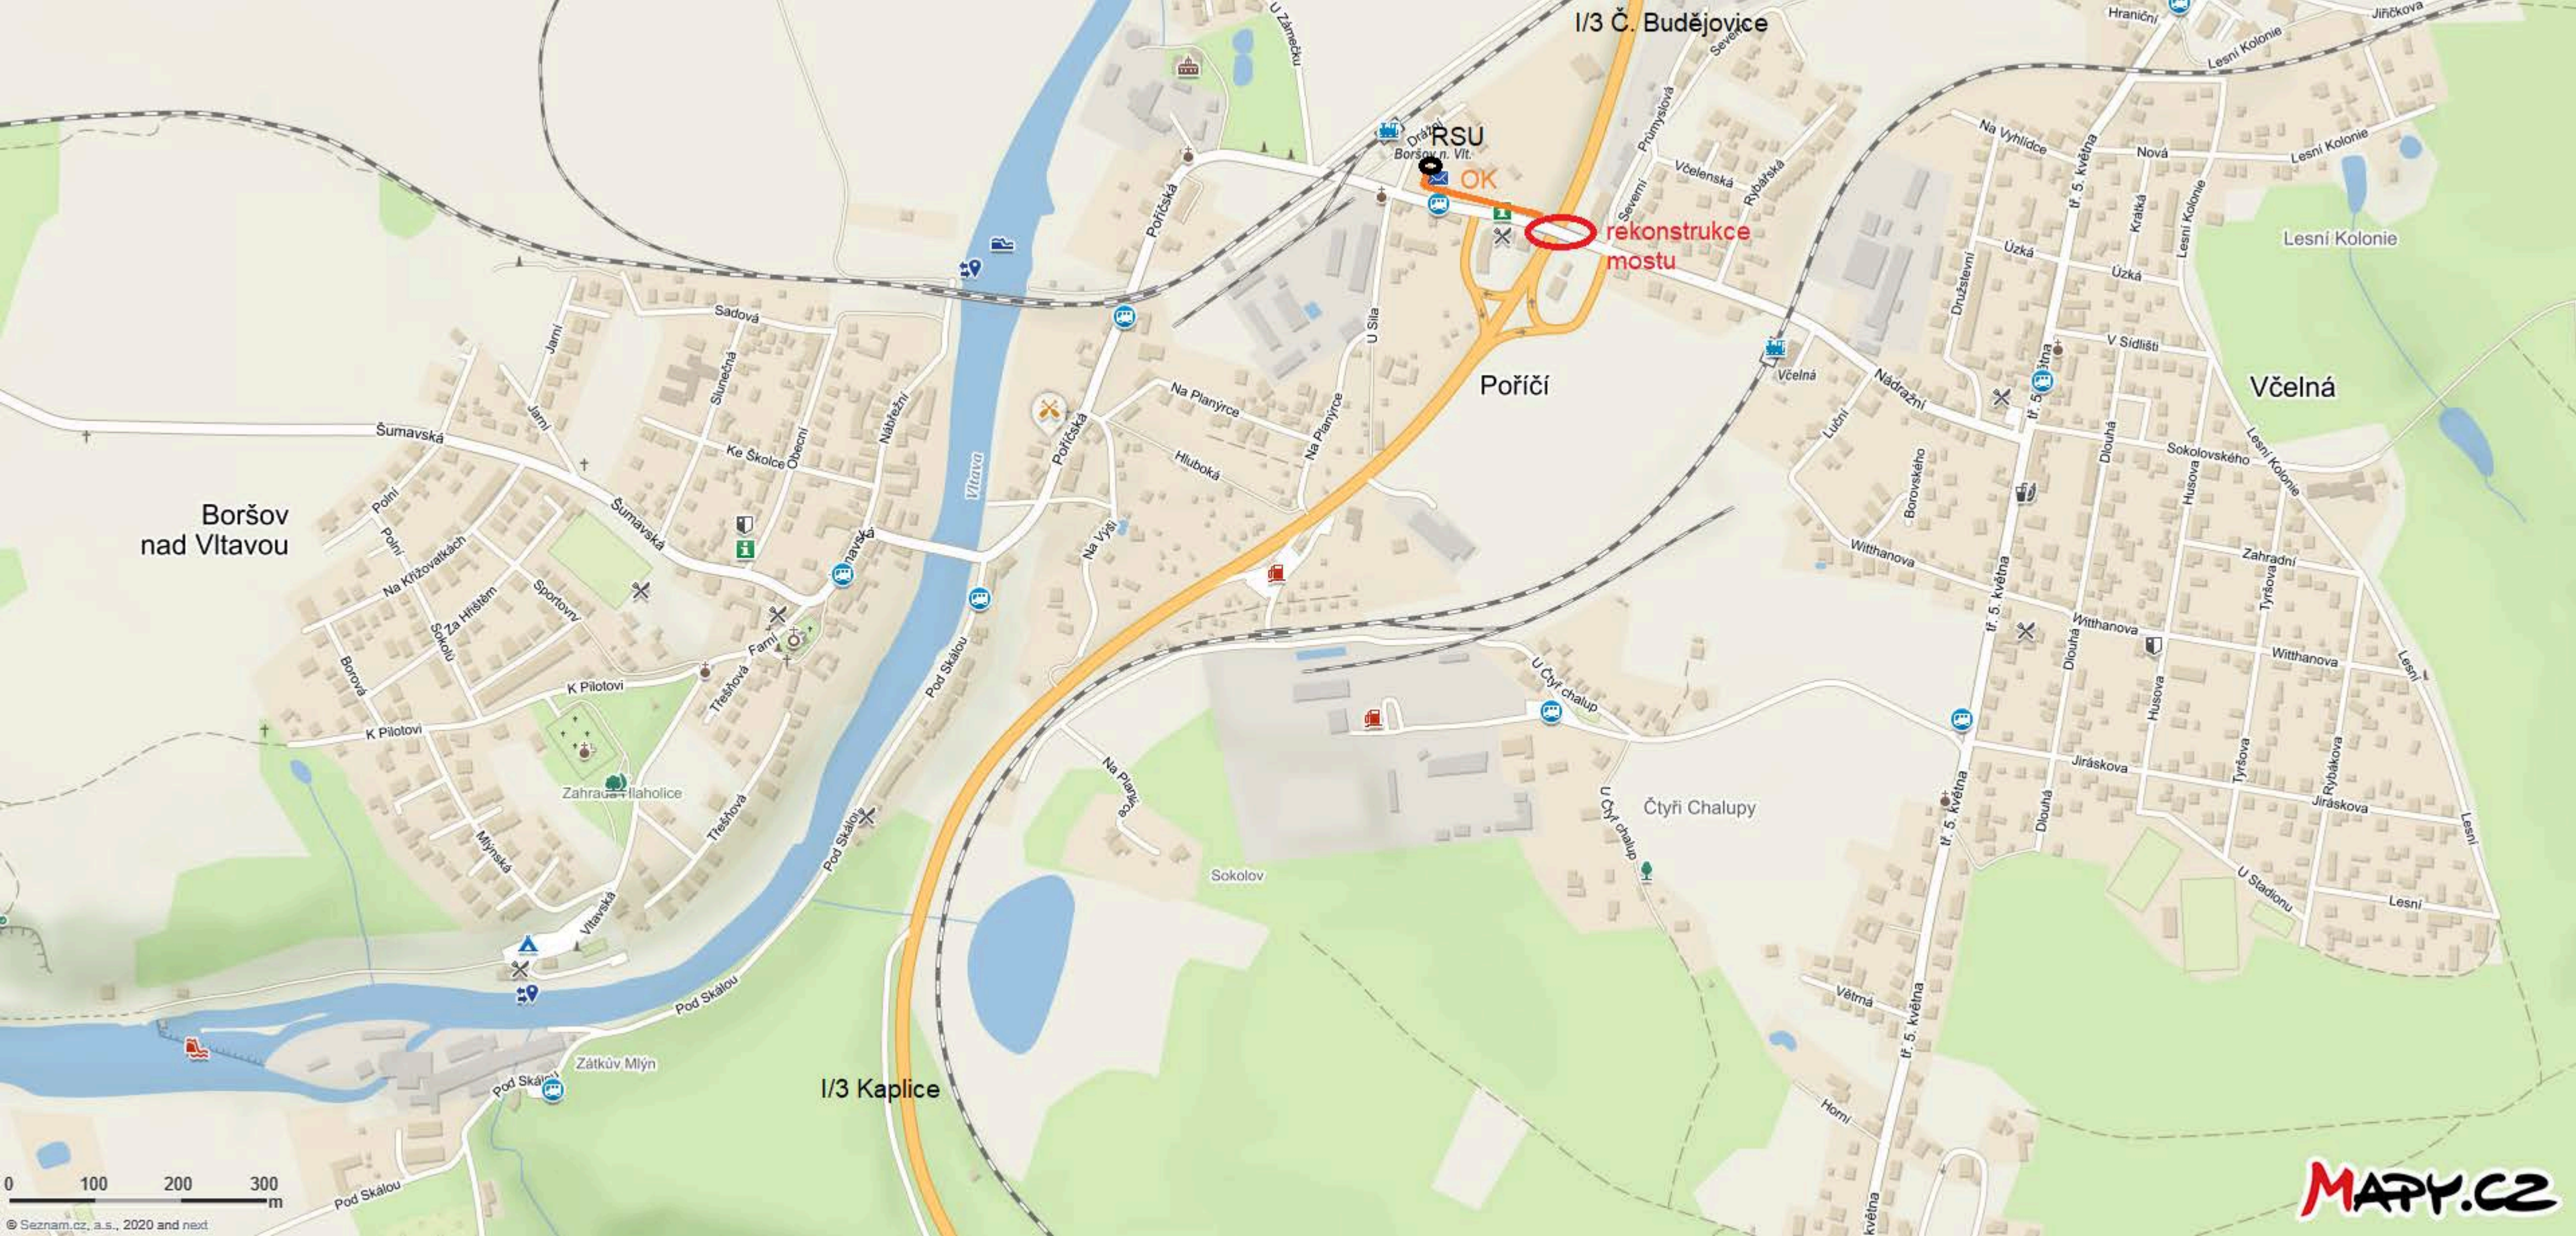

I/3 Č. Budějovice

RSU
Boršov n. Vlt.

rekonstrukce
mostu

Poříčí

Včelná

Čtyři Chalupy


I/3 Kaplice

Boršov
nad Vltavou

0 100 200 300
m

MAPY.CZ


© Seznam.cz, a.s., 2020 and next

	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010
	K.M.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: CTN
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
Název výkresu:	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko: 1:500
Název zakázky:	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 02/2020
Polohopisná situace- provizorní překládka		Číslo výkresu:
VPIC Boršov n/Vlt., most 14325, přel. SEK		P1a

KOORDINAČNÍ SITUACE
 Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou

- trasa provizorní překládky
- - - výfuk a záfuk 3x OK
- - - vyvěšení kabelu na lávku, popř. výložníky

- - - nadzemní vedení VN (E.ON)
- - - podzemní vedení NN (E.ON)
- - - STL plynovod (E.ON)
- - - STL plynovod- zrušený vodovod (ČEVAK)
- - - kanalizace (ČEVAK)
- - - kabel VO (Obec Boršov)

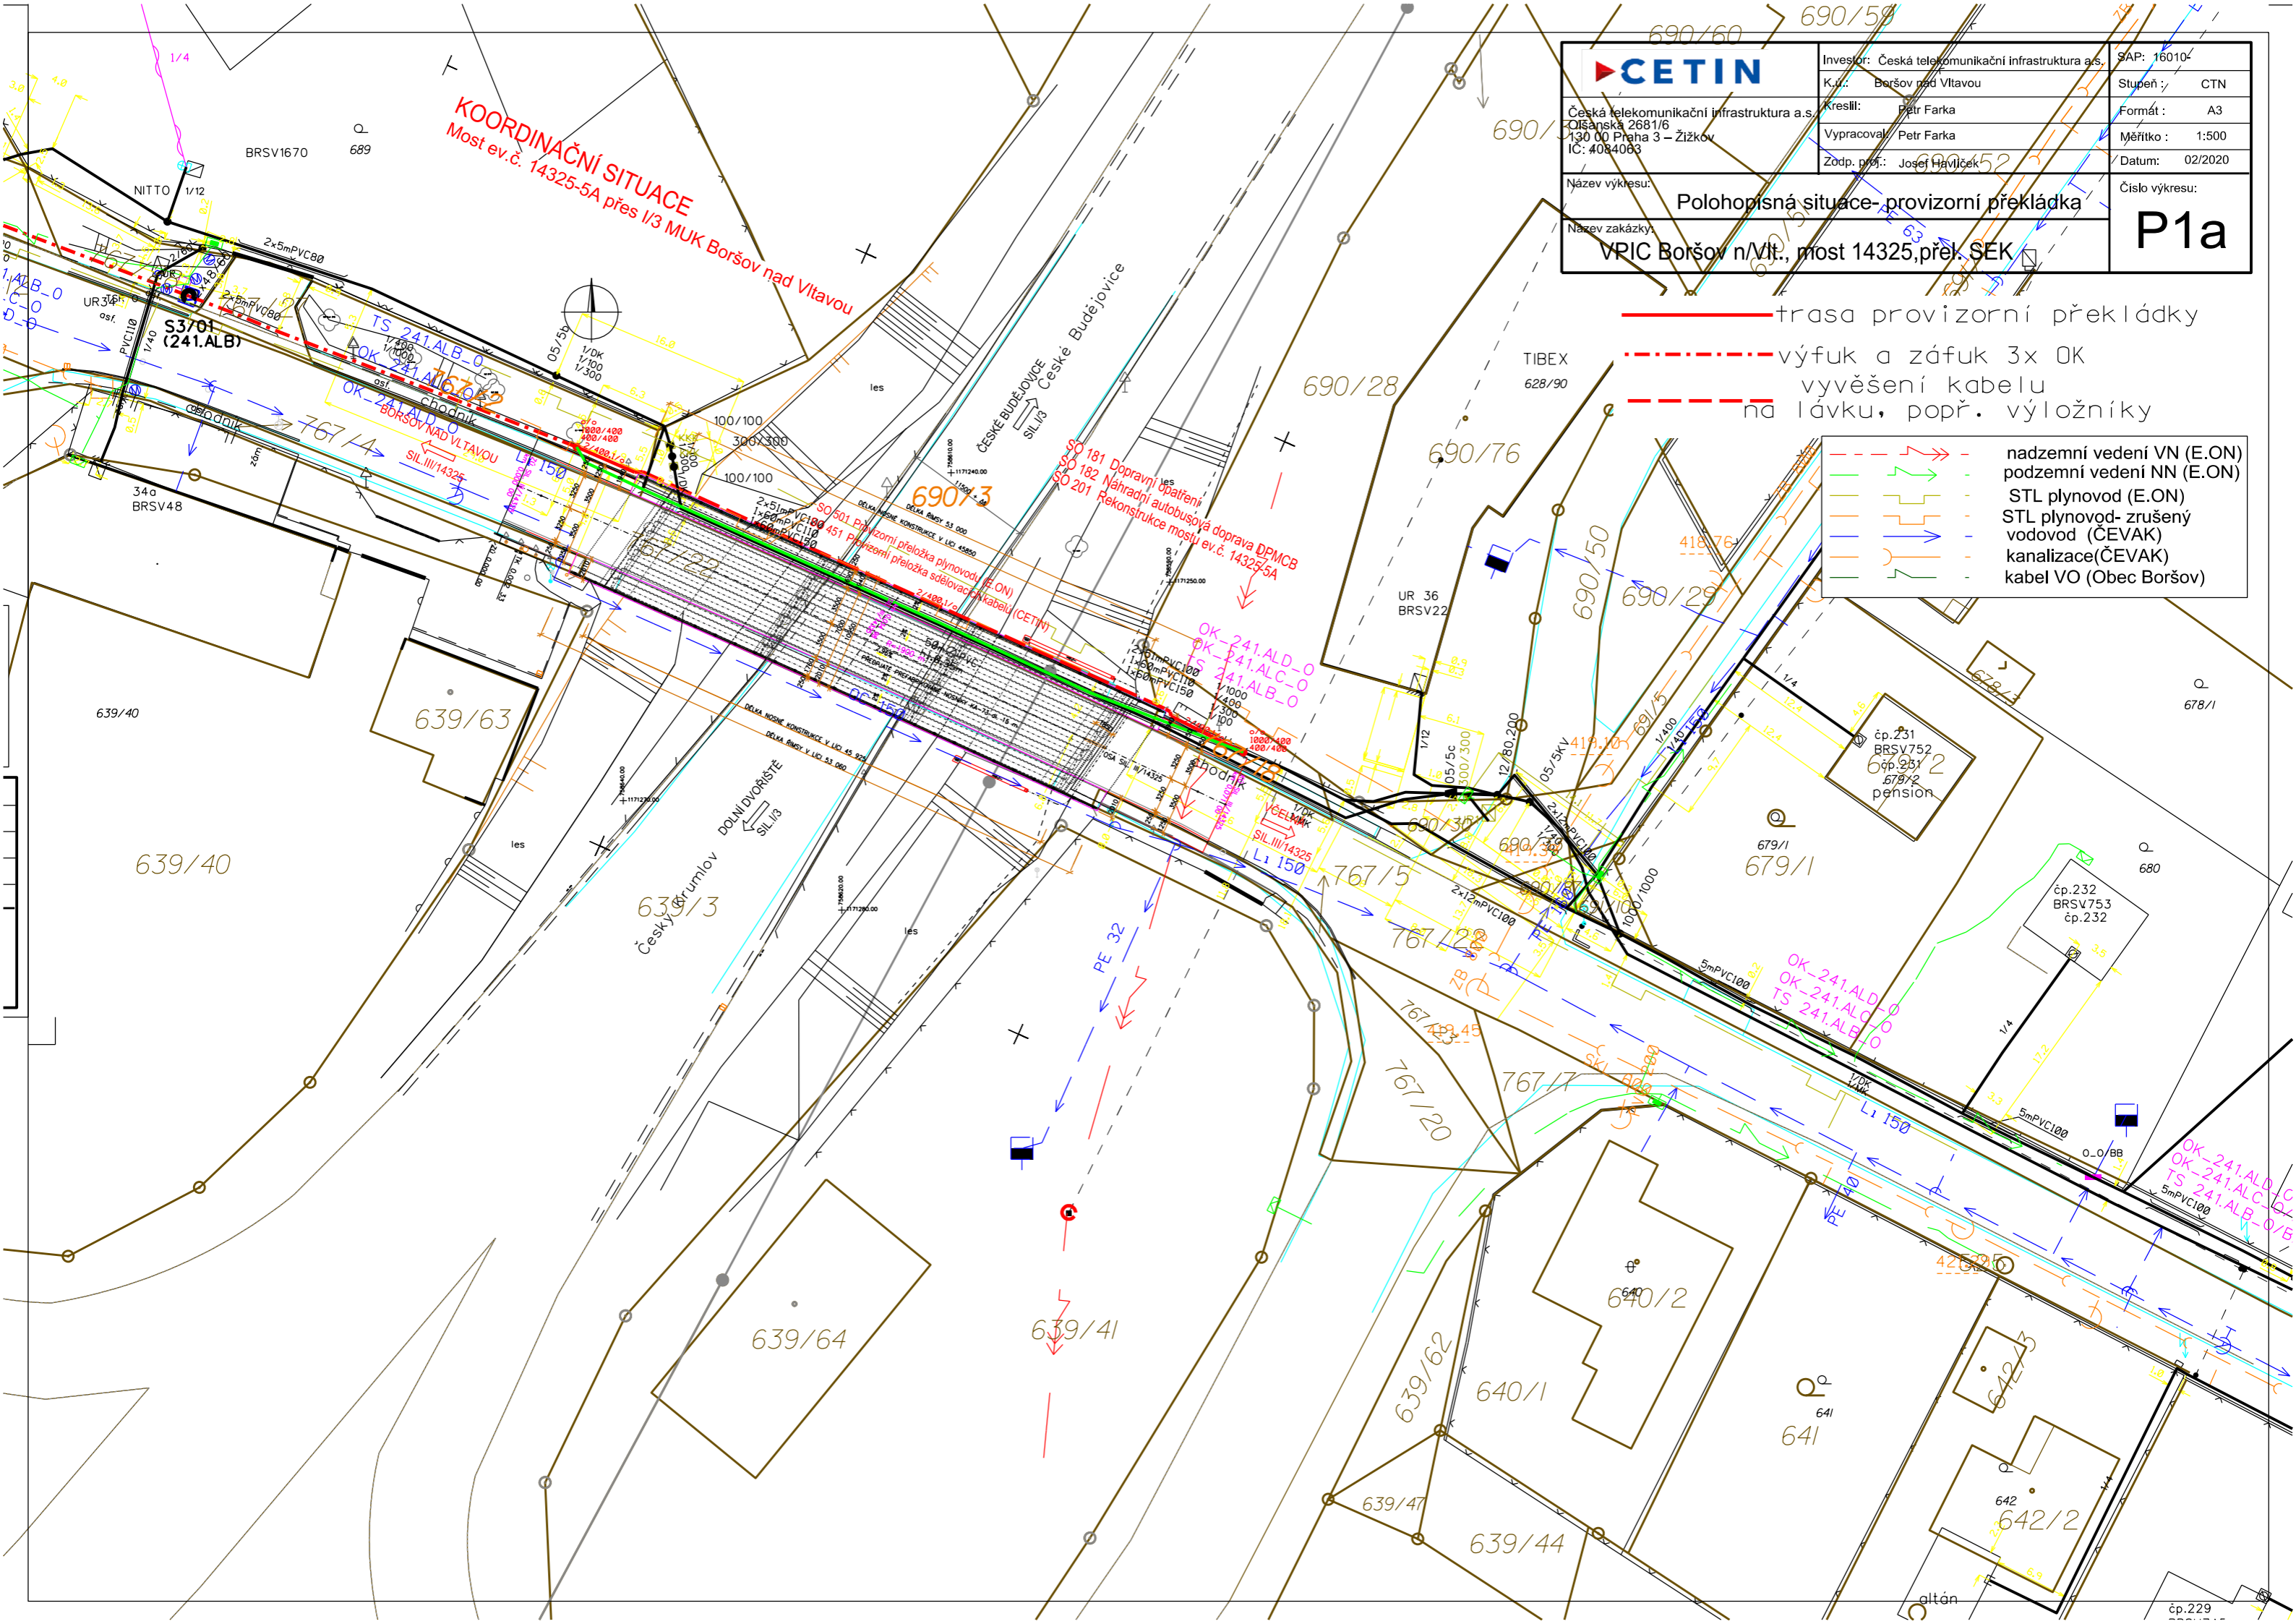



KOORDINAČNÍ SITUACE
 Most ev.č. 14325-5A přes 1/3 MUK Boršov nad Vltavou

<p>Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olsánská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084083</p>	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-
	K.z.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: CTN
	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko: 1:500
Název výkresu: Polohopisná situace-definitivní překládka	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 02/2020
Název zakázky: VPIC Boršov n/Vlt., most 14325.přel. SEK	Číslo výkresu: P1b	

— trasa definitivní překládky
 - - - výfuk a záfuk 3x OK

- nadzemní vedení VN (E.ON)
- podzemní vedení NN (E.ON)
- STL plynovod (E.ON)
- STL plynovod- zrušený vodovod (ČEVAK)
- kanalizace(ČEVAK)
- kabel VO (Obec Boršov)

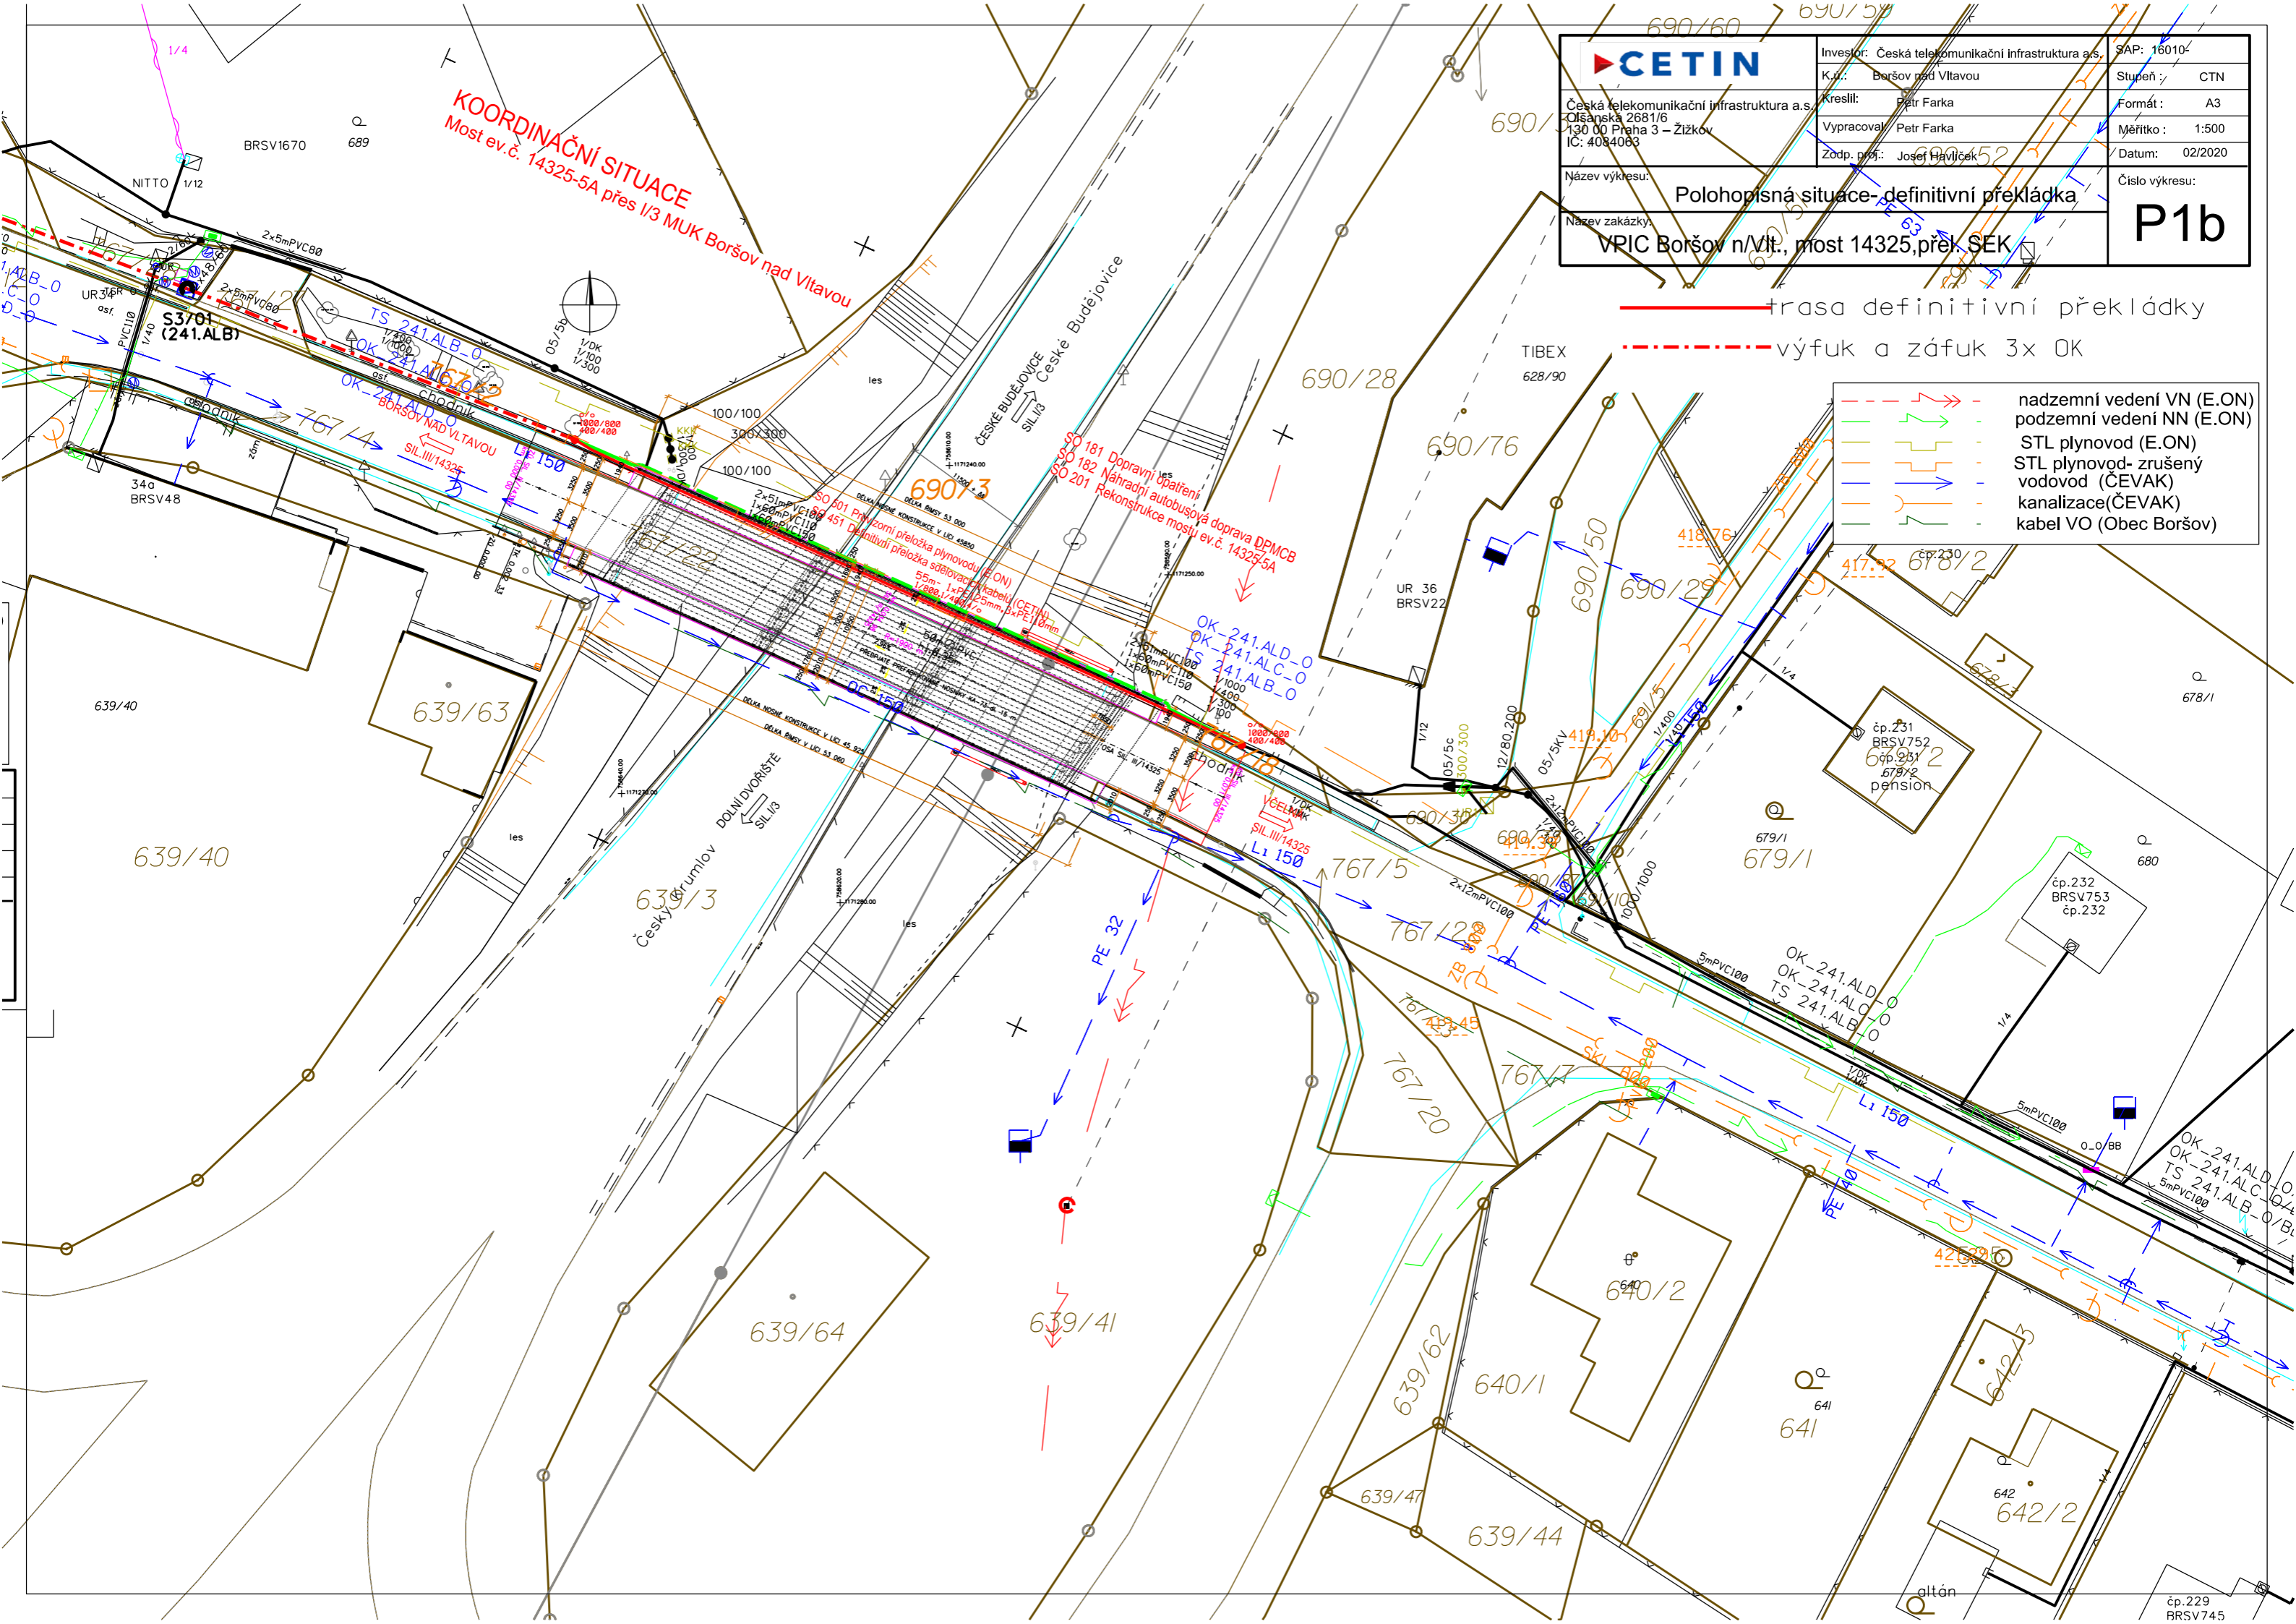


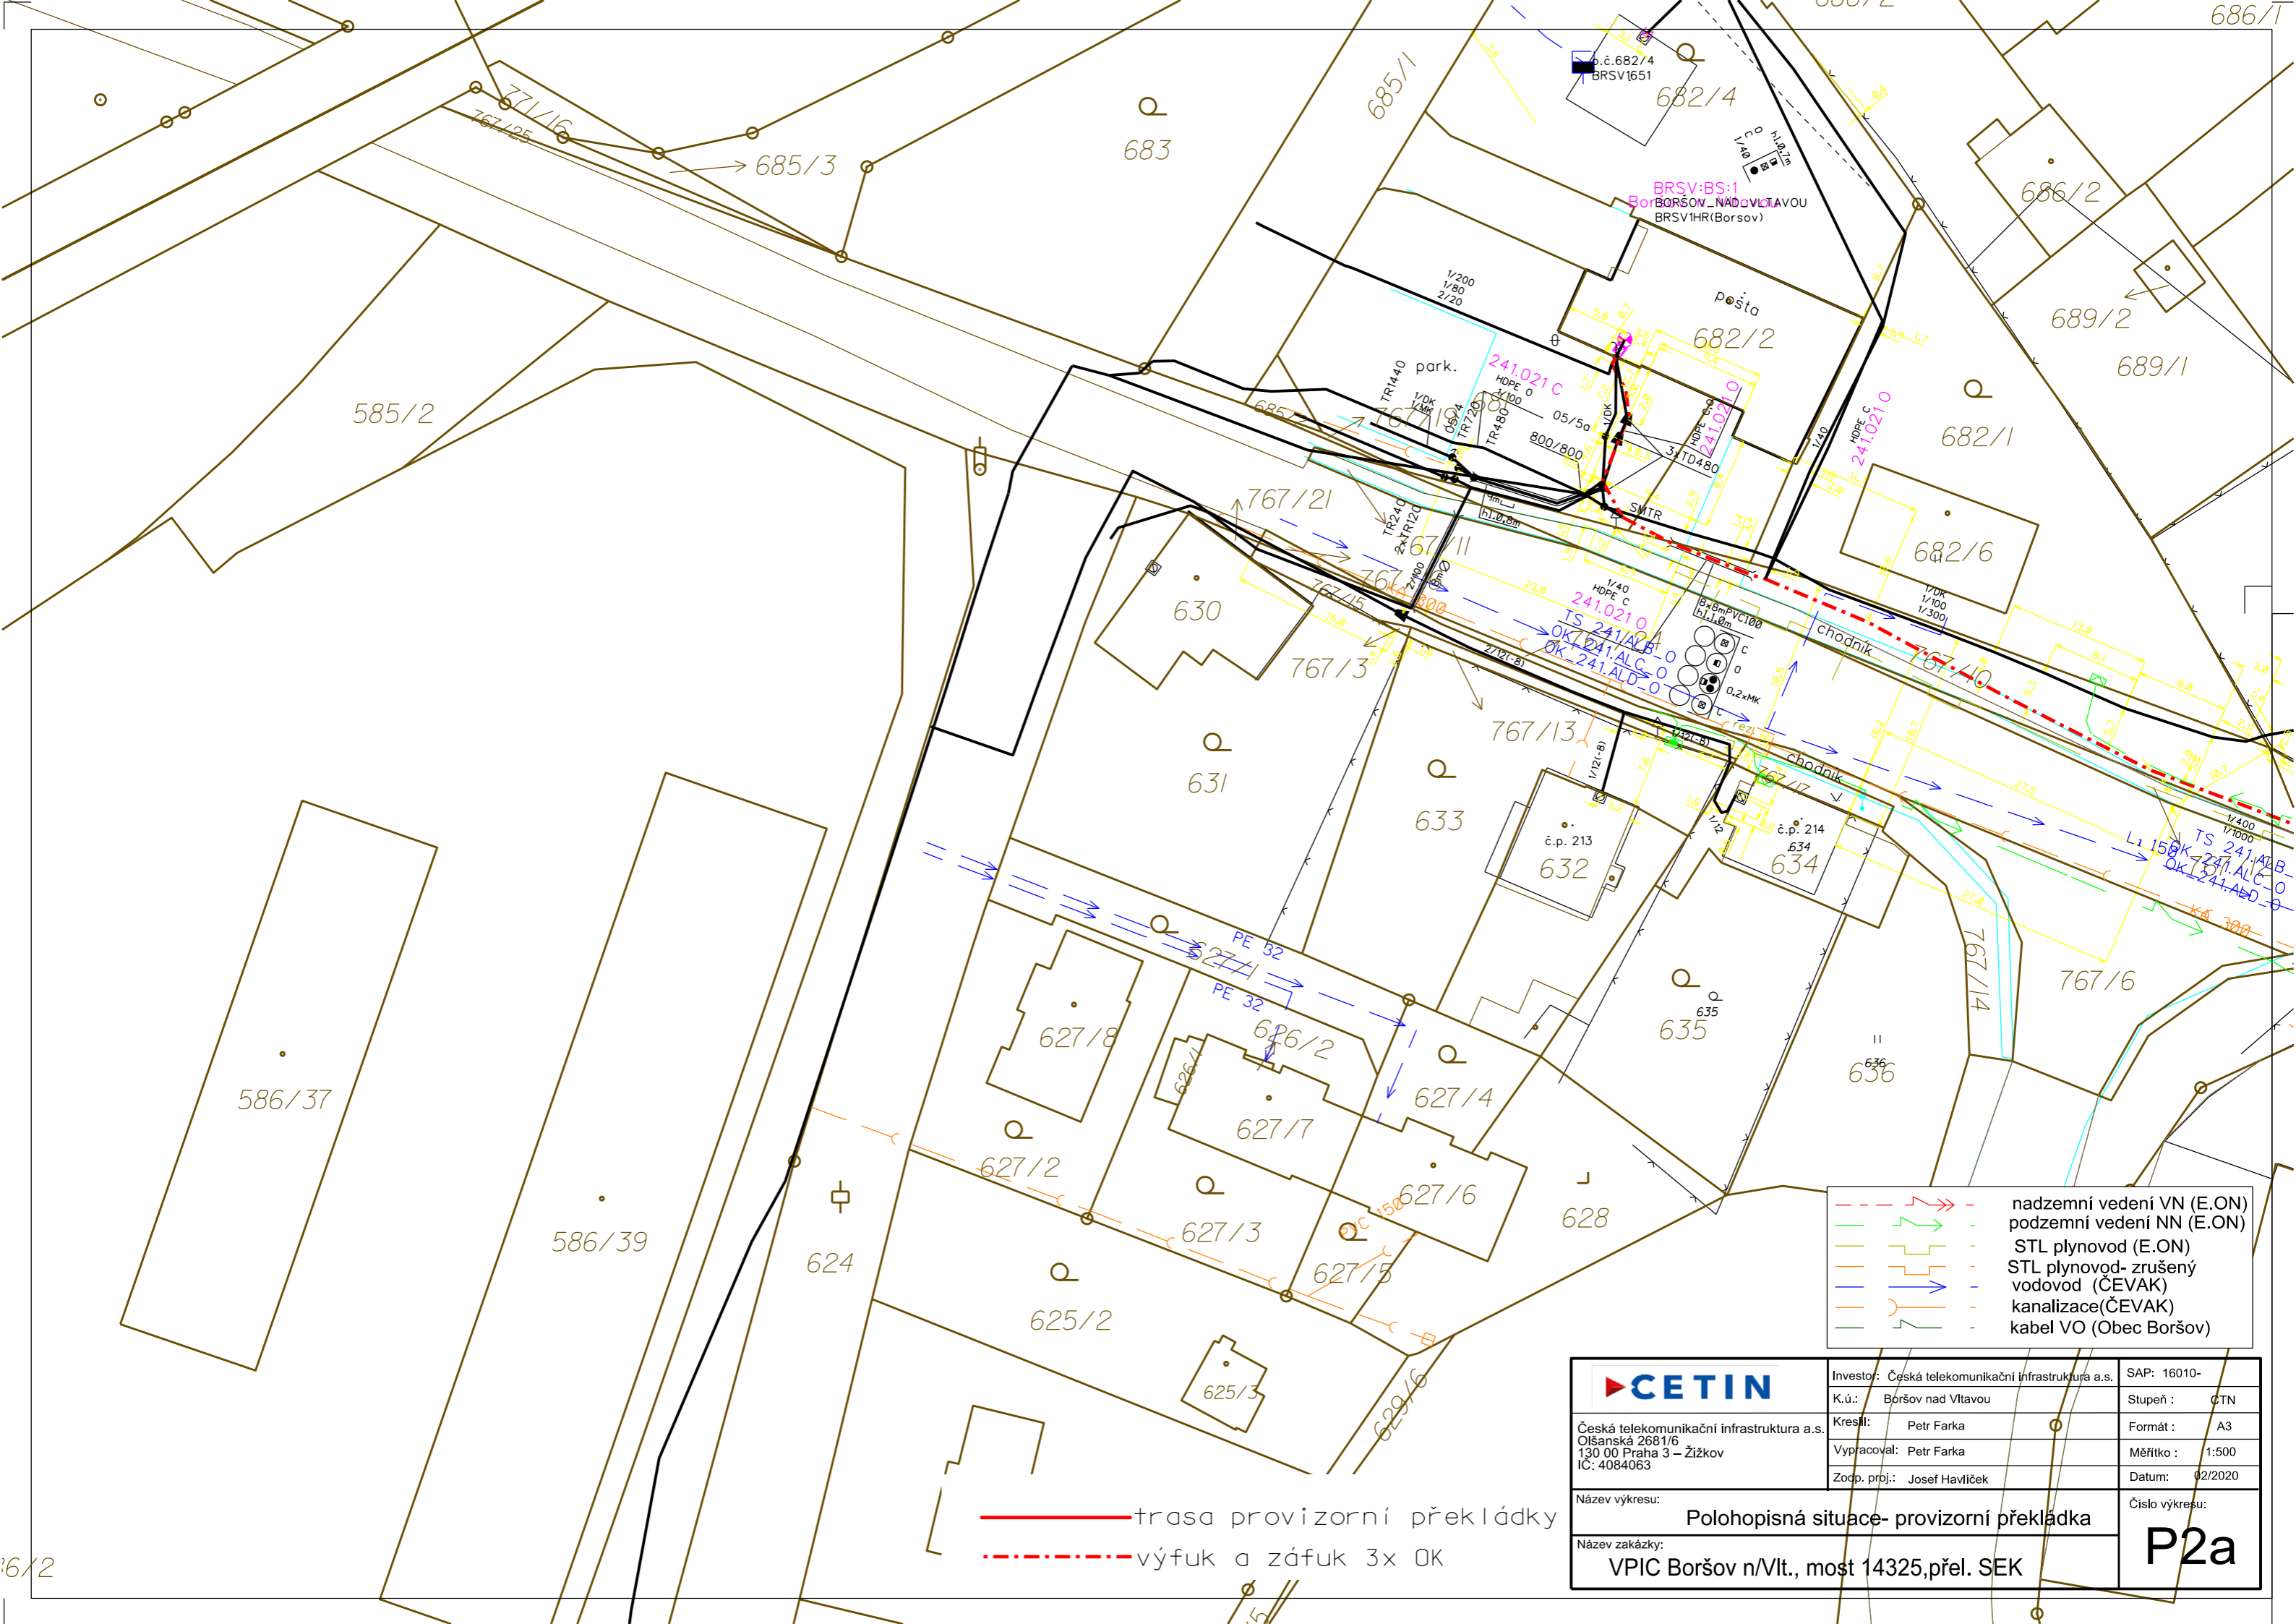

——— trasa provizorní překládky
- - - - - výfuk a záfuk 3x OK

- - - - - nadzemní vedení VN (E.ON)
- - - - - podzemní vedení NN (E.ON)
- - - - - STL plynovod (E.ON)
- - - - - STL plynovod- zrušený
- - - - - vodovod (ČEVAK)
- - - - - kanalizace(ČEVAK)
- - - - - kabel VO (Obec Boršov)


	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň : CTN
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Kreslil: Petr Farka	Formát : A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko : 1:500
	Zořp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 02/2020
Název výkresu:	Polohopisná situace- provizorní překládka	
Název zakázky:	VPIC Boršov n/Vlt., most 14325,přel. SEK	
		P2a

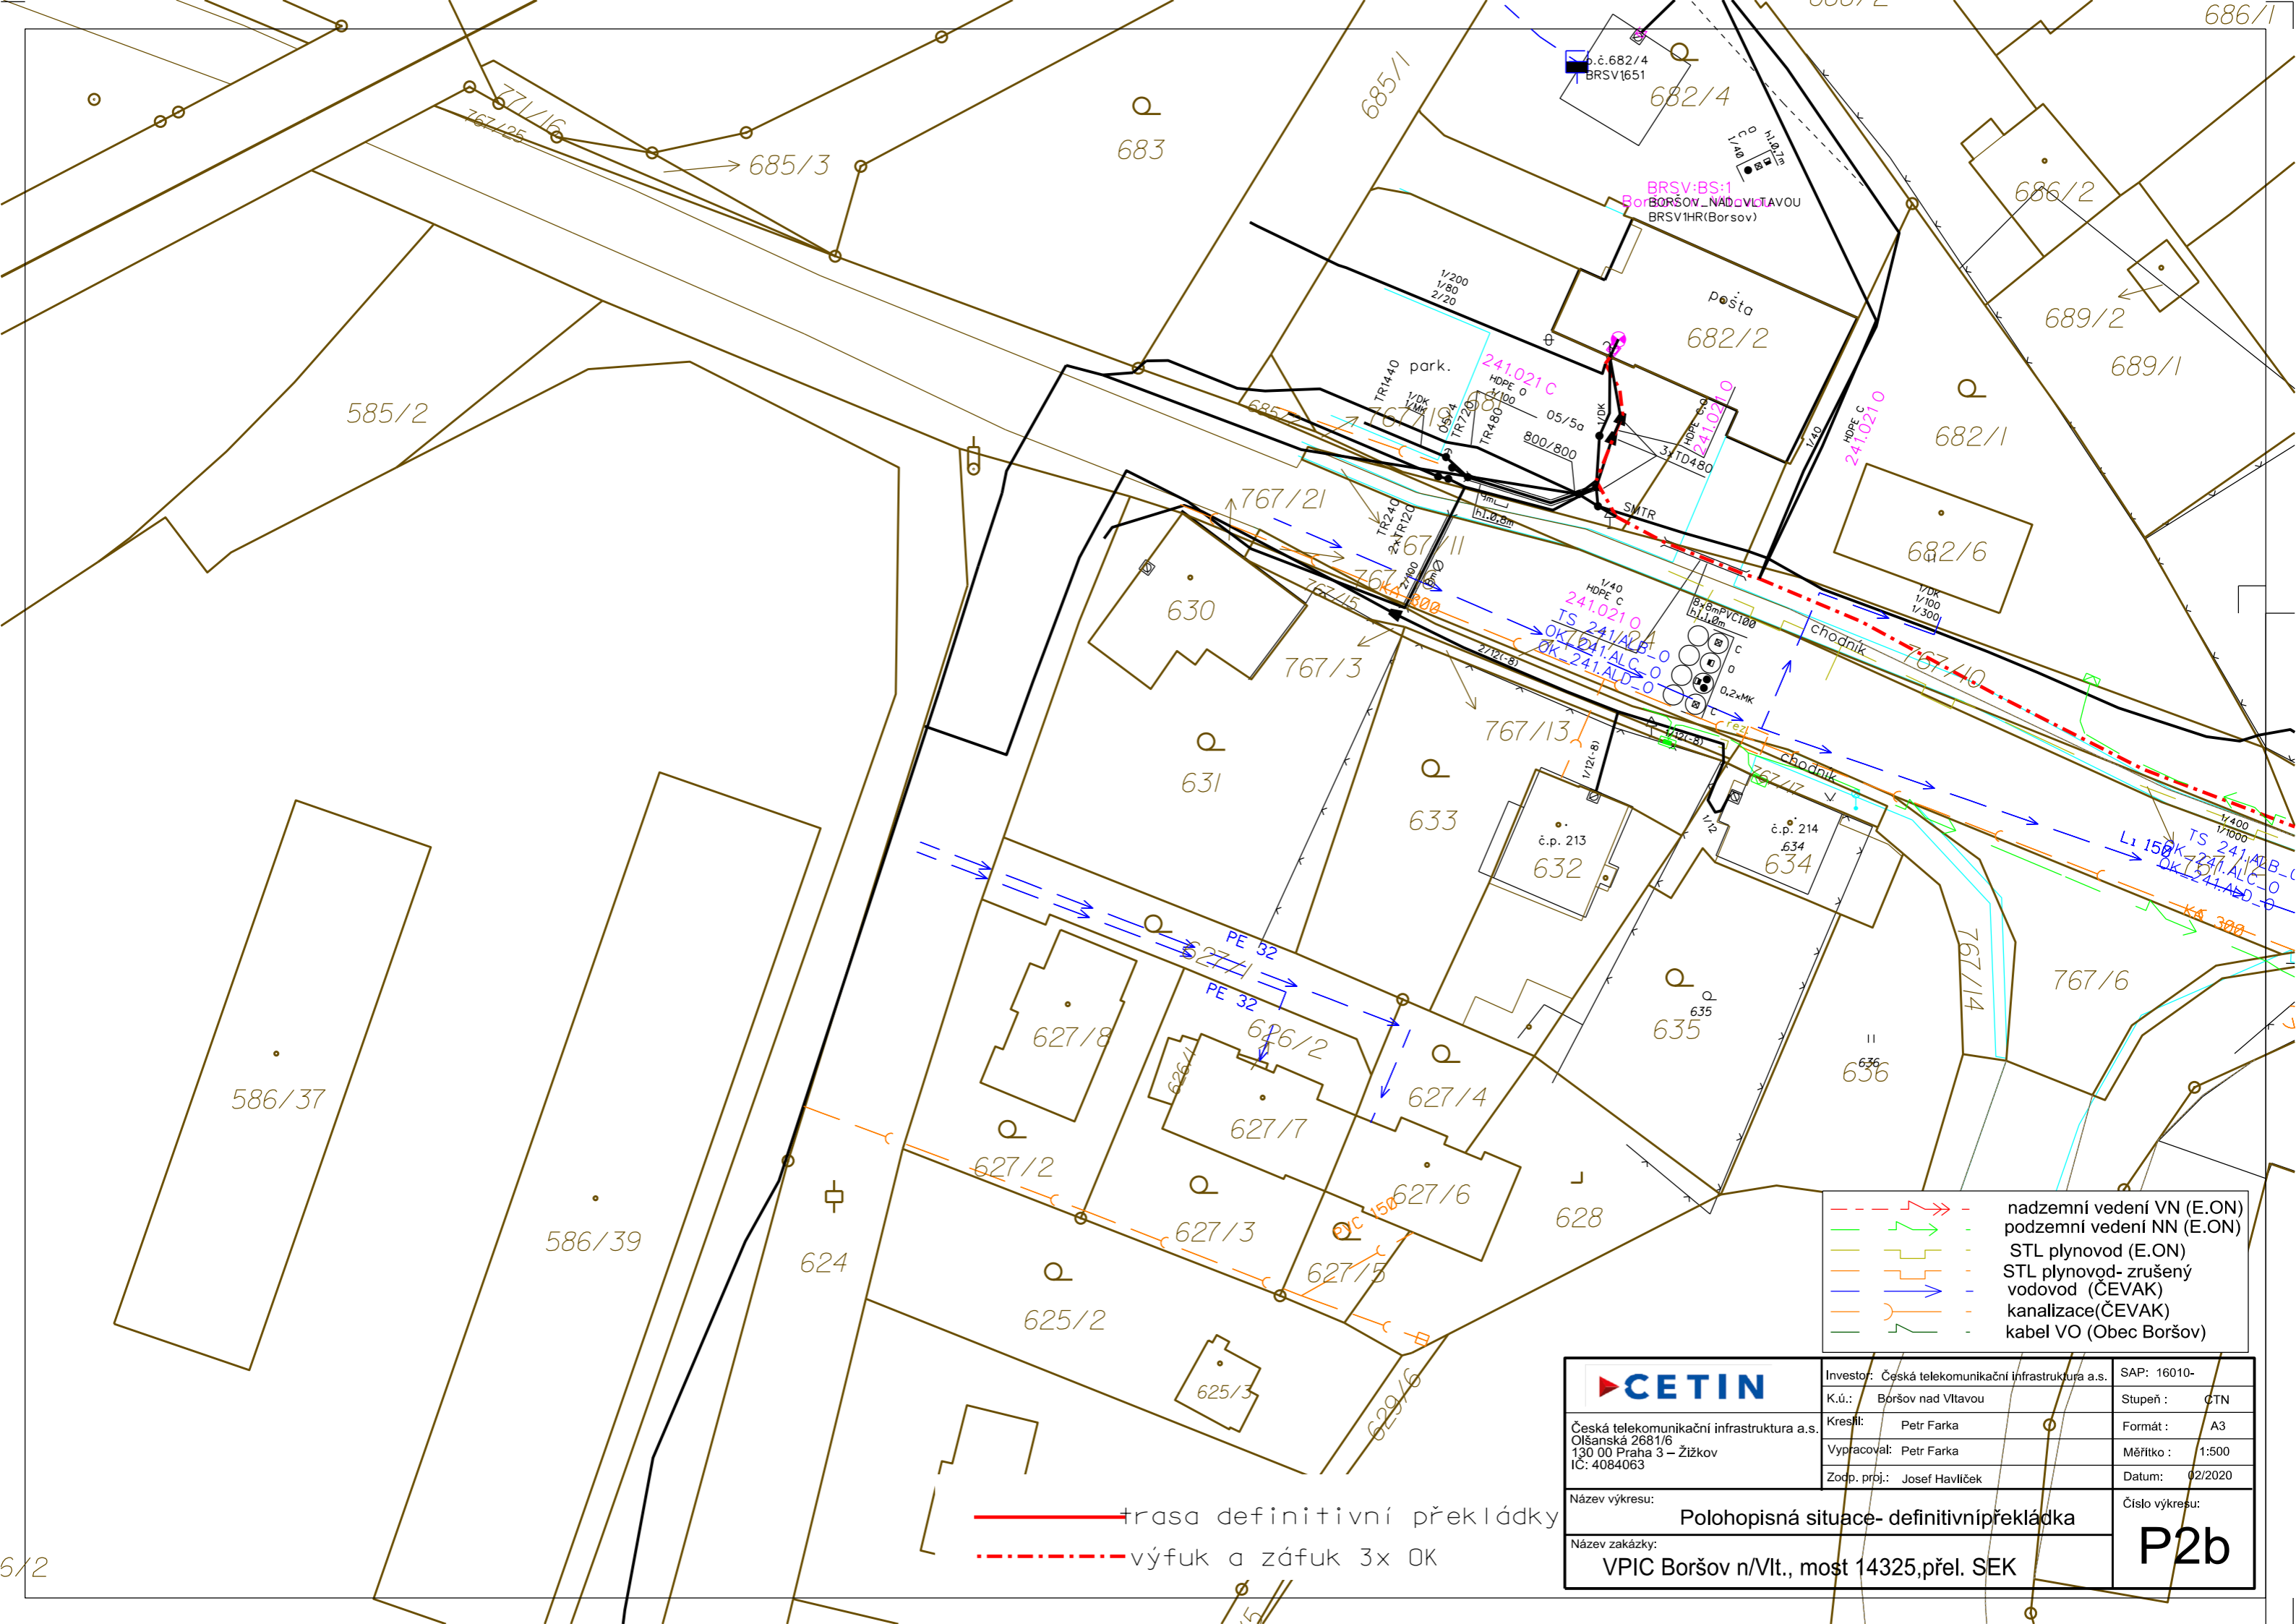



- - - - - nadzemní vedení VN (E.ON)
- - - - - podzemní vedení NN (E.ON)
- - - - - STL plynovod (E.ON)
- - - - - STL plynovod- zrušený
- - - - - vodovod (ČEVAK)
- - - - - kanalizace(ČEVAK)
- - - - - kabel VO (Obec Boršov)


————— trasa definitivní překládky
- - - - - výfuk a záfuk 3x OK

	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: CTN
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko: 1:500
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 02/2020
Název výkresu:	Polohopisná situace- definitivní překládka	
Název zakázky:	VPIC Boršov n/Vlt., most 14325, přel. SEK	
		P2b


	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-029362
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: DPS
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Kreslí: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítka:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu:	Schéma METalika+ HDPE- provizorní překládka	
Název zakázky:	VPIC Boršov n/Vlt., most 14325, přel. SEK	
		Číslo výkresu: S1a

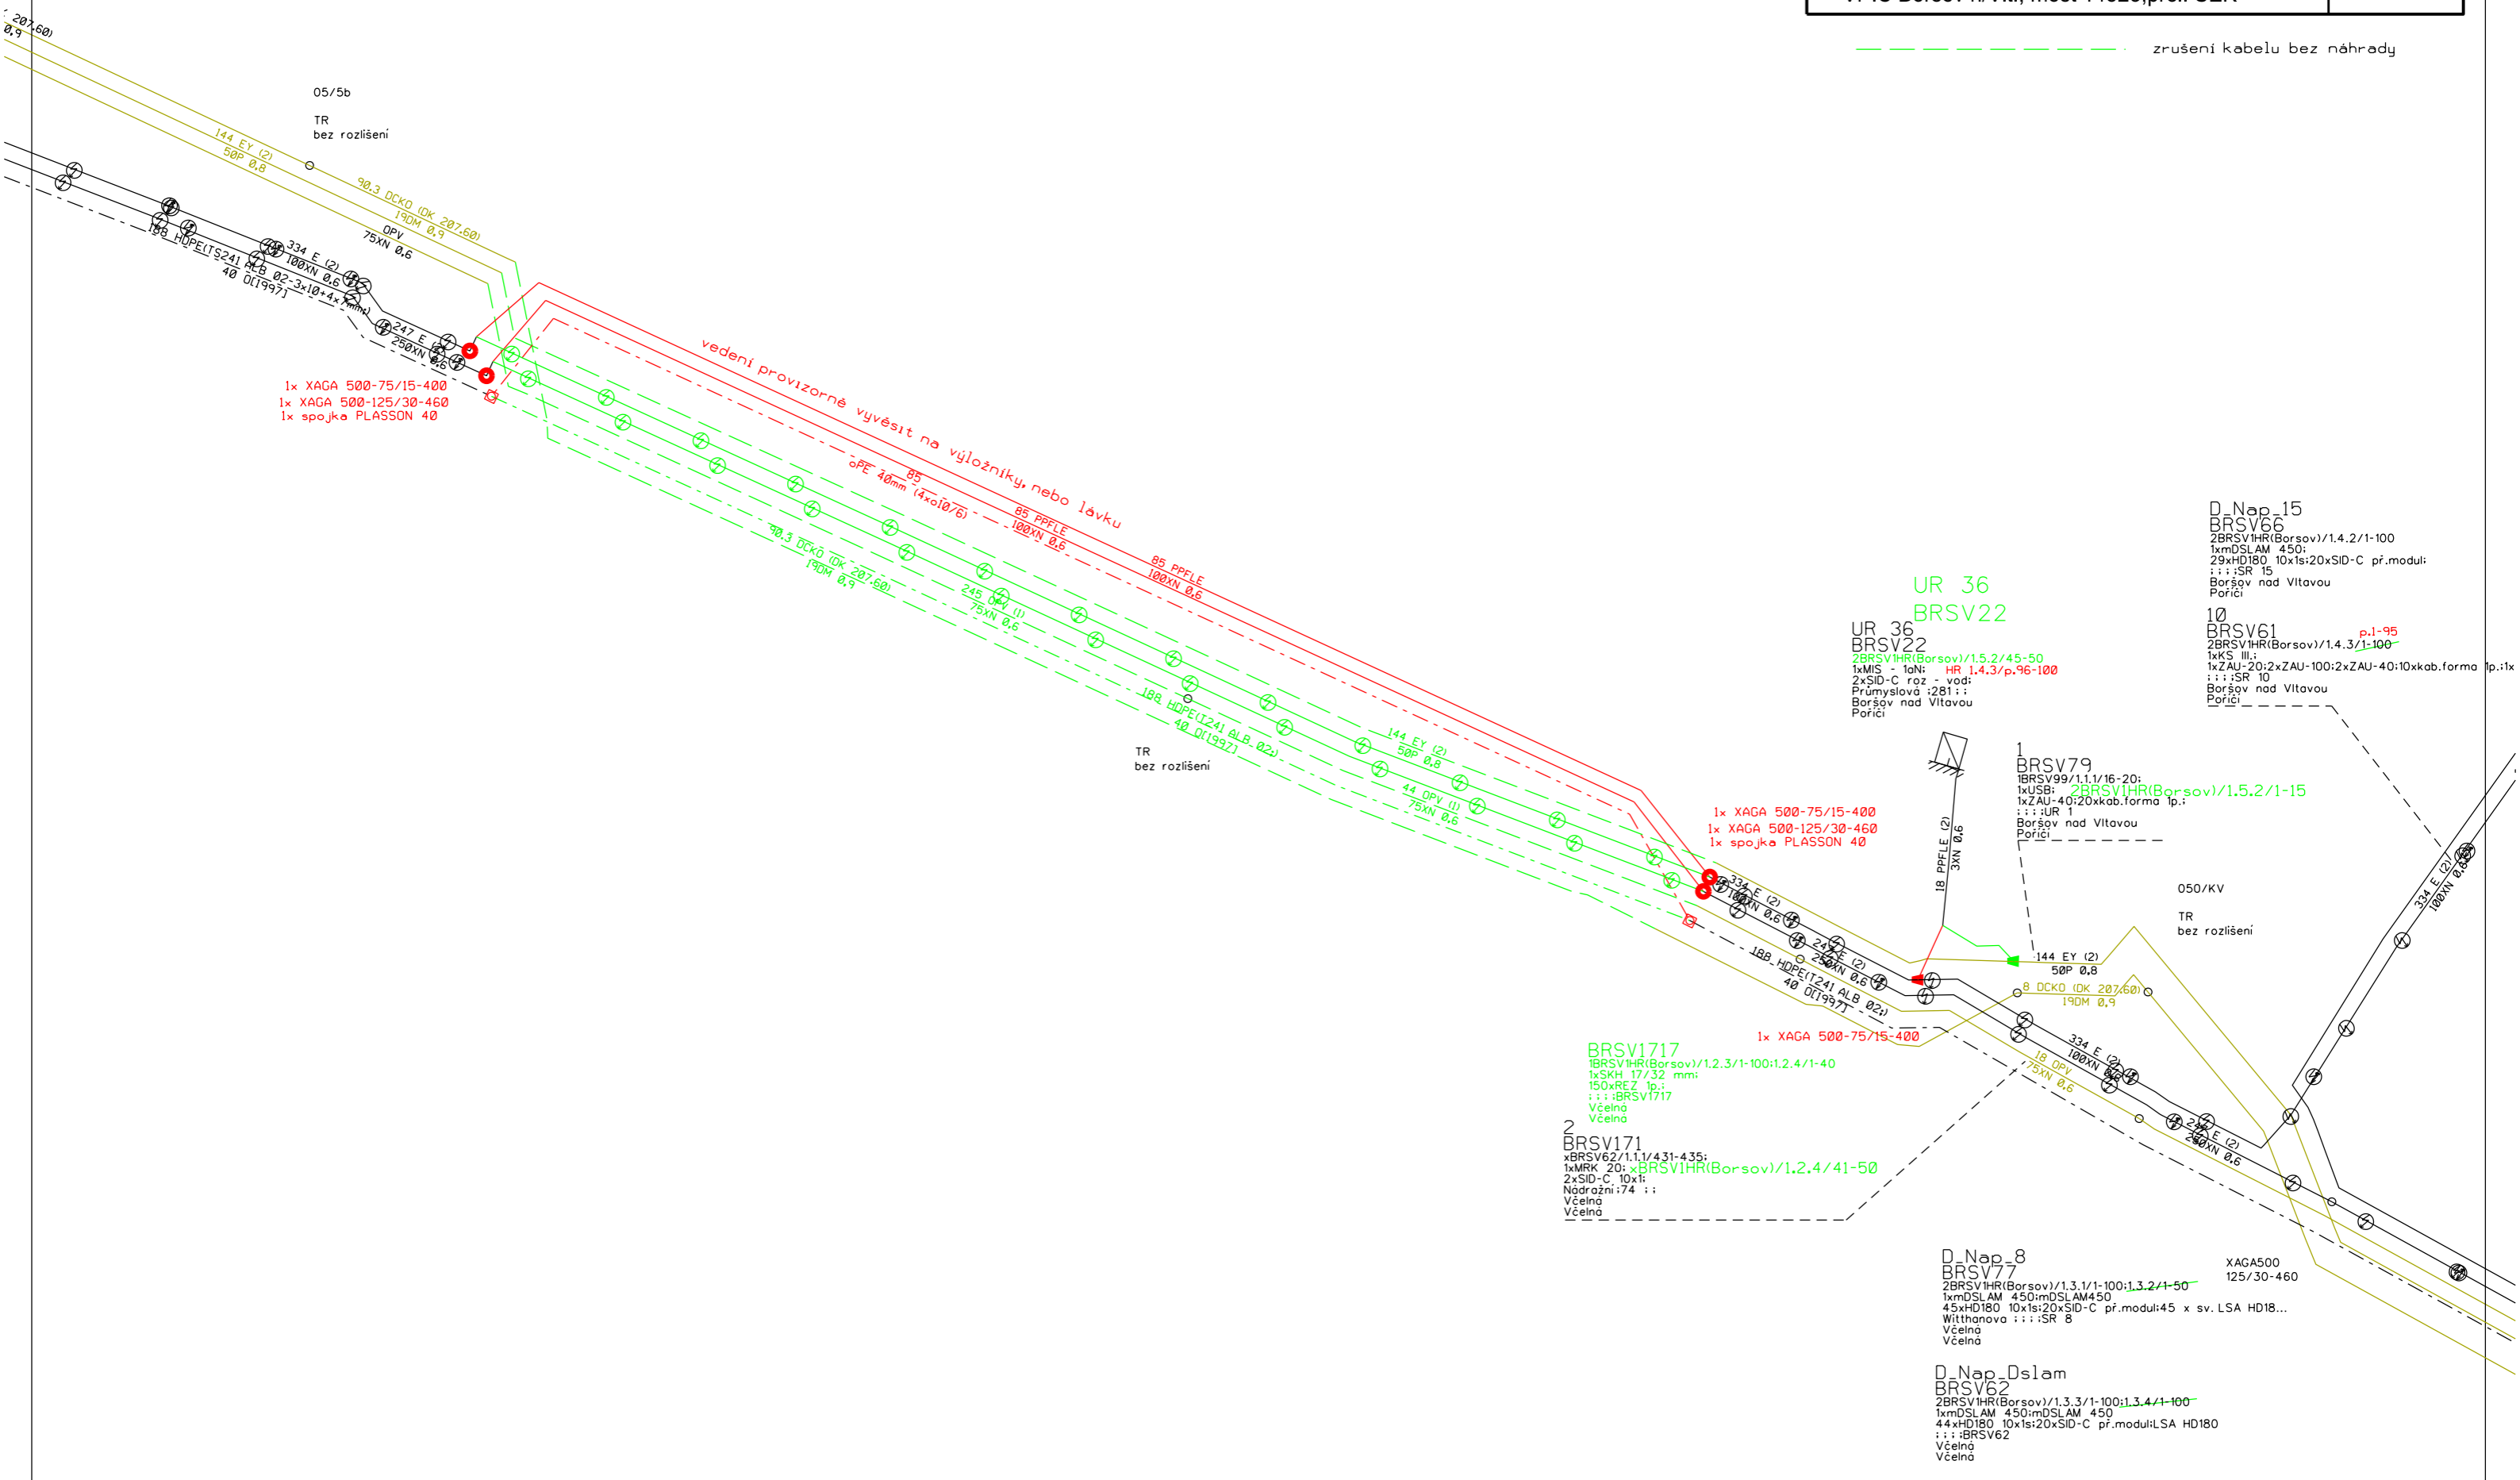

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-029362
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: DPS
	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu:	Schéma- definitivní přeládka	
Název zakázky:	VPIC Boršov n/Vlt., most 14325, přel. SEK	
		Číslo výkresu: S1b

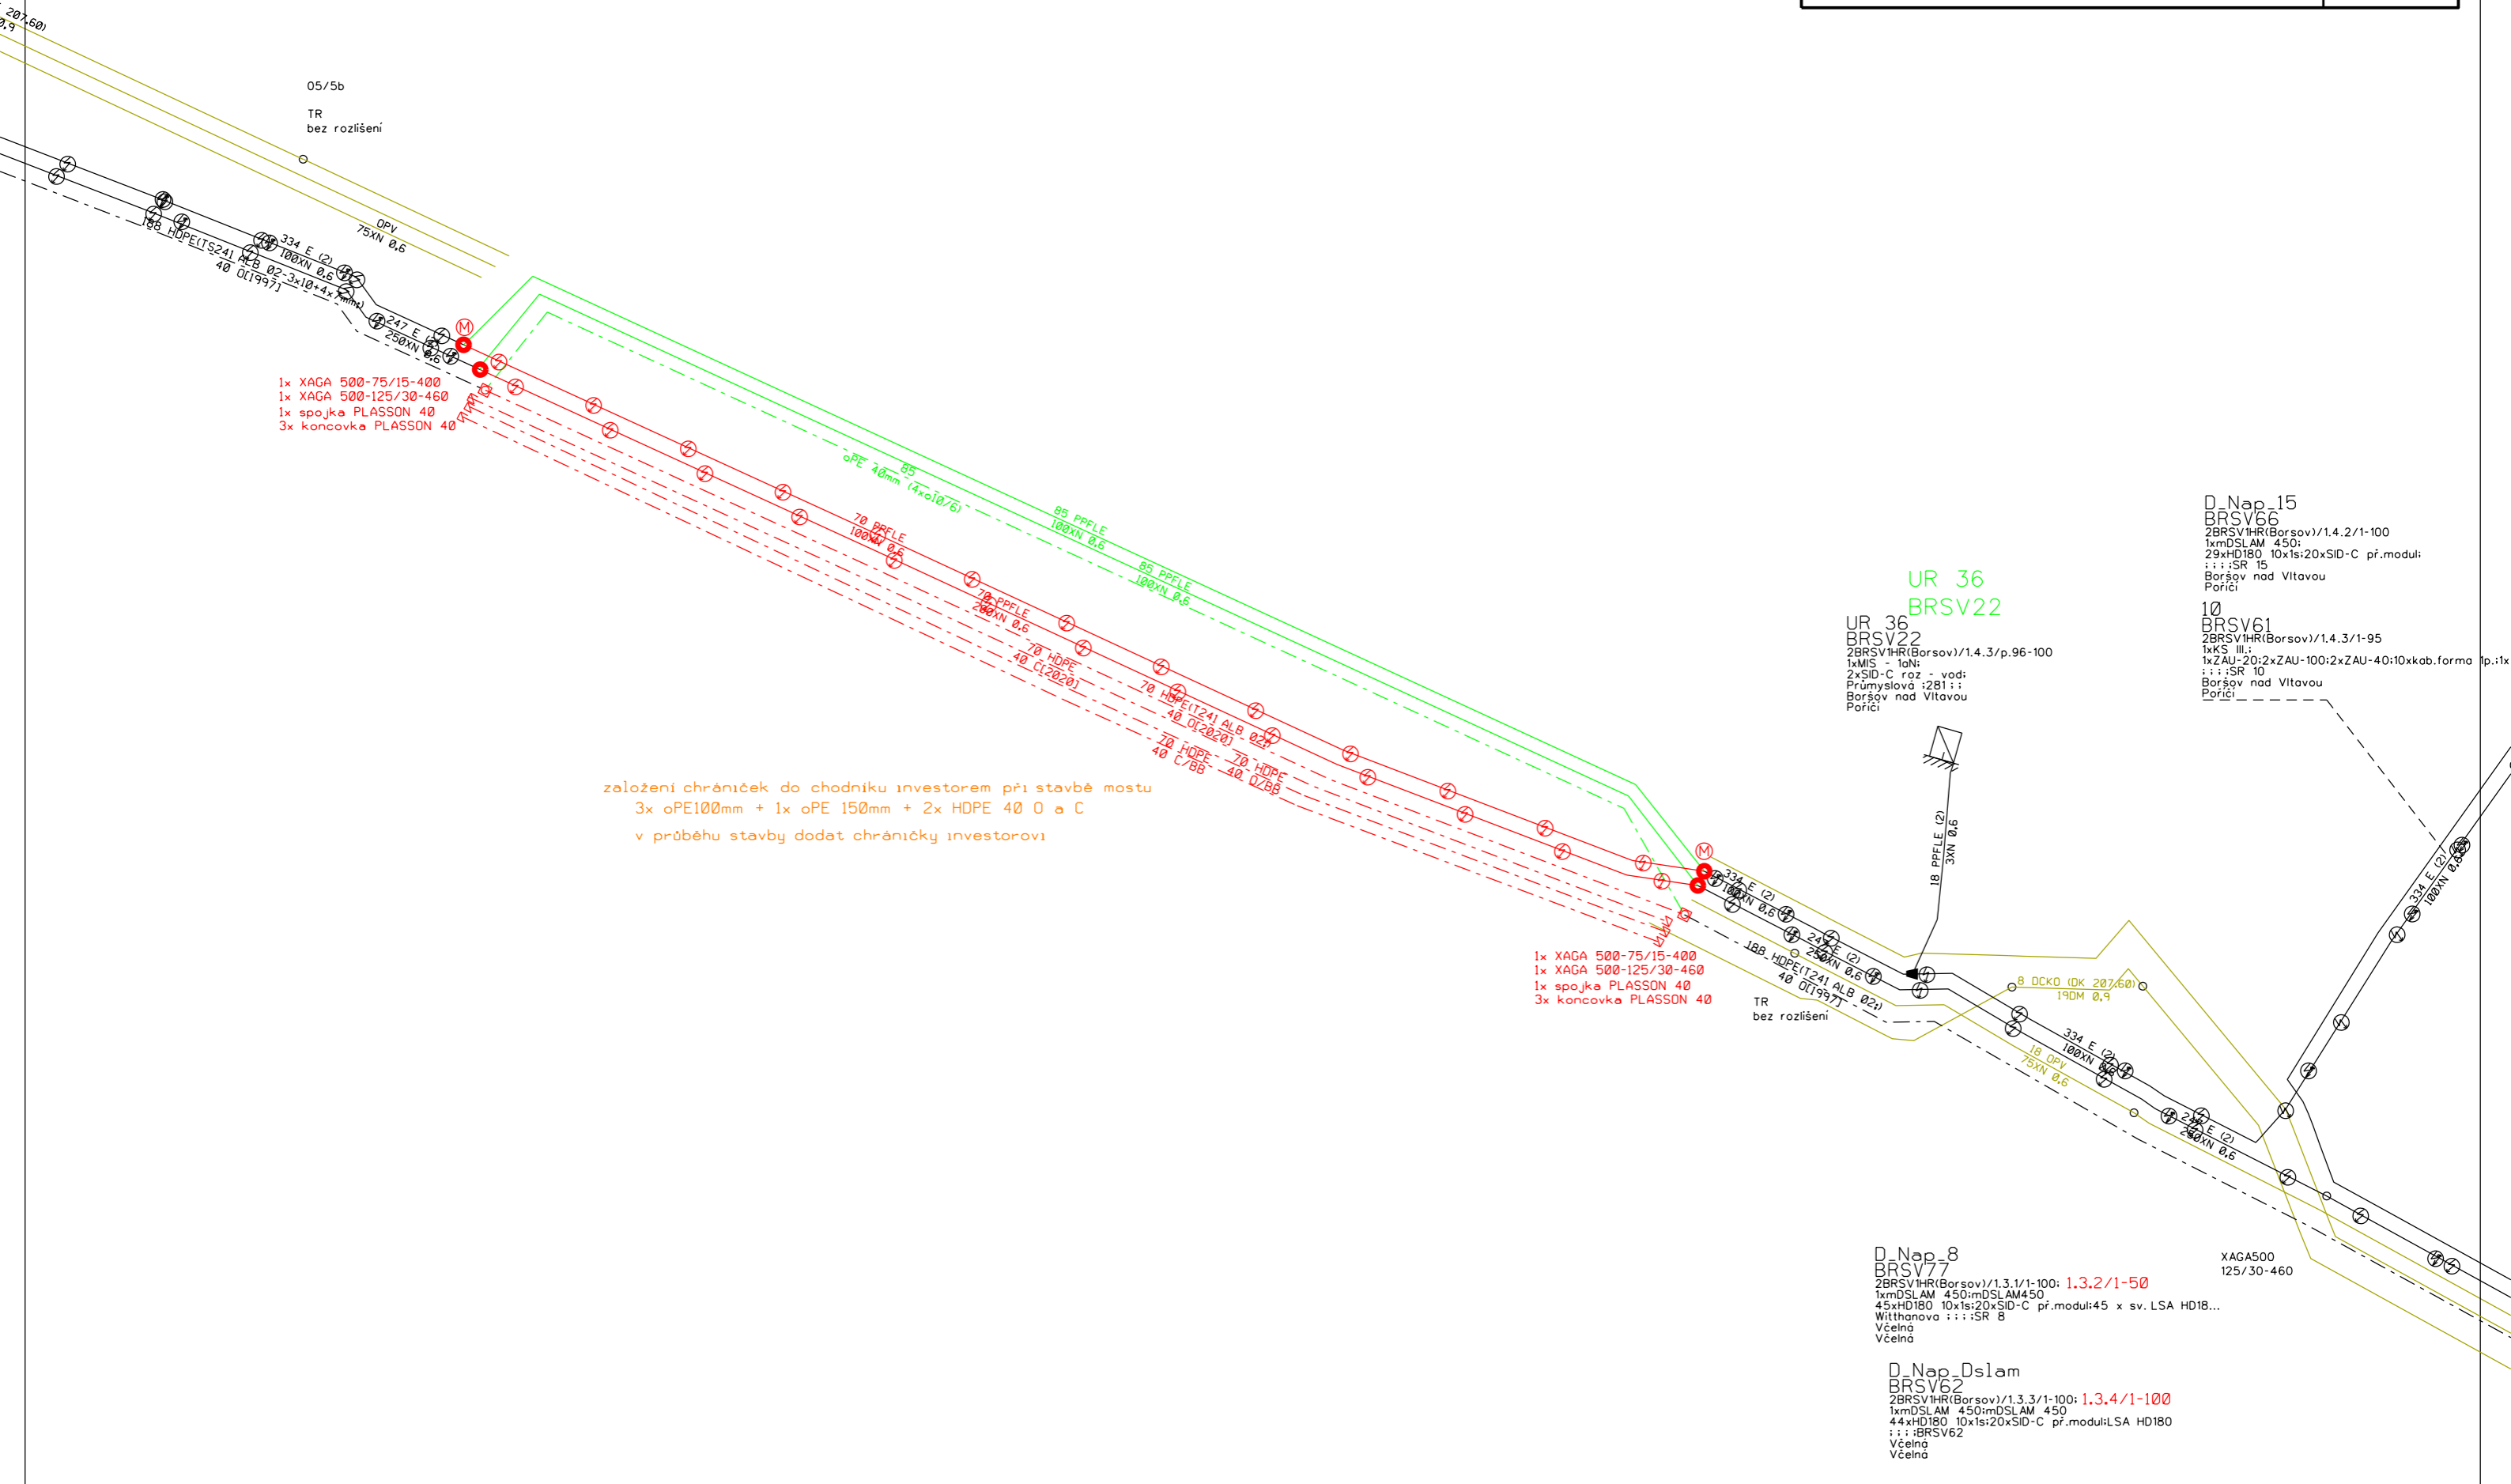



Trubkový kabel: 241 ALB - RSU BORŠOV-BTS CBVCE (ON:05.02.2020 09:12:37)
 (BRSV:BS:1 - PLAV:BS:2) Stránka: [K] Provozni

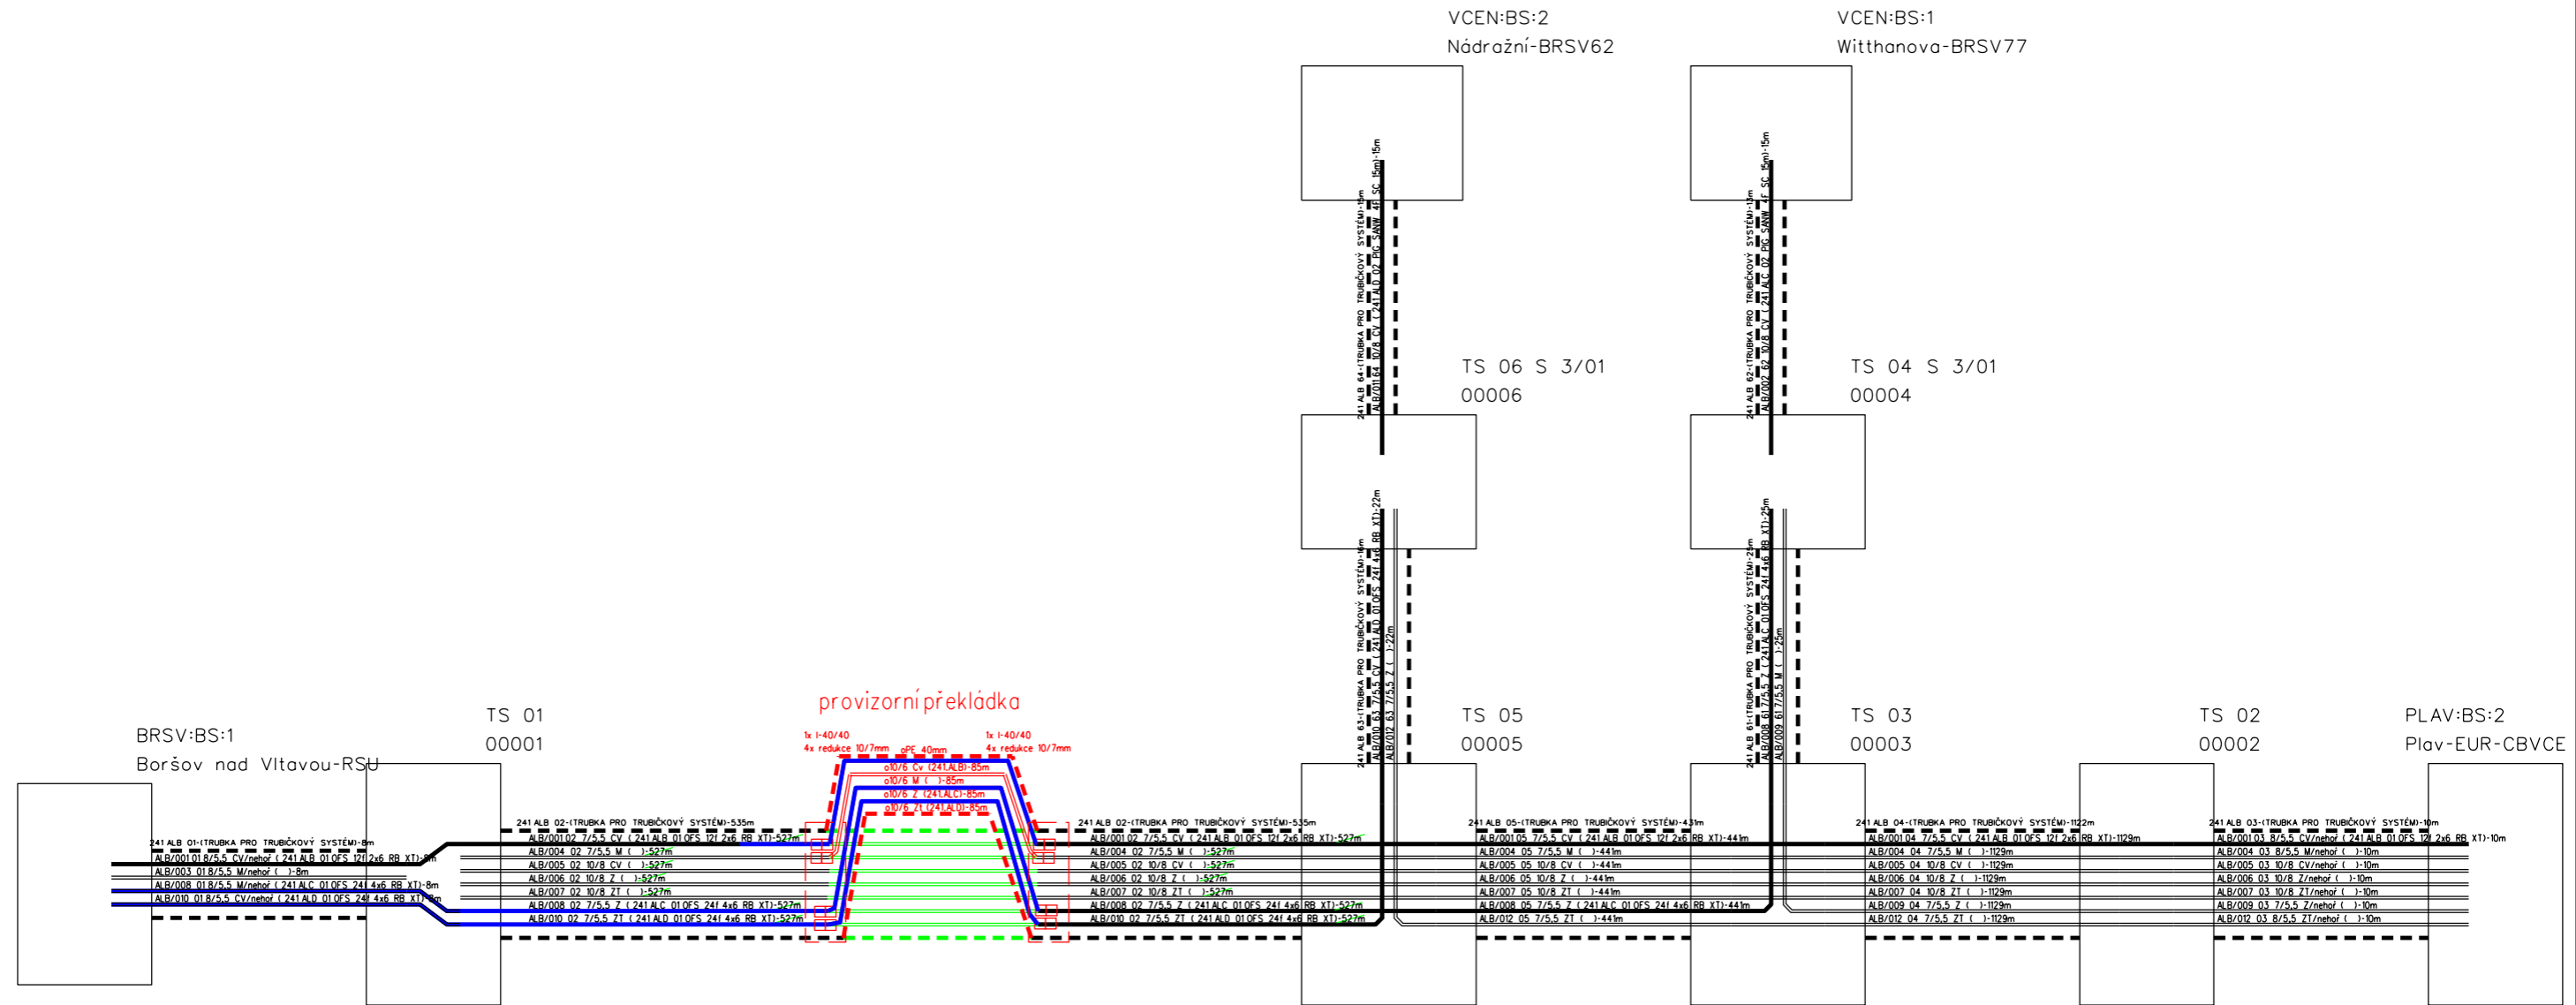


<p>Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ošlanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063</p>	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: DPS
	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřitko:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu: Schéma trubiček 241.ALB- provizorní překládka		Číslo výkresu:
Název zakázky: CTN VPIC Boršov nVlt., most 14325,přel. SEK		S2a

Trubkový kabel: 241 ALB - RSU BORŠOV-BTS CBVCE (ON:05.02.2020 09:12:37)
 (BRSV:BS:1 - PLAV:BS:2) Stránka: [K] Provozní

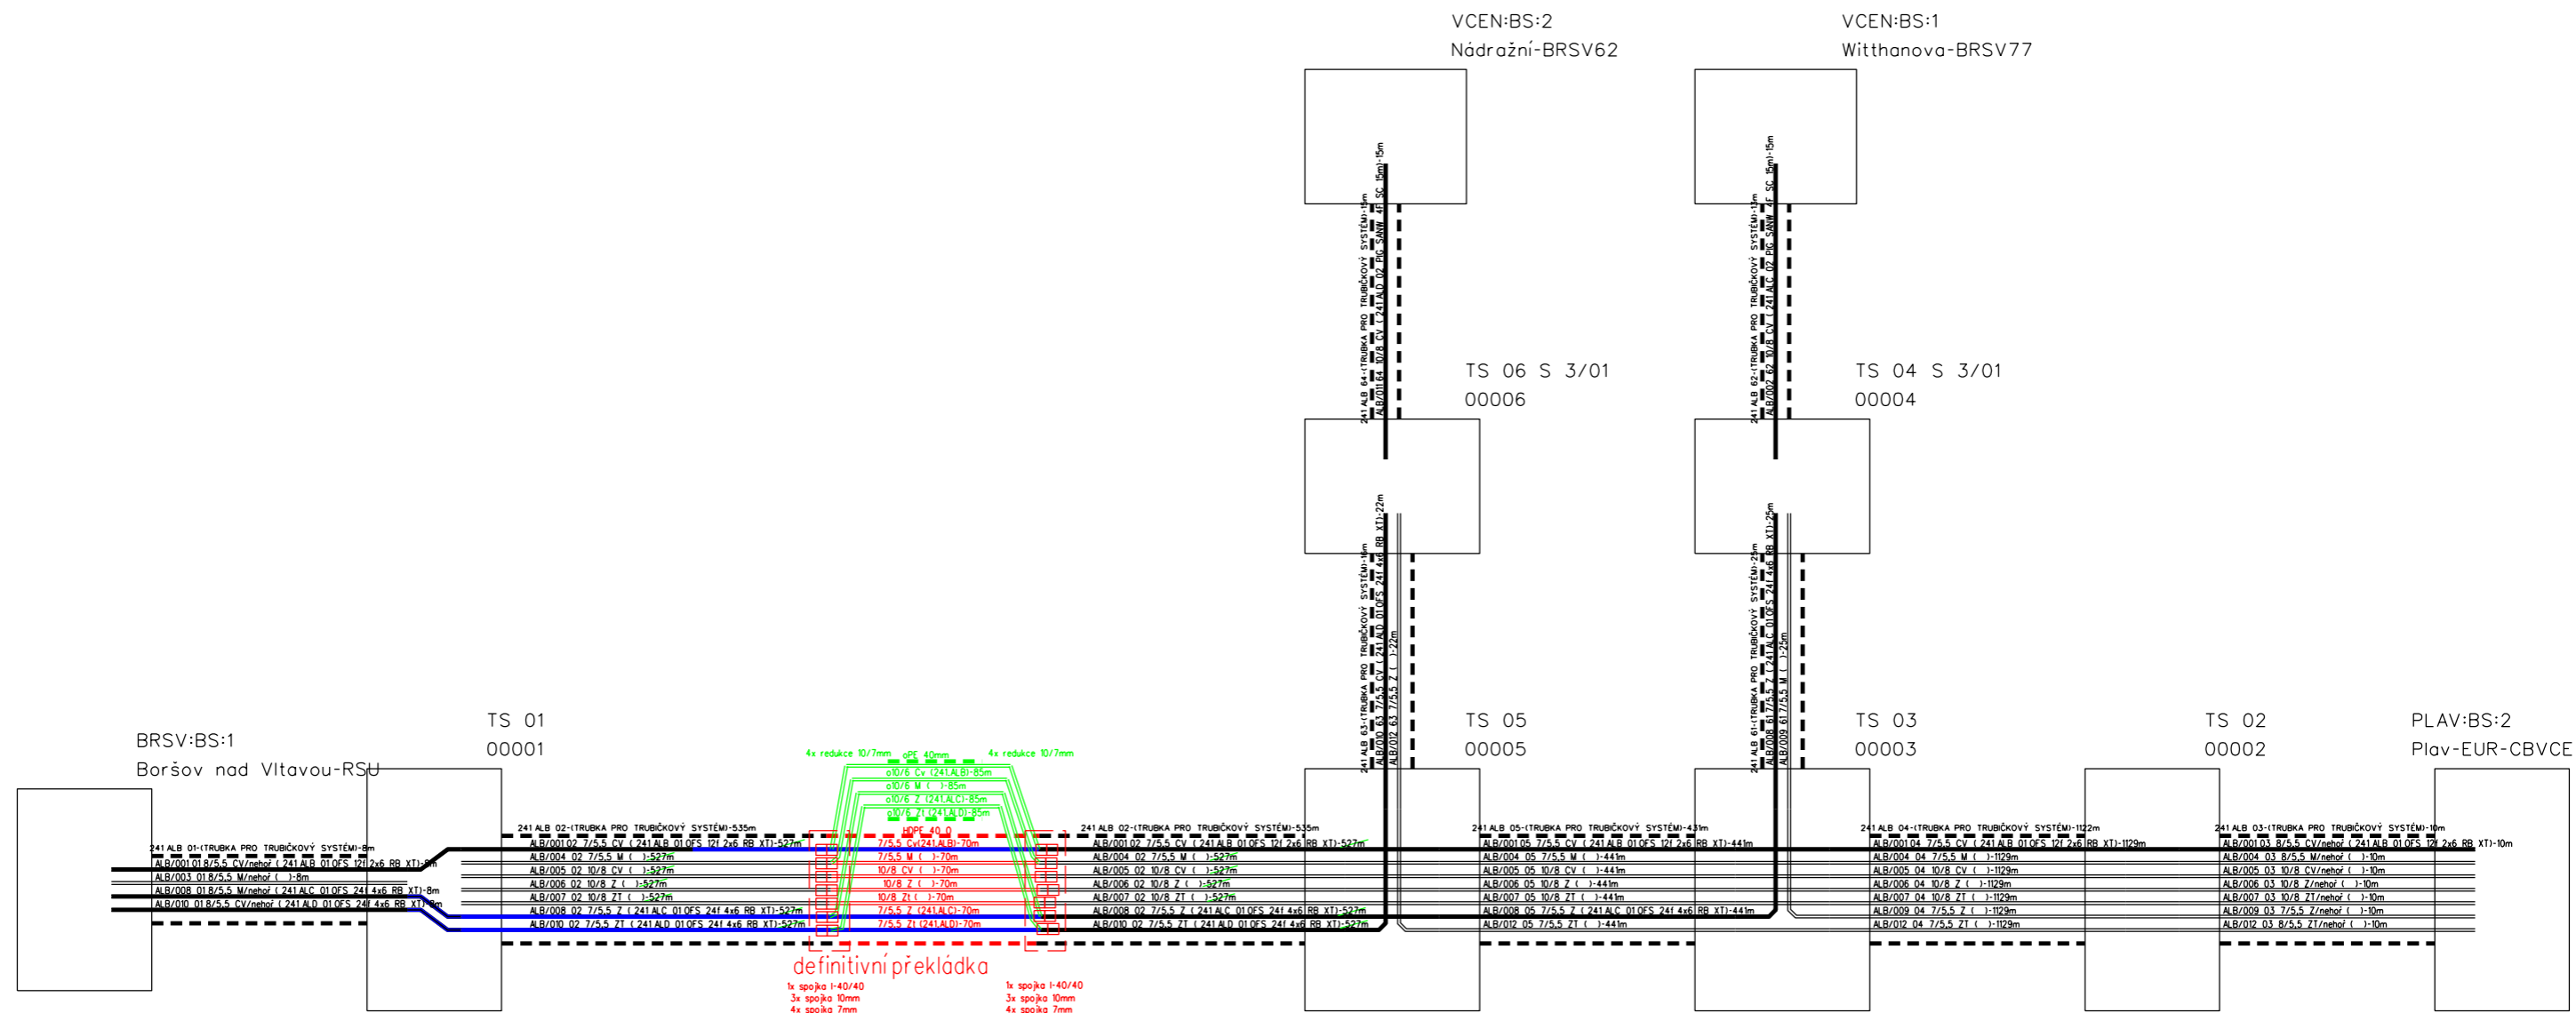


	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 16010-
	K.ú.: Boršov nad Vitavou	Stupeň: DPS
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Kreslil: Petr Farka	Formát: A3
	Vypracoval: Petr Farka	Měřitko:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu:	Schéma trubiček 241.ALB- definitivní překládka	
Název zakázky:	CTN VPIC Boršov nVlt., most 14325,přel. SEK	
		S2b


Úsek: 241 ALB 01 - RSU BORŠOV-BTS CBVCE (ON:05.02.2020 14:50:46)
 (BRSV:BS:1 - PLAV:BS:2)




Kabel: 241 ALC - Boršov n. Vltavou-BRSV77 rVDSL (ON:05.02.2020 15:18:07)
 (BRSV:BS:1 - VCEN:BS:1) Stránka: [K] Provozní




Kabel: 241 ALD - Boršov n. Vltavou-BRSV62 rVDSL (ON:05.02.2020 15:22:05)
 (BRSV:BS:1 - VCEN:BS:2) Stránka: [K] Provozní




 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 11010-
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: DPS
	Kreslil: Petr Farka	Formát: A4
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítko:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu:	Schéma OK 241.ALB, ALC, ALD	
Název zakázky:	CTN VPIC Boršov nVlt., most 14325,přel. SEK	

S3a+b


Úsek: 241 ALB 01 - RSU BORŠOV-BTS CBVCE (ON:05.02.2020 14:53:36)
(BRSV:BS:1 - PLAV:BS:2)

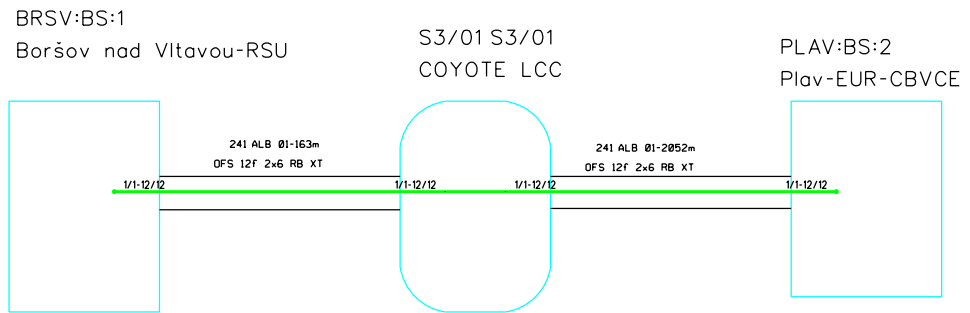


Kabel: 241 ALC - Boršov n. Vltavou-BRSV77 rVDSL (ON:05.02.2020 15:18:00)
(BRSV:BS:1 - VCEN:BS:1) Stránka: [K] Provozní

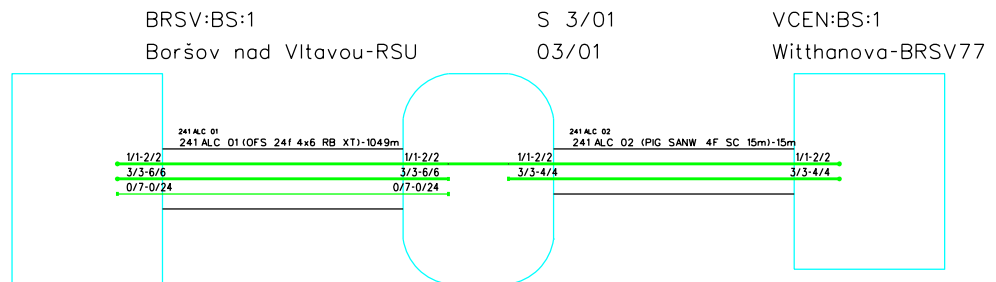

Kabel: 241 ALD - Boršov n. Vltavou-BRSV62 rVDSL (ON:05.02.2020 15:21:59)
(BRSV:BS:1 - VCEN:BS:2) Stránka: [K] Provozní

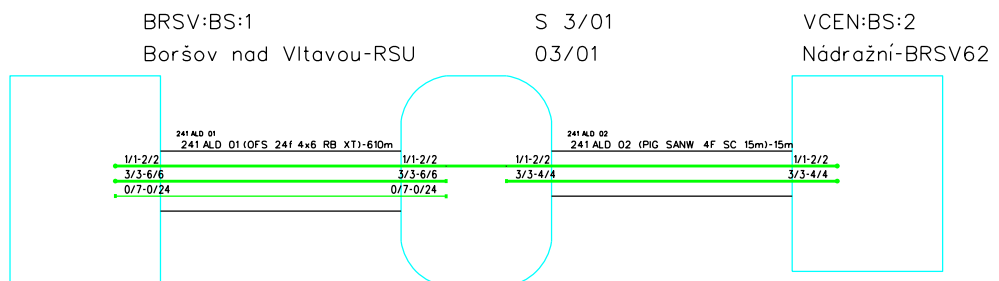

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 – Žižkov IČ: 4084063	Investor: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	SAP: 11010-
	K.ú.: Boršov nad Vltavou	Stupeň: DPS
	Kreslil: Petr Farka	Formát: A4
	Vypracoval: Petr Farka	Měřítka:
	Zodp. proj.: Josef Havlíček	Datum: 11/2020
Název výkresu:	Schéma vláken OK 241.ALB, ALC, ALD	
Název zakázky:	CTN VPIC Boršov nVlt., most 14325, přel. SEK	

S4a+b

Název stavby: Boršov nVlt., most 14325,přel. SEK- provizorní překládka
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	34.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.170	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	32 282,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	22 136,47 Kč
MONTÁŽ	240 640,85 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 369,74 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	104 465,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **400 894,63 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 368 612,63 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 32 282,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 759,50 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	15375.00 JV	15 375,00 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	10147.50 JV	10 147,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	85.00 m	2 225,30 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 465,77 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	20.00 m	13 445,40 Kč
MONTÁŽ				
958294 S		Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	511,26 Kč
955092 S		Demontáž rozvaděče optického	2.00 ks	1 386,32 Kč
958303 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	340.00 m	584,80 Kč
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks	4 630,80 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	16.00 ks	8 455,52 Kč

958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	16.00 ks	1 512,16 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	989,35 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	195.00 ks	8 938,80 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	403.00 ks	15 402,66 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	866,45 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	5.00 ks	10 686,15 Kč
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks	358,86 Kč
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	17.00 ks	549,61 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	116,26 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	170.00 m	7 792,80 Kč
956049 S	Pokládka tlustostěnné trubičky	340.00 m	4 304,40 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	3.00 ks	97 041,84 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	580,08 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	20 171,58 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropoli	4.00 ks	2 836,56 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 934,44 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 723,46 Kč
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	1254.00 m	34 372,14 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	55.00 m	540,65 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	110.00 m	3 528,80 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	165.00 m	3 527,70 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
322303 S		Kazeta pro Coyote LCC 3x žl.držák svarů	1.00 ks	497,50 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	872,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	911,20 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	95,80 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	170.00 m	86 625,20 Kč
301765 S		Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	2.00 ks	40,02 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	15.00 ks	27,60 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	750,33 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	80.00 ks	2 158,40 Kč
318641 S		Multimodul FOB 6xSC/APC 2m 0,25m	2.00 ks	946,84 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	6.00 ks	235,26 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	159,52 Kč
318807 S		Spojka I trubky průběžná40EBM-R40 vodot	2.00 ks	2 319,86 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	3.00 ks	2 363,25 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 608,52 Kč
317533 S		Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami	4.00 ks	221,72 Kč
322127 S		Spojka trubič.redukční 10/7 Gasblock OFA	8.00 ks	605,68 Kč
323827 S		Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist	3.00 ks	148,02 Kč
304901 S		Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	4.00 ks	407,20 Kč
323235 S		Trubička HDPE 10/6mm č.1 červená polopr	85.00 m	569,50 Kč
323236 S		Trubička HDPE 10/6mm č.2 zelená poloprůs	85.00 m	569,50 Kč
323237 S		Trubička HDPE 10/6mm č.3 žlutá poloprůs	85.00 m	569,50 Kč
323238 S		Trubička HDPE 10/6mm č.4 modrá poloprůs	85.00 m	569,50 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	85.00 m	1 563,15 Kč

Název stavby: Boršov nVlt., most 14325,přel. SEK- definitivní překládka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.020	KMP:	45.000	bytových HTS	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.150	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.300	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	25 566,05 Kč
MONTÁŽ	259 579,99 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	6 691,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	2 554,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	168 123,45 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **462 515,96 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 462 515,96 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	216.00 m	5 654,88 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 465,77 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	20.00 m	13 445,40 Kč
MONTÁŽ				
958294 S		Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	511,26 Kč
955092 S		Demontáž rozvaděče optického	2.00 ks	1 386,32 Kč
958303 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba	550.00 m	946,00 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	300.00 m	1 329,00 Kč
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	24.00 ks	4 630,80 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - : 16.00 ks	16.00 ks	8 455,52 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - st: 16.00 ks	16.00 ks	1 512,16 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	989,35 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	295.00 ks	13 522,80 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	600.00 ks	22 932,00 Kč
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	87,26 Kč
955003 S		Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	866,45 Kč

955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	8 548,92 Kč
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks	358,86 Kč
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.	21.00 ks	678,93 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	300.00 m	5 973,00 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	150.00 m	6 876,00 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	3.00 ks	97 041,84 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	2.00 ks	580,08 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	20 171,58 Kč
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a met	4.00 ks	2 836,56 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 934,44 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 723,46 Kč
955942 S	Zafukování svazku trubiček	75.00 m	2 581,50 Kč
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	1254.00 m	34 372,14 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	4.00 ks	5 982,76 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	170.00 m	5 453,60 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 691,91 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
322303 S		Kazeta pro Coyote LCC 3x žl.držák svarů	1.00 ks	497,50 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	872,24 Kč
318979 S		Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	6.00 ks	507,78 Kč
318980 S		Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	8.00 ks	677,04 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	911,20 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	95,80 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFL 100x4x0,6	75.00 m	38 356,50 Kč
300123 S		Kabel plastový TCEPKPFL 200x4x0,6	75.00 m	77 762,25 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	229,82 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	750,33 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	120.00 ks	3 237,60 Kč
318641 S		Multimodul FOB 6xSC/APC 2m 0,25m	2.00 ks	946,84 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	6.00 ks	235,26 Kč
318806 S		Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	2.00 ks	2 966,06 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 575,50 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	24.00 ks	1 070,64 Kč
316166 S		Spojka plastová 125/107mm	8.00 ks	432,56 Kč
320295 S		Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	2.00 ks	2 608,52 Kč
317533 S		Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami	4.00 ks	221,72 Kč
323827 S		Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist	3.00 ks	148,02 Kč
300633 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	75.00 m	312,75 Kč
300634 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	75.00 m	312,75 Kč
300635 S		Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	75.00 m	312,75 Kč
300623 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	75.00 m	201,75 Kč
300624 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	75.00 m	201,75 Kč
300625 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	75.00 m	201,75 Kč
300626 S		Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	75.00 m	201,75 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	75.00 m	2 435,25 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	75.00 m	2 435,25 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	75.00 m	2 435,25 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	75.00 m	2 435,25 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	27.00 ks	15 111,63 Kč
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	9.00 ks	9 976,95 Kč

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Gabriela Peška
manažer

os. č. 12140, nar. dne 1.11.1971, bytem Kosmonautů 244, Pardubice, PSČ 530 09
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užítých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva
CETIN a.s.
14:49 29.11.2023
RSA/4096

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
09:32 29.11.2023
RSA/4096



69. jednání Rady Jihočeského kraje dne 27. 08. 2015

K bodu: Svěření rozhodování o smlouvách s vlastníky veřejné technické infrastruktury a o dohodách o předčasném užívání stavby

Usnesení č. 887/2015/RK-69

Rada Jihočeského kraje

I. svěřuje

podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi rozhodování o uzavírání smluv s vlastníky veřejné technické infrastruktury a rozhodování o uzavírání dohod o předčasném užívání stavby se zhotoviteli stavby, a to pro účely správních řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se staveb pozemních komunikací.

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
