



Číslo smlouvy společnosti CETIN: PN 2023_0006
Číslo smlouvy Stavebníka: 171-OMI/2023

SAP S/4 Hana: 8030004661
Registr smluv: NE

12-OMI/2024

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 348/28/23
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ROP 2024
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost KOLFOVA JF
Zveřejněno na profilu

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2023_0006**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Horní Slavkov

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Jiřím Syrovým, supervizorem, VFS Čechy jih

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Horní Slavkov

se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO: 00259322

DIČ: CZ00259322

ID DS: pm6bqn3

zastoupené Alexandrem Terekem, starostou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Horní Slavkov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

kteřé umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 11.9.2023 vydané pod čj. 257499/23 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC H_Slavkov_Osvoboditelů_chodník**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací

Překládka a/nebo jednotlivými úkony Překládka pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 174 odst. 1 písm. a) Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnost vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé v souvislosti s व्यवस्थापन řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou Stavebník s plněním povinností dle Smlouvy a/nebo po kterou byla služebnost přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit Stavebníkovi.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno oznámení uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v hlavičce Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany se dohodly, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručeno, pokud oznámení od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy doručeno elektronickou poštou uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž tímto ustanovením nejsou vyloučeny všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, pokud by nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni 31.12.2023 **416 831,00 Kč** (slovy: čtyři sta šestnáct tisíc osm set třicet Kč). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě údajů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, a to výše, která je stanovena v „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborní subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou Překládka,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/ poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, je pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobených plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanoví se změně písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit ročně, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Fa

Číslo smlouvy společnosti CETIN: PN 2023_0006
Číslo smlouvy Stavebníka:171-OMI/2023

SAP S/4 Hana: 803
Registr smluv: NE

- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společně Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené prodlením.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 606 694 076, e-mail: theodor.valenta@cetin.cz

ve věcech technických: Václav Křivánek
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 602 659 028, e-mail: vaclav.krivanek@cetin.cz

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Alexandr Terek
funkce: starosta
tel. 354 229 663, e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN opodstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN jí s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výš stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výš stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stav společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škod vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají povinnosti, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejméně před uzavřením Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou měsíců od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s Smlouvou do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají přípa

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou, Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strana předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy mohou být Osobní údaje z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících z povinností za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, které jsou subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zpracování údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových zprávek;
 - (c) e-mailovou zprávou podpořenou zaručeným elektronickým podpisem;

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných osob. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemných sporů, ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavazující stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Ve Smlouvě Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právem označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými stranami na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronickou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou použity osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku neuzavírají odpovědnost za nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jejího předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech povinností Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a která jsou závažná pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný před uzavřením Smlouvy ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán jako ustanovení Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: PN 2023_0006

SAP S/4 Hana: 803

Číslo smlouvy Stavebníka:171-OMI/2023

Registr smluv: NE

Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho prac externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy. Smlouva je účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet zabránit tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo e poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účir Aniz by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opati vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu ne situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo naruš by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících : Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménu uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přiče je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá : jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Horní Slavkov usnesením č 29.12.2023.

CETIN
V Praze dne

Stavebník
V Horním Slavkově dr



VPIC H. Slavkov_Osvoboditelů_chodník

Návrh cenový a technický na přeložení metalické sítě společnosti CETI plánované stavby: CHODNÍK V ULICI OSVOBODITELŮ

V místě připravované stavby nového chodníku se nachází nadzemní ka – 5XN na dřevěných a betonových sloupech. Sloupy jsou umístěny blíz kde bude vybudován nový chodník.

Dále do nového chodníku částečně zasahuje rozvaděč SIS 450, DSLAI

Řešení je patrné z příložené dokumentace.

Rozvaděč bude zcela obnažen včetně části kabelové trasy a posunut b o 0,3 m mimo budovaný chodník.

V ulici Horní Příkopy a poblíž u garáží budou vybudovány 2 nové sloup provedeno převěšení kabelů do nových tras. Demontáž původních slou Ostatní nadzemní kabelové přípojky budou nahrazeny úložnou přípojko chodníku. Ve většině trasy v souběhu s budovaným VO a trasou NN. K c celé trase v chráničce KOPOFLEX 50. Ve vjezdech a pod obrubou v (

Nové trasy budou projednány ve společném územním řízení na stavbu. dohody součástí projektu nosné stavby. Pro zpracování DPPS je nutné dokladovou část dokumentace.


V rámci zpracování DPPS budou uzavřeny smlouvy o služebnosti sítě r

Vypracoval:

Jiří Hrdlička, únor 2023

tel. 702 128 387



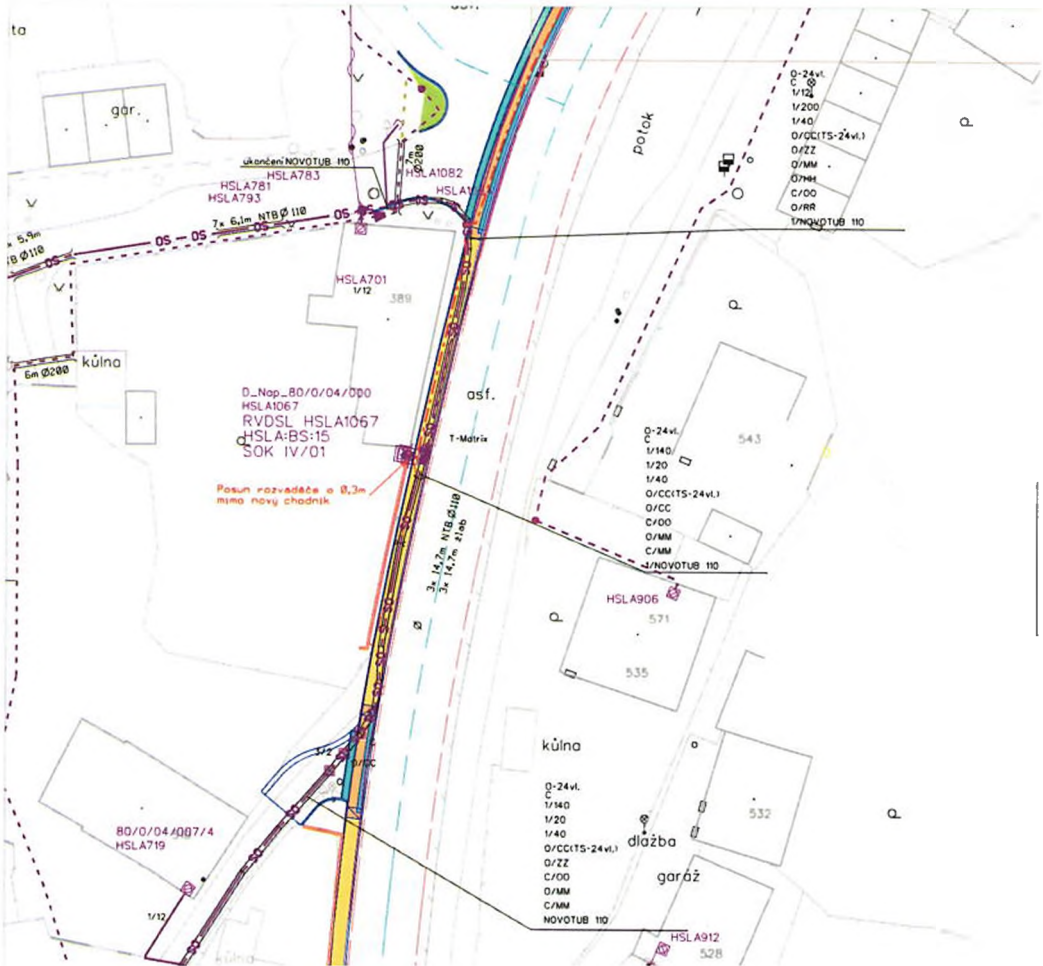

D_Nap_80/0/04/000
 HSLA1067
 RVDSL HSLA1067
 HSLA:BS:15
 SOK IV/01

Posun rozvádčača o 0,3m
 mimo nový chodník.


Ø-24v.
 C 1/12
 1/200
 1/40
 Ø/CC(15-24v.)
 Ø/ZZ
 Ø/MM
 Ø/HH
 C/00
 Ø/RR
 17NQDUTUB 110

Ø-24v.
 C 1/140
 1/20
 1/40
 Ø/CC(15-24v.)
 Ø/CC
 C/00
 Ø/MM
 C/MM
 1/NOVOTUB 110

Ø-24v.
 C 1/140
 1/20
 1/40
 Ø/CC(15-24v.)
 Ø/ZZ
 C/00
 Ø/MM
 C/MM
 NOVOTUB 110

80/0/04/007/4
 HSLA719

HSLA912
 528

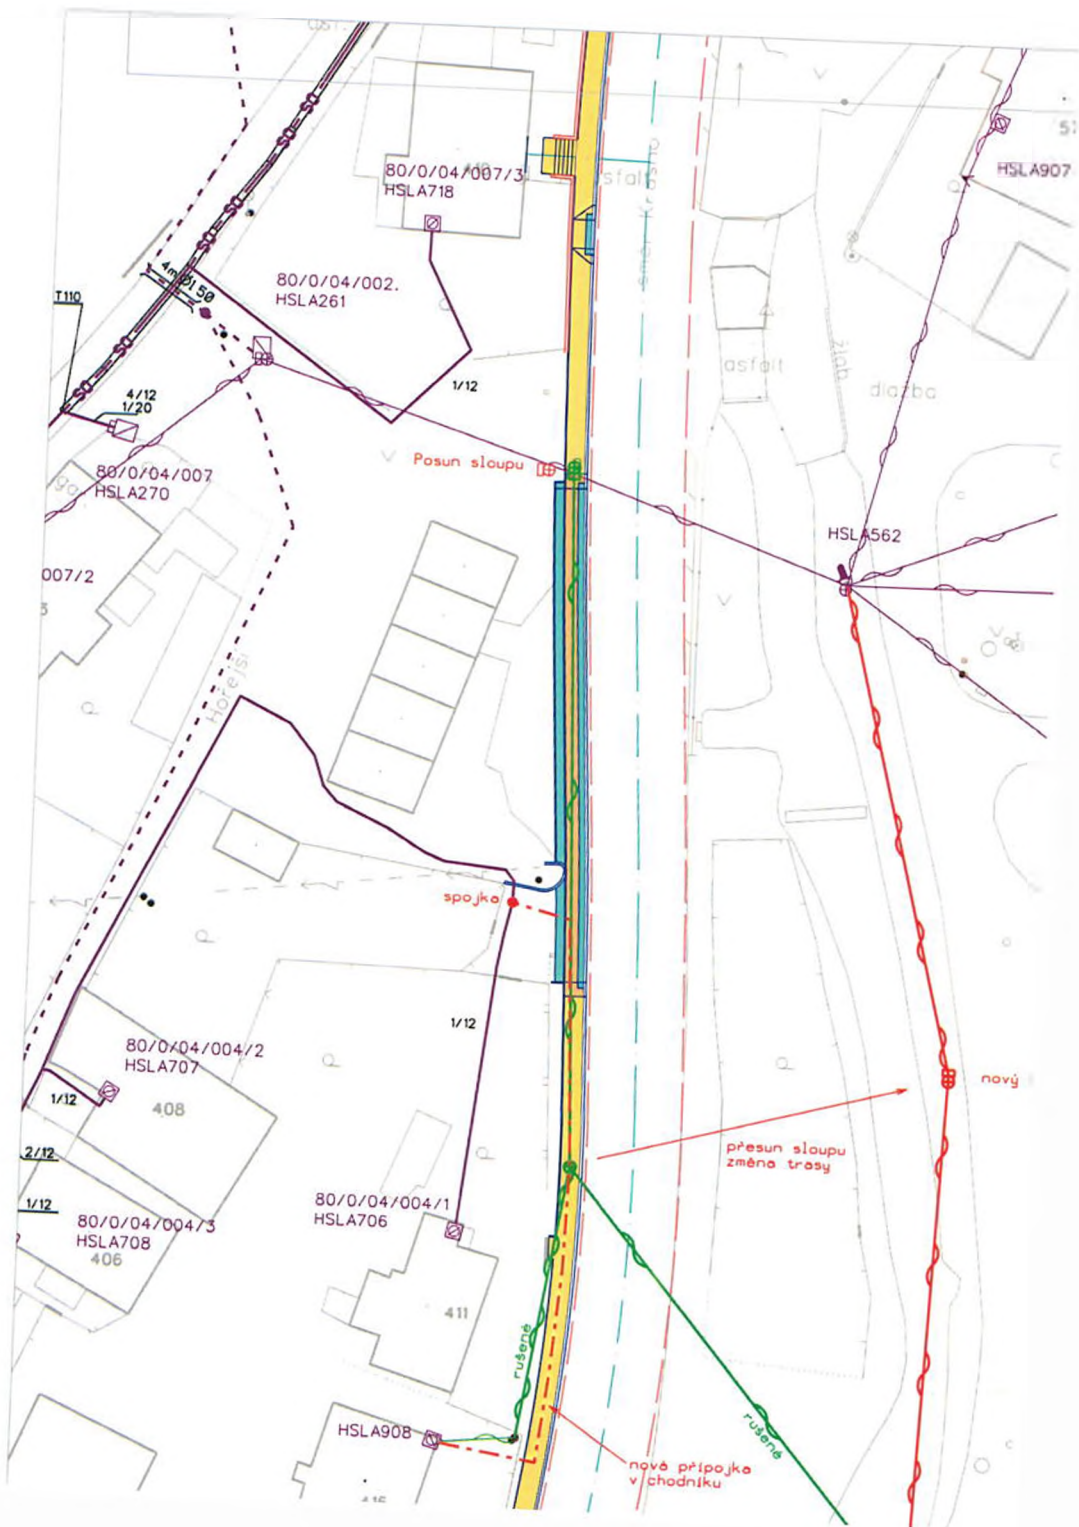

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

H VP STAND. H 2C

Položková databáze:

2023.04

Název stavby: VPIC H. Slavkov_Osvoboditelů_chodník

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Jiří Hrdlička

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.315	KMP:	4.640	bytových HTS:
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.390	podnik. HTS:
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:
		KMTRU:	0.000	PP HR:
		KMOK:	0.000	PP UR:
		KMVL:	0.000	
		KMTRK:	0.000	

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	43 256,16 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	125 773,41 Kč
MONTÁŽ	88 562,67 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	18 591,91 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	19 602,56 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 827,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	17 609,10 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	62 608,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 416 831 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 327 745,73 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 89 085,56 Kč

Seznam položekČíslo SAP Stavební činnost
PŘÍPRAVA

Název položky

Množství

955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	330.00 m
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	9840.00 JV
	Účast na KD hlavního investora, řešení střetů mimo PD	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	17.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks
955248 S	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka	1.00 ks
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	2.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	7.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	2.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	810.00 m
955073 S	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	14.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	14.00 ks
GEODETIČKÉ PRÁCE REALIZACE		
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	400.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu	1.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	2.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	10.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	315.00 ks
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	6.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	315.00 m
300118 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	130.00 m
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	60.00 m
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	80.00 m
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	60.00 m
300176 S		Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6	60.00 m
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	70.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks
322275 S		Skříň rozvaděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2	2.00 ks
301339 S		Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	3.00 ks
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	8.00 ks
313998 S		Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů	2.00 ks
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	10.00 ks

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NE

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zastoupená Theodorem Valentou, specialistou pro výstavbu sítě - přek
liniových sítí ČJ
(„**CETIN**“)

a

[•]
(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strana**
„**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných u
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Obč**

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**ČI. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní rozhodnutí**“), které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu ve elektronických komunikacích („**Stavba telekomunikačního vedení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práv a povinností z telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí.

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NI

2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II oc oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pr uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně, a v elektronické podobě výslovně označenými za dodatky elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvní dokumentu; změna jinou formou je vyloučena. Ujednání Smluvních stran, aby na základě jejich výslovné dohody dodatky k Dohodě v listinné podobě s podpisy oprávněných stran na téže listině.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovat podepsán zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické komunikace ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - c) e-mailovou zprávou se Zaručeným elektronickým podpisem.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí právní úpravy mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně v oboru se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně stanoveno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené v České republice, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení ze strany odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, mají právo uplatnit svůj nárok na řešení sporu v České republice.

Číslo Dohody:
Číslo Dohody stavebníka:

SAP: ...NE
Registr smluv: NE

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Praze dne _____ 20[•]

V _____ dne_

za **CETIN a.s.**

Jméno: [•]

Funkce: [•]

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostoru subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých odvolacích řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním sítí a přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních konstrukcí veřejné komunikační sítě náležející Společnosti technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo s možností komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení smlouvy nebo vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavázat závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v celkové hodnotě **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je veřejné komunikační síť Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zaměstnanec může projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů Přebudování a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka komunikační sítě, v souvislosti s provedením Přebudování pro stavebníka tře uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy uzavřené Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu trvání nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdělení výkladů se smlouva vždy uzavírá



ČLEN SKUPINY PPF

Eviden

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným n souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i čín přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společno republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí t poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu ne užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci

Dokument VPIC H_ Slavkov_Osvoboditelů_chodník _ SoRP_el. podpis.pdf vznikl převedením elektronického c pořadovým číslem 162146550-464278-240115135559. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokume

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovate Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření pl zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.01.2024 13:26:05. Údaje o z kvalifikovaného certifikátu 01 5C 99 36, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualifi osobu JIŘÍ SYROVÝ, 75374, CETIN a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 11.01.2024 10:59:00. Podpis byl shledá porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.01.2024 13:26:05. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podj elektronický podpis 01 SF 63 B6, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru P pro podepisující osobu Alexandr Terek, 001, MĚSTO HORNÍ SLAVKOV. Podpis byl označen platným l kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikov 11.01.2024 10:59:00. Údaje o časovém razítku: 11.01.2024 10:59:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro č poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Město Horní Slavkov, IČ: 00259322

Pracoviště: Město Horní Slavkov

Datum vyhotovení: 15.01.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Jaroslava Rohová

Otisk úředního razítka:



16214655

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními pře evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.
