
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. CB 2024_0010**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [REDACTED]

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp.zn. Pr 737

se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

ID DS: qbep485

kontaktní osoba: [REDACTED]

zastoupená Mgr. Martinem Vítem, MPA - technickým ředitelem, na základě pověření č.j. 20971/22/SÚSPK-P
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Stříbro spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní

realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 24.1.2023 vydané pod čj. 23984/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI Stříbro, most ev.č. 193-18 bez překl.MK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistila zpracování Projektu;
- (ii) zajistila Územní souhlas Městského úřadu Stříbro pro stavbu „Most ev. Č. 193-018 Stříbro, Přeložka metalických a optických kabelů CETIN“ čj. 1672/OVÚP/23-2/25/Ha ze dne 2.10.2023, který je přílohou č. 2 Smlouvy;
- (iii) uzavřela smlouvy o smlouvách budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí.

(b) se zavazuje po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, písemně vyzvat společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne doručení Kvalifikované výzvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **924.692,00 Kč** (slovy: devět set dvacet čtyři tisíc šest set devadesát dva korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinální výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci

Překládky,

- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

funkce: specialista koordinace výstavby sítě

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních a technických:

[REDACTED]

funkce: Technik plánování a administrace dotací

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

funkce: Vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu zásad stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně

na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních

stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování

uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Územní souhlas Městského úřadu Stříbro čj. 1672/OVÚP/23-2/25/Ha

Příloha č. 3 - Pověření CETIN


Příloha č. 4 - Pověření SÚS Plzeňského kraje, p.o


CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Plzni dne




manažer, VFS
(podepsáno elektronicky)


za **Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, p.o**
Mgr. Martin Vít, MPA
technický ředitel
(podepsáno elektronicky)



PODROBNÁ SITUACE 1:250

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 KOMUNIKACE
- SO 201 MOST EV.Č. 193-018 STŘÍBRŮ
- SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ CHODNÍKU
- SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 403 PŘELOŽKA KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

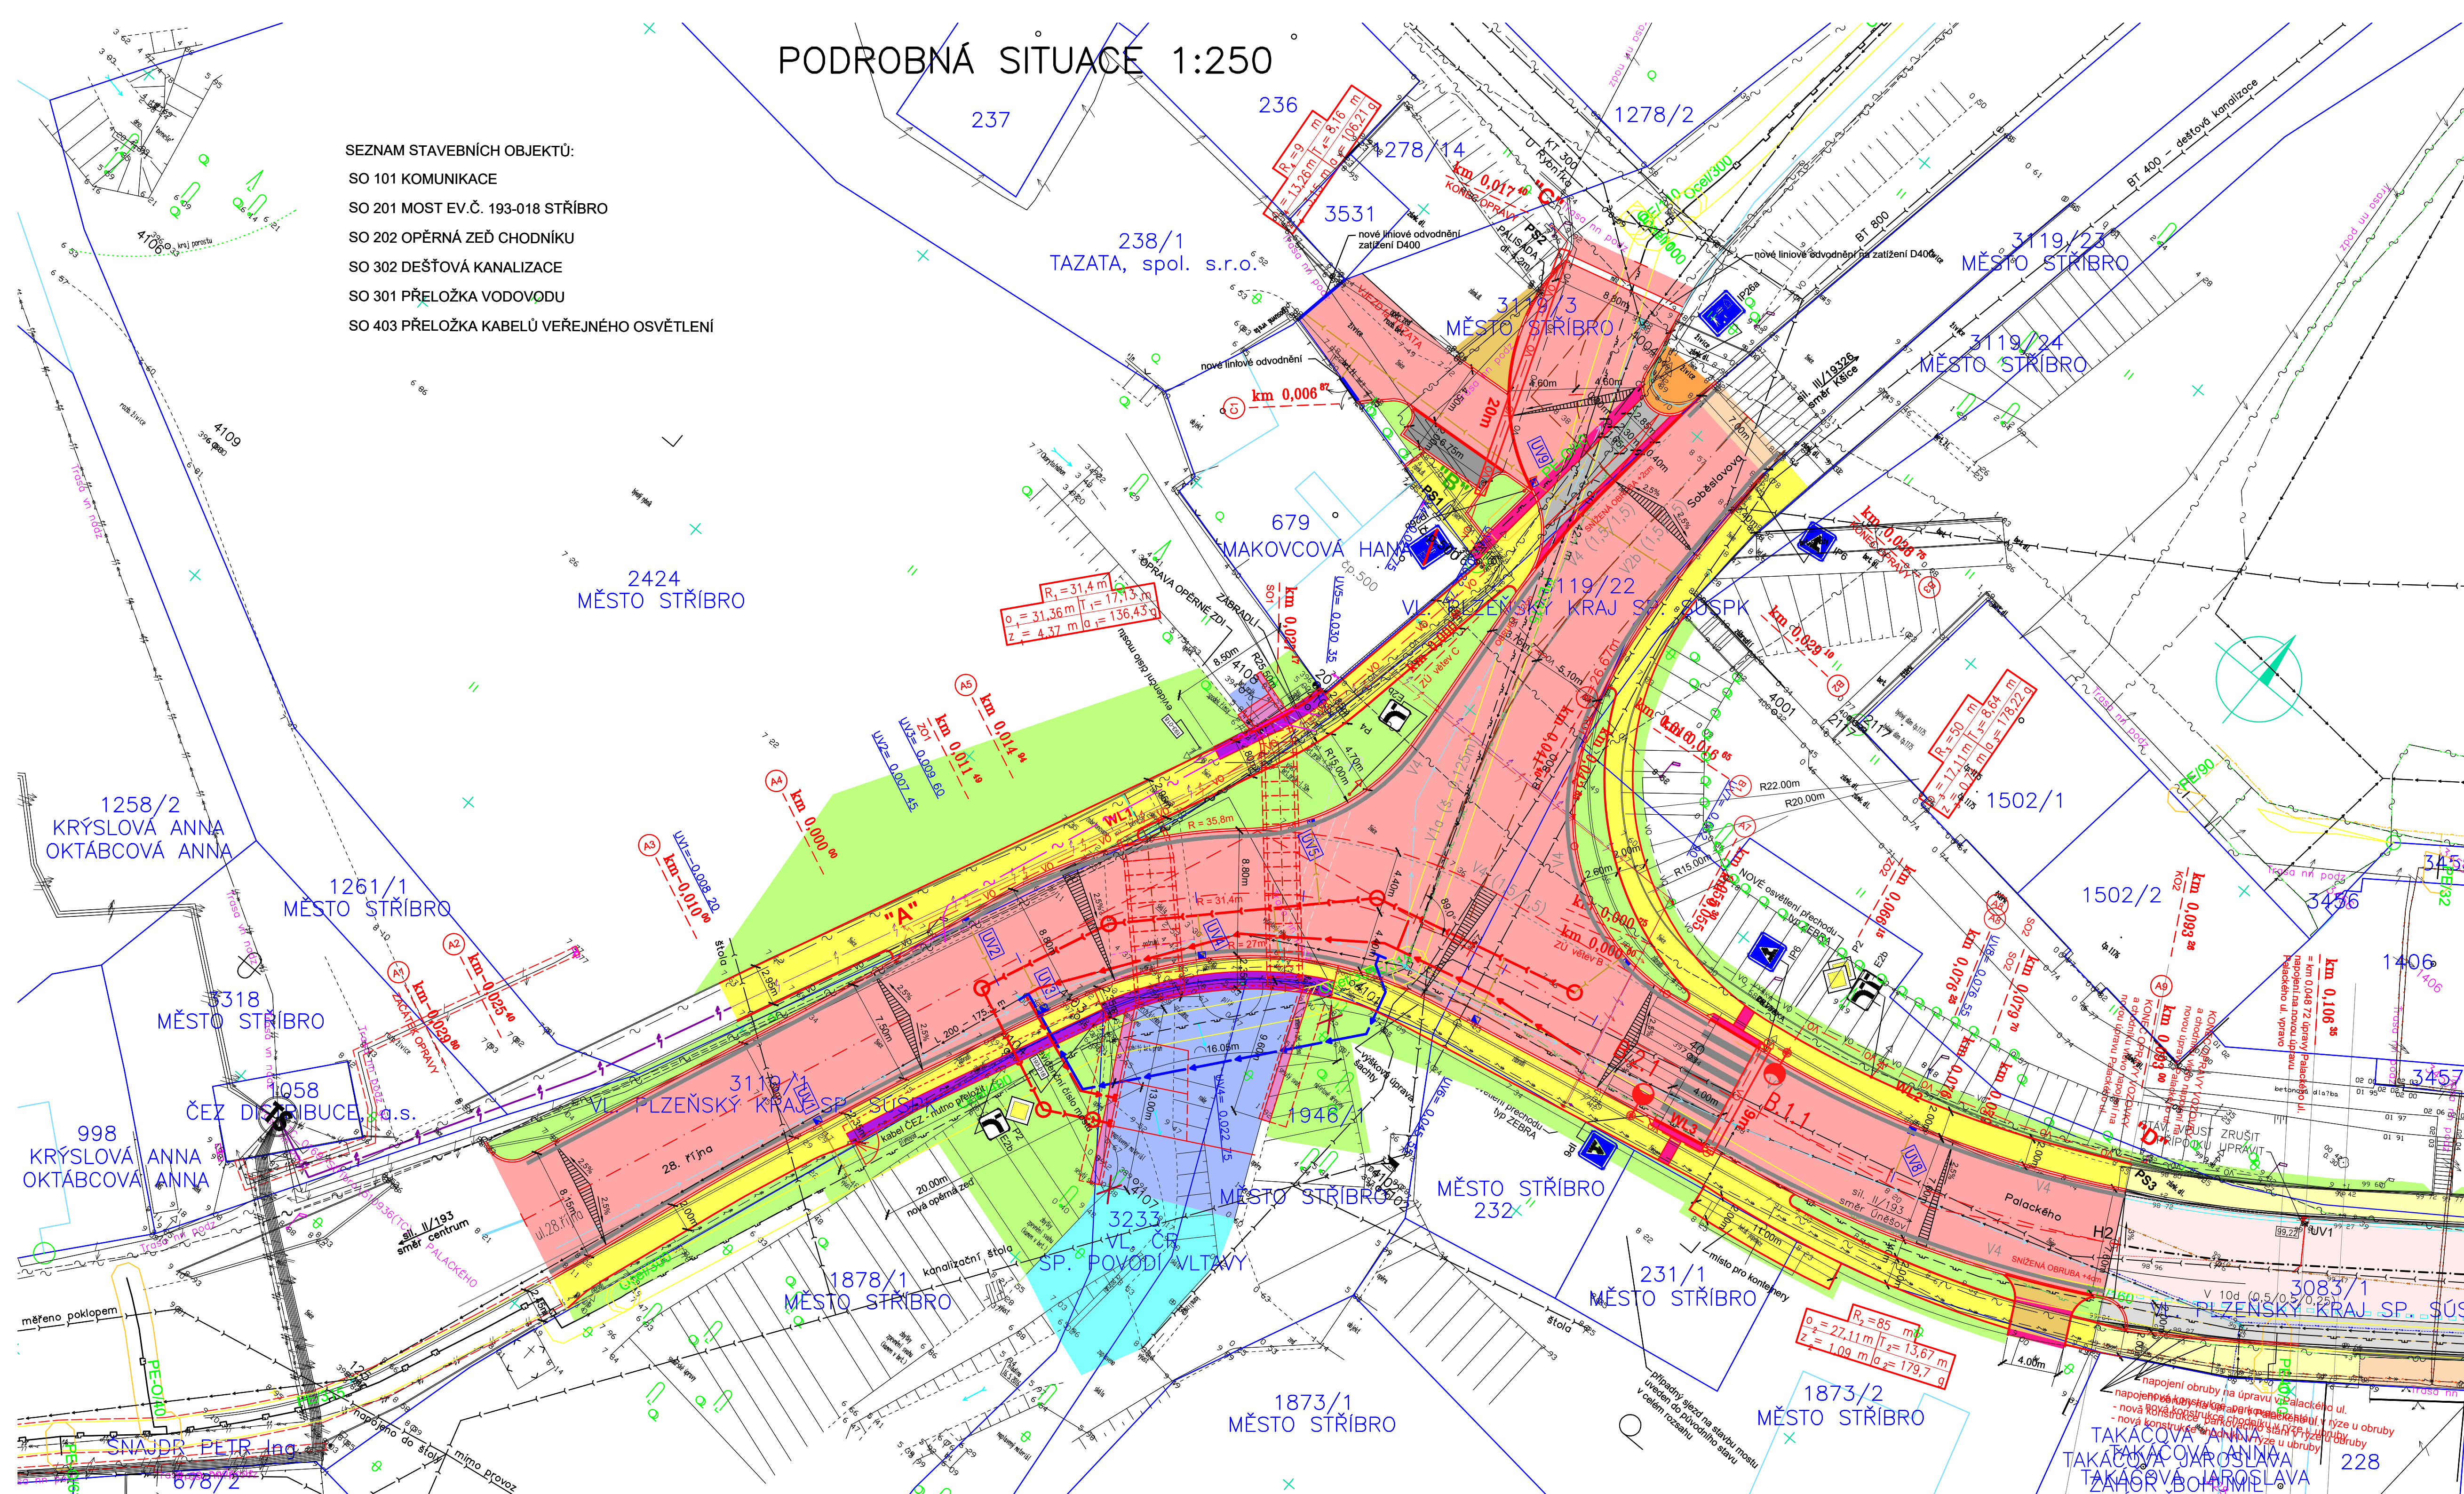

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PLYNOVOD
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE
- VEDENÍ VN PODZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE
- KABEL TELEFONICA O2 METALICKÝ
- KABEL TELEFONICA O2 NEPROVOZOVANÝ
- KABEL TELEFONICA O2 NEZAMĚŘENÝ

PŘELOŽKA CETIN

- TRASA PŘELOŽKY

PŘELOŽKA ČEZ

- nový zemní kabel AXEKVCE
- nový zemní kabel AYKY

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU
 - TRASA PŘELOŽKY PO DOBU STAVBY
 - TRASA PŘELOŽKY DO PŮVODNÍ TRASY
- SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - TRASA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
 - UL. VPUST A POTRUBÍ DN150
- SO 403 PŘELOŽKA KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
 - VO STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO
 - VO STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO - AYKY 4Bx25 - DEMONTOVAT
 - VO NOVÝ KABELOVÝ ROZVOD VO CYKY 4Jx16


LEGENDA:

- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- POVRCHOVÁ OPRAVA VOZOVKY
- ŽB MONOLITICKÁ ŘÍMSA - POCHOZÍ
- ŽB KONSTRUKCE
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- VJEZD - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- KAMENNÁ DLAŽBA Z KOSTEK 20x20cm
- KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LŮŽE
- ÚPRAVA KORYTA
- ZELEŇ
- KAČÍREK - u č.p. 500
- MOŽNOST PROVIZORNÍHO SJEZDU PRO STAVBU
- KÁCENÉ STROMY
- HRANICE POZEMKU
- SLOUČENÁ HRANICE POZEMKU

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ. ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTĚ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES, KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI.




| VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ p.v. | | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VED. PROJEKTANT Ing. Škubalová | ZDOP. PROJEKTANT Ing. Škubalová | VYPRACOVAL Bossavá | SCHVÁLIL Ing. Škubalová |
| Kraj: Plzeňský | | Kraj: Plzeňský | |
| Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje | | Kategorie: G2em1: Strážov | |
| Akce: MOST EV. Č. 193-018 STŘÍBRŮ | | FORMÁT | 1/2023 |
| Obsah: PODROBNÁ SITUACE | | DATUM | 1/2023 |
| | | ČÍS. ZAKÁZKY | 1631 |
| | | MĚŘITKO | 1:250 |
| | | ČÍS. VÝKRESU | B3 |
| | | ČÍS. KOPIE | |

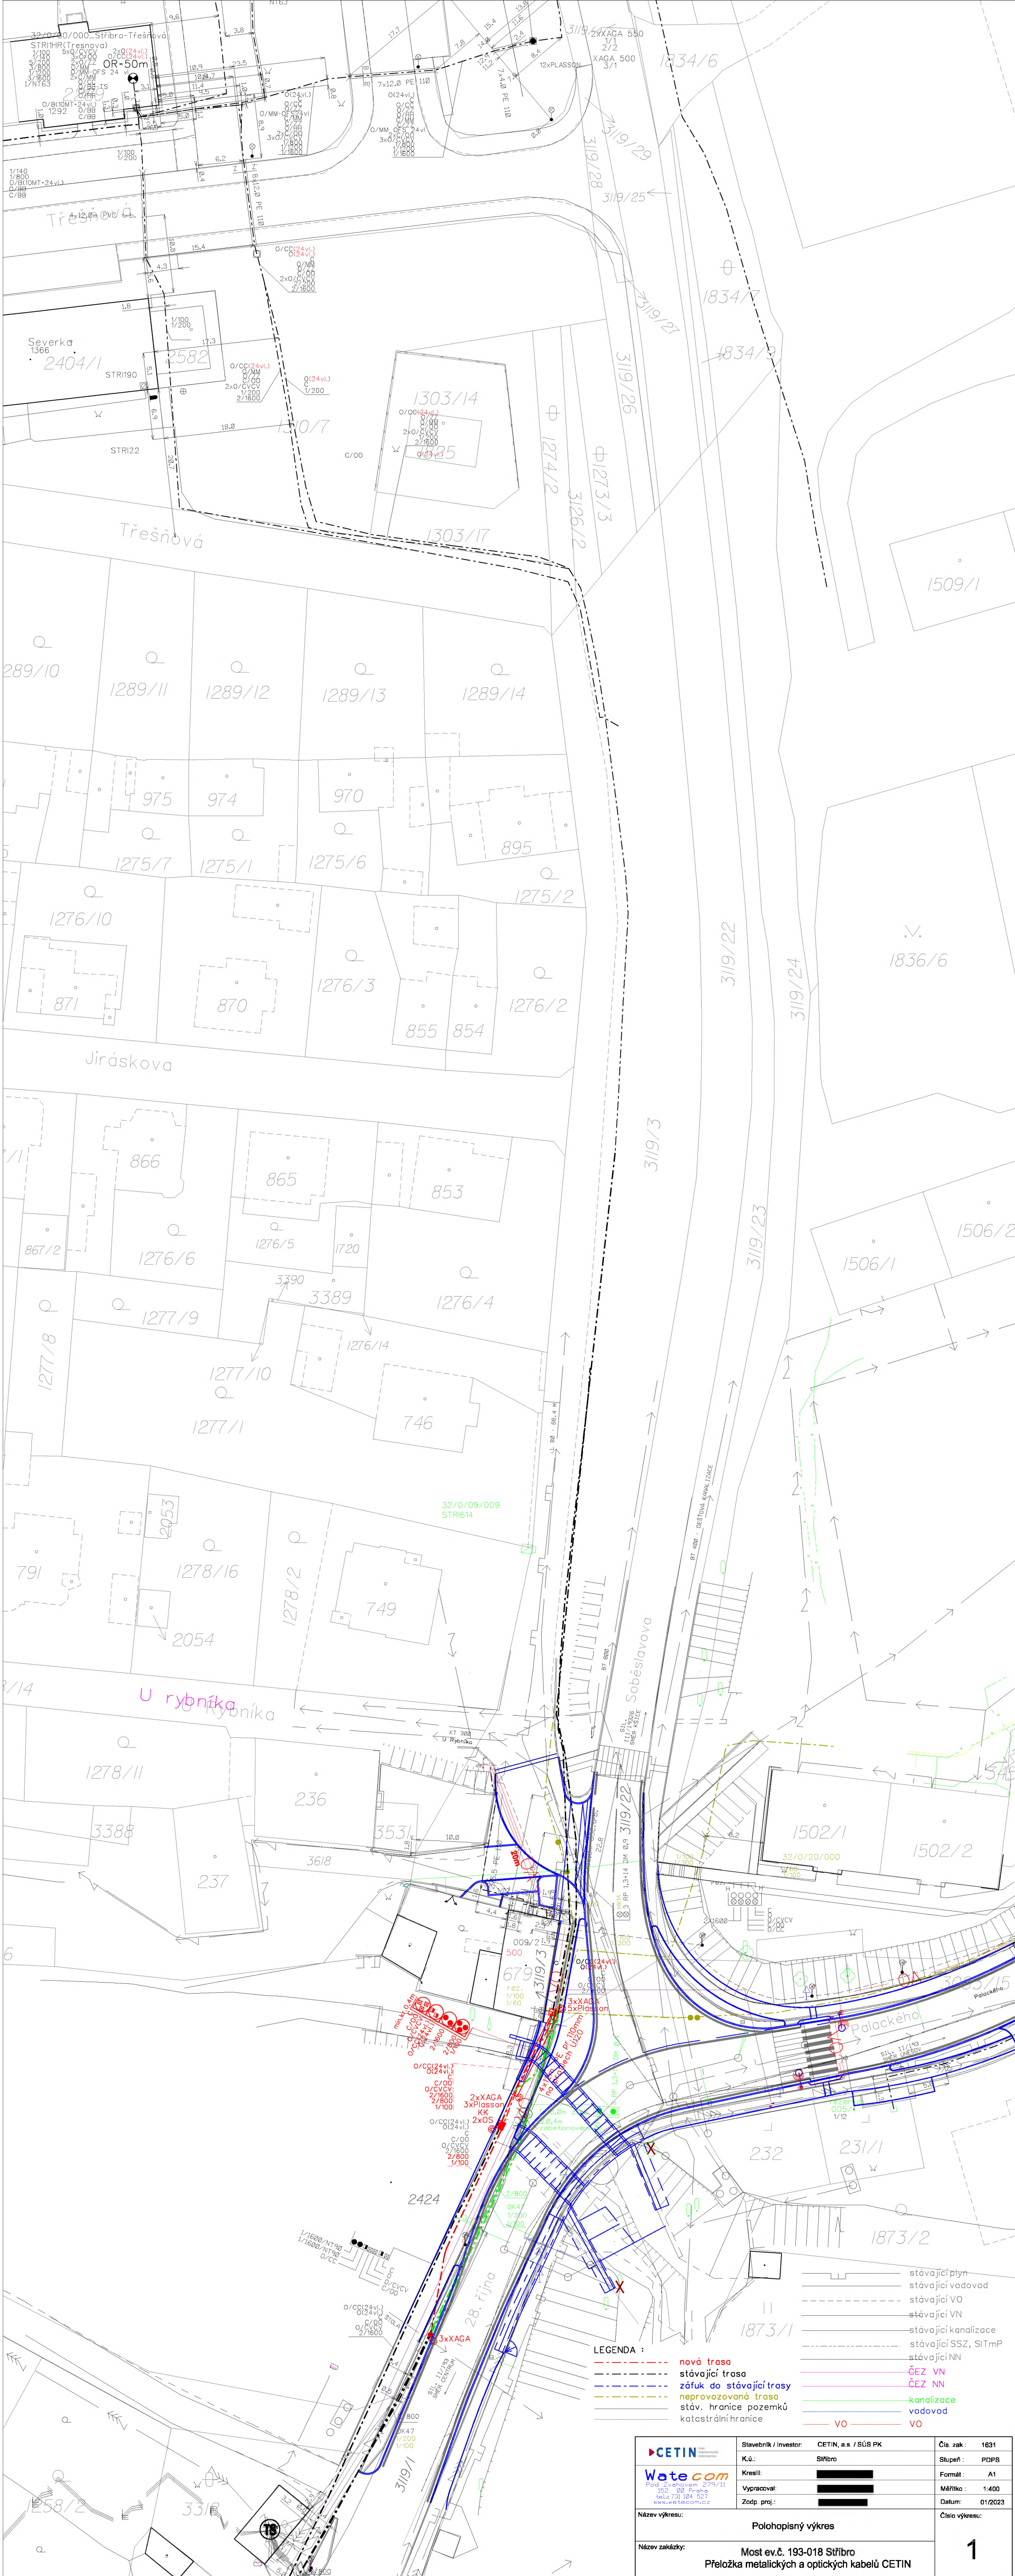

- LEGENDA :**
- nová trasa
 - stávající trasa
 - zářuk do stávající trasy
 - neprovozovaná trasa
 - stáv. hranice pozemků
 - katastrální hranice
 - stávající plyn
 - stávající vodovod
 - stávající VO
 - stávající VN
 - stávající kanalizace
 - stávající SSZ, SItmP
 - stávající NN
 - ČEZ VN
 - ČEZ NN
 - kanalizace
 - vodovod
 - VO
 - VO

| | | |
|---|--|-----------------|
| | Stavětk / investor: CETIN, a.s. / SGB PK | Čís. zak.: 1631 |
| | Ká.: Slibro | Stupeň: PDRP |
| | Kresil: [redacted] | Formát: A1 |
| | Vypracoval: [redacted] | Mřížka: 1:400 |
| Název výkresu: | Zařp. proj.: [redacted] | Datum: 01/2023 |
| Polohopisný výkres | | Číslo výkresu: |
| Název zakázky: Most ev.č. 193-018 Slibro Přeložka metalických a optických kabelů CETIN | | 1 |

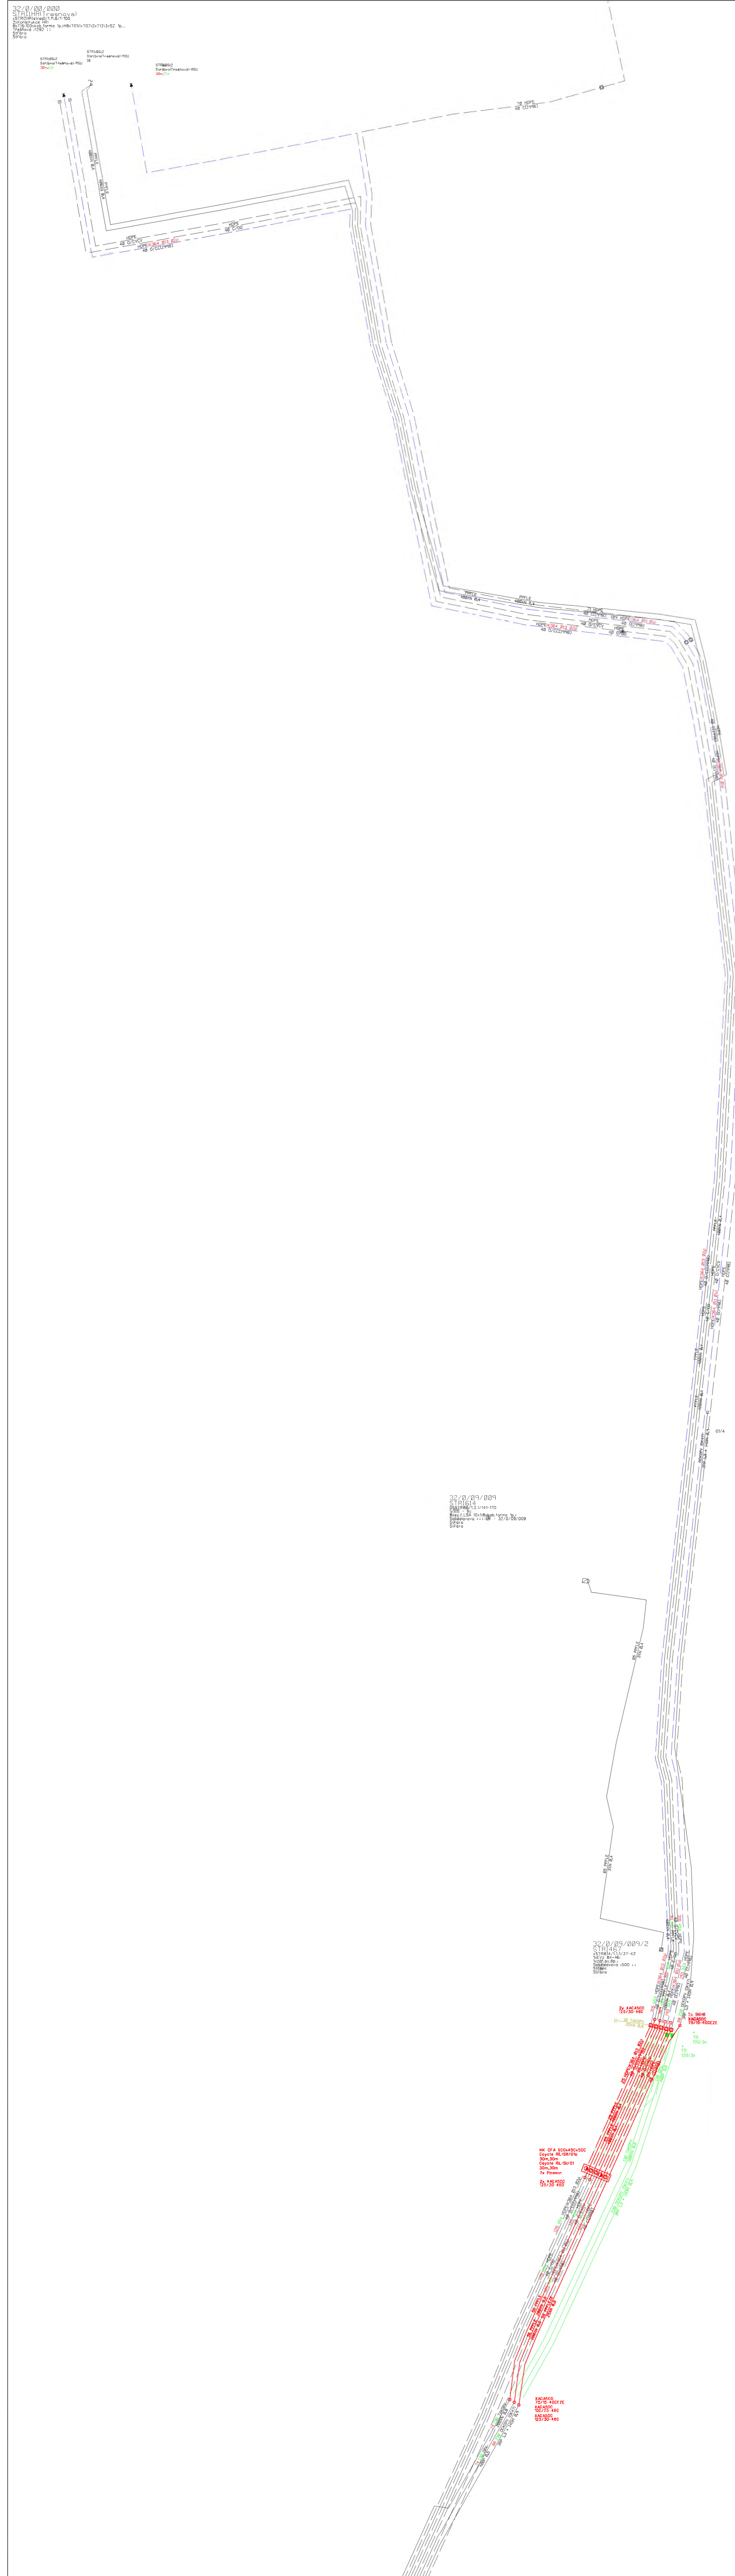


- LEGENDA :
- nová trubka HDPE
 - nový MK
 - - - stávající trubka HDPE
 - - - stávající MK
 - zrušená trubka HDPE
 - zrušený MK
 - výřez do stávající trasy HDPE
 - neprovozovaný MK

| | | |
|---|--|-----------------|
| Wete.com s.r.o. IČO: 250 74 741 DIČ: CZ25074741 www.wete.com.cz | Stavěbník / Investor: CETIN, a.s. / SUB PK | Čís. zak.: 1631 |
| | K.Ú.: Sřibro | Stupeň: PDPS |
| Kreslí: [redacted] | Formát: A1 | |
| Vypracoval: [redacted] | Mřítko: 1:400 | |
| Zatřp. proj.: [redacted] | Datum: 01/2023 | |
| Název výkresu: Schematický výkres | Číslo výkresu: 2 | |
| Název zakázky: Most ev.č. 193-018 Sřibro Přeložka metalických a optických kabelů CETIN | | |

SCHÉMA HDPE TRUBEK



ZS STŘÍBRO
BOŽENY NĚMCOVÉ
STRI:BS:1

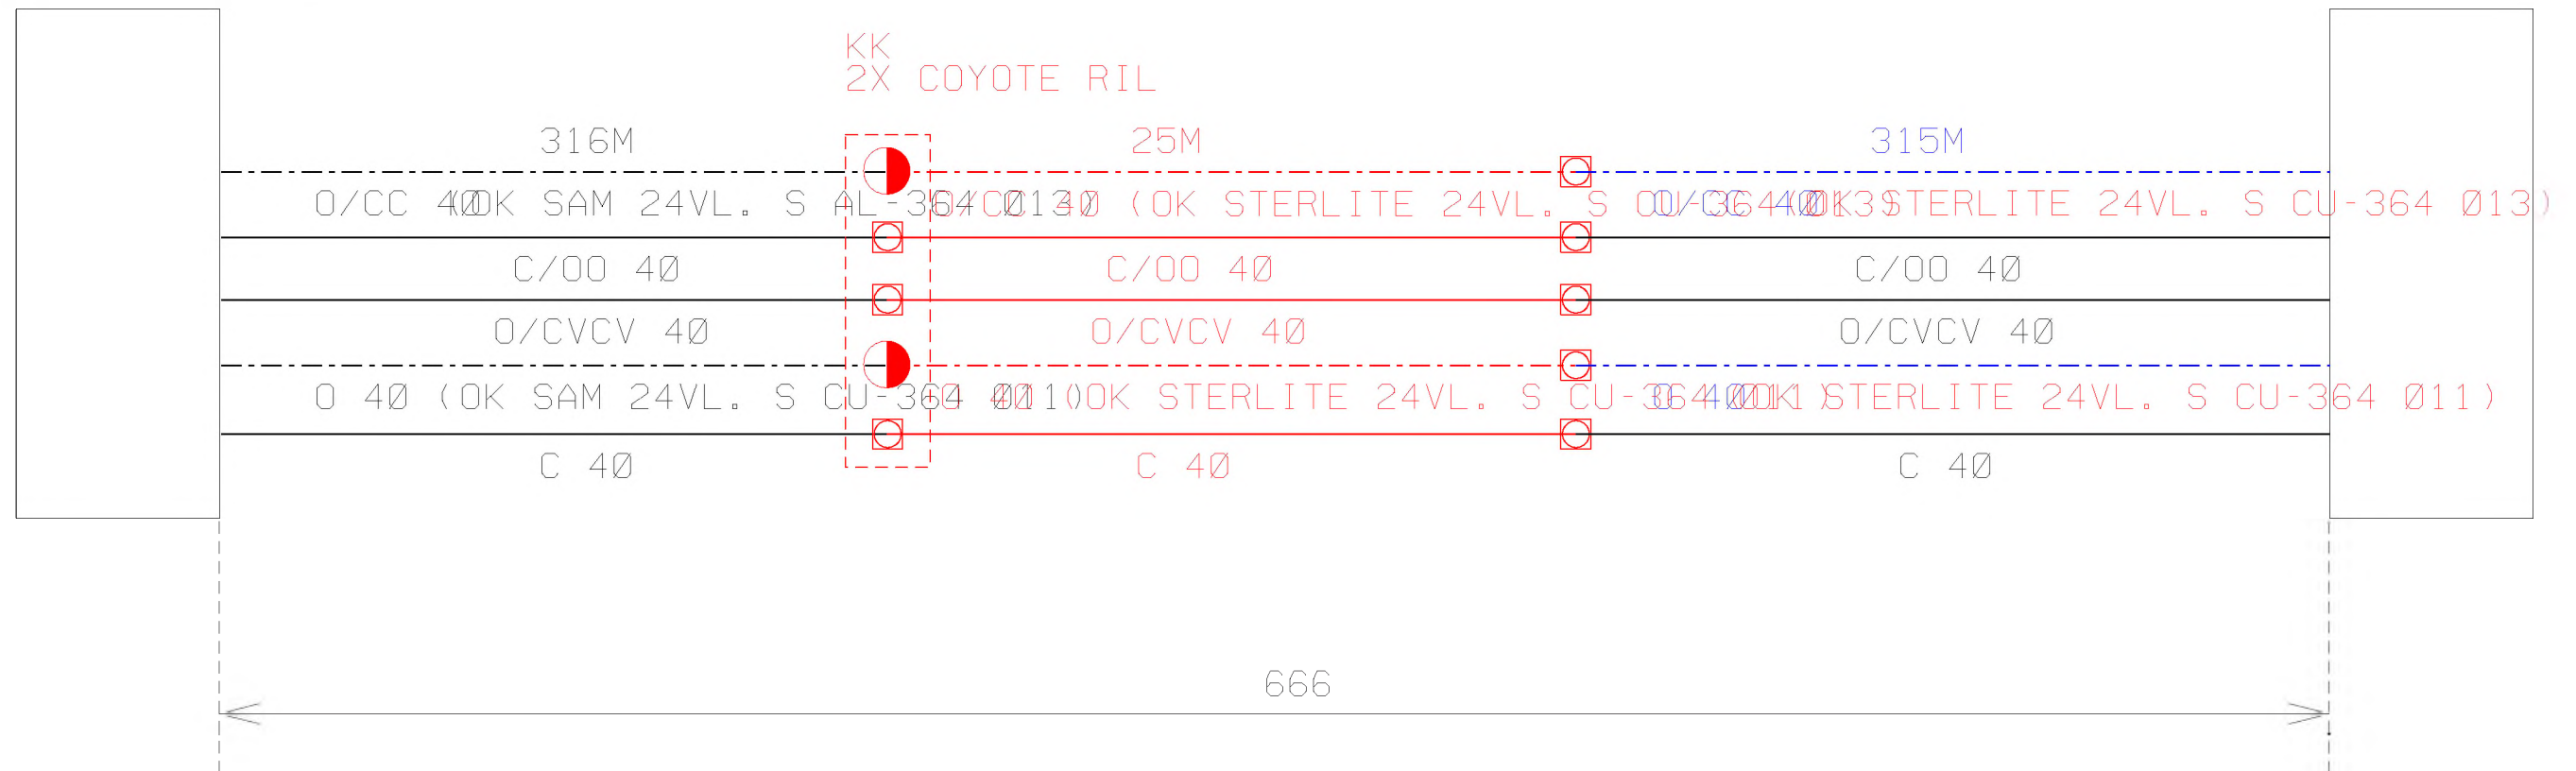NZS STŘÍBRO
TŘEŠNOVÁ
STRI:BS:2



LEGENDA :

- nová trubka HDPE rezervní
- - - - - nová trubka HDPE s OK
- stávající trubka HDPE rezervní
- - - - - stávající trubka HDPE s OK
- - - - - vý/záfuk do stávající trubky


| | | |
|--|---|---|
|  | Stavebník / Investor: CETIN, a.s. | SAP: - |
| | K.ú.: Stříbro | Stupeň : DPS |
|  <p style="font-size: small;">Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha tel.: 731 104 527 www.watecom.cz</p> | Kreslil: ██████████ | Formát : A4 |
| | Vypracoval: ██████████ | Měřítko : - |
| | Zodp. proj.: ██████████ | Datum: 08/2023 |
| Název výkresu: <h2 style="text-align: center;">Schéma HDPE trubek</h2> | | Číslo výkresu: <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">3</h1> |
| Název zakázky: <h2 style="text-align: center;">Most ev.č. 193-018 Stříbro</h2> | | |

PŘEHLED DÉLEK A SPOJEK


OK 364 AAB

OK 364 013

sál RE STŘÍBRO
 STRI:BS:3

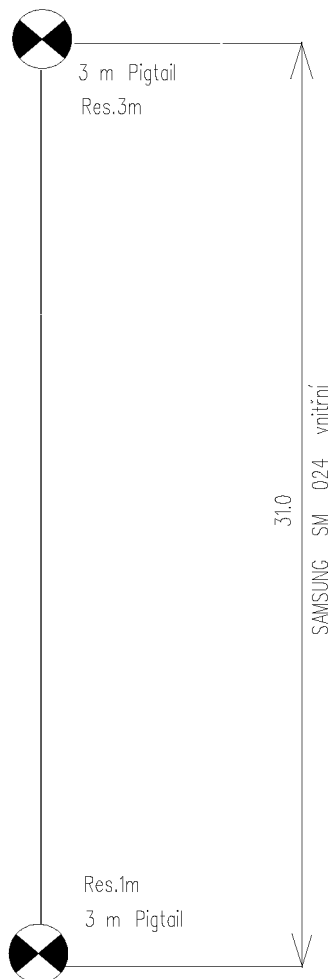

RDLU STŘÍBRO Třešňová
 STRI:BS:2

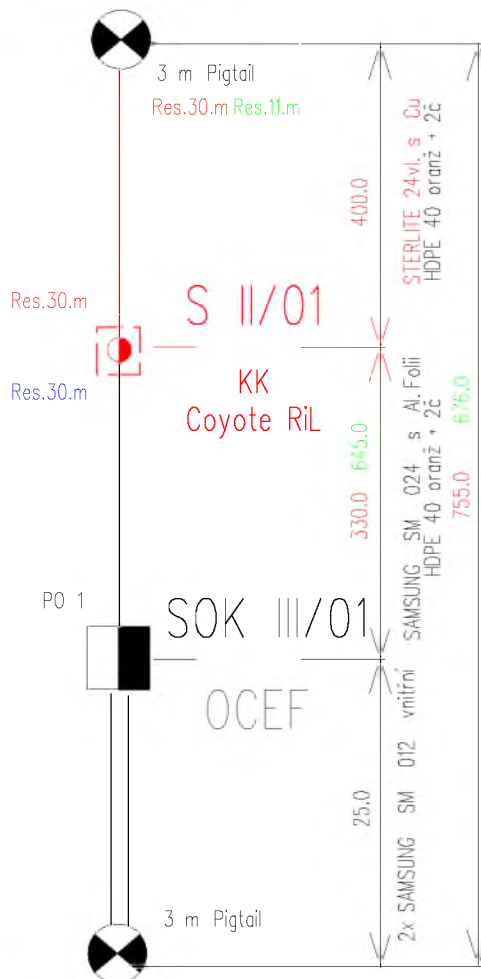

ZS STŘÍBRO
 STRI:BS:1

ZS STŘÍBRO
 STRI:BS:1

| | | |
|--|---|----------------------------|
| | Stavebník / Investor: CETIN, a.s./ SÚS PK | SAP: - |
| | K.ú.: Stříbro | Stupeň : DPS |
| | Kreslil: [REDACTED] | Formát : A4 |
| | Vypracoval: [REDACTED] | Měřítko : - |
| Zodp. proj.: [REDACTED] | | Datum: 08/2023 |
| Název výkresu: Schéma dílčích délek OK 364 013 | | Číslo výkresu: 4 |
| Název zakázky: Most ev.č. 193-018 Stříbro | | |

Název stavby: VPI Stříbro, most ev.č. 193-18
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Watecom s.r.o.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

| | | | | | |
|-------------|-------|--------|--------|---------------|---|
| KMVYK: | 0.050 | KMP: | 40.000 | bytových HTS: | 0 |
| KMVYK: voz. | 0.000 | KMMK: | 0.050 | podnik. HTS: | 0 |
| km otvorů: | 0.000 | KMNT: | 0.000 | rekreač. HTS: | 0 |
| | | KMTRU: | 0.125 | PP HR: | 0 |
| | | KMOK: | 0.800 | PP UR: | 0 |
| | | KMVL: | 19.200 | | |
| | | KMTRK: | 0.000 | | |

Rozdělení dle zón:

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| 1: Nad 100 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv. | | | | | |
| Historické centrum | 0.000 km | Městská zástavb | 0.000 km | Předměstí | 0.000 km |
| 4: Do 1 tis. obyv. | | | | | |
| Chráněná přírodní území | 0.000 km | Ostatní terén | 0.000 km | | |

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| PŘÍPRAVA | 9 840,00 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 180 047,99 Kč |
| MONTÁŽ | 445 347,06 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | 8 542,79 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 7 885,28 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 34 530,88 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 1 059,84 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 227 438,33 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 10 000,00 Kč |

Celkové náklady: **924 692 Kč**

| | |
|--------------------|---------------|
| STAVEBNÍ ČINNOST | 871 781,33 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST | 52 910,84 Kč |

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 953646 | | Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě | 9840.00 JV | 9 840,00 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 1179.00 m | 33 471,81 Kč |
| 958554 S | | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 6 983,18 Kč |
| 955265 S | | Práce zemní pro podzemní tratě síťové | 18450.00 JV | 18 450,00 Kč |

Výkop a příprava spojkovišť 3x

| | | | |
|--|--|-------------|--------------|
| 952346 S | Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm | 150.00 m | 51 802,50 Kč |
| 954951 S | Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 | 50.00 m | 67 902,50 Kč |
| 955053 S | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 100.00 m | 1 438,00 Kč |
| MONTÁŽ | | | |
| 955120 S | Demontáž ochrany přepěťové PO2 | 1.00 ks | 648,92 Kč |
| 955092 S | Demontáž rozvaděče optického | 2.00 ks | 1 499,40 Kč |
| 952706 S | Instalace optického kabelu v budovách | 60.00 m | 3 067,80 Kč |
| 958306 S | Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba | 900.00 m | 4 320,00 Kč |
| 958310 S | Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stav | 48.00 ks | 27 431,52 Kč |
| 958314 S | Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavb | 48.00 ks | 4 902,24 Kč |
| 952649 S | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 2.00 ks | 427,70 Kč |
| 952650 S | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 798.00 ks | 39 524,94 Kč |
| 952644 S | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 798.00 ks | 26 286,12 Kč |
| 952643 S | Měření střídavé během stavby - první čtyřka | 2.00 ks | 231,06 Kč |
| 952647 S | Měření útlumu během stavby- první čtyřka | 2.00 ks | 427,70 Kč |
| 955000 S | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | 1600.00 ks | 66 080,00 Kč |
| 955288 S | Montáž koncovky SKH | 3.00 ks | 198,00 Kč |
| 955267 S | Montáž nadzemní tratě síťové | 8610.00 JV | 8 610,00 Kč |
| složení a usazení profilů U120 do trasy CETINu pomocí jeřábu | | | |
| 955004 S | Montáž ochran. kabel. komory pro spojku | 1.00 ks | 2 402,70 Kč |
| 952875 S | Montáž ochrany přepěťové PO2 | 1.00 ks | 732,49 Kč |
| 958321 S | Montáž protipožárních ucpávek/přepážek | 0.50 m2 | 5 396,54 Kč |
| 955260 S | Montáž rozvaděče optického | 2.00 ks | 1 703,40 Kč |
| 955286 S | Montáž spojky bez montáže vláken | 2.00 ks | 2 716,10 Kč |
| 955282 S | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 4.00 ks | 9 237,20 Kč |
| 955284 S | Montáž spojky, redukce mechanické rozeb | 8.00 ks | 502,48 Kč |
| 952602 S | Montáž trubky úložné | 125.00 m | 2 688,75 Kč |
| 954993 S | Montáž úložných kabelů nad 300 XN | 50.00 m | 3 466,00 Kč |
| 958592 S | Provádění PEW v maintenance window | 2.00 ks | 69 871,12 Kč |
| 958557 S | Realizace optické akce-ostatní činnosti | 1.00 ks | 21 786,49 Kč |
| 958331 S | Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní | 96.00 ks | 49 081,92 Kč |
| 958469 S | Uvedení stavby do provozu | 6273.00 JV | 6 273,00 Kč |
| 955630 S | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 5.00 ks | 7 355,60 Kč |
| 958336 S | Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky | 1600.00 m | 50 944,00 Kč |
| 958558 S | Zkouška trhací | 2.00 ks | 6 840,62 Kč |
| 958556 S | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 6 801,29 Kč |
| 955084 S | Zrušení optického kabelu v budovách | 60.00 m | 1 755,60 Kč |
| 955067 S | Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř | 2.00 ks | 3 232,28 Kč |
| 955012 S | Zrušení úložné trubky | 125.00 m | 1 337,50 Kč |
| 955042 S | Zrušení úložných kabelů do 300 XN | 112.00 m | 3 881,92 Kč |
| 955041 S | Zrušení úložných kabelů do 50 XN | 56.00 m | 1 294,16 Kč |
| 955043 S | Zrušení úložných kabelů nad 300 XN | 50.00 m | 2 390,50 Kč |
| GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE | | | |
| 955610 S | Popis umístění tlk.vedení v budově | 2.00 ks | 1 315,04 Kč |
| 956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 7 227,75 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | | | |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 2.00 ks | 7 885,28 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | | |
| 958747 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 2.00 ks | 9 345,32 Kč |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 10000.00 JV | 10 000,00 Kč |
| odhad nákladů za VBŘ | | | |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 2.00 ks | 6 132,72 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 2.00 ks | 8 030,30 Kč |
| 958459 | Zápis dokumentu do systému Objednatele | 2.00 ks | 1 022,54 Kč |
| POPLATKY | | | |
| 955367 | Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. | 10000.00 JV | 10 000,00 Kč |
| doprava profilů | | | |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|--|-------------|--------------|
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | | | | |
| 303003 S | | Spojka trubky HDPE 40mm Plasson | 8.00 ks | 1 059,84 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 310345 S | | Adaptér E2000/APC červený/oranž | 24.00 ks | 2 465,76 Kč |
| 310327 S | | Adaptér E2000/APC žlutý/modrý | 24.00 ks | 2 465,76 Kč |
| 303918 S | | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 100.00 ks | 4 556,00 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 100.00 m | 479,00 Kč |
| 323551 S | | Kabel optický 24vl. s CU párem Sterlite | 800.00 m | 17 192,00 Kč |
| 300113 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4 | 50.00 m | 47 399,00 Kč |
| 318863 S | | Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 | 2.00 ks | 1 044,74 Kč |
| 323724 S | | Komora kabelová OFA 900x450x500mm | 1.00 ks | 4 885,77 Kč |
| 316534 S | | Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm | 1.00 ks | 69,57 Kč |
| 316553 S | | Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm | 2.00 ks | 509,28 Kč |
| 320879 S | | Materiál pro tratě síťové | 47847.00 ks | 47 847,00 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 4.00 ks | 1 000,44 Kč |
| 312417 S | | Modul konektor. 4000-25P | 128.00 ks | 7 354,88 Kč |
| 323050 S | | Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm | 160.00 ks | 865,60 Kč |
| 306776 S | | Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm | 2.00 ks | 1 415,44 Kč |
| 303251 S | | Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon | 4.00 ks | 413,04 Kč |
| 310309 S | | Pružina k adaptéru E2000/APS | 48.00 ks | 454,08 Kč |
| 306732 S | | Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line | 2.00 ks | 10 262,82 Kč |
| 303501 S | | Spojka plastová 110/94 mm | 4.00 ks | 178,44 Kč |
| 320295 S | | Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460 | 4.00 ks | 5 294,04 Kč |
| 310773 S | | Šňůra optická 2xE2000/APC 0,9mmSM/Allw f | 48.00 ks | 20 347,20 Kč |
| 300028 S | | Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr. | 25.00 m | 811,75 Kč |
| 300023 S | | Trubka HDPE 40/33 černá | 25.00 m | 811,75 Kč |
| 300035 S | | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy | 25.00 m | 811,75 Kč |
| 300037 S | | Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr. | 25.00 m | 811,75 Kč |
| 300030 S | | Trubka HDPE 40/33 oranžová | 25.00 m | 811,75 Kč |
| 302672 S | | Trubka PE 110/6,3/6000mm | 6.00 ks | 5 288,58 Kč |
| 302343 S | | Trubka vrapovaná 40/32 s lankem | 1030.00 m | 18 941,70 Kč |
| 302381 S | | Trubka vrapovaná 63/51 s lankem | 31.00 m | 817,16 Kč |
| 302405 S | | Trubka vrapovaná 90/75 s lankem | 82.00 m | 3 868,76 Kč |
| 308513 S | | Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 | 96.00 ks | 17 963,52 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | | | | |
| 301685 S | | Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda | 2.00 ks | 0,00 Kč |
| 403175 S | | Pěna montážní Soudal 300ml | 4.00 ks | 0,00 Kč |

MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO;

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO

Tel. [REDACTED], Fax [REDACTED], Email: [REDACTED]

Č.j.: 1672/OVÚP/23-2/25/Ha

Ve Stříbře dne 2. 10. 2023

E.č. písemnosti: 23193/23-STŘIBRO

Oprávněná úřední osoba: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako místně příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, dále jen „stavební zákon“, podle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a podle § 154 zákona č. 500/2004. Sb., správní řád, v platném znění, vydává k návrhu stavebníka: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ 040 84 063, jménem které na základě plné moci jedná Watecom s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha, IČ 272 00 175, ze dne 22. 8. 2023, **územní souhlas**, pro stavbu

Most ev. č. 193-018 Stříbro Přeložka metalických a optických kabelů CETIN.

Stavba obsahuje:

- Přeložení stávající trasy CETINu v křižovatce ulic Soběslavova x Palackého x 28. října ve Stříbře v rámci úprav mostu ev.č. 193-018 a komunikace. Trasa přeložky povede v novém chodníku a do chodníku se přeloží i trasa CETINu vedoucí v betonových žlebcích ve vozovce. V místě mostní konstrukce se přeložka provede tak, že se v nové trase umístí ocelové U profily 120 mm v délce cca 12 m, na které se položí chráničky pro překládané vedení CETINu. Nádledně se bude most opravovat a ubourávat, přeložené vedení bude jištěno ocelovými U profily, které v mostní konstrukci zůstanou natrvalo. Konce profilů s chráničkami PE pr. 110 mm se obetonují, aby nemohlo dojít k jejich posunu. Celkem se zde umístí 4 chráničky PE pr. 110 mm.

Struktura přeložení:

1. Přeložení trubek HDPE s Optickými kabely 24 vláken
2. Přeložení prázdných trubek HDPE
3. Přeložení MK TCEPKPFLE 400x4x0,4
4. Přeložení MK DK 47, TAKOPV 200x4x0,8 a OPV 200x4x0,5.

V rámci zemních prací se provede výkop o rozměrech 80 x 50 – 70 cm pro uložení v chodníku s minimálním krytím 0,4 m a trasa se ochrání v mostní konstrukci pomocí PE pr. 110 mm. Výkop bude opatřen pískovým ložem nebo prosátým výkopkem. Místa spojek a konce chrániček se označí Mini Markery. V celém průběhu trasy bude položena výstražná fólie oranžové barvy s potiskem. Proti vniknutí vody, plynu a nečistot budou trubky plynotěsně a protipožárně utěsněny. Při realizaci akce dojde ke styku s některými inženýrskými sítěmi. Výkopy je nutné provádět ručně a s maximální opatrností, aby nedošlo k narušení stávajících sítí. V případě křižovatky, či souběhu bude bezpodmínečně nutné respektovat podmínky a doporučení správců sítí a ČSN 73 6005.

Záměr se umísťuje na st. p. č. 2424, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; **p. p. č. 3119/3**, druh pozemku: ostatní plocha, **p. p. č. 3119/22**, druh pozemku: ostatní plocha a **p. p. č. 3119/1**, druh pozemku: ostatní plocha, vše v **k.ú. Stříbro**, oba pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje, právo hospodařit Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČ 720 53 119 a dále ve vlastnictví: Město Stříbro, IČ 002 60 177, se sídlem Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro.

Stavba bude umístěna dle Polohopisného výkresu, projektové dokumentace „**Most ev. č. 193-018 Stříbro, Přeložka metalických a optických kabelů CETIN**“, zpracované v 01/2023 projektantem Watecom, Pod Žvahovem 279/11, Praha, autorizoval Ing. Luděk Bláha, ČKAIT 0201333.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazných stanovisek a vyjádření:

Městský úřad Stříbro, koordinované závazné stanovisko č.j. 725/OVÚP/23-2/Ha, Městský úřad Stříbro, závazné stanovisko souhlas dle § 17 vodního zákona, č.j. 1599/ŽP/23, Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn. PVL-45574/2023/340/Ta

ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001133219054, GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5002800792.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace a silnice vydal Městský úřad Stříbro dne 26.9.2023 pod č.j. 1614/OVÚP/23-4/456.

Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Z nich vyplývá povinnost ohlásit s dostatečným časovým předstihem již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popř. jiné oprávněné organizaci či osobě oprávněné k průzkumům, a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Oznámení lze učinit buď písemnou formou, lépe však on-line na webu AU AV ČR [redacted]. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních prací tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s prováděcí organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu, viz seznam pověřených archeologických pracovišť. V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

Územní souhlas se uděluje na dobu určitou a platí 2 roky ode dne jeho vydání. Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

V souladu s ustanovením § 96 odst. 4 stavebního zákona nabývá územní souhlas právních účinků dnem doručení žadateli (případně jeho zástupci). Územní souhlas bude následně (po nabytí jeho právních účinků) doručen s vyznačením účinnosti osobám uvedeným v ustanovení § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona, dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není sám stavebním úřadem.

za správnost vyhotovení: [redacted]

[redacted]
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tento územní souhlas nabyl právních účinků dne:

Bude doručeno:

Watecom s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, 152 00 Praha

Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01

PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení zn.

PVL-45574/2023/340/Ta

Obdrží:

ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001133219054,

GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5002800792

MěÚ Stříbro

vlastní

Písemnost vypravěna dne:

Za vydání tohoto souhlasu proveďte úhradu správního poplatku 500,- Kč na účet města Stříbra, č.ú. 112 595 803/0300 V.S. 315 67

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

[redacted]
manažer

os. č. [redacted]

(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užítých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva
CETIN a.s.
14:49 29.11.2023
RSA/4096

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
09:32 29.11.2023
RSA/4096

č.j.: 20971/22/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737 se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

tímto pověřuje pana **Mgr. Martina Víta, MPA**,
nar.: [REDAKCE]
trvale bytem: [REDAKCE]

k tomu, aby ji zastupoval při právních jednáních, a to v rozsahu kompetencí generálního ředitele organizace, včetně podepisování smluv či dohod, a to:

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene);
2. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene);
3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – PK investor;
4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení;
5. Smlouva o provedení překládky telekomunikačního zařízení;
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
7. Smlouva o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
8. Smlouva o zvláštním užívání silnic (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje) třetími stranami dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
9. Smlouva o omezení užívání nemovitosti (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje), jejímž předmětem je stanovení podmínek při provádění stavebních prací v komunikaci anebo pozemku a uložení inženýrské sítě do silničního pozemku, na něm nebo na mostních objektech za účelem zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
10. Dohoda o technických podmínkách při zvláštním užívání komunikace (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje).

Toto pověření nabývá účinnosti dnem [REDAKCE]

V Plzni dne

26 -09- 2022

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

V Plzni dne

Pověření přijímá [REDAKCE]

Mgr. Martin Vít,

Zapsaná v OR vedené
oddíl Pr, vložka č. 737
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Tel.: [REDAKCE]
