

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2024/00019**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Olomouc

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Ing. Petrem Truhlářem, supervizorem VFS Morava sever
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ00299308
zastoupená Ing. Markem Drešrem, vedoucím odboru investic MMOI
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27-1801731369/0800
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 17.8.2021 vydané pod čj. 758804/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **258.629,- Kč** (slovy: dvě stě padesát osm tisíc šest set dvacet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **42.629,- Kč** (slovy: čtyřicet dva tisíc šest set dvacet devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO


- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE


- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



- 8.2 Za Stavebníka:



9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhá Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
Registr smluv: ANO

- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00019
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004758
 Registr smluv: ANO

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

CETIN:

Stavebník:

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

Petr

Truhlář

Digitálně podepsal

Petr Truhlář

Datum: 2024.02.27

12:35:55 +01'00'

CETIN a.s.

Petr Truhlář

Supervizor, VFS Morava sever

Statutární město Olomouc

Ing. Marek Drešř

vedoucí odboru investic

CETIN

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

VPIC OL,POLSKÁ-ROOSEVELTOVA, KŘÍŽOVATKA

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Budoucí uživatel | NO-OS | |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, HORNÍ NÁMĚSTÍ 583, 779 11 OLOMOUC | |
| Zpracovatel | MULTINET, s.r.o. | Ing. Aleš Jurečka |
| Předkladatel | VEGACOM, a.s. | Pavel Sedlář |
| Schvaluje | | Miroslav Kot Petr Truhlář Martin Hupšil Jaroslav Špunda Lubomír Býma |

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| | |
|----------------|---|
| Název: | VPIC OL,POLSKÁ-ROOSEVELTOVA, KŘÍŽOVATKA |
| Kategorie: | AN – Přístupová síť |
| Podkategorie: | VPI – Metal. kab přístupová síť |
| Typ investice: | Přeložka |
| Důvod 1: | |
| Číslo interní: | |
| Prvek SPP: | |
| ABC: | |
| HOST: | |
| ATÚ: | |

Kapacitní údaje

| | Průměrný náklad na: |
|---|---------------------|
| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0 km |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0 km |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0 km |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 0 km |
| 100300_Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů | 0 km |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |

Požadavky:

Název polygonu: VPIC OL,POLSKÁ-ROOSEVELTOVA, KŘÍŽOVATKA

Termíny:

| | |
|-------------------------------|---|
| Platnost ÚR od: | Překládka SEK CETIN bude součástí územního řízení na stavbu - dodá stavebník. |
| Nabytí právní moci ÚR: | |
| Plánované zahájení přípravy: | 10/2021, nutno zpracovat realizační PD, uzavřít SoSB o zřízení služebnosti |
| Plánované ukončení přípravy: | |
| Plánované zahájení realizace: | Předpoklad 2022 |
| Plánované ukončení realizace: | Dle požadavku investora |
| Nabídka k převímce (Plán): | |

1.2 Účel stavby:

CTN stavby "VPIC OL,POLSKÁ-ROOSEVELTOVA, KŘÍŽOVATKA"

Předmětem stavby je přeložka sítě elektronických komunikací, kterou si vynutí realizace stavby:
„Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky“.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Poptávka VEGACOM, podklady GWS, projekt generálního projektanta stavby.

2.2 Navrhované řešení:

Technické řešení:

V oblasti projektovaných úprav se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN. Dotčeny budou: metalické zemní kabely TCEPKPFLE, HDPE trubky 40 mm a neprovozované metalické kabely staré sítě.

Řešení ochrany a přeložky kabelů podle jednotlivých míst.

Místo č. 1

Prodloužení mechanické ochrany 1x SYS160 a 1x SYS200 za obrubník rozšiřované komunikace a výšková úprava (prohloubení) trasy. Dotčeny budou:

- kabel 15XN04 do UR OLKR1325 a 1326
- kabely ve směru ulice Roosveltova 200XN04, 500XN04 a 600XN04
- HDPE 40, O, s trubičkovým systémem 769 BAD, kabel 769 BAL - RSU POLIKLINIKA - OLPK17, OL:BS:1 - OL:BS:334, úsek 769 BAL 01, kabel OFS 24f 4x6 RB D
- HDPE 40, C, prázdná

Místo č. 2

Stranová přeložka mimo obrubník autobusové zastávky. Dotčeny budou:

- kabely ve směru ulice Roosveltova 200XN04, 500XN04 a 600XN04
- HDPE 40, O, s trubičkovým systémem 769 BAD, kabel 769 BAL - RSU POLIKLINIKA - OLPK17, OL:BS:1 - OL:BS:334, úsek 769 BAL 01, kabel OFS 24f 4x6 RB D
- HDPE 40, C, prázdná

Trasu stranové přeložky navrhnul generální projektant a je dodržena.

Neprovozované kabely staré sítě nebudou překládány. V dotčených místech nejsou ani uvedeny ve schématu.

Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů a HDPE trubek. Povolení záhozu bude zapsáno ve stavebním deníku. Stavbu je nutno koordinovat s generálním dodavatel stavby.

Řešení podle směrnice TM000072:

model 1 – kabely bez provozu, trasa nevyužita

model 3 – stranová přeložka.

Trasa kabelu je v kat. území Nové Sady u Olomouce, Olomouc-město.

Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt:

SO 403 - Zásah do zařízení CETIN

Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.

Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníkem dotčené parcely.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkládováno VBŘ do KN.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPFLE, HDPE 40 mm

Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Mini markery 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí – Optické kabely
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001

Protože nedojde k rozpojení kabelů, nebude na metalických kabelech prováděno měření.

Na optickém kabelu budou provedena rozdílová měření před a po přeložce, a to na vláknech, na kterých nyní není provoz.

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa přeložky bude koordinována s generálním dodavatelem stavby.

2.7 Ostatní:

Kontakty

stavebník:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Markem Drešrem, mark.dresr@olomouc.eu tel. 588 488 680

ve věcech technických: Ing. Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@olomouc.eu, tel. 588 488 698

e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky: tomas.ruzicka@olomouc.eu,

žadatel:

Mgr. Lucie Krátká, Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

atelis.kratka@gmail.com, tel. 739 774 019, web: www.atelis.eu

gen. projektant - viz žadatel

Projektový koordinátor CETIN: Petr Truhlář, tel. 602 721 590

Zpracovatel CTN: MULTINET, s.r.o. – Ing. Aleš Jurečka, tel. 724 227 769


Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou.


4. Vyjádření a záznamy – viz příloha.



5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
|---------------------------------------|--------|
| Přehledová situace | CTN |
| Situace | CTN |
| Situace - katastrální mapa | CTN |
| Schéma - MET. KABELY | CTN |
| Schéma HDPE | CTN |
| Vyjádření SEK č.j. 758804/21 | CTN |
| Poznámky k PPD | CTN |
| Výpis KN | CTN |
| Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel | CTN |
| Kalkulace nákladů, projekční příprava | CTN |

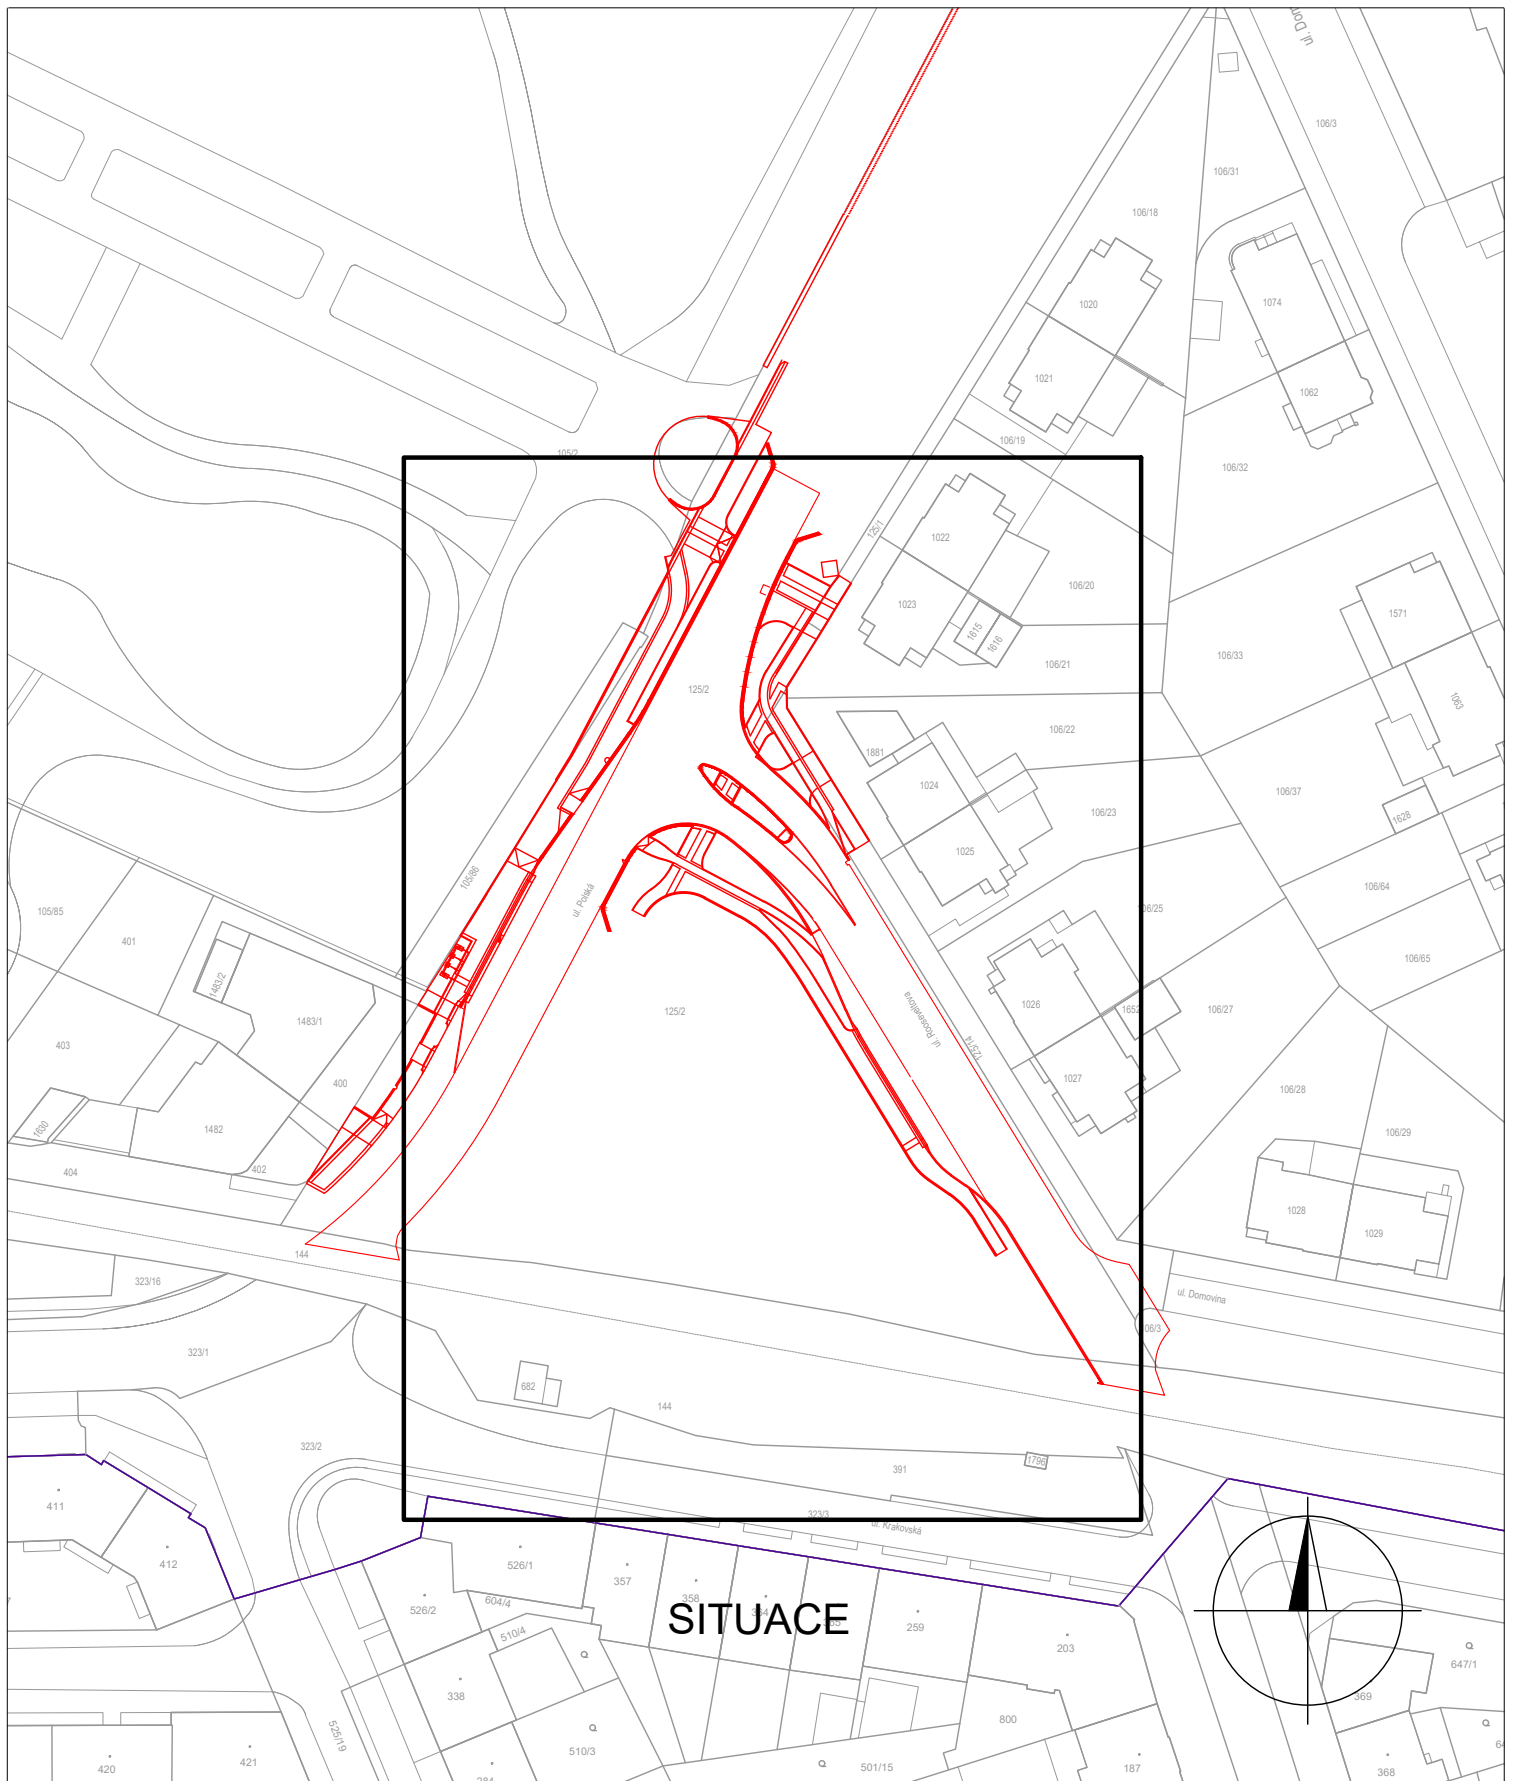


SITUACE


| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--|---------|---------|--------|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL |  Farského 43/4, OLOMOUČ www.multinet.cz | | | |
| MÍSTO | OLOMOUČ | KRAJ | OLOMOUČSKÝ | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | | | | | | |
| STAVBA | VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka | | | ÚČEL | CTN | MĚŘITKO | 1:1000 |
| VÝKRES | PŘEHLEDOVÁ SITUACE | | | ARCH.Č. | P 52-21 | DATUM | 10/21 |
| | | | | Č.VÝK. | | | 0 |

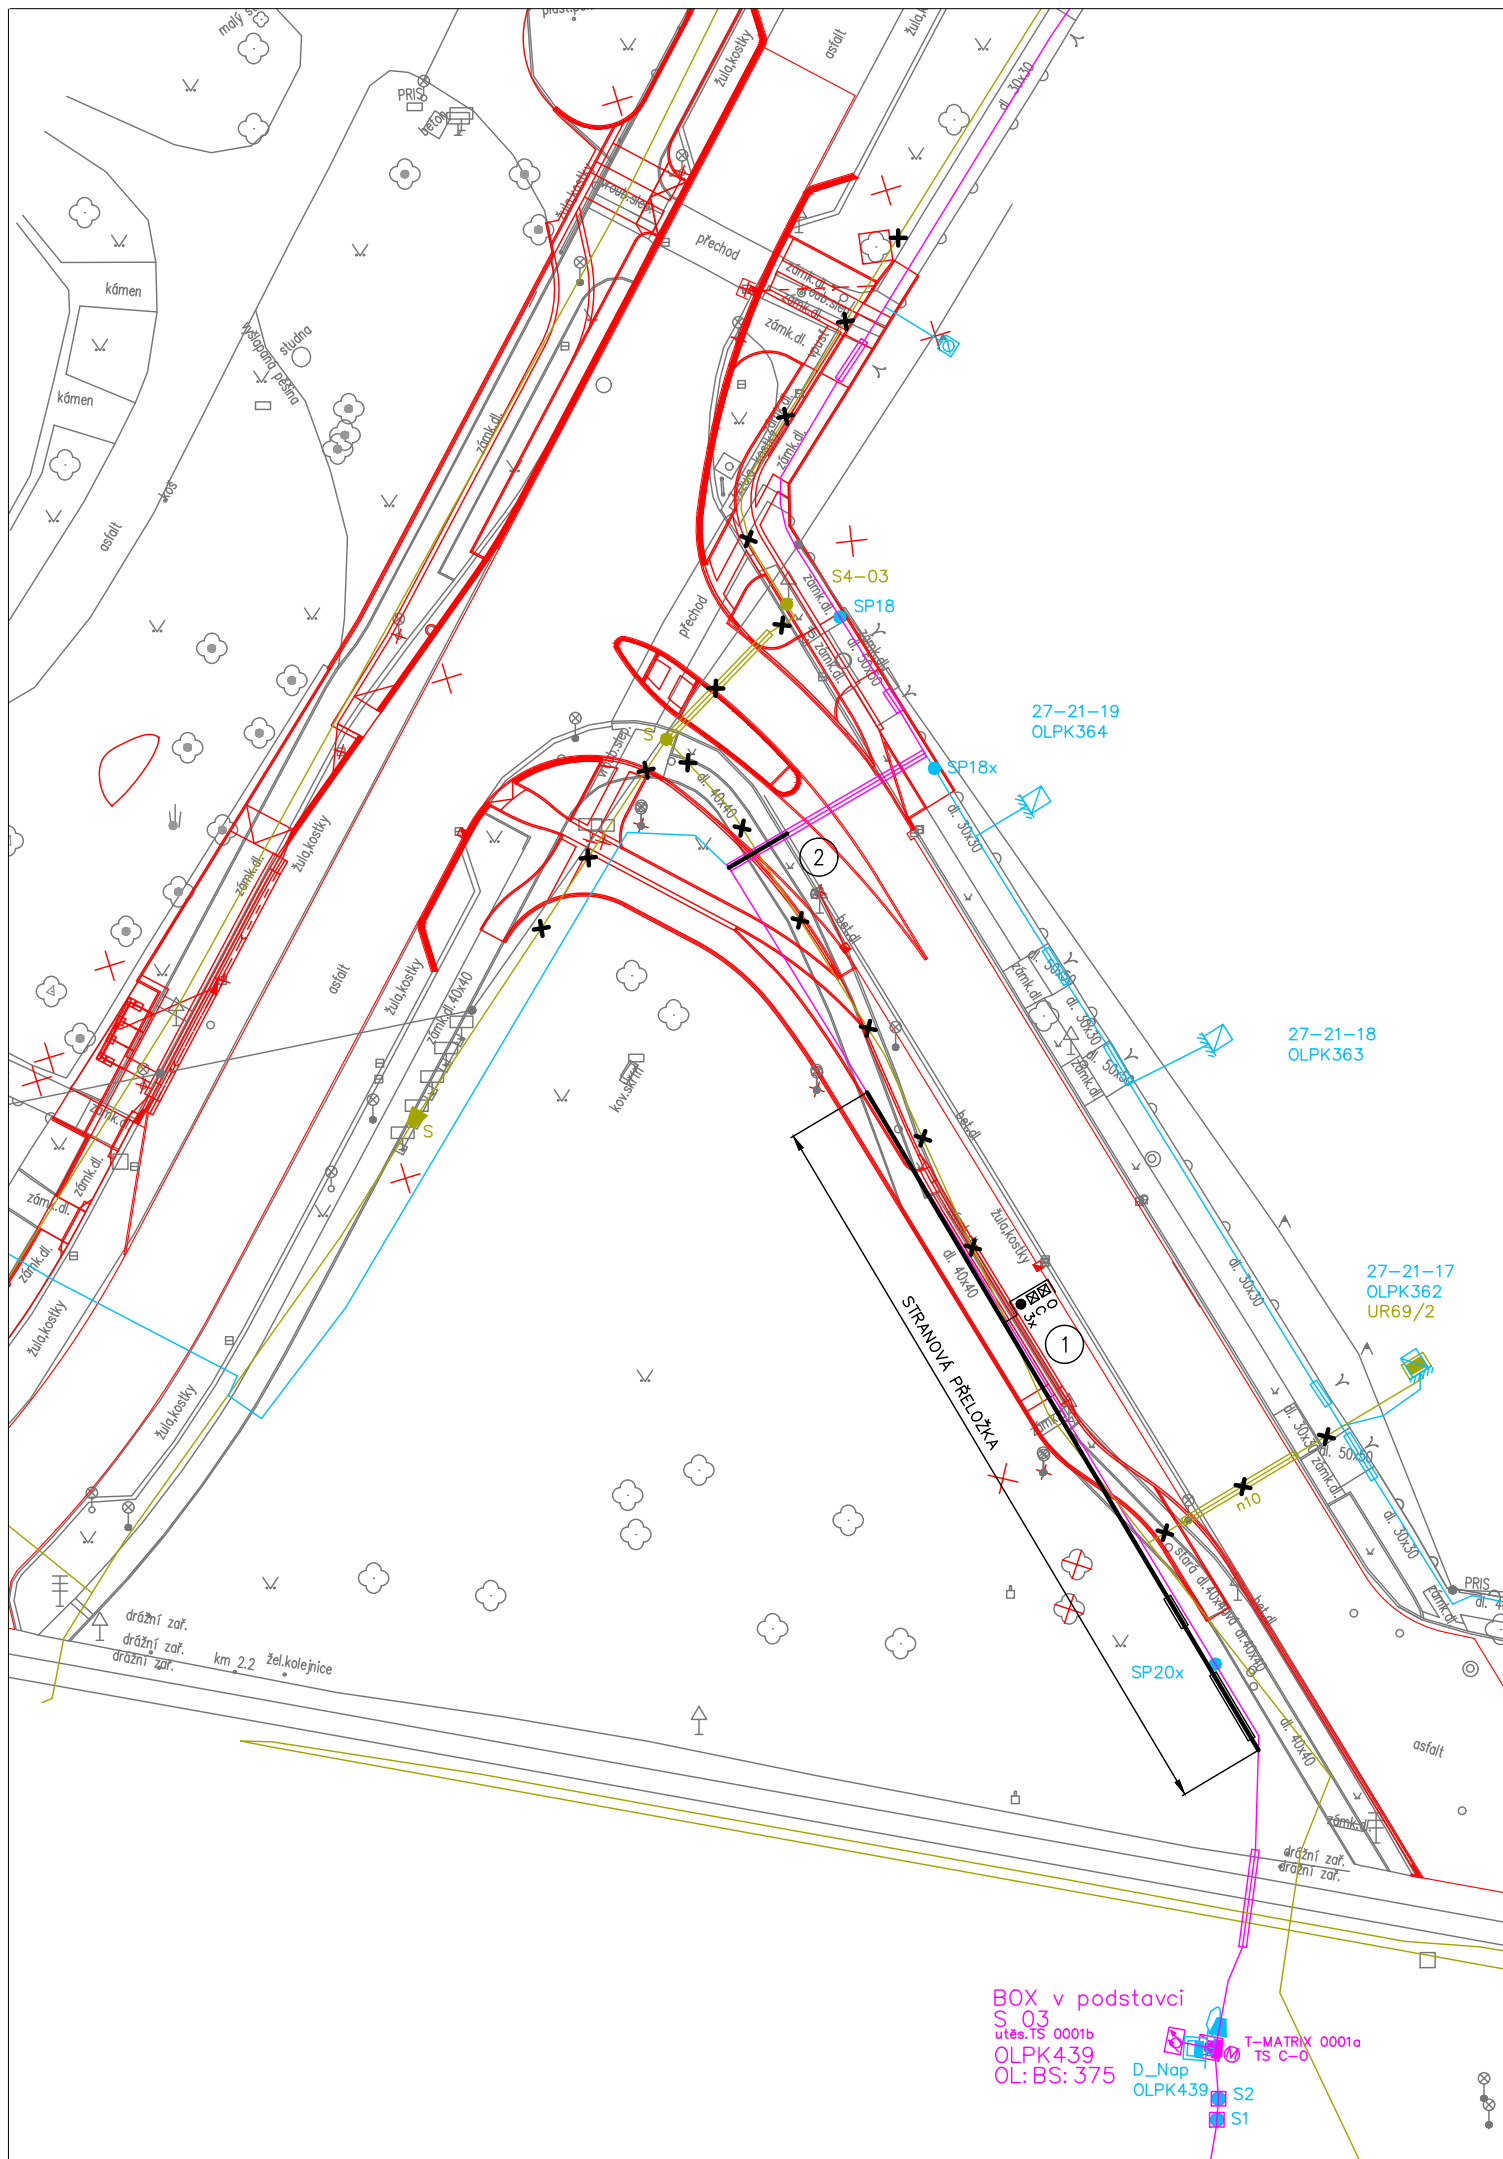


| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--|---------|---------|-------|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL | Farského 43/4, OLMOUC www.multinet.cz | | | |
| MÍSTO | OLMOUJC | KRAJ | OLMOUCKÝ | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | | | ÚČEL | CTN | MĚŘITKO | 1:500 |
| STAVBA | VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka | | | ARCH.Č. | P 52-21 | DATUM | 10/21 |
| VÝKRES | SITUACE | | | Č.VÝK. | 1 | | |

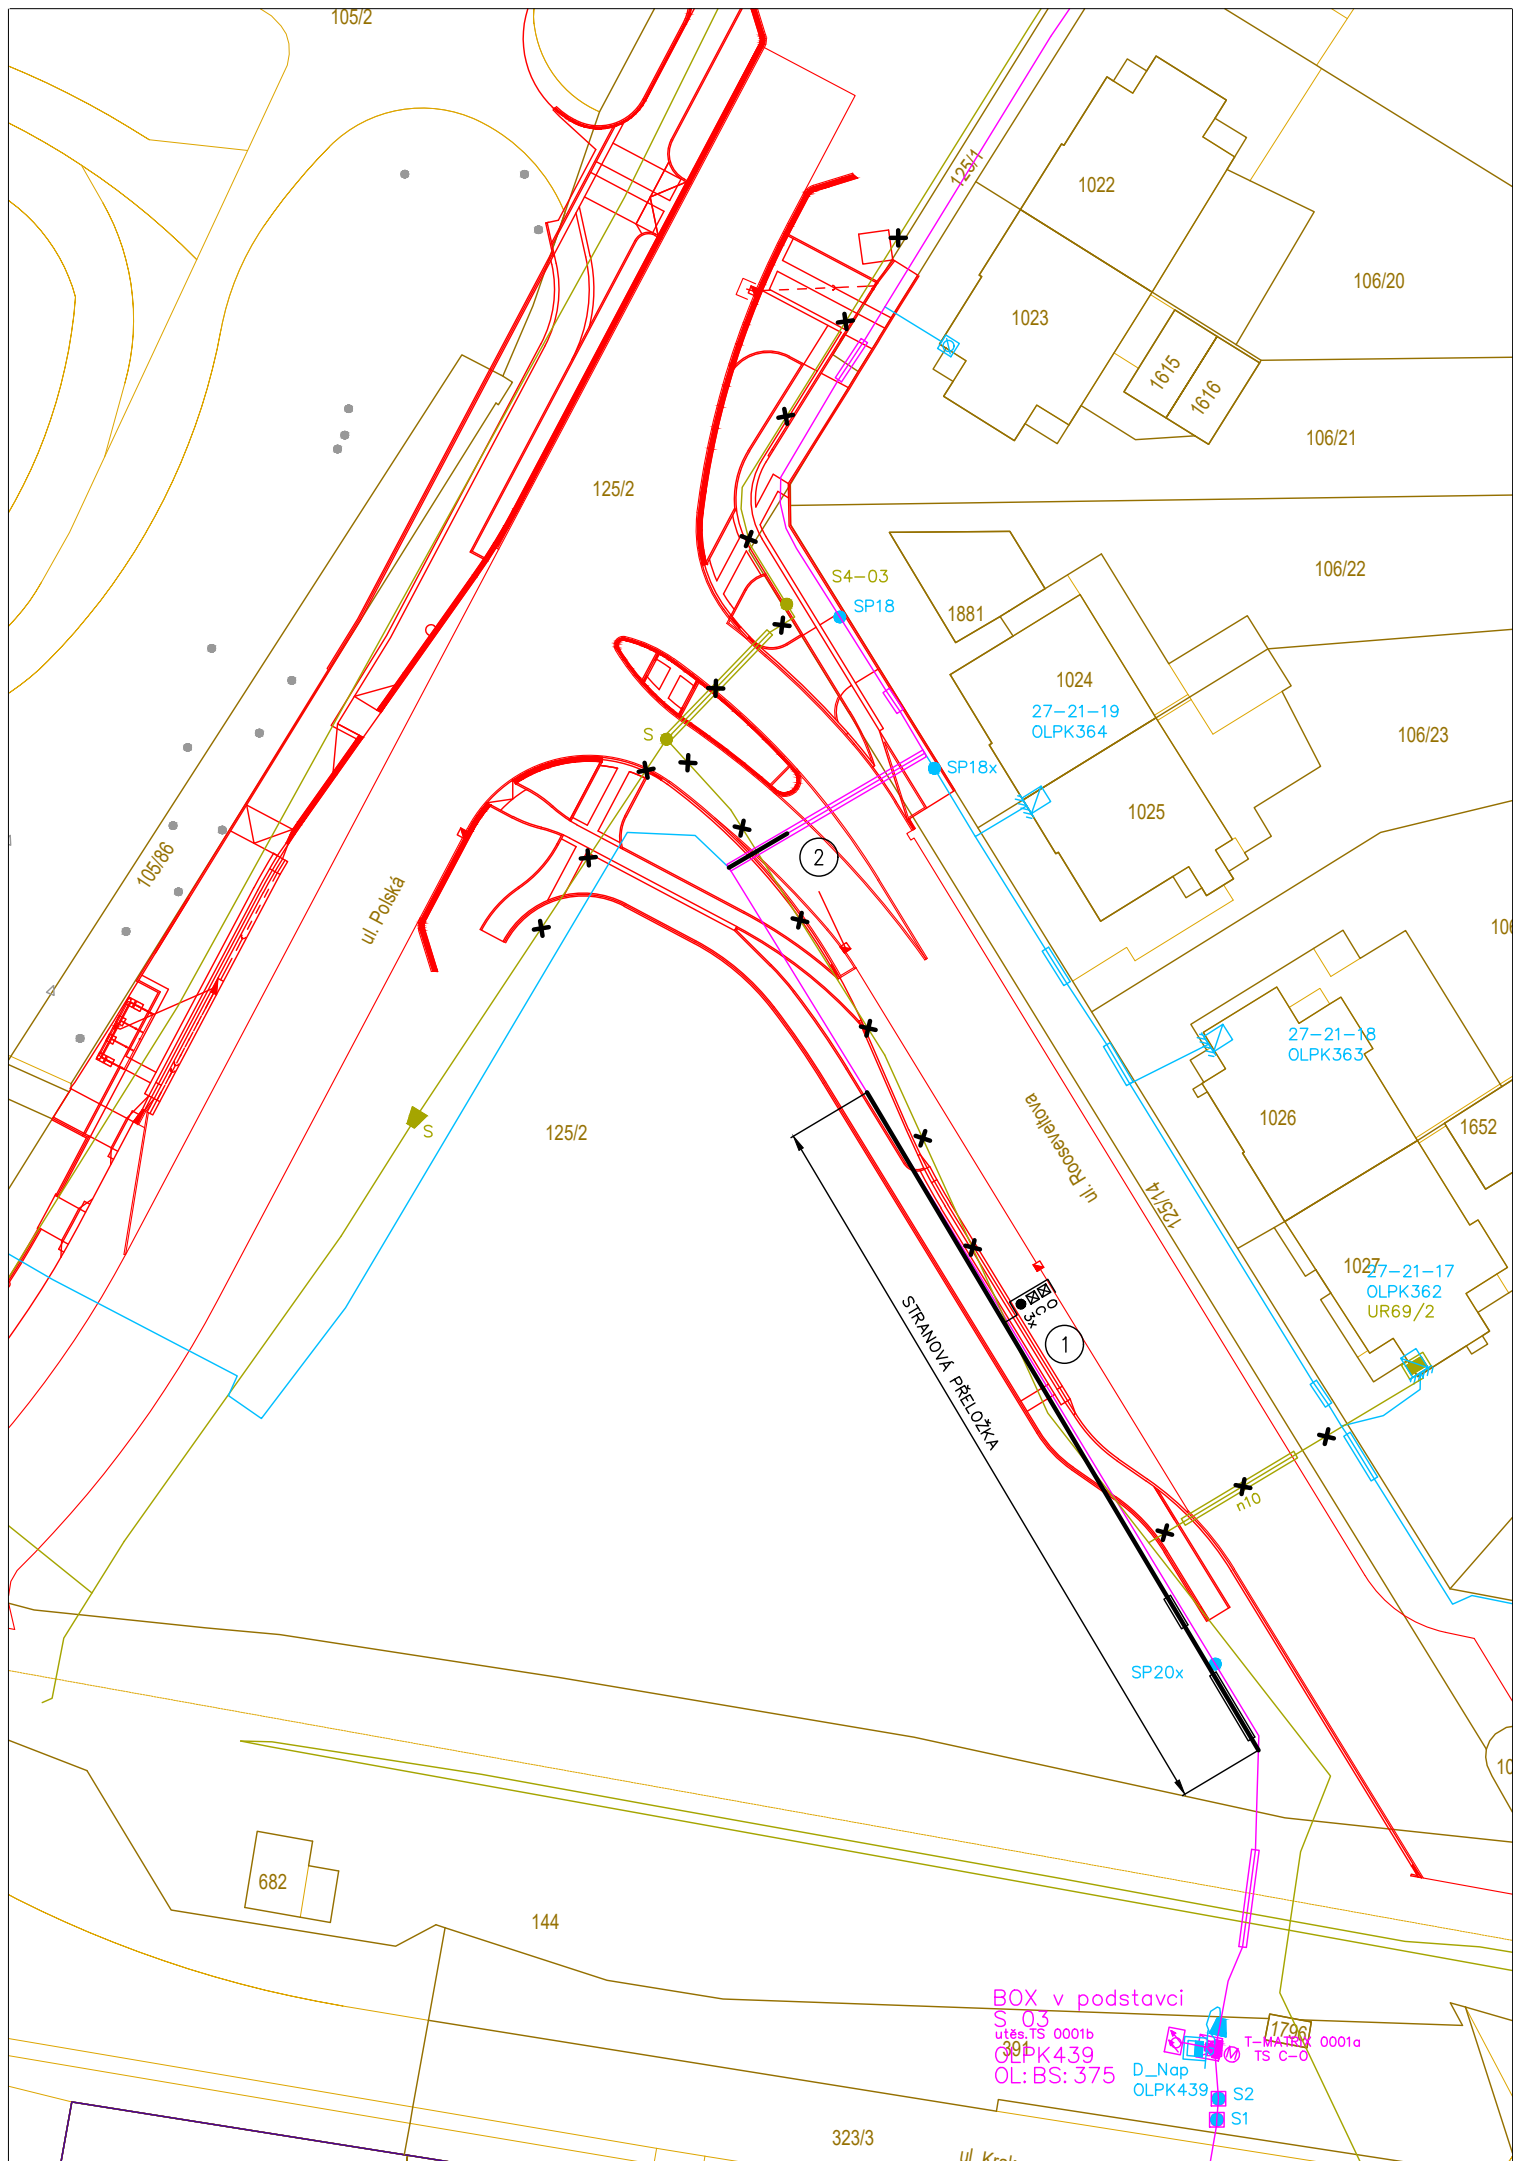


| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| | MET.KABELY, CHRÁNIČKA | | PROJEKTOVANÁ TRASA CHRÁNIČKA |
| | MET.KABELY, STARÁ SIŤ NEUVEDENO VE SCHÉMATU | | NOVÉ OBJEKTY |
| | HDPE TRUBKY S OPT.KABELY, ZDE SPOLEČNĚ S MET.KABELY | | |
| | PRÁZDNÉ HDPE TRUBKY | | |
| | PŘEKLÁDANÉ KABELY | | |






| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|--|---------|---------|-------|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL | Farského 43/4, OLOMOUC www.multinet.cz | | | |
| MÍSTO | OLOMOUJC | KRAJ | OLOMOUCKÝ | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | | | ÚČEL | CTN | MĚŘITKO | 1:500 |
| STAVBA | VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka | | | ARCH.Č. | P 52-21 | DATUM | 10/21 |
| VÝKRES | SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA | | | Č.VÝK. | 2 | | |

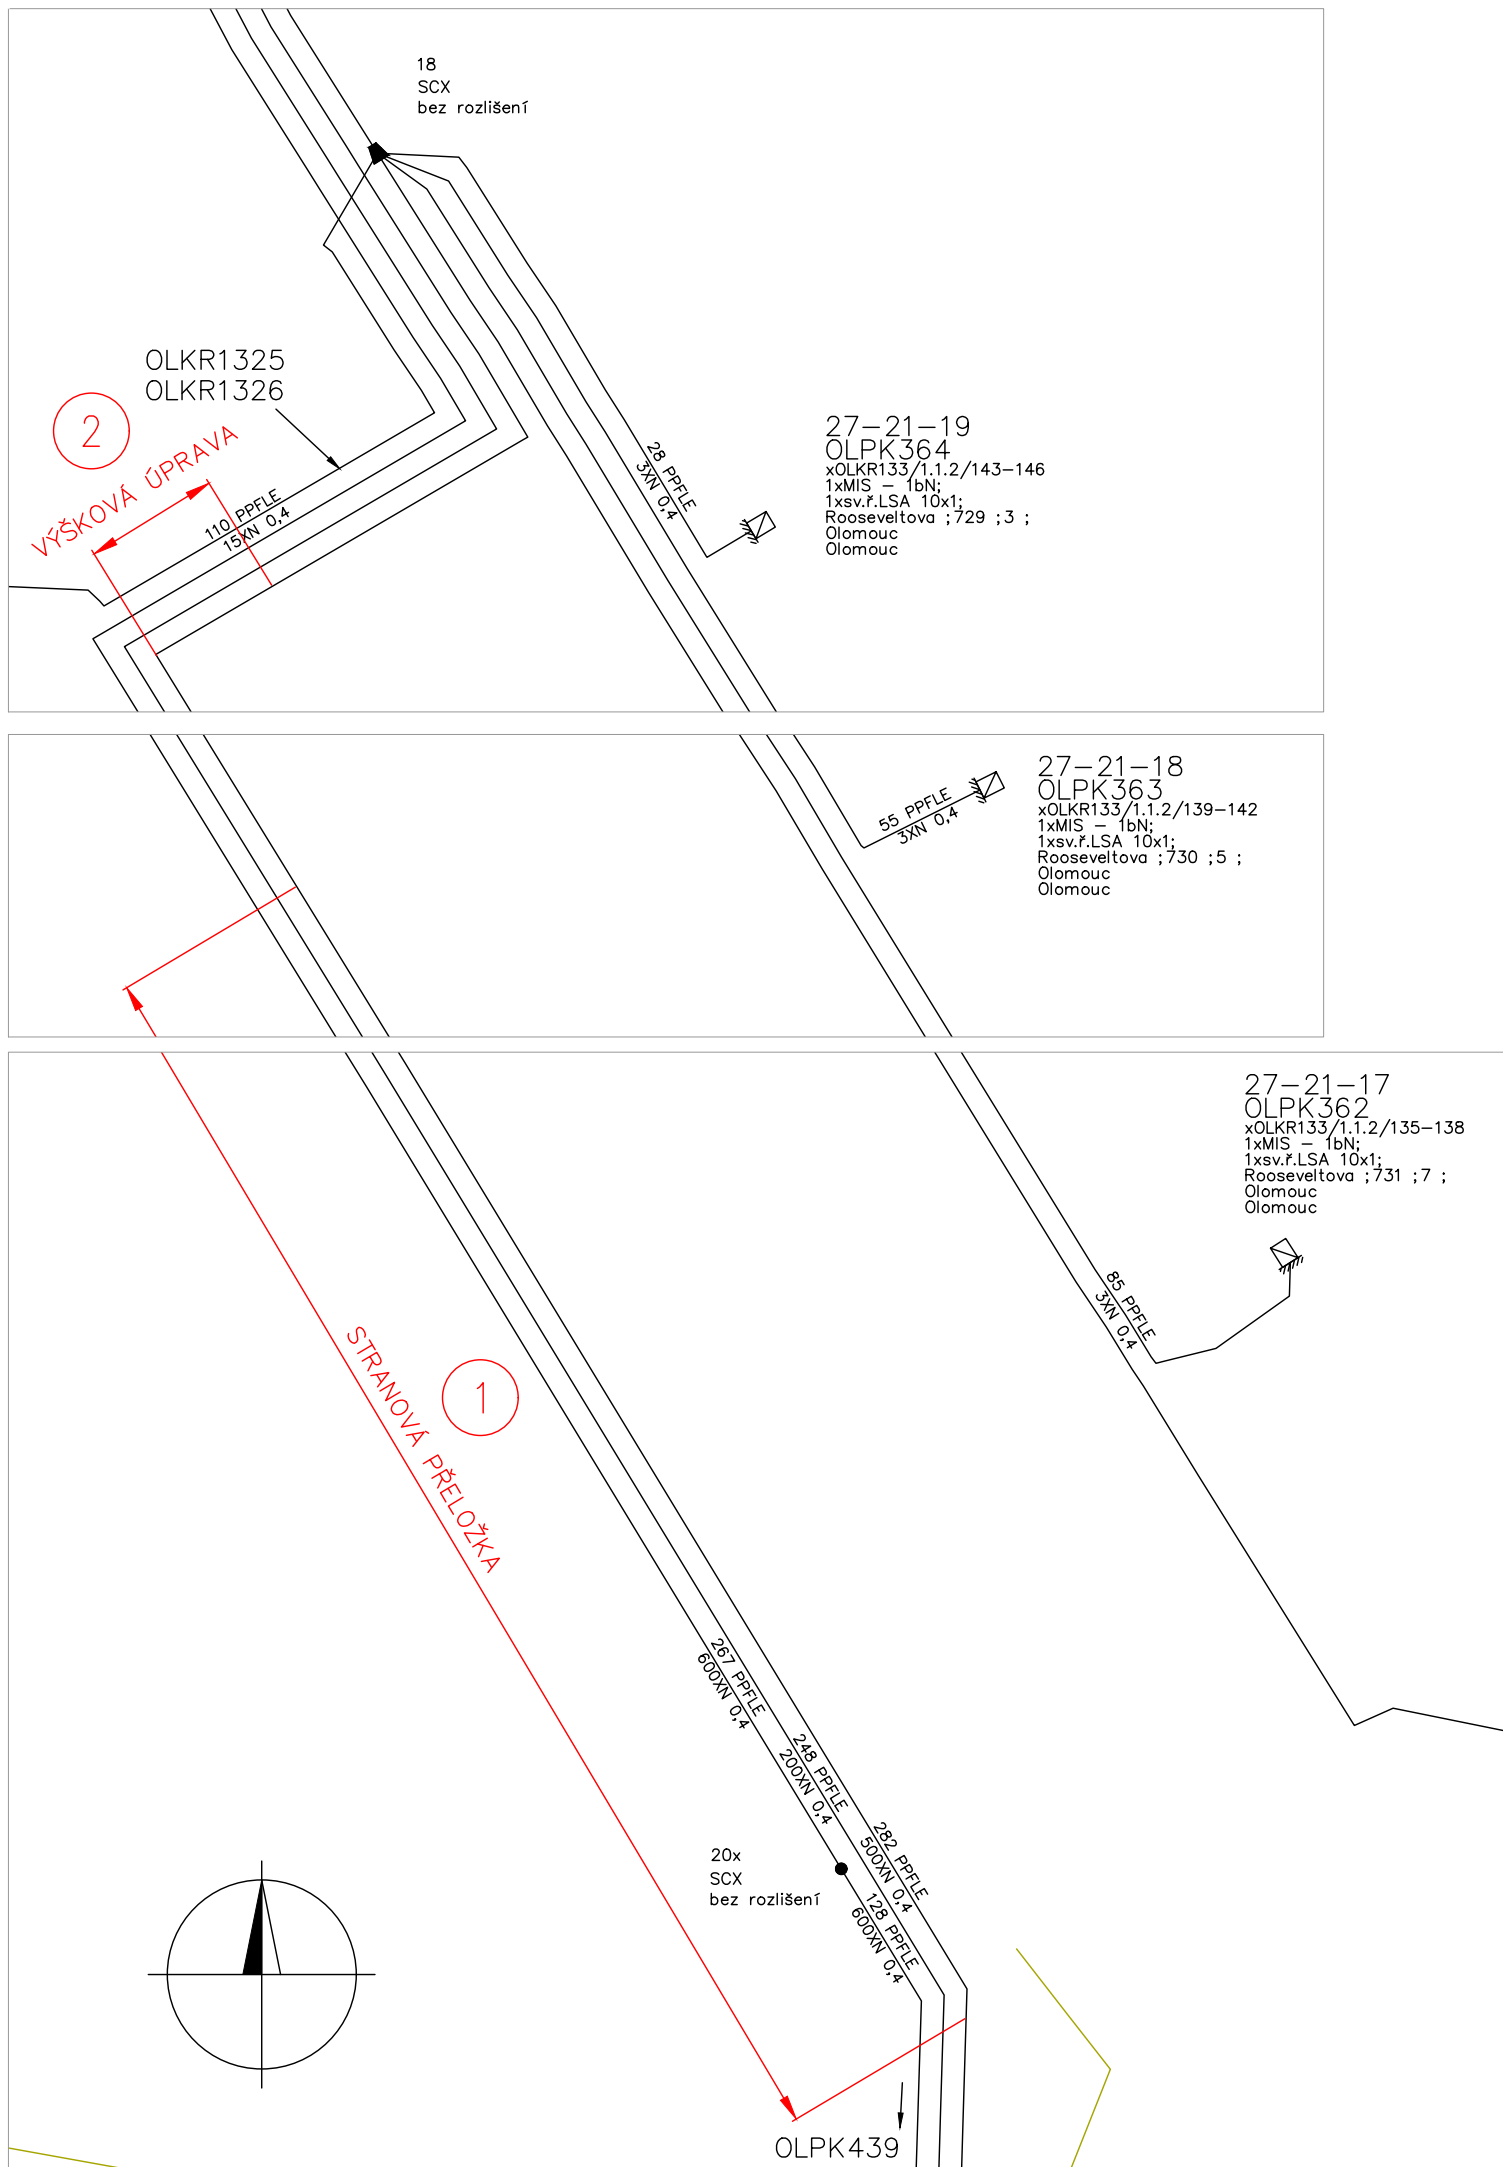


OLPK439

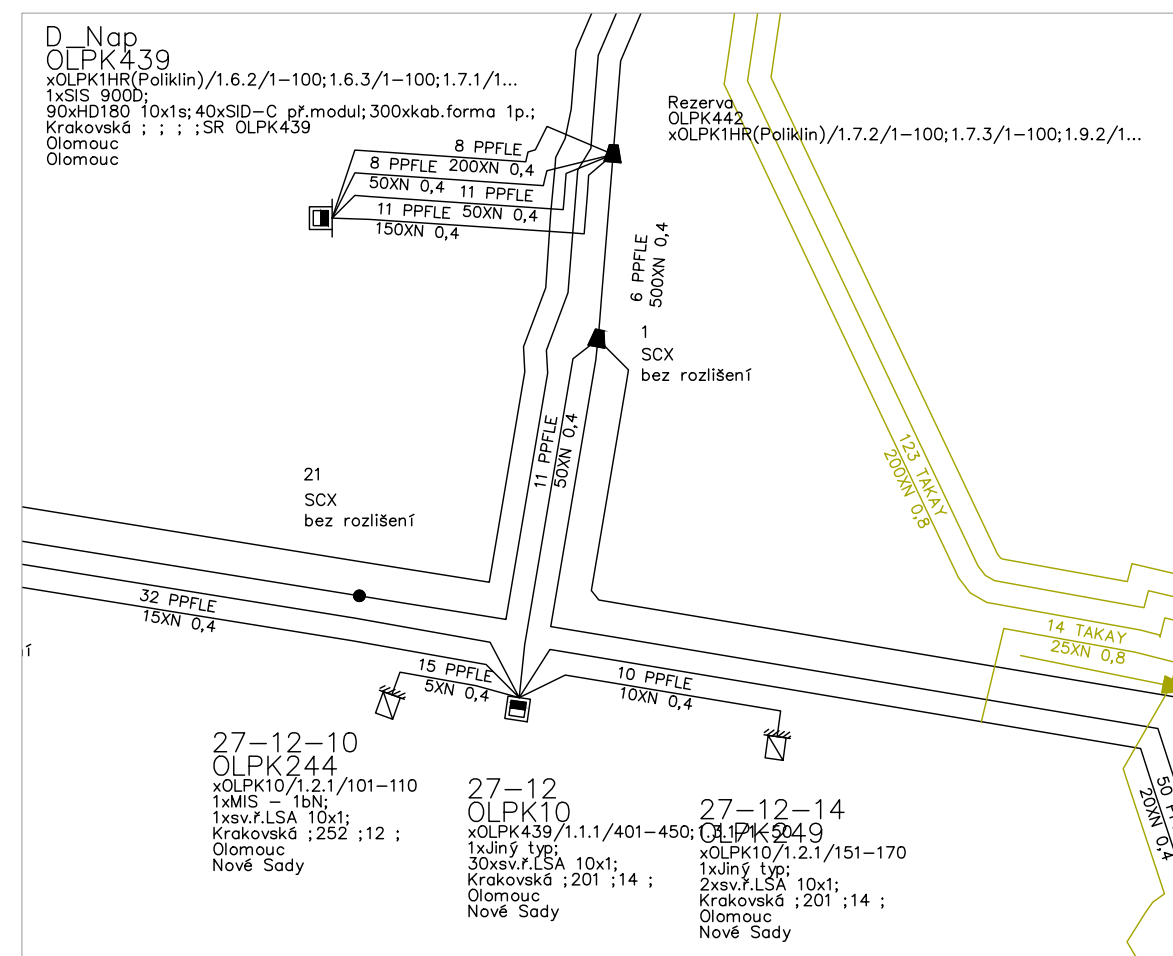

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|---|---------|---------|-------|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL | Farského 43/4, OLOMOUC www.multinet.cz | | | |
| MÍSTO | OLOMOUJC | KRAJ | OLOMOUCKÝ | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | | | ÚČEL | CTN | MĚŘITKO | - |
| STAVBA | VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka | | | ARCH.Č. | P 52-21 | DATUM | 10/21 |
| VÝKRES | SCHEMA - MET.KABELY | | | Č.VÝK. | 3 | | |

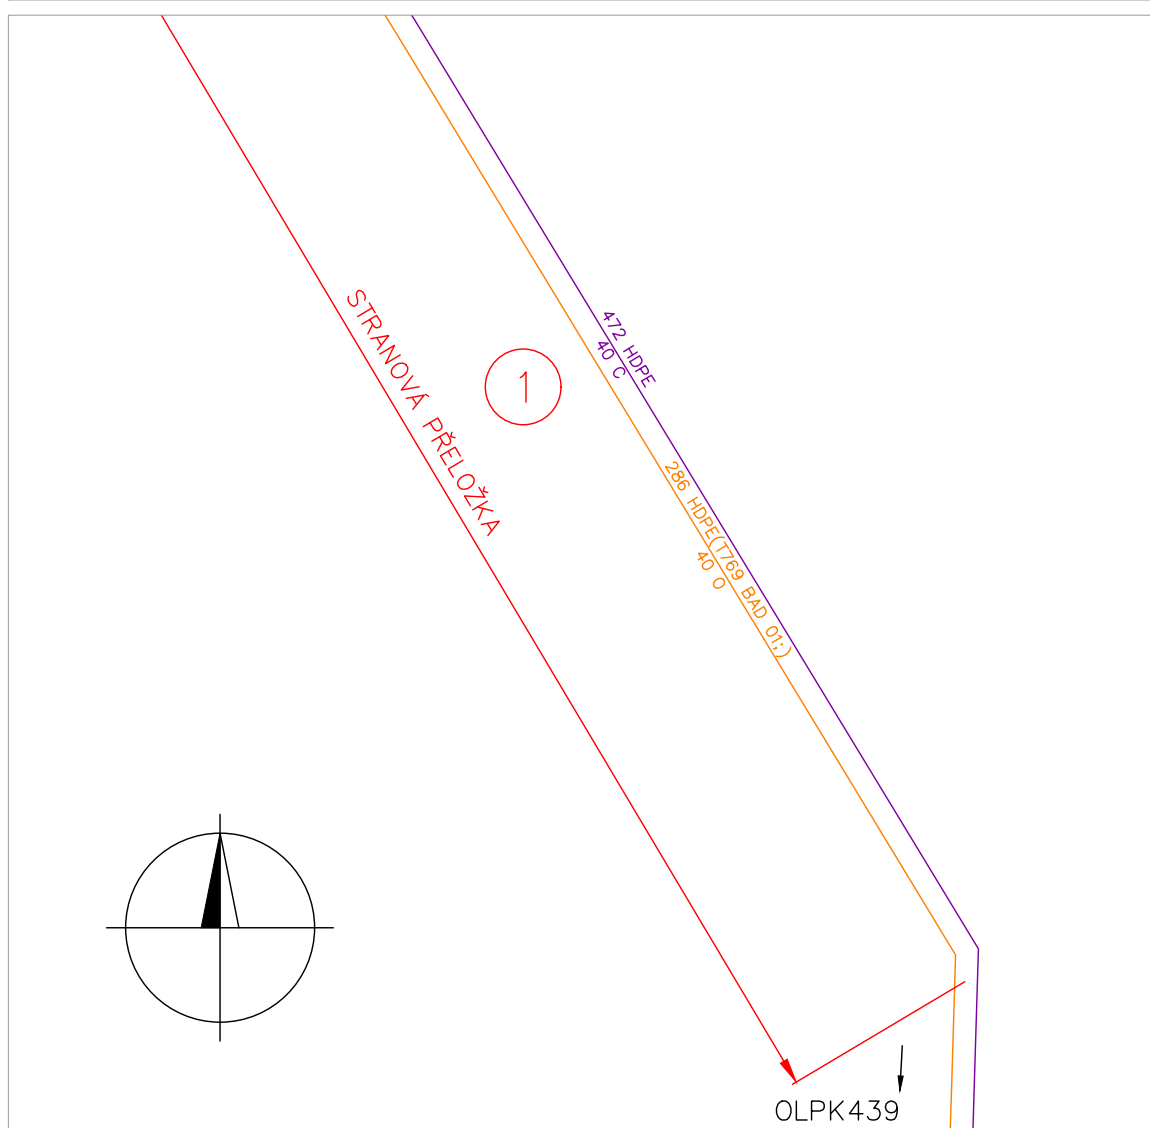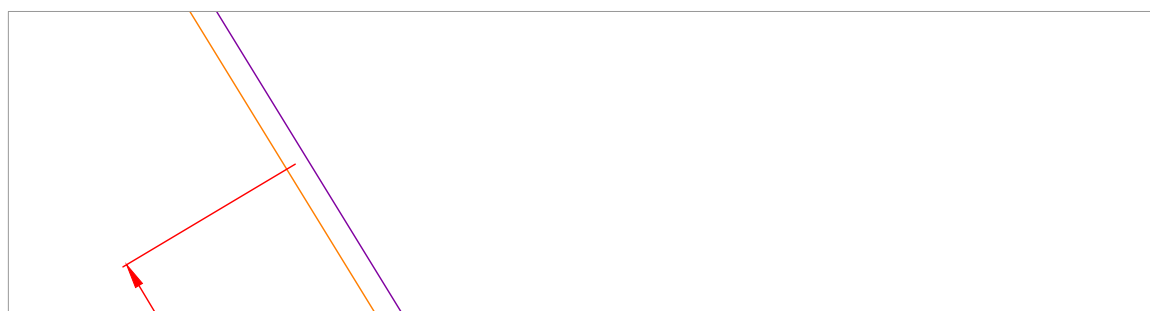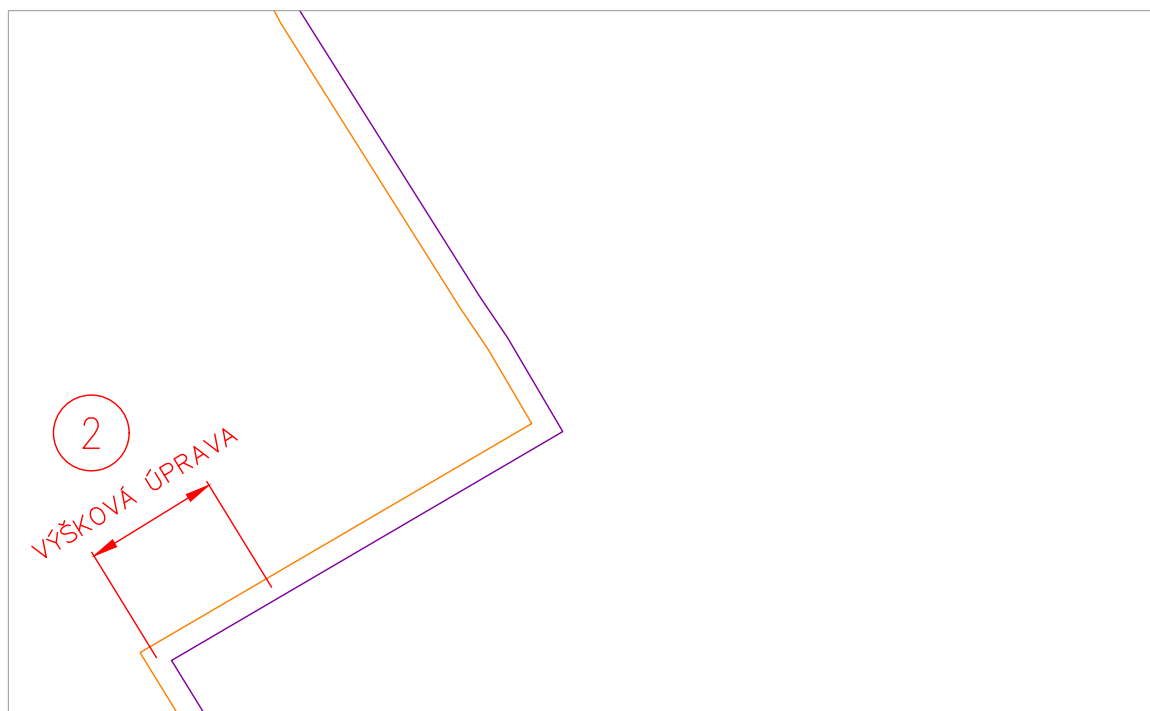


OLPK439

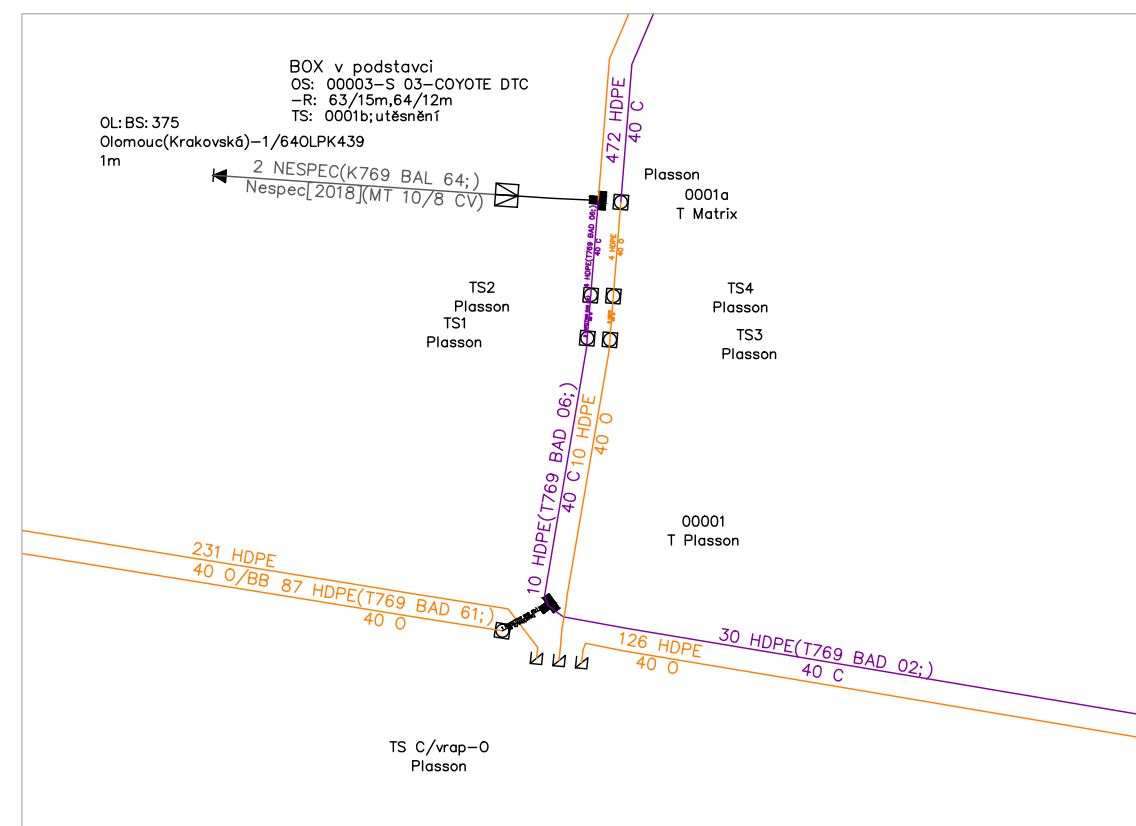

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------------|---|---------|---------|-------|
| VYPRACOVAL | ING. JUREČKA | AUTORIZ.ING. | ING. KAREL | Farského 43/4, OLOMOUC www.multinet.cz | | | |
| MÍSTO | OLOMOUJC | KRAJ | OLOMOUCKÝ | | | | |
| INVESTOR | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | | | ÚČEL | CTN | MĚŘITKO | - |
| STAVBA | VPIC OL, Polská-Rooseveltova, křižovatka | | | ARCH.Č. | P 52-21 | DATUM | 10/21 |
| VÝKRES | SCHEMA - HDPE | | | Č.VÝK. | 4 | | |

Informace o pozemku

| | |
|---------------------------|--|
| Parcelní číslo: | 125/2 |
| Obec: | Olomouc [500496] |
| Katastrální území: | Olomouc-město [710504] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m ²]: | 26391 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | jiná plocha |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

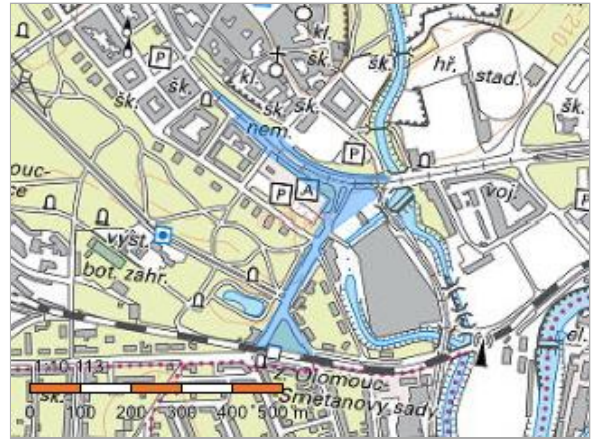

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Název

památkově chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 27.10.2021 07:00.

Specifikace nákladů_VPIC OL,Polská-Rooseveltova, křižovatka

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.02

Položková databáze: 2024.02

Název stavby: VPIC OL,Polská-Rooseveltova, křižovatka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 38 686,17 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 99 713,57 Kč |
| MONTÁŽ | 74 437,22 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA | 0,00 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 13 377,75 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | 3 942,64 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | 11 854,17 Kč |
| PROVOZNÍ PRÁCE | 0,00 Kč |
| MATERIÁL DOD. CETIN | 0,00 Kč |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ | 0,00 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 16 617,47 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč |
| POPLATKY | 0,00 Kč |

Celkové náklady: 258 628,99 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 208 818,67 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 49 810,32 Kč

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 7 300,26 Kč |
| 953634 | | Projekt tlkm liniové metalické sítě | 1.00 ks | 31 385,91 Kč |
| | | zóna I, 0,1-0,4 km | | |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 952368 S | | Pokládka žlabů TK2,T2N | 14.00 m | 1 670,76 Kč |
| 955550 S | | Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm | 10.00 m | 986,90 Kč |
| 951549 S | | Přesun lávky přechodové z ocelové desky | 2.00 ks | 95,38 Kč |
| 955577 S | | Rýha v chodníku 35/50-70 | 49.00 m | 35 590,66 Kč |
| 952359 S | | Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 | 59.00 m | 56 631,15 Kč |
| 955578 S | | Rýha v chodníku rozšíření o10cm | 5.00 m | 1 044,70 Kč |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 108.00 m | 1 553,04 Kč |
| 954972 S | | Znovuosazení obrubníků chodníkových | 6.00 m | 1 821,42 Kč |
| 951349 S | | Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky | 2.00 ks | 319,56 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955010 S | | Demontáž úložné trubky | 114.00 m | 1 611,96 Kč |
| 955031 S | | Demontáž úložných kabelů do 300 XN | 57.00 m | 2 445,30 Kč |
| 955029 S | | Demontáž úložných kabelů do15 XN | 5.00 m | 123,55 Kč |
| 955032 S | | Demontáž úložných kabelů nad 300 XN | 114.00 m | 6 964,26 Kč |
| 958318 S | | Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba | 20.00 ks | 7 152,80 Kč |
| 955268 S | | Montáž podzemní tratě síťové metalické | 6150.00 JV | 6 150,00 Kč |
| | | koordinace se stavbou | | |
| 952602 S | | Montáž trubky úložné | 114.00 m | 2 452,14 Kč |
| 954990 S | | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 5.00 m | 140,75 Kč |
| 954992 S | | Montáž úložných kabelů do 300 XN | 57.00 m | 2 823,21 Kč |
| 954993 S | | Montáž úložných kabelů nad 300 XN | 114.00 m | 7 902,48 Kč |
| 957753 S | | Realizace tratě síťové dohodou | 17220.00 JV | 17 220,00 Kč |
| | | rozpočtová rezerva | | |
| 958469 S | | Uvedení stavby do provozu | 6765.00 JV | 6 765,00 Kč |
| | | kolaudace | | |
| 955630 S | | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 4.00 ks | 5 884,48 Kč |
| 958556 S | | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 6 801,29 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-------------|
| 955278 S | Provedení geodetického měření pro tratě síťové Vytyčení trasy podle geo bodů | 6150.00 JV | 6 150,00 Kč |
| 956284 S | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 7 227,75 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | | | |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 3 942,64 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | | | |
| 958747 S | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 1.00 ks | 4 672,66 Kč |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady za SoSB - odhadovaná Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. | 100.00 JV | 100,00 Kč |
| 955315 | Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ | 1.00 ks | 3 066,36 Kč |
| 958085 | Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN | 1.00 ks | 4 015,15 Kč |

| Limitka materiálu | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303918 S | | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 54.00 ks | 2 460,24 Kč |
| 303813 S | | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 50.00 m | 239,50 Kč |
| 303777 S | | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | 220.00 m | 501,60 Kč |
| 302532 S | | Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 | 1.00 ks | 281,19 Kč |
| 319184 S | | Spona trubkySYSPRO | 84.00 ks | 3 066,00 Kč |
| 319209 S | | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 7.00 m | 4 050,27 Kč |
| 319210 S | | Trubka dělená SYSPRO 200/160 | 7.00 m | 6 018,67 Kč |

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063

zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě –
překládky SEK
(„**CETIN**“)

a

[•]

(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**Čl. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně

oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí


CETIN:

Partner:

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

za **CETIN a.s.**



za [•]
Jméno: [•]
Funkce: [•]
