



SMLOUVA O DÍLO č. 27Spr 1695/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

1. **Česká republika – Okresní soud v Šumperku**
se sídlem Šumperk, M. R. Štefánika 784/12
zastoupená Mgr. Milanem Lipenským, předsedou okresního soudu
IČ: 00025283
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **přesný název zhotovitele**
JOMBOX - Šmoldas, veřejná obchodní společnost
Obchodní rejstřík Ostrava, oddíl AXVIII, vložka 258
Dobrovského 825/21
Šumperk
787 01
zastoupená Bohumilem Šmoldasem, společníkem v.o.s.
IČO: 166 26 770
DIČ: CZ 166 26 770
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

- Dokumentace k projektu realizace stavební úpravy eskortní místnosti z 27.2.2024
- Nabídka zhotovitele ze dne 4.3.2024

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je rozdělení odkládací ceny dle Dokumentace k projektu realizace stavební úpravy eskortní místnosti v budově Okresního soudu v Šumperku a cenové nabídky zhotovitele, které jsou specifikované v čl. II.1. této Smlouvy.
2. Místo provádění díla - hlavní budova Okresního soudu v Šumperku (1. PP) na adrese Šumperk, M. R. Štefánika 784/12. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v dokumentaci, kterou vypracovala Vazební věznice Olomouc, a která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy,
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených v Zadávací dokumentaci,
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
6. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do pěti týdnů od podpisu této smlouvy o dílo, kdy současně ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli.
3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy.
4. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a ten takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín (*max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu*).

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 113.861 Kč (slovy: ---jednostřinácttisícosmsetšedesátjedna---), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).

2. Rozpis ceny v Kč:
- bez DPH 94.100,00 (slovy:---devadesátčtyříticícesto ---)
 - DPH 19.761,00 (slovy:---devatenácttisícsemdsetšedesátjedna---)
 - **vč. DPH 113.861,00 (slovy: ---jednostotřinácttisícosemsetšedesátjedna---**)
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
- a) poplatky za uložení zeminy a stavební sutí a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,
4. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.
6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.
8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavení v opodstatněných případech upravovat.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy.
4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. **Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc.** Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 20 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 17 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
6. **Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě**

konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
- přerušil práce bez příkazu objednatele,
 - přerušil práce z důvodů na straně zhotovitele,
 - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v rozporu dokumentací stavby

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. **Zhotovitel zabezpečí vedení evidence odpadů vzniklých při stavbě včetně jejich množství. Tyto údaje mohou být vedeny ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě na samostatné stránce.**
2. **Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.**
3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví nebo dozvěděl od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
6. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelům jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolení osoby určené objednatelům v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.
7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna

opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební sutě.

9. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst objednatele a na účet objednatele.
10. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet.
11. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
12. Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
 - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
 - veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.
 - zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele.
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
 - zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
 - zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
 - zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.
 - zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

- zhotovitel je povinen při bouracích pracích učinit taková opatření, která eliminují šíření prachu do dalších prostor. Pokud zhotovitel nezajistí účinná opatření, může objednatel požadovat po zhotoviteli uvedení prostor do původního stavu nebo refundaci nákladů, které vynaložil objednatel sám na uvedení prostor do původního stavu.

13. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů včetně informací, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit (dle § 105, odst. 1, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění).

VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
- a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:



- b) ve věcech ekonomických:



2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:
- a) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele a denních záznamů do stavebního deníku:



3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Stavební deník

1. **Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo alespoň jednoduchý záznam o stavbě v souladu s § 163, odst. 2, písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění (stavební zákon).**
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora.
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na

objednatel potvrdí zápisem o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatel budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V.1 této Smlouvy.
8. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací a projektové dokumentace stavby prostřednictvím vlastních pracovníků a zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jeho smluvním subjektům přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatel.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí dokončené stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě, stejně tak i oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. **V zápisu zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady.** Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí dokončené stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (elektrické rozvody),
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
 - jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
 - zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách,
 - stavební deník(y) nebo jednoduchý(é) záznam(y) o stavbě,
 - doklady o odzkoušení technologických zařízení.
4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
 6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
 7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
 9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
 10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla **v délce 24 měsíců**, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části

zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - (a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - (b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - (c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení .
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč .
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XV. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv zajistí objednatel.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

**XVII.
Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Dokumentace k projektu realizace stavební úpravy eskortní místnosti z 27.2.2024
- Nabídka zhotovitele ze dne 4.3.2024

V Šumperku dne 25-03-2024



Mgr. Milan Lipenský
předseda okresního soudu

Okresní soud
M. R. Štefánika 12
787 73 ŠUMPERK

V Šumperku dne 11.03. 2024



Bohumil Šmoldas
společník v.o.s.

OKRESNÍ SOUD V ŠUMPERKU

M. R. Štefánika 784/12, 787 01 Šumperk

**Dokumentace k projektu realizace stavební úpravy eskortní
místnosti v budově Okresního soudu v Šumperku**

Předmět projektu

Předmětem projektu je stavební úprava odkládací cely v eskortní místnosti Okresního soudu v Šumperku, kdy v prostoru největší odkládací cely budou zbudovány dvoje mříže s pojezdovými dveřmi, čímž v prostoru této odkládací cely vzniknou cely dvě.

Požadavek na úpravu eskortní místnosti vzešel ze strany Vězeňské služby ČR s ohledem na pravidla pro oddělené umístění osob.

Projekt byl vypracován ve spolupráci Okresního soudu v Šumperku s Vězeňskou službou ČR, Vazební věznicí Olomouc, a bude sloužit stavební firmě jako závazný podklad pro realizaci stavebních úprav.

Tato projektová dokumentace obsahuje:

- zadávací parametry k výrobě a instalaci
- nákres mříží s dveřmi

Přílohou dokumentace jsou dále:

- žádost o stavební úpravu eskortní místnosti ze dne 22. 11. 2022
- žádost o úpravu odkládací cely ze dne 30. 1. 2023

Úpravou cely bude naplněno ustanovení § 7 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v účinném znění, a § 7 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, v účinném znění, a bude tak umožněno oddělené umístění osob eskortovaných k soudním jednáním bez kompromisních řešení a dosaženo přípustné míry bezpečnostních rizik při realizaci eskortní činnosti.

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, kterými se Vězeňská služba ČR řídí při realizaci akcí obdobného typu.

Schválení parametrů projektu

S realizací projektu stavebních úprav eskortní místnosti v budově Okresního soudu v Šumperku na základě parametrů uvedených v tomto projektu souhlasím a nemám k těmto parametrům žádné výhrady.

V Šumperku dne



Mgr. Milan J. Lipenský
předseda Okresního soudu v Šumperku

V Olomouci dne




**Zadávací parametry k výrobě a instalaci 2 kusů katrových dveří a 2 ks mříže
k zabezpečení místnosti pro eskortované vězněné osoby
v budově Okresního soudu v Šumperku**

I. Materiál

- 1) ocelový profil (jekl) – dutý uzavřený svařovaný
 - síla stěny – min. 2 mm
 - rozměry – min. 30 x 40 mm
- 2) ocelová kulatina – síla – 16 mm
- 3) ocelová pásovina – min. 5 x 30 mm
- 4) ocelový „C“ nosný profil pro posuvné dveře
 - síla dle potřeby nosnosti
 - rozměry – 40 x 40 mm – dle rozměrů pojezdových ložisek
- 5) svařovaná síť ocelová – výplň mříže a katrových dveří
 - průměr drátu – min. 3 mm
 - rozměry oka – 40 x 40 mm
- 6) šroub k uchycení konstrukce do zdiva
 - délka – min. 80 mm
 - průměr – min. 7,5 mm
 - průměr hlavy – min. 14 mm
- 7) katrové posuvné dveře – 2x
 - rozměr dveří – 2000 x 800 mm
 - konstrukčně vhodný zadlabací zámek pro posuvné dveře – 2x
 - cylindrická zámková vložka – 2x
 - ocelová kulatina pro výrobu madla posuvných dveří – 2x – síla min 20 mm nebo jiný odolný průmyslový systém
 - kování – pojezdové ložisko – 12 x (4x horní část, 2x dolní část) – vnější průměr min. 35 mm
 - ocelový „C“ nosný profil pro posuvné dveře – síla dle potřeby nosnosti, rozměry – dle rozměrů pojezdových ložisek
- 8) dorazy dveří – silon nebo jiný vhodný materiál
- 9) poutací okénko 2x
 - rozměr okénka – 400 x 200 mm
 - plech – síla min. 4 mm
 - pant na poutací okénko – 2x
 - cylindrická zámková vložka – 2x
 - zadlabací zámek pro poutací okénko – 2x
 - madlo – shodné provedení dle bodu 7), čtvrtá odrážka

II. Provedení

- 1) **Mříže**
 - povrchová antikoroziční úprava
 - ukotvení nerozebíratelnými spoji do stavební konstrukce zdi
 - rozteč ocelové kulatiny dle oddílu I. Bod 2) maximálně 12 cm
 - vzájemné spojení sekcí mříží dle místních podmínek a podmínek dodavatele – svár nebo šroubení nerozebíratelným spojem (s opatřením k zamezení nepovolené manipulace ze strany vězněných osob)
- 2) **Katry** (katrové dveře)
 - úprava proti vysazení
 - pevné části katrů s ukotvením do stavební konstrukce budovy (zdi) nerozebíratelnými spoji
- 3) **Uzamykací systémy**
 - uzamykací systémy, které nesnižují celkovou odolnost konstrukce
 - složení z cylindrické zámkové vložky a vhodného zadlabacího hákového zámku pro posuvné dveře

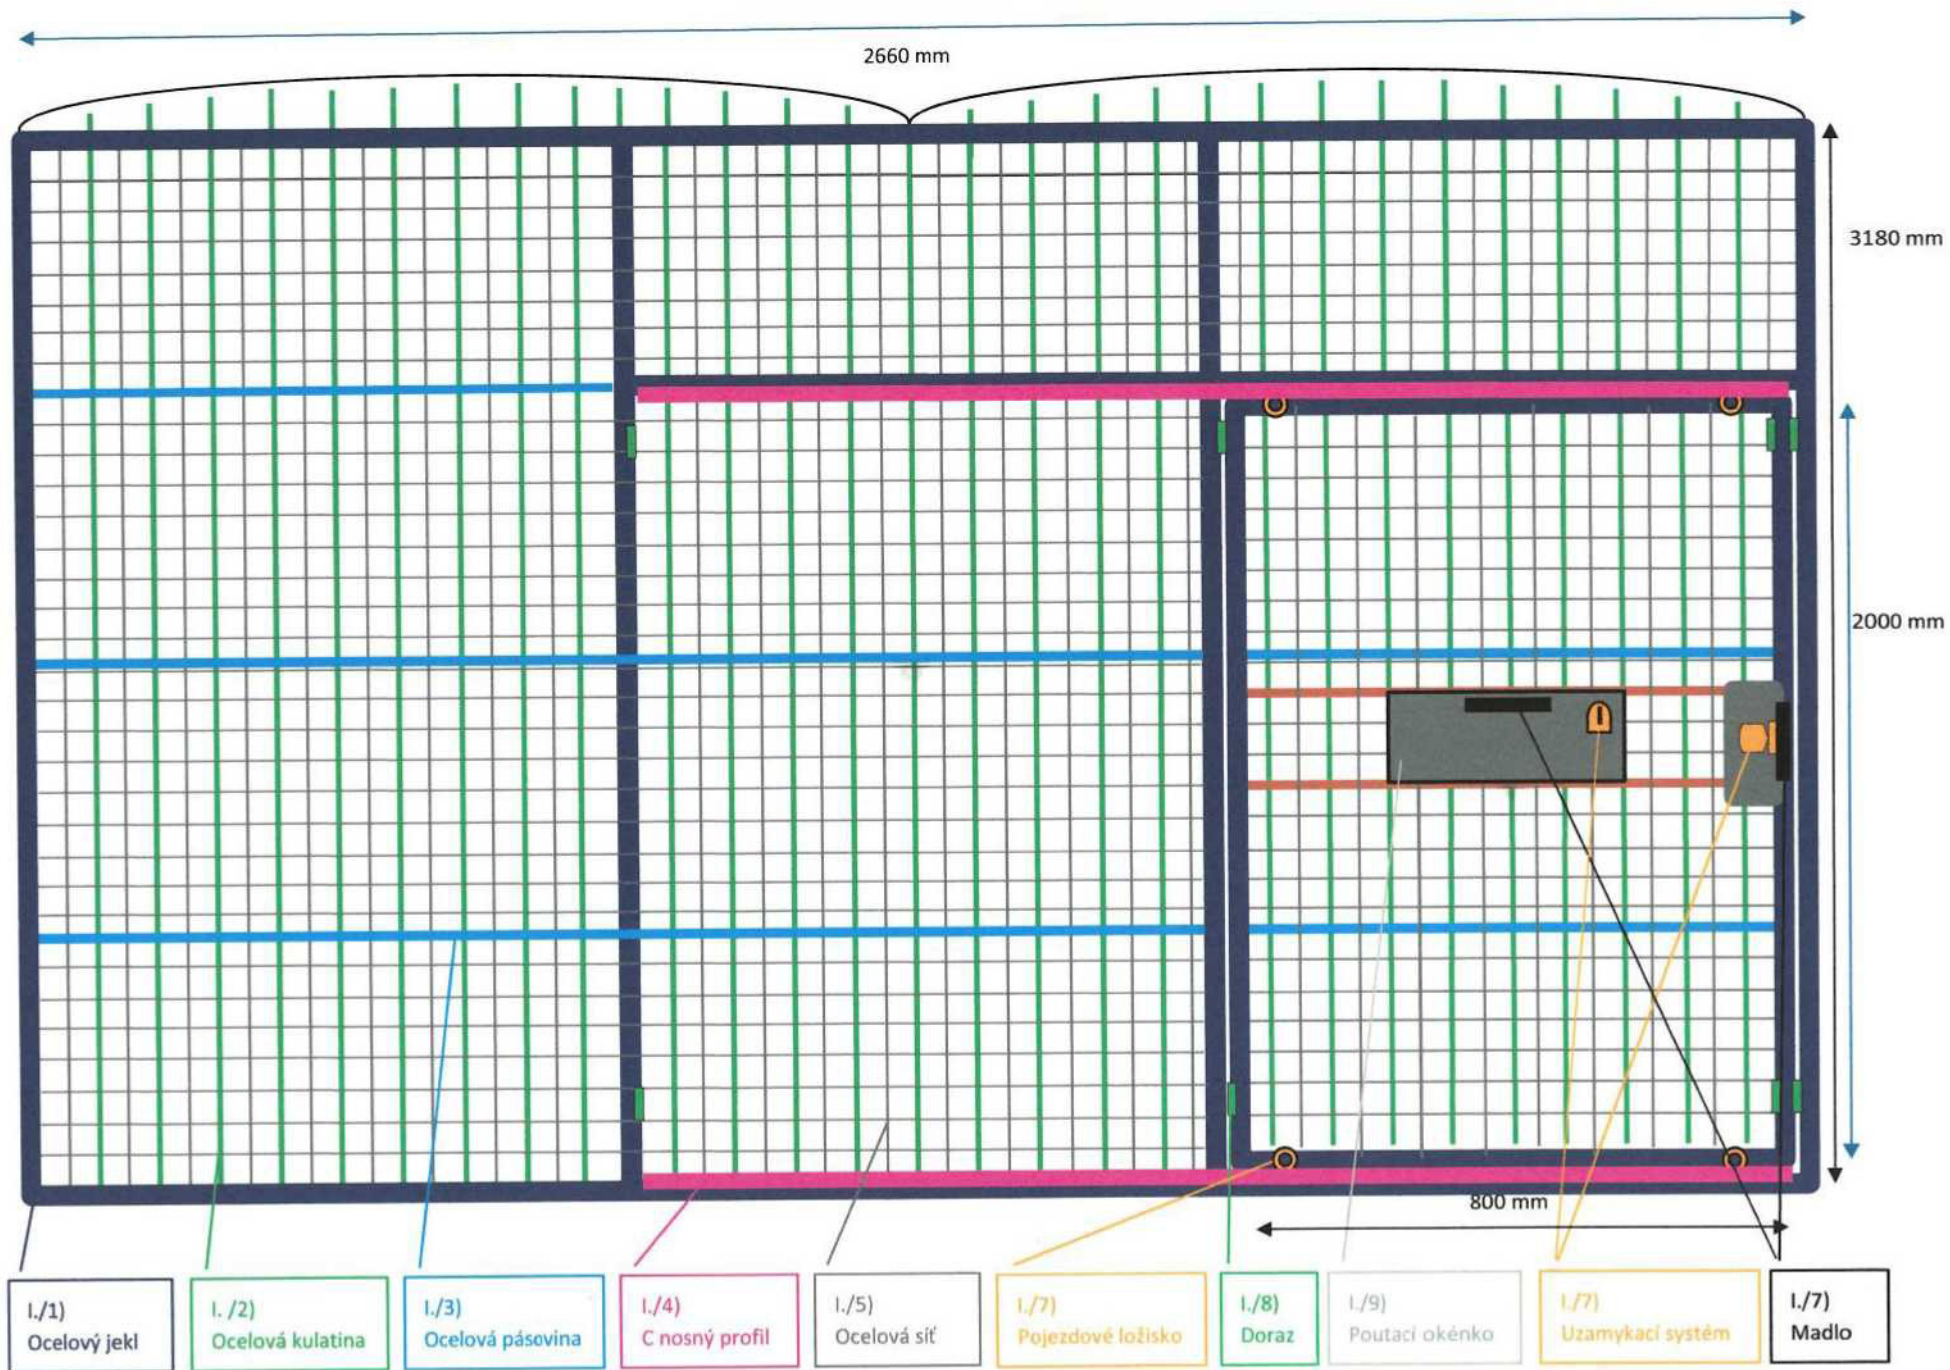




Vězeňská služba České republiky
Vazební věznice Olomouc, Oddělení vězeňské stráže
Švermova 1161/2, P.O. BOX 84, 771 57 Olomouc, ID DS: qpnd4z7

Č. j. VS-222009-2/ČJ-2022-803760

Okresní soud v Šumperku


M. R. Stefánika 784/12
Šumperk 787 73
35yabet


– datovou zprávou –

Olomouc 22. listopadu 2022
Počet stran: 1

Žádost o stavební úpravu eskortní místnosti v budově OS Šumperk

Dobrý den,

dne 19. 10. 2022 byl předsedkyni soudu prostřednictvím příslušníka oddělení vězeňské stráže Vazební věznice Olomouc přednesen návrh na možnou úpravu eskortní místnosti situované v suterénu Okresního soudu v Šumperku. Úprava, konkrétně rozdělení aktuálně největší eskortní místnosti na dvě části, má jednoznačně přispět k naplnění povinností Vězeňské služby souvisejících s umístováním vězněných osob dle příslušných ustanovení zákona o výkonu vazby a zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

V návaznosti na výše uvedené Vás tedy zdvořile prosím o realizaci nastíněné úpravy a rovněž o účast zástupců Vazební věznice Olomouc na tvorbě projektu. Kontaktní osobou za zdejší vazební věznici je pro tento účel 


Předem děkuji za kladné vyřízení věci.



podepsáno elektronicky



Vězeňská služba České republiky
Vazební věznice Olomouc, Oddělení vězeňské stráže
Švermova 1161/2, P.O. BOX 84, 771 57 Olomouc, ID DS: qpnd4z7

Č. j. VS-222009-3/ČJ-2022-803760

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 784/12
Šumperk 787 73
35yabet

– datovou zprávou –

Olomouc 30. ledna 2023
Počet stran: 2

Žádost o úpravu odkládací cely v budově Okresního soudu v Šumperku - zdůvodnění

Vážená paní předsedkyně,

v současné době jsou pověřeni zaměstnanci Vazební věznice Olomouc společně se zástupci Okresního soudu v Šumperku v jednání, které se týká přípravy a praktické realizace rozdělení největší odkládací cely v prostoru eskortní místnosti soudu na dvě části. V této souvislosti náš žádáte o podrobné odůvodnění našeho požadavku, včetně uvedení právních předpisů, ze kterých požadované úpravy vyplývají.

Požadavek Vazební věznice Olomouc na rozdělení odkládací cely vzešel z potřeby zachování zákonné povinnosti Vězeňské služby ČR související s obsáhlými pravidly pro oddělené umístování obviněných a odsouzených. Tyto pravidla vycházejí jednak ze znění ustanovení § 7 z. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ze znění ustanovení § 7 z. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Tato ustanovení hovoří mimo jiné o povinnosti odděleného umístění obviněných v koluzní vazbě, obviněných se společným trestním řízením, obviněných od odsouzených, mladistvých od dospělých, recidivistů od prvotrestaných, odsouzených za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti, velmi nebezpečných odsouzených, osob s duševními poruchami a poruchami chování atd. Takový postup při umístování vězněných osob je analogicky vyžadován, a v praxi realizován, rovněž při jejich umístování v odkládacích celách soudů.

V prostoru eskortní místnosti Okresního soudu v Šumperku jsou historicky situovány čtyři odkládací cely. Tento stav je vzhledem k povinnosti Vězeňské služby ČR dodržovat výše popsaná zákonná ustanovení, ve spojení s aktuálně vysokým počtem současně probíhajících soudních jednání, tudíž i počtem současně eskortovaných vězněných osob do prostoru budovy soudu a značně rozmanité skladbě těchto vězněných osob z hlediska jejich umístování, ne zcela dostačující.

Rozdělením předmětné odkládací cely, která je zároveň z tamních cel jedinou, která takový zásah svou velikostí umožňuje, vznikne nový prostor, umožňující kompletní

naplnění výše uvedené zákonné úpravy bez hledání kompromisních řešení při umístování vězňených osob do odkládacích cel soudu a zároveň zachování přípustné míry bezpečnostních rizik při realizaci eskortní činnosti.

Pro výše shrnuté důvody tedy zdvořile žádám o schválení projektu realizace zmíněné úpravy, přičemž současně deklaruji možnost úzké spolupráce při plánování a provedení akce ze strany kompetentních zaměstnanců Vazební věznice Olomouc.

S pozdravem



podepsáno elektronicky

CENOVÁ NABÍDKA

V Šumperku dne 04.03. 2024

Dle zaměření situace na Okresním soudu v Šumperku a požadavku na změnu dle zadávacích parametrů k výrobě a instalaci 2 ks katrových dveří a 2 ks mříží k zabezpečení místnosti pro eskortované vězněné osoby v budově Okresního soudu Vám posíláme aktualizovanou cenovou nabídku na výrobu výše uvedeného.

Cenová nabídka platí dva měsíce od vyhotovení.


Mříž s posuvnými dveřmi, cena 94.100 Kč + DPH / sestava

Mříže budou vyrobeny dle zadávacích parametrů ze dvou částí, které se sestaví až na místě při vlastní montáži.

Použitý materiál:

- hlavní rám - uzavřený svařovaný profil 40x30x2 mm
- výplň rámu - pletivo oka 40x40x3 mm, kulatina pr. 16 mm
- dveře 2000x800 mm - uzavřený svařovaný profil 40x30x2 mm
- výplň dveří - pletivo oka 40x40x3
- ocelový „C“ profil pro posuvné dveře
- poutací okénka 400x200 mm, PL 4 mm, rámeček uzavřený svařovaný profil
- 4 ks cylindrická vložka
- 2 ks standardní zámky do poutacích okének
- 2 ks zámky do posuvných dveří s hákem

Konstrukce jako celek bude ukotvena nerozebíratelnými spoji do stavebních konstrukcí zdí.
Antikorozní úprava barvou dle požadovaného RAL odstínu.



JOMBOX-Šmoldas
veřejná obchodní společnost
IČO: 166 26 770
DIČ: CZ166 26 770
Dobrovského 825 / 21
Šumperk 787 01

