

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1) **Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice**

zastoupená: Zbyňkem Žákovským, starostou

IČ: 00287644

DIČ: CZ00287644

tel. (+420) 573 386 125

e-mail: starosta@prusinovice.cz

jako „objednatel“

a

2) **NEOTA CZ s.r.o., Štefánikova 75/8, 602 00 Brno - Ponava**

zastoupená: Ing. Ivo Tatýrkem, jednatelem

IČ: 27759431

DIČ: CZ27759431

tel. +420 576 130 900

email: obchod@neota.cz

uzavírají dnešního dne tuto

Smlouvu o dílo

I.

Výchozí údaje a podklady

1. Výchozí údaje:

1.1. Název stavby: **Instalace FVE a tepelného čerpadla v budově OÚ Prusinovice**

2. Místo realizace: Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je instalace FVE a tepelného čerpadla v budově OÚ Prusinovice dle projektové dokumentace od Ing. Antonína Tomšů, Fotovoltaika Zlín s.r.o., Lázeňská 616, 763 12 Vizovice, IČ: 11774657 a projektové dokumentace Instalace nového zdroje pro vytápění od Ing. Jiřího Hendrycha, Bílovecká 167, 746 01 Opava, IČ: 11544058.

III.

Čas plnění

1. Termín plnění:
2. Termín zahájení prací: 27. 3. 2024
3. Termín dokončení prací: 31. 5. 2024
4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo řádně a včas převezme a zaplatí za něho dohodnutou cenu.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla podle smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
2. Cena za provedení díla činí: 1.950.694,- Kč bez DPH
409.646,- Kč DPH
2.360.340,- Kč včetně DPH
3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. Detailně jsou jednotlivé položky rozepsány v položkovém rozpočtu.
 - 4.1. Ke změně ceny může dojít pouze v těchto případech:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
 - 4.2. V případě změn ceny u prací, které jsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
 - 4.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, jsou ceny stanoveny s ohledem na jednotkové ceny uvedené v RTS - Českých stavebních standardech.
 - 4.4. Postup či způsob sjednání ceny nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel postupně na základě daňových dokladů (faktur), které budou vystaveny měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek je objednatel povinen potvrdit podpisem do 2 dnů od jeho předložení zhotovitelem, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.
2. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je považován poslední den příslušného měsíce.

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat především tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo
- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele a jejich bankovní spojení
- název stavby, číslo smlouvy
- rozsah a předmět plnění
- fakturovanou částku
- datum vystavení a odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb. ve znění platných předpisů.

Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Smluvní strany se dohodly, že potvrzením zjišťovacího protokolu o provedených předaných a převzatých, stavebních pracích a soupisu provedených prací a dodávek objednatelem zhotovitel předává a objednatel přebírá rozsah prací, které byly v daném období provedeny, a uznává tyto v souladu s platnou právní úpravou Občanského zákoníku jako jeho plnění.
5. Po ukončení díla bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.
Dnem předání díla začíná běžet záruční lhůta v trvání dle bodu XV.1.
6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vážné vady či nedostatky.

VI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb.
2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

3. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí žádnou formou přenášet na zhotovitele.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
2. Pokud zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím subdodavatele, je možné jej změnit pouze ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel nemá odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

VIII. Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši minimálně 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen předložit uzavřenou pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce před uzavřením této smlouvy.

IX. Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí

plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

X.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

XI.

Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel má povinnost jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena povinnost objednatele za správnost předané dokumentace.
2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

XII.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, tj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických a technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 10 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

XIII. Stavební deník

1. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláškou ke stavebnímu zákonu).

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 3 dny předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokolu o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení XV., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokolu stanovena lhůta pro odstranění

vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení XV., bod 5. a násl.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

XV.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle této smlouvy o dílo. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má

vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

XVI.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v části II po termínu uvedeném v bodu III.3., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den.
3. Úhrada smluvní pokuty zhotovitelem nemá vliv na náhradu případné škody uplatněné objednatelem.

XVII. Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo.
3. Pokud dohody uzavřené podle bodu XVII.1. mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
4. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení konečné faktury, nejméně však do 31. 12. 2034:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
 - b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
 - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim

- poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.
- e) označit každou fakturu názvem a číslem projektu.

5. Podstatným porušením smlouvy je:

Prodlení s termínem zhotovení díla uvedeným v bodu III.3. o více než 30 dnů.

XVIII.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní


1. Vlastníkem zhotovované věci je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody na zhotovované věci až do jejího předání a převzetí objednatelem a do doby uhrazení celkové dohodnuté ceny objednatelem (sjednává se výhrada vlastnictví).

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá ze smluvních stran ponechá po dvou.

V Prusinovicích dne 26. 3. 2024




.....
Objednatel

OBEC PRUSINOVICE -1-
ZÁMČISKO 350
768 42 PRUSINOVICE
IČ: 002 87 644 • DIČ: CZ00287644



NEOTACZ 11
TEPELNÁ ČERPADLA
NEOTA CZ s.r.o.
Štefánikova 75/8, 602 00 Brno-Ponava
IČ: 277 59 431, DIČ: CZ 27759431
Provozovna: Jankovice




.....
Zhotovitel

NAZEV OBJEKTU :	ZDROJ,REGULACE,DOPOJENÍ NA OTOPNOU SOUSTAVU+TV					REG	.C.STAVBY
NAZEV STAVBY :	Záměsisko 350, 768 42 Prusinovice, Obecní úřad					ZAK	.C.OBJ.
CIS.	Z K R A C E N Y P O P I S	M.J.	MNOZSTV	JEDNOTK	.CENA		CELKEM CENA
CENIK	731 800-731						
REMES	LNÝ OBOR 731						
1	731 A01 731111997			SADA	1,00	45 000,00	45 000,00
2	732 A01 731111998			M2	12,00	2 000,00	24 000,00
3	733 A01 731111999			M2	80,00	500,00	40 000,00
4	734 A01 731112000			M2	11,00	2 300,00	25 300,00
5	732 A01 731112001			KUS	1,00	42 150,00	42 150,00

23	731 A01 731119480	PLOTOVÝ PANEĽ SVAŘOVANÝ POZINKOVANÝ, OKA 200*50mm, dĺžka=2*1600*1530mm +1*2500*1530mm , KOTVÍCÍ PRVKY NA SLOUPKY, 4*SLOUPEK DN500-POZINKOVANÝ	SADA	1,00	18 560,00	18 560,00	
24	731 A01 998731101	KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M	T	2,97	2 500,00	7 425,00	
	OBOR 731	KOTELNY CELKEM					
	OBOR 733	POTRUBNI ČÁST					
25	731 A03 733111290	POMOC.PRACE+ZPĚTNÁ OPRAVA= DRÁŽKA PODLAHOU pro kanalizaci 2,0m/60cm ² , PROSTUP zdma.stropem PŘI REALIZACI KANALIZACE, VODY, VYTÁPĚNÍ, ELEKTRA 15kg DO PLOCHY 90cm ²	SADA	1,00	25 000,00	25 000,00	
26	731 A03 733111300	POTRUBÍ HT d40-17m, KANALIZACE-pro ODVOD VNĚJŠÍ JEDNOTKY+P.V.+napoj.na odpad v 1.PP	M	17,00	80,00	1 360,00	
27	732 A03 733111301	JÍMKA pro NÁPOJ pojistných ventilů, vnitřní akumulace, venkovní jednotky vypouštěcích ventilů na potrubí d40 HT na kanalizaci	KUS	4,00	75,00	300,00	
27	731 A03 733111304	POTR Cu d35 PAJENE+IZ30mm izolace KAUČUKOVÉ -termoizolační trubice tl.30mm/	M	40,00	1 950,00	78 000,00	
28	731 A03 733111306	PROPOJ. STÁVAJÍCÍ OCEL. POTRUBÍ OTOPNÉ SOUSTAVY-POTRUBÍ Cu D35 od ZDROJE+IZOLACE SPOJE V TL.30mm	SADA	1,00	4 500,00	4 500,00	
29	732 A03 733111307	VLOŽENÍ ODBOČKY d32/20 PRO VODOINSTALACI	SADA	1,00	2 500,00	2 500,00	
30	731 A03 733123130	POTRUBÍ VODOINSTALACE d20/PN16+IZ 9mm	M	15,00	45,00	675,00	
31	732 A03 733123130	Demineralizační jednotka AVDK 200 slouží k demineralizaci napouštěcí vody pro topné systémy. trvalá instalaci k úpravě dopouštěcí topné vody AVDK 200: Technické parametry Velikost připojení G 3/4" Výstupní vodivost 1-5 µs/ cm. Průtok 1,5 m ³ /hod. 1,5 m ³ /hod. 1,5 m ³ /hod. 1,5 m ³ /hod.	SADA	1,00	15 260,00	15 260,00	
27	731 A03 733190108	NAPUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY	HOD	2,00	3 500,00	7 000,00	
28	731 A03 733190109	Uvedení do provozu-zkoušky ústředního vstředního-zkoušky zkušební-zkoušky zkušební	KUS	1,00	4 250,00	4 250,00	
29	731 A03 998733103	POTRUBNÍ ČÁST PRESUN UMISTENI VYSCE-6M	T	0,41	2 500,00	1 025,00	

	OBOR 733	POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM				
CENIK	731 800-731	CELKEM bez DPH	999 765,00	kč		
		DPH 21 %	209 950,65	kč		
		CELKEM + DPH	1 209 715,65	kč		

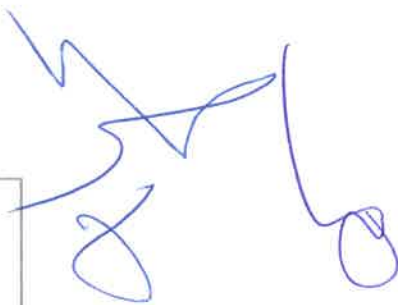

OBEC PRUSINOVICE -1-
 ZÁMČÍSKO 350
 768 42 PRUSINOVICE
 IČ: 002 87 644 • DIČ: CZ00287644



Štefánikova 75/8, 602 00 Brno-Ponava
 IČ: 277 59 431, DIČ: CZ 27759431
 Provozovna: Jankovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

FVE Obecní úřad Prusinovice, 16,65 kWp / 17,4 kWh

INSTALACE SYSTÉMU FVE					
označení	název	MJ	počet	materiál	celkem bez DPH
ZARÍZENÍ	FVE SYSTÉM + montáž				950 929,00 Kč
	FOTOVOLTAICKÉ PANELE				166 500,00 Kč
	Fotovoltaické panely účinnost: 20,77 % výkon: 450 Wp 2,17 m ²	ks	37	4 500 Kč	166 500,00 Kč
	Fotovoltaický střídač				160 250,00 Kč
	3-fázový fotovoltaický střídač 15kWp	ks	1	110 250 Kč	160 250,00 Kč
	MONTÁŽNÍ SYSTÉM				70 000,00 Kč
	Montážní systém - nosná konstrukce pro šikmé střechy	ks	13	3 500 Kč	45 500,00 Kč
	Montážní systém - nosná konstrukce pro šikmé střechy sklon 10°	ks	7	3 500 Kč	24 500,00 Kč
	Rozvaděč R-FV-DC				36 734,00 Kč
	Přepěťová ochrana kombinovaná T1+T2	ks	3	8 500 Kč	25 500,00 Kč
	Pojistkový odpojovač 1kV 2P DC, 10x38	ks	3	268 Kč	804,00 Kč
	Pojistka DC 1000V/16A, 10x38, pro FVE	ks	6	130 Kč	780,00 Kč
	Nástěnný rozvaděč	ks	1	7 800 Kč	7 800,00 Kč
	Svorkovnice 6mm ²	ks	6	45 Kč	270,00 Kč
	Vnitřní vodičové vybavení, montážní materiál, vývodky	kpl	1	1 580 Kč	1 580,00 Kč
	Rozvaděč R-FV-AC				29 470,00 Kč
	Přepěťová ochrana kombinovaná T1+T2	ks	1	8 500 Kč	8 500,00 Kč
	Jistič B40/3, 10kA	ks	2	680 Kč	1 360,00 Kč
	Napěťová spoušť	ks	1	1 200 Kč	1 200,00 Kč
	Jistič B6/3, 10kA	ks	1	1 500 Kč	1 500,00 Kč
	Jistič B6/1, 10kA	ks	2	980 Kč	1 960,00 Kč
	Stykač 3P 63A, s napětovou cívkou 230V	ks	1	1 200 Kč	1 200,00 Kč
	Napěťo-frekvenční hlídání	ks	1	2 500 Kč	2 500,00 Kč
	Svorkovnice 6mm ²	ks	6	45 Kč	270,00 Kč
	Napěťové relé pro hlídání přepětí/podpětí	ks	1	1 600 Kč	1 600,00 Kč
	Nástěnný rozvaděč	ks	1	7 800 Kč	7 800,00 Kč
	Vnitřní vodičové vybavení, montážní materiál, vývodky	kpl	1	1 580 Kč	1 580,00 Kč
	Elektroinstalační materiál				35 150,00 Kč
	Dovybavení stávajícího domovního rozvaděče	kpl	1	25 000 Kč	25 000,00 Kč
	Elektroinstalační kabelový žlab 80x40	m	10	250 Kč	2 500,00 Kč
	Kabelový žlab 62,5/50, vč podpět a příslušenství	m	12	450 Kč	5 400,00 Kč
	Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace DN32	m	30	25 Kč	750,00 Kč
	Konektor MC4	ks	6	250 Kč	1 500,00 Kč
	AKUMULACE				273 750,00 Kč
	Baterie 5,8 kWh	ks	3	91 250 Kč	273 750,00 Kč
	KABELÁŽ				19 575,00 Kč
	Kabel CYKY-J 5x10 mm ²	m	15	35 Kč	525,00 Kč
	Kabel CXKH-R (J) 5x10 mm ²	m	10	34 Kč	340,00 Kč
	Kabel CXKH-R (J) 3x1,5mm ²	m	20	31 Kč	620,00 Kč
	Kabel solární, UV odolný, 1x6mm ²	m	100	130 Kč	13 000,00 Kč
	FTP Cat5e	m	30	42 Kč	1 260,00 Kč
	CYA 25 Z/Ž	m	30	35 Kč	1 050,00 Kč
	CYA 16 Z/Ž	m	30	32 Kč	960,00 Kč
	CYA 6 Z/Ž	m	70	26 Kč	1 820,00 Kč
	MONTÁŽNÍ PRÁCE				106 500,00 Kč
	Instalace panelů	kpl	20	2 200 Kč	44 000,00 Kč
	Elektroinstalační práce (vč. Revize a úpravy hromosvodu)	ks	1	15 000 Kč	15 000,00 Kč
	Protipožární ucpávky	dm ²	5	8 500 Kč	42 500,00 Kč

Horizontální doprava materiálu (plošina)	kpl	1	5 000 Kč	5 000,00 Kč
ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU				18 000,00 Kč
Technická kontrola a uvedení do provozu, zkušební provoz, nastavení systému, monitoringu a regulace	kpl	1	18 000 Kč	18 000,00 Kč
ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU				8 500,00 Kč
Revizní správa	ks	1	8 500 Kč	8 500,00 Kč
VRN				26 500,00 Kč
Doprava	kpl	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
Přesuny materiálu	kpl	1	6 500 Kč	6 500,00 Kč
Likvidace odpadu	kpl	1	10 000 Kč	10 000,00 Kč
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - není předmětem výběrového řízení				0,00 Kč
Zpracování projektové dokumentace vč inženýrniku	kpl	1	- Kč 0	0,00 Kč
Statické posouzení konstrukce	kpl	1	- Kč 0	0,00 Kč
PBR - dokumentace požární ochrany	kpl	1	- Kč 0	0,00 Kč

OBEC PRUSINOVICE -1-
ZÁMČISKO 350
768 42 PRUSINOVICE
IČ: 002 87 644 • DIČ: CZ00287644

NEOTACZ
TĚPĚLNÁ ČERPADLA
NEOTA CZ s.r.o.

Štefánikova 75/8, 602 00 Brno-Ponava
IČ: 277 59 431, DIČ: CZ 27759431
Provozovna: Jankovice
