

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

na zhotovení projektové dokumentace

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. EP Rožnov a.s.

Sídlo: Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Zastoupená: Ing. Pavel Scholz – předseda představenstva,
Ing. Vladimír Nohavica – člen představenstva
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6900851/0100
IČ: 45193631
DIČ: CZ45193631
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 346
Datová schránka: wiwceaa
Adresa pro doručování: EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení (dále jen „smlouva“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce operačních sálů“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zpracovat projekt pro stavbu „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce stávajících operačních sálů“ ve stupních dokumentace pro provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů. Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků a měření nutných pro vypracování projektové dokumentace (včetně zaměření/pasportizace stávajícího stavu). Předmětem smlouvy je rovněž prověření možností umístění VZT. Dále budou řešeny stavební úpravy ve stávajících sálech gynekologického oddělení ve 3.NP, které budou sloužit jako oční operační sály a během rekonstrukce centrálních sálů nahradí částečně jejich kapacitu.
2. Projektová dokumentace:
 - 2.1. Projektová dokumentace bude navazovat a rozpracovávat architektonickou studii, která tvoří přílohu této smlouvy

Etapa 0 – přípravná fáze
Etapa I – Zahrnuje přípravu sálu 3 a jeho zázemí pro provizorní provoz během rekonstrukce sálů 1 a 2 a chodby.
Etapa II – Jedná se o samotnou rekonstrukci sálů 1. a 2. a přilehlé chodby.
Etapa III – Uvedení stavu úprav z I. a II. etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2.
Etapa IV – Dojde ke kompletní rekonstrukci sálu 3 a uvedení provozu do původního stavu a k znovu propojení celého oddělení.
 - 2.2. Rozsah projektové dokumentace:
 - projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 - položkový rozpočet (ke každé etapě samostatně)
 - slepý soupis prací a materiálu s výkazem výměr (ke každé etapě samostatně)
 - 2.3. Předání projektové dokumentace proběhne ve dvou termínech – přednostně bude vyprojektována a předána „Etapa 0“, aby investor (objednatel) mohl přistoupit k realizaci této etapy a následně budou vyprojektovány a předány zbývající etapy. Projektová dokumentace bude koncipována tím způsobem, že „Etapa IV“ bude figurovat v projektové dokumentaci zcela samostatně tak, aby investor mohl její případnou realizaci v případě potřeby odložit a následně realizovat na základě tohoto samostatného celku.
 - 2.4. Projektová dokumentace bude předána v následujících formách:
 - 6x v tištěné podobě
 - na datovém médiu (v .pdf i v editovatelné formě)

2.5. Požadavky zadavatele na zpracování projektové dokumentace

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro provádění stavby (DPS) včetně technických specifikací (podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby) a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po částech dle výzvy zadavatele k plnění.
- Projektová dokumentace stavebních úprav podléhajících stavebnímu řízení bude zpracována v rozsahu pro ohlášení stavby, resp. vydání stavebního povolení včetně dokladové části a žádosti o stavební povolení.
- Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to pro stavební nebo inženýrský objekt, technická a technologická zařízení (zdravotnická technologie), vnitřní vybavení a interiér.
- Součástí PD dále bude:
 - pasport dotčené části stavby, stavebně technický průzkum,
 - zajištění inženýrské činnosti (IČ) nutné ke zpracování žádosti pro zahájení příslušného řízení o povolení stavby včetně zpracování žádosti o stavební povolení resp. ohlášení stavby,
 - dokladová část a dále informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- Součástí projektové dokumentace bude mj. dokumentace zdravotnické technologie a zdravotnického vybavení. Zadavatel předpokládá, že úpravu projektů pro instalaci lékařské technologie resp. zdravotnických prostředků bude provádět projektant se specializací na zdravotnickou technologii.
- Úprava projektů pro konkrétní zdravotnickou technologii vybranou na základě veřejné zakázky bude zahrnuta a oceněna v rámci autorského dozoru.
- Projektová dokumentace bude průběžně konzultována se zadavatelem a dodavatelem vybrané lékařské technologie dle dohodnutého harmonogramu projekčních prací včetně zpracování zápisů z jednání a zadavatelem před odevzdáním odsouhlaseny.
- Zpracování projektové dokumentace musí být provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů, v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů v platném znění, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou technické a uživatelské standardy.
- Projektová dokumentace musí splňovat požadavek zadavatele, aby zpracovatel projektové dokumentace (PD) popsal jednoznačně, ale zároveň požaduje, aby nepoužíval v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr názvy obchodních firem, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu nebo odkazy na ně. Použít případně nějaký odkaz může zpracovatel PD pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné vzhledem k tomu, že popis předmětu plnění veřejné zakázky provedený postupem podle ZZVZ není dostatečně přesný a srozumitelný. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné

známky nebo označení původu.

Je-li požadován standard určitého stavebně-technologického prvku, vyjádřený přímým nebo nepřímým odkazem, je tím myšlena kvalitativní úroveň shodná, popř. vyšší než reprezentuje uváděný odkaz.

Objednatel požaduje uvést u každého takového konkrétního označení informaci o možnosti nabídnout a využít jiný rovnocenný stavebně-technologický prvek.

Zpracovatel PD takovýto postup projedná s objednatelem a v takovémto případě uvede v PD, že je umožněno účastníkovi pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Projektová dokumentace stavby musí zohlednit požadavek zadavatele realizovat instalaci lékařské technologie za plného a neomezeného provozu nemocnice (příslušného pracoviště zadavatele), nesmí dojít k omezení přívodu energií a ostatních provozních médií a je nutné zohlednit oddělení jednotlivých čistých a špinavých prostorů, zohlednit cesty dopravy materiálu a osob tak, aby bylo minimalizováno poskytování zdravotní péče mimo dotčené prostory. Doprava na stavbu nesmí přerušit ani omezit průjezdnost uvnitř areálu, pokud není s objednatelem dohodnuto jinak.

3. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do projektové dokumentace.
4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko objednatele s projektovou dokumentací.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude využit pro stavební práce nutné k instalaci zdravotnické techniky zakoupené objednatelem.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo uvedené v čl. I bod 2 v souladu s touto smlouvou ve výši:

1 930 000,00 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetřicet tisíc korun českých)

DPH ve výši 21 % činí 405 300,00 Kč

(slovy: čtyřistapěttisíc tři sta korun českých)

2 335 300,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvě miliony třicet pět tisíc tři sta korun českých)

(dále jen „cena“)

2. Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. čl. II. V souladu s jednotlivými položkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy - Stanovení ceny, a to na základě daňových dokladů (faktur). Zhotovitel je oprávněn objednateli cenu díla fakturovat průběžně vždy po dokončení a předání projektové dokumentace na každou jednotlivou část díla (tj. podle jednotlivých částí, viz čl. III. této smlouvy).
4. Kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (čl. IV. Bod 3 této smlouvy) bude podstatnou přílohou vystaveného daňového dokladu (faktury). Pokud zhotovitel k vystavené faktuře nepřiloží kopii podepsaného protokolu, jedná se o vadu takového dokladu a bude postupováno obdobně dle bodu 6 tohoto článku smlouvy.

5. Faktura bude adresována:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
6. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy včetně žádosti o stavební povolení předat objednateli následovně:

1. část projektové dokumentace **do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** (přípravná fáze: úpravy ve 3NP pro následnou rekonstrukci – „Etapa 0“ dle již zpracované studie)
2. část projektové dokumentace **do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** (zbývající část projektové dokumentace: „Etapa I, II, III“ dle již zpracované studie)
3. část projektové dokumentace **do 270 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** (zbývající část projektové dokumentace: kompletní rekonstrukce sálu 3 - „Etapa IV“ dle již zpracované studie)

Článek IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně provést ve sjednaném termínu a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn dílo předávat po jednotlivých ucelených částech, kdy za tyto části jsou považovány jednotlivé projektové dokumentace řešící každý jednotlivý stavební objekt.
3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla, případně řádně provedenou část díla. O předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
6. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.
7. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

Článek V.

Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
3. K žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.

Článek VI.

Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelovým stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

1. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení objednatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
2. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za část díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám čl. XII, bod 3. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování.
6. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých objednateli.

7. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:
 - a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části,
 - b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak,
 - c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou,
 - d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo
 - e) zhotovitel k žádosti objednatele neprokáže účast zodpovědných osob (nebo jejich schválených náhradníků), prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, na plnění předmětu díla, nebo
 - f) je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci nebo
 - g) neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.

Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto: V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
2. Zhotovitel se zavazuje, dílo bude provedeno osobou oprávněnou dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizace v oboru pozemní stavby).

Článek XIII.

Náhrada škody

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
2. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,5 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii nebo pojistný certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek XIV. **Licenční ujednání**

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XV. **Závěrečná ustanovení**

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Stanovení ceny

Příloha č. 2 – Architektonická studie

V Pardubicích dne 7.5.2024

V Rožnově pod Radhoštěm dne 3. 5. 2024

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Scholz
předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
člen představenstva

.....
Ing. Vladimír Nohavica
člen představenstva

Příloha č. 1 - Stanovení ceny

Položka	Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem včetně DPH
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a součinnost při výběru zhotovitele v rámci veřejné zakázky	1 930 000,00	405 300,00	2 335 300,00

Odvětrání operačních sálů
Architektonická studie

Vypracoval [REDACTED]
Odpovědný projektant [REDACTED]

04/2023



TOULOVCOVO NÁM. 156
570 01 LITOMYŠL

Identifikace stavby:

Název stavby: Studie stavby - Odvětrání operačních sálů
Místo stavby: Litomyšlská nemocnice, Purkyně 652, Monoblok
Kraj: Pardubický J. E.
Charakter stavby:

Zpracovatel : K I P , spol. s r. o.
Toulovcovo nám. 156, Litomyšl
[REDACTED]

Předmětem studie je návrh postupu rekonstrukce stávajících operačních sálů ve 2.NP v budově M Litomyšlské nemocnice. Jedná se zejména o prověření možností umístění VZT. Dále budou řešeny stavební úpravy ve stávajících sálech gynekologického oddělení ve 3.NP, které budou sloužit jako Oční operační sály a během rekonstrukce centrálních sálů nahradí částečně jejich kapacitu.

Postup rekonstrukce :

Z důvodu plánování rekonstrukce za částečného provozu operačních sálů bude nutné celou rekonstrukci rozdělit do následujících etap:

Etapa 0 – přípravná fáze

Před zahájením samotné rekonstrukce bude nutné zajistit dočasnou náhradu pro provádění očních operací. Během rekonstrukce samotné se přepokládá pouze provoz operačního sálu 3 a tyto operace bude nutné zajistit na novém pracovišti, které vznikne ve 3.NP křídla B. Zde dojde k vytvoření provizorního operačního sálu očního oddělení z pokoje – dříve porodního sálu na oddělení gynekologie.

Zde dojde k následujícím stavebním úpravám:

Z pokoje č.301 bude vytvořena vyšetřovna UZ gynekologie – bude vytvořen výklenek pro umístění lehátka.

Stávající výkonový sálek č. 303 zůstane téměř beze změny – dojde k odstranění posuvného závěsu a úpravě WC 304 na sklad.

Dojde k vytvoření nového filtru – vyčlenění z chodby 307, vytvoření hygienického zázemí

Předpokládá se, že zákroky na novém sálku 312 a stávajícím gynekologickém sálku 303 nebudou probíhat souběžně. Pro personál gynekologického oddělení bude sloužit WC 302, pro oční lékaře bude zázemí WC 306, které během operačních dnů očního oddělení nebude využíváno lékaři gynekologie. Hygienické zázemí pacientek gynekologie zůstane beze změny.

Sál bude vytvořen ze stávajícího porodního pokoje č. 312.

Elektroinstalace musí splňovat závaznou normu ČSN 33 2000-1 ED.2 Předpokládá se úprava stávajících rozvodů v rámci místnosti 312 – z důvodu dispozičních změn a nutného napojení na UPS, které pro porodní sál nebylo požadováno.

Přípravná pacientů bude v místnosti 314. Pacienti mají zázemí na očním oddělení, přijíždí připraveni v rámci předoperační přípravy na čas a ihned po výkonu jsou transportováni na zázemí očního stacionáře.

Vybavení sálu bude v souladu vyhláškou 92/2012 bod 22 a 23.

Etapa I

Zahrnuje přípravu sálu 3 a jeho zázemí pro provizorní provoz během rekonstrukce sálů 1 a 2 a chodby.

Bude vytvořen nový provizorní filtr ze stávajícího dospávajícího pokoje – jeden pro pacienty a druhý společný pro všechny lékaře. Vznikne zvláštní vchod v místě stávajícího vstupu do dospávajícího pokoje – nezávislý na stávající společné chodbě a vstupu pro všechny sály. Tato chodba bude stavbě oddělena – dojde k uzavření otvorů SDK deskami, nebo jiným typem suché výstavby.

Etapa II

Jedná se o samotnou rekonstrukci sálů 1. a 2. a přilehlé chodby. Dojde ke kompletní rekonstrukci všech vnitřních rozvodů, podlah a povrchů. Dojde k rozdělení odvětrání sálů 1 a 2, které jsou nyní nevyhovujícím způsobem napojeny na 1 společnou jednotku. Zároveň dojde k doplnění odvětrání i společné chodby a zázemí.

Nové jednotky budou částečně umístěny ve stávající strojovně VZT č 235. Předpokládá se, že bude nutné vytvořit nový prostor pro umístění jednotek na střeše budovy č. 402, výkres 04 – z důvodu rozdělení a navýšení objemu větraných místností nebude prostor původní jednotky dostačující.

Během této rekonstrukce je reálné zajistit zásobovány stavy z oken operačních sálů.

Bude nově vystrojen výtah do sterilizace.

Etapa III

V rámci této úpravy budou uvedeny do provozu sály 1 a 2. dojde k přípravě rekonstrukce sálu 3. Stavební oddělení obou částí bude v této etapě zachováno.

Etapa IV

Dojde ke kompletní rekonstrukci sálu 3 a uvedení provozu do původního stavu a k znovu propojení celého oddělení.

Řešení a zabezpečení TZB:

Navrhované stavební úpravy budou mít značný vliv na veškeré vnitřní instalace.

Pouze pro Etapu 0 se uvažuje s využitím stávající vzduchotechniky a rozvody elektro, předpokládá se pouze dílčí zásah do ZTI s ohledem na změnu zařizovacích předmětů v hygienickém zázemí.

Většina instalací je vedena v podhledu daného podlaží. Při realizaci je nutno vyhnout se stavebním zásahům mimo řešené patro.

Rozvody ZTI (vodovod a kanalizace) bude nově napojeno na stávající stoupačky nebo rozvod v sousedních místnostech.

Změna se nejvíc dotkne rozvodů vzduchotechniky, která bude zrealizována nově v plném rozsahu.

Zcela nově bude proveden rozvod elektro silový, slaboproud, LAN, dorozumívací zařízení, zásah a úprava bude nutná i v rámci interní JIP.

Parametry stavebních úprav, nové povrchy s ohledem na třídu hygienické čistoty ve třídě 7 dle ČSN ISO 14644-1, dle EU GMP –C. Na základě tohoto požadavku je nutno upravit povrchy s ohledem na čistitelnost a použitelnost desinfekčních prostředků ve zdravotnictví. Bude nutno zajistit celistvost povrchu – předpokládá se výměna povlaku celé podlahy.

Podlahy v hlavních místnostech budou povlakové krytiny v elektrostaticky vodivé úpravě.

Orientační propočet investičních nákladů:

Etapa 0.


Celkem	730 000,00 Kč	153 300,00 Kč	883 300,00 Kč
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Jedná se o cenový odhad bez nákladů na přístrojové vybavení a zařízení sálu.

Rekonstrukce operačních sálů:

	cena bez dph	dph	celkem
Etapa I	1 460 000,00 Kč	306 600,00 Kč	1 766 600,00 Kč
Etapa II	24 200 000,00 Kč	5 082 000,00 Kč	29 282 000,00 Kč
Etapa III	780 000,00 Kč	163 800,00 Kč	943 800,00 Kč
Etapa IV	10 800 000,00 Kč	2 268 000,00 Kč	13 068 000,00 Kč
Celkem	37 240 000,00 Kč	7 820 400,00 Kč	45 060 400,00 Kč

Náklady na přístrojové vybavení a zařízení sálu není součástí odhadu.

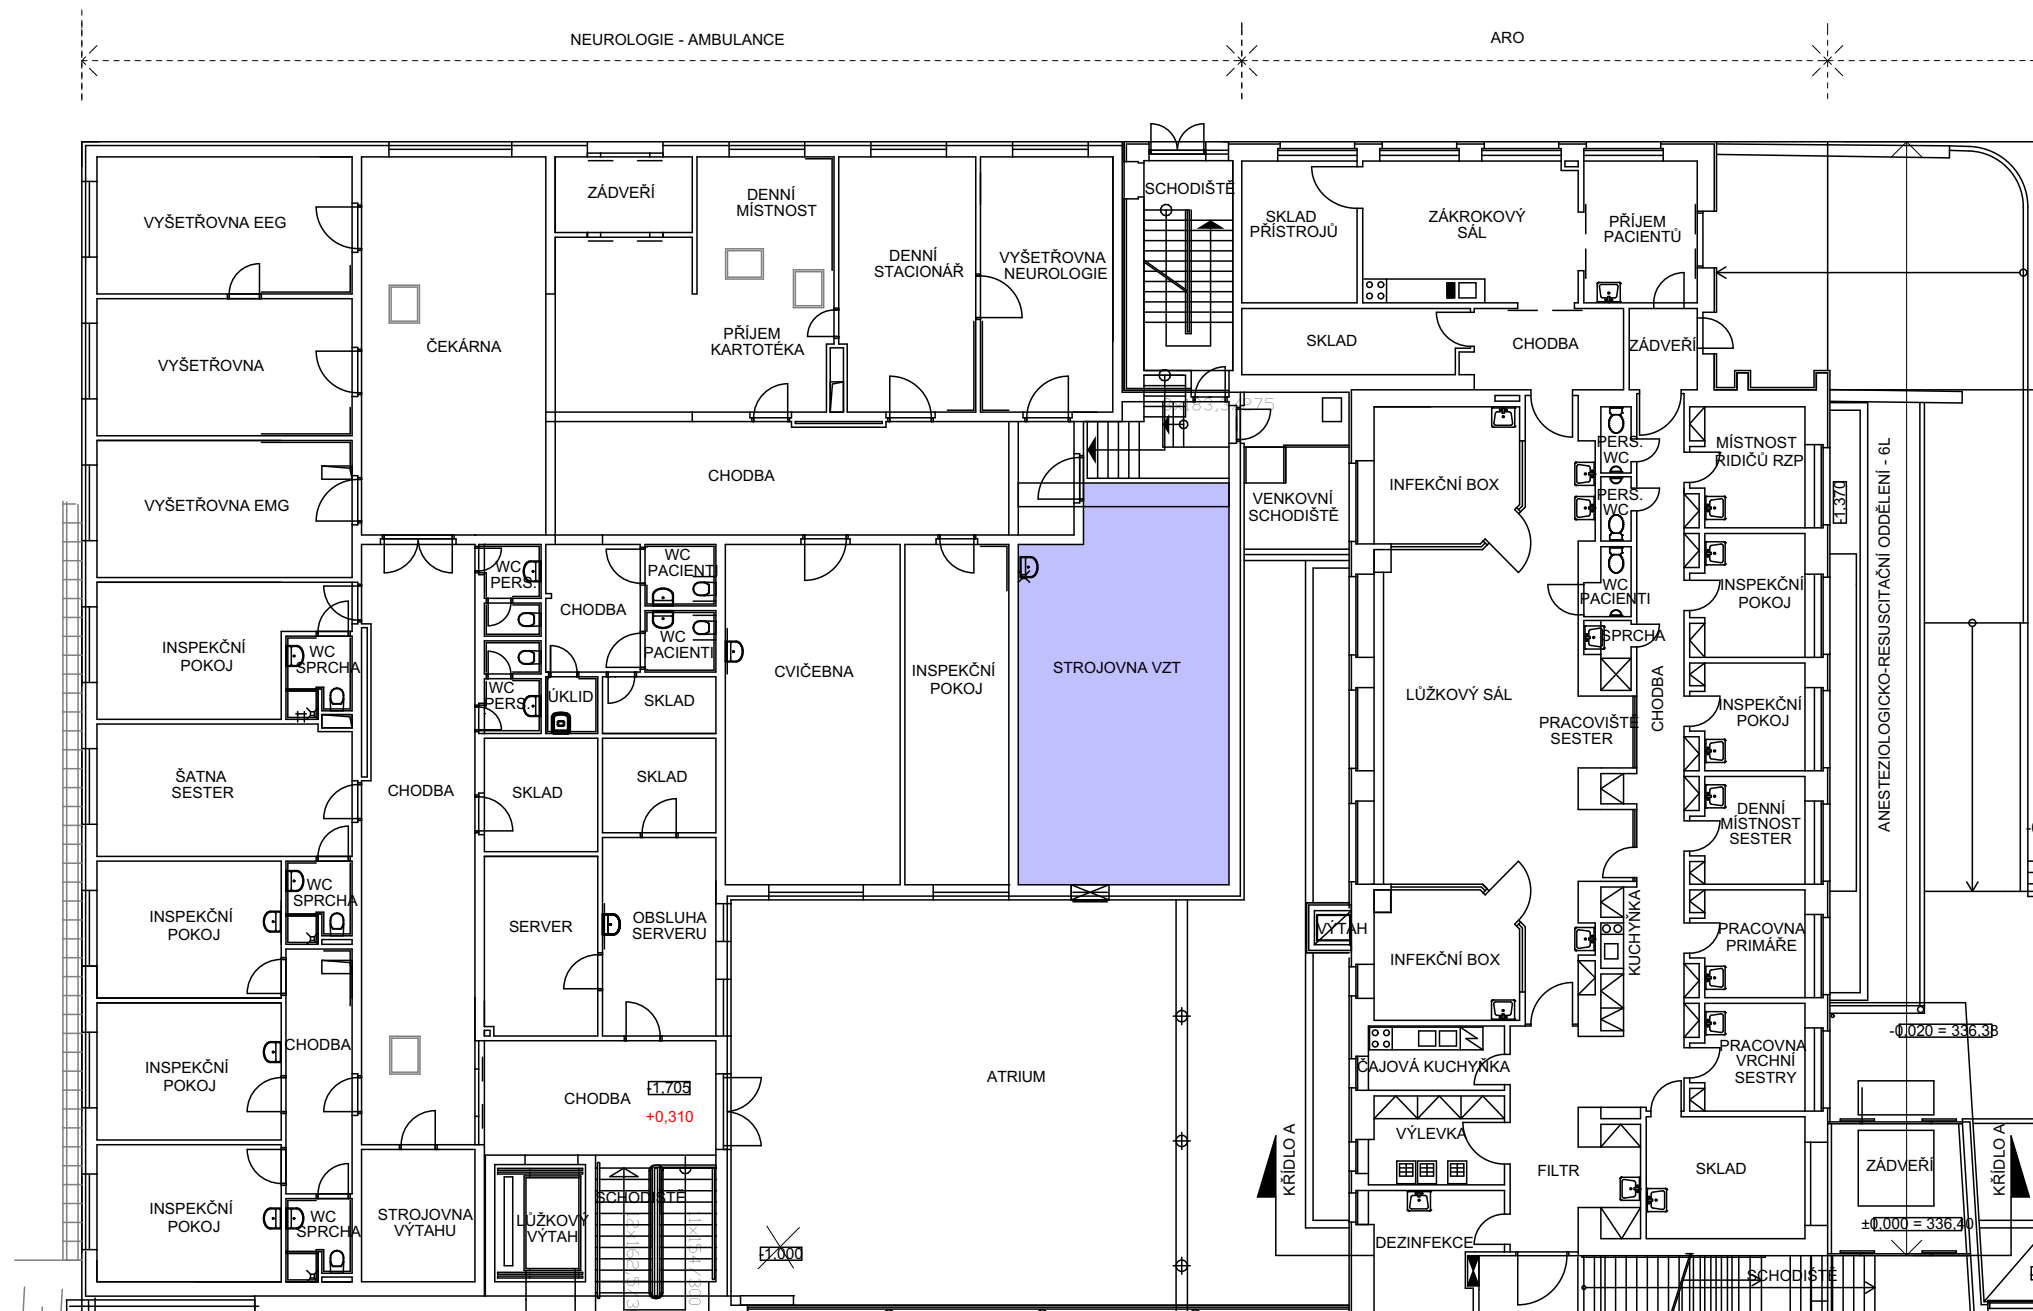

Legenda

- 0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrovový OCN sál, zákrovový sál GYN téměř bez stavebních úprav
- I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvoření nového filtru pro sál 3 (pro zajištění provozu sálu 3 během rekonstrukce sálů 1 a 2)
- II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky (či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí
- III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2
- IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3
- bourané konstrukce
- nové konstrukce


Odvětrání operačních sálů

Architektonická studie


Půdorys 1.NP

Vypracoval [redacted]
Odpovědný projektant [redacted]

Stávající stav

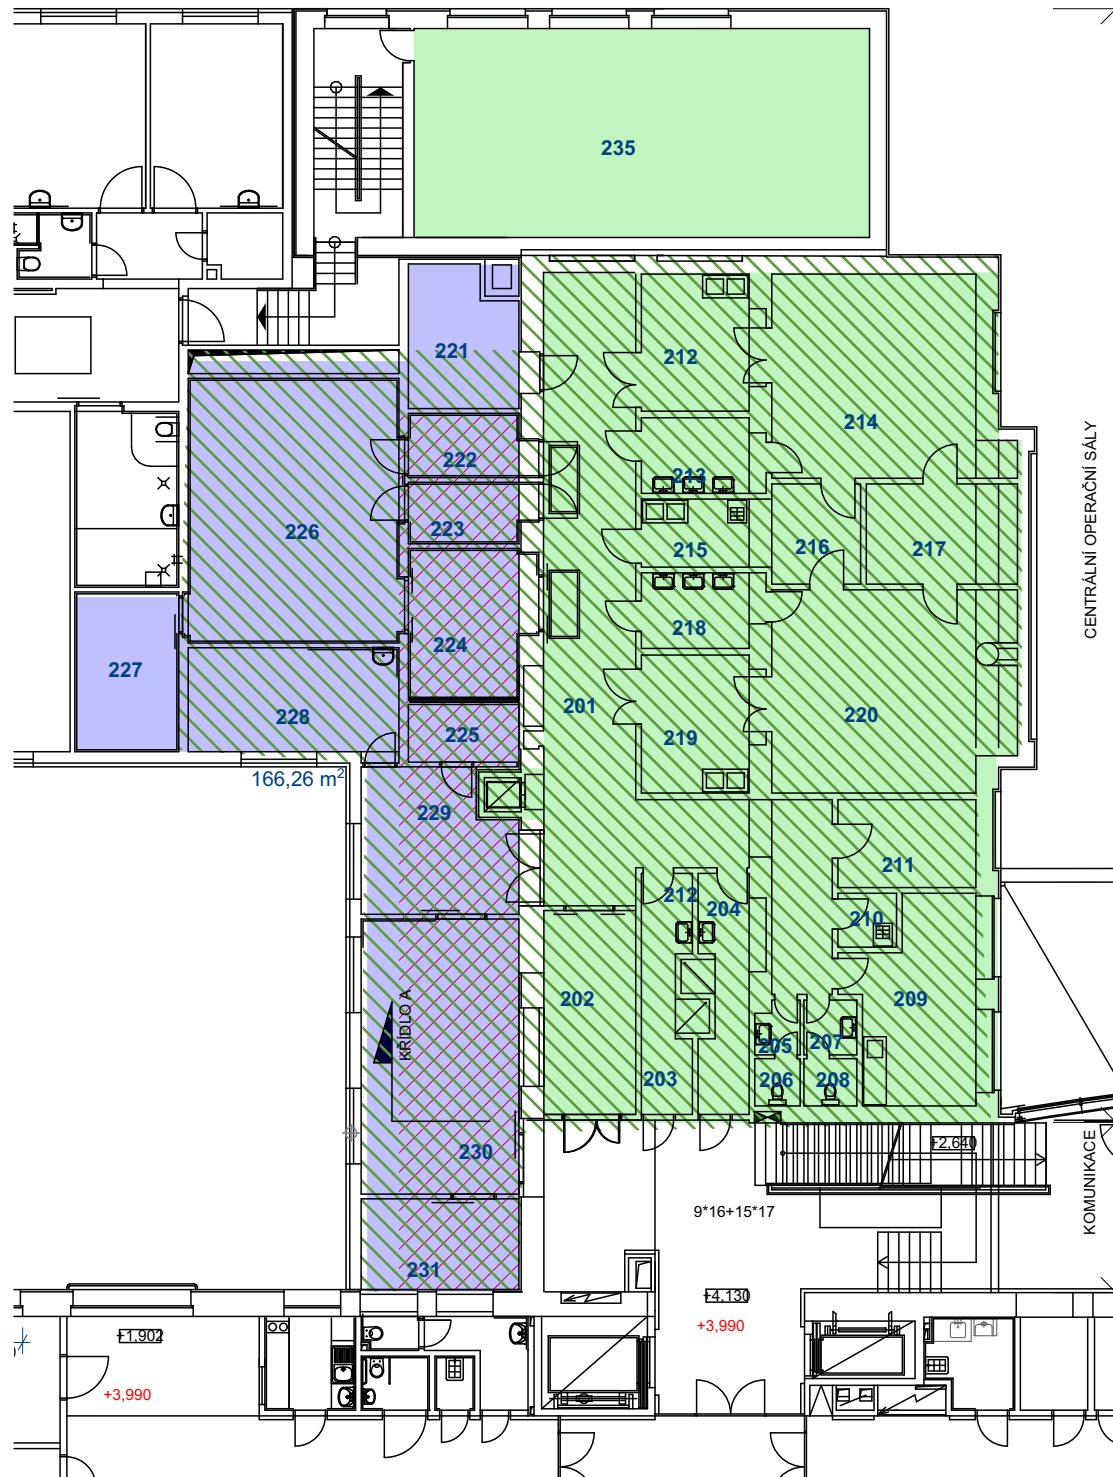

Návrh

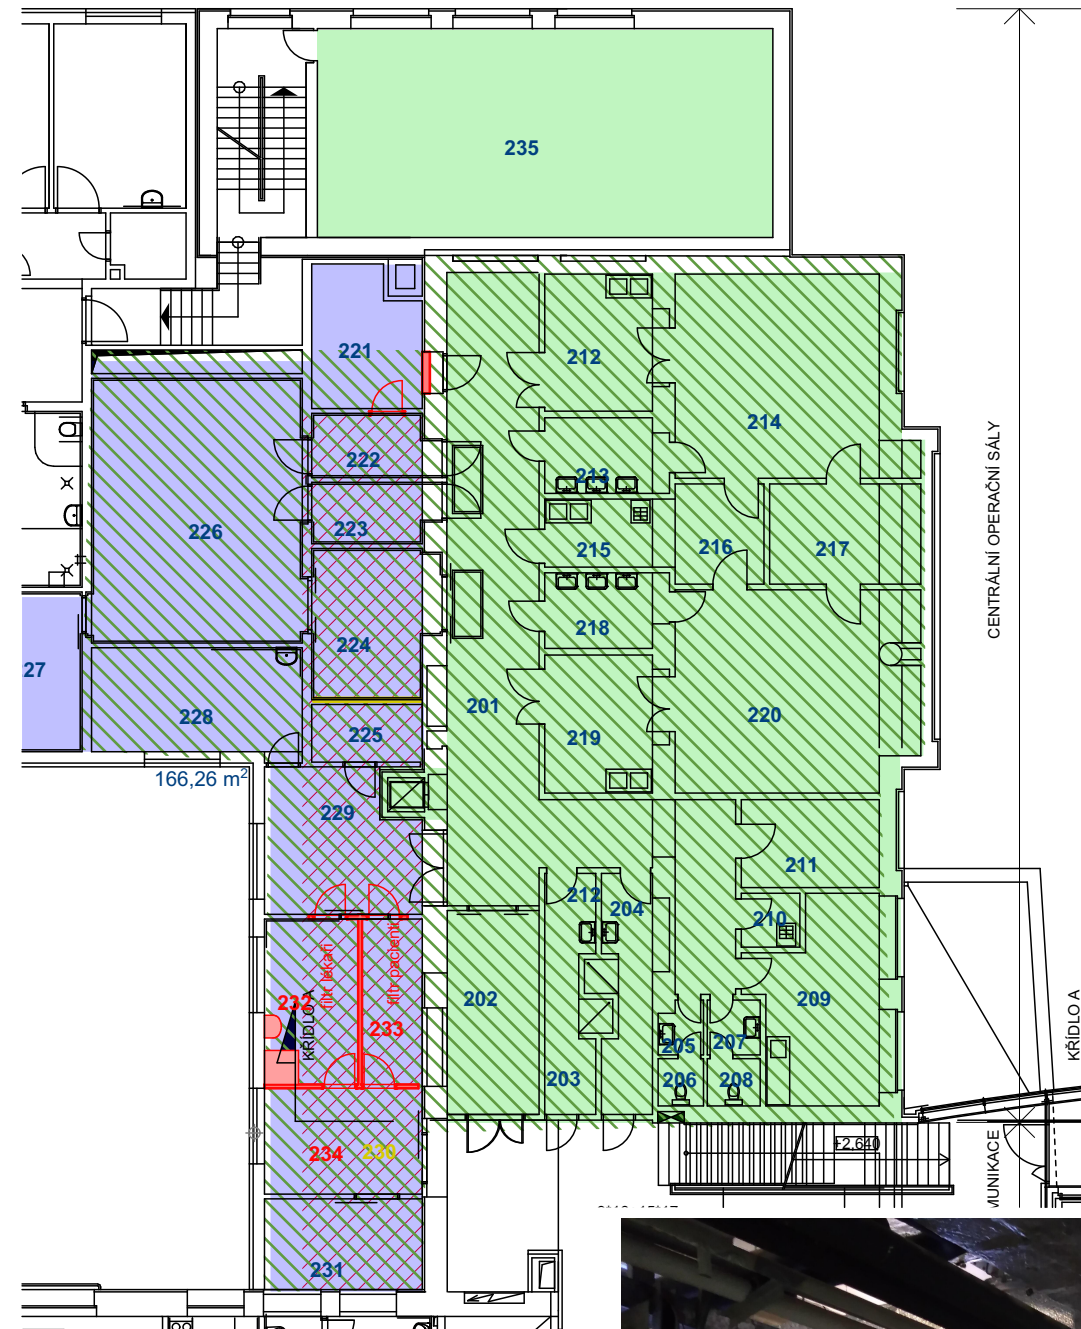

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m²)
201	Chodba	54,83
202	Filtr pacienti	13,10
203	Filtr ženy	8,40
204	Filtr muži	8,40
205	Předsíň	1,58
206	WC	1,50
207	Předsíň	2,03
208	WC	1,75
209	Denní místnost sester	15,94
210	Úklid	2,21
211	Sklad	8,49
212	Příprava pacinta, probuzení	20,66
213	Umývárna	6,42
214	Operační sál 2	29,77
215	Čistící místnost	5,13
216	Sklad	6,23
217	Sklad	10,60
218	Umývárna	6,31
219	Příprava pacinta, probuzení	10,40
220	Operační sál 1	29,03
221	Sklad	10,19
222	Čistící místnost	5,34
223	Umývárna	5,30
224	Příprava pacinta, probuzení	11,73
225	Sklad	4,46
226	Operační sál 3	39,03
227	Sklad	11,10
228	Denní místnost lékařů	15,62
229	Chodba	14,71
230	Dospávací pokoj	30,37
231	Sklad	10,17
235	Strojovna VZT	66,28
		467,07 m²

Legenda

- 0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrovový OCN sál, zákrovový sál GYN téměř bez stavebních úprav
- I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvoření nového filtru pro sál 3 (pro zajištění provozu sálu 3 během rekonstrukce sálů 1 a 2)
- II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky (či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí
- III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2
- IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3
- bourané konstrukce
- nové konstrukce

Odvětrání operačních sálů

Architektonická studie

Půdorys 2.NP

Vypracoval : XXXXXXXXXX
Odpovědný projektant XXXXXXXXXX

Stávající strojovna - umístěny jednotky sálů





Stávající stav

Návrh

Stávající kotelna



přejezd výtah

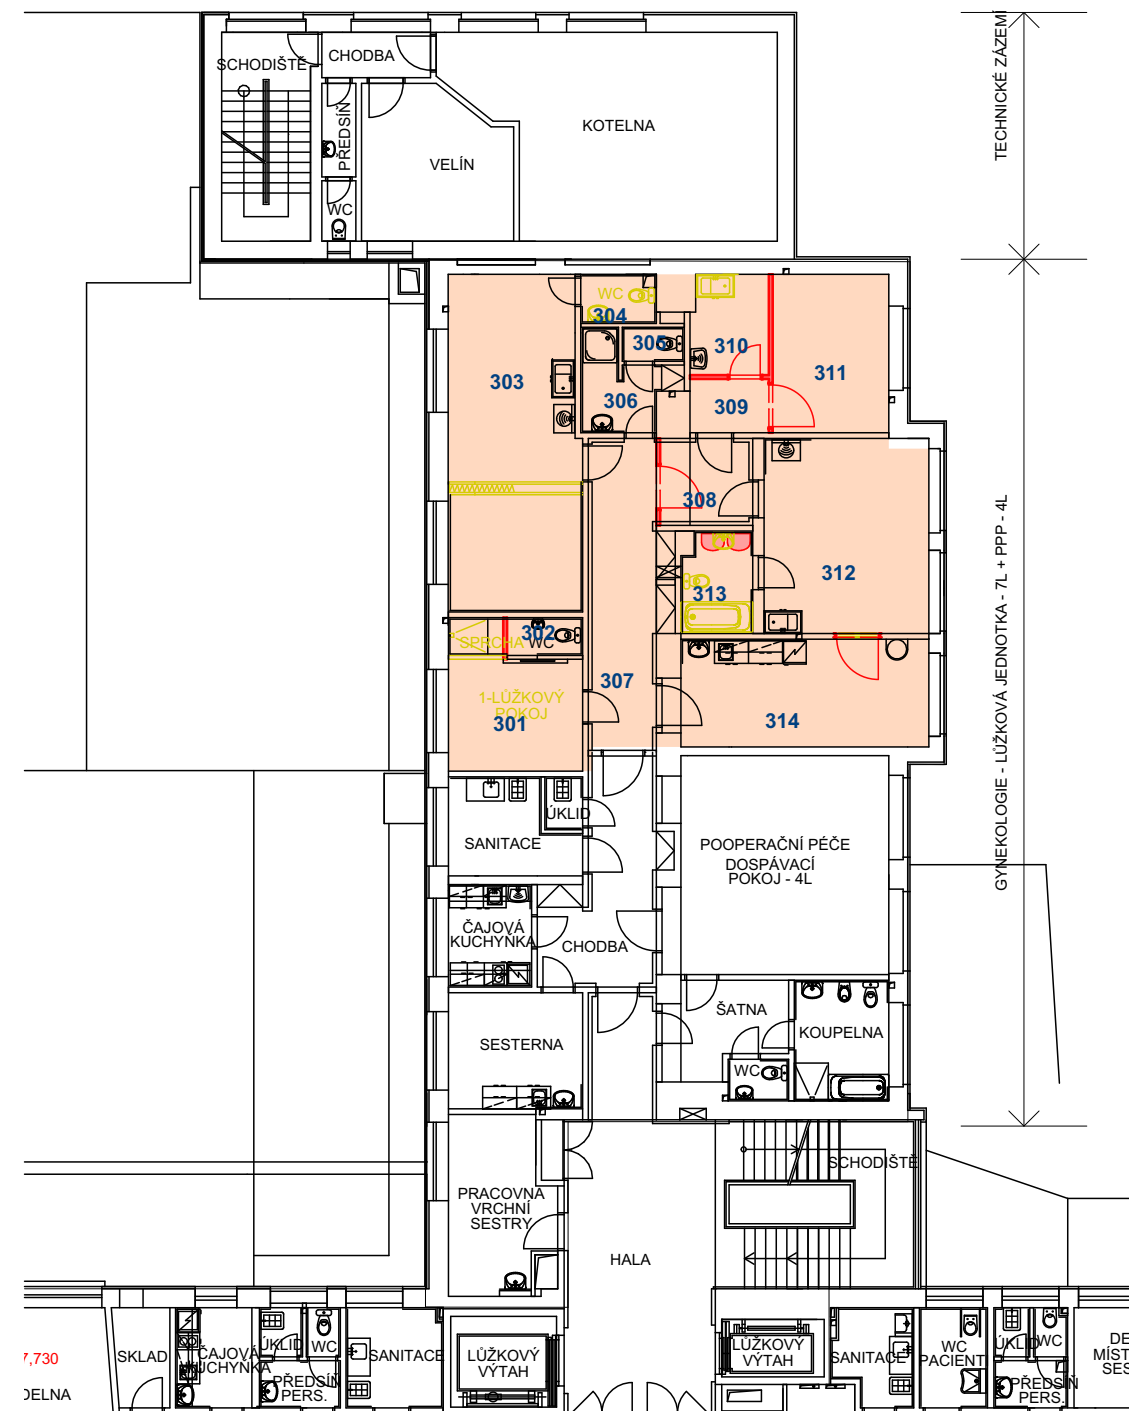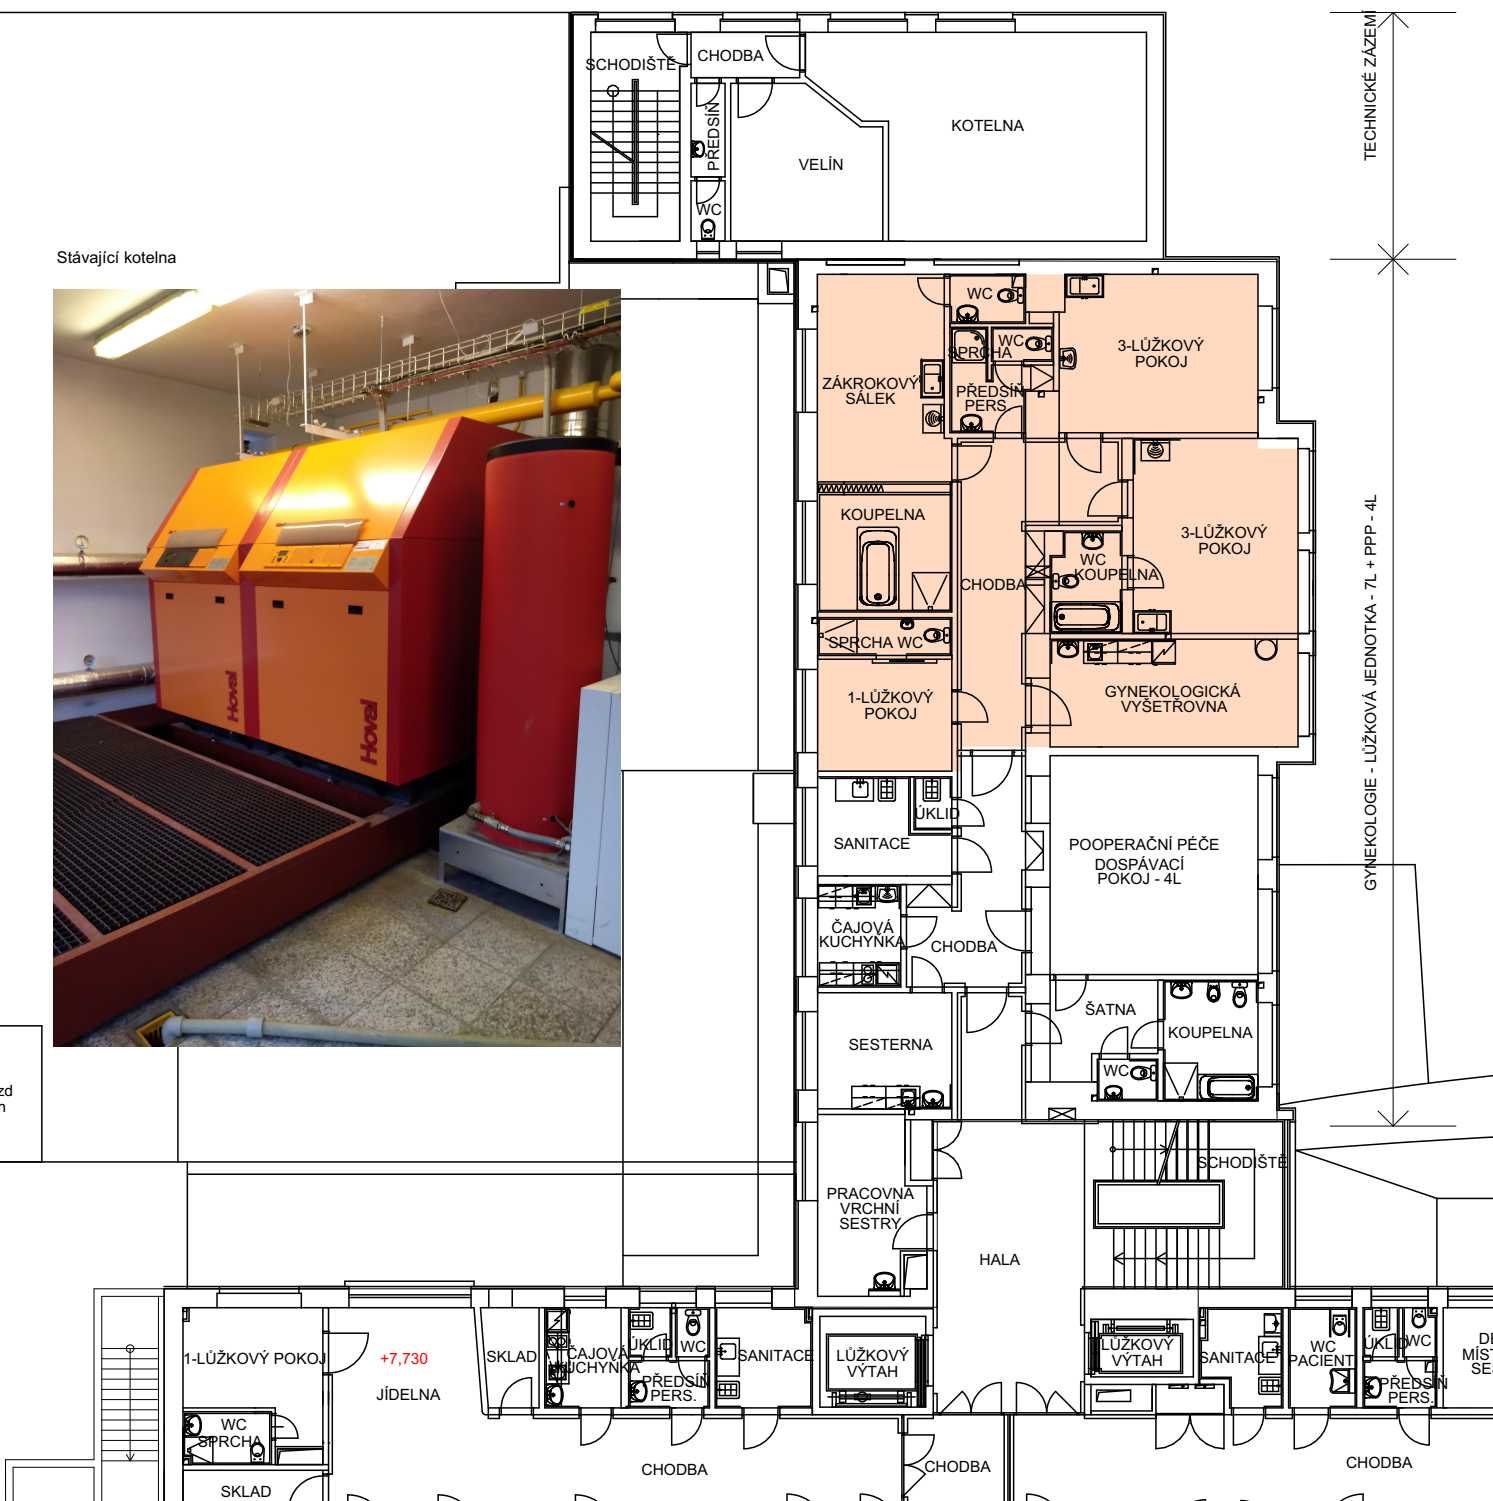

Legenda

- 0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrovový OCN sál, zákrovový sál GYN téměř bez stavebních úprav
- I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvoření nového filtru pro sál 3 (pro zajištění provozu sálu 3 během rekonstrukce sálů 1 a 2)
- II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky (či jednotek) pro sály 1 a 2 a přilehlou chodbu a zázemí
- III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2
- IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3
- bourané konstrukce
- nové konstrukce

Odvětrání operačních sálů

Architektonická studie

Půdorys 3.NP

Vypracoval : XXXXXXXXXX
 Odpovědný projektant XXXXXXXXXX

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)
301	Výšetřovna a UZ	12,10
302	Sprcha, WC	2,00
303	Výkonový sálek GYN	30,83
304	Čistý sklad GYN	2,39
305	WC	1,34
306	Umyvadlo, sprcha	5,05
307	Chodba	14,85
308	Chodba	5,64
309	Filtr	3,11
310	Filtr - hyg. zázemí	5,87
311	Denní místnost, protokol	12,87
312	Oční sál	22,50
313	Umývárna - oční sál	4,90
314	Přípravna - oční sálu k výkonům	18,70
		142,15 m ²


03



TOULOVCOVO NÁM. 156
570 01 LITOMÝŠL

04/2023

Návrh

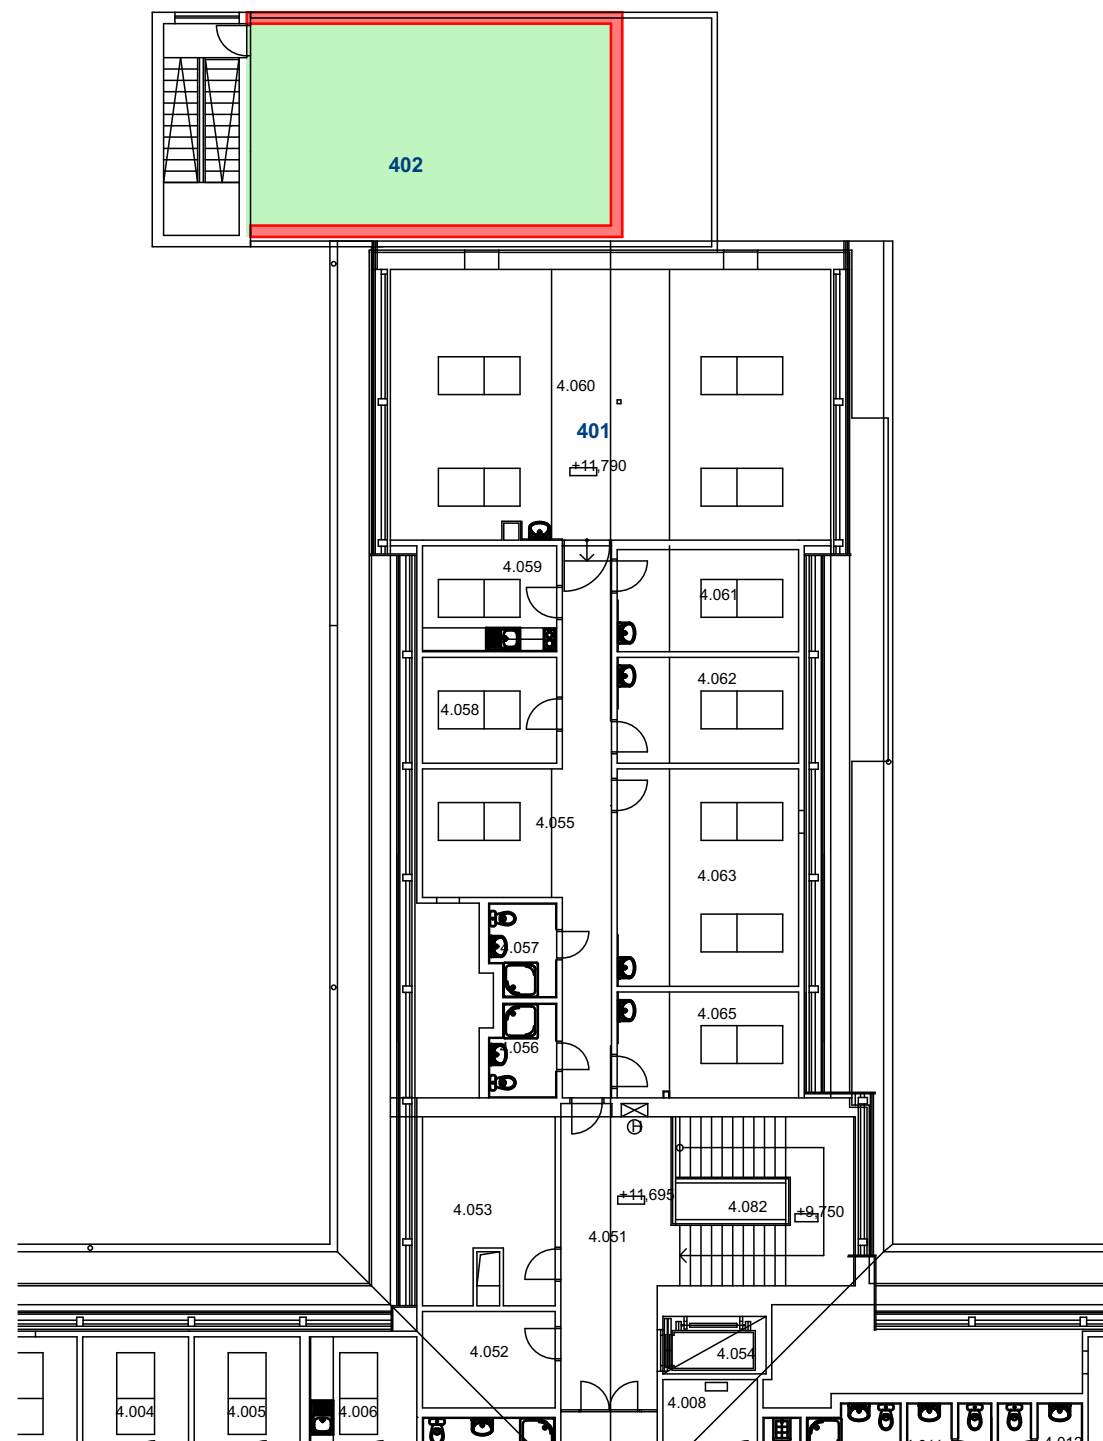

Tabulka místností 4.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
401	Strojovna - stávající	83,41
402	Strojovna - NÁVRH	51,05
		134,47 m ²



Prostor pro střešní nástavbu nové strojovny



Stávající strojovna 401

Legenda

- 0. etapa - adaptace oddělení GYN na dočasný zákrovový OCN sál, zákrovový sál GYN téměř bez stavebních úprav
- I. etapa - provizorní úprava stávajících sálů - vytvoření nového filtru pro sál 3 (pro zajištění provozu sálu 3 během rekonstrukce sálů 1 a 2)
- II. etapa - kompletní rekonstrukce sálů 1 a 2., realizace a umístění nové VZT jednotky (či jednotek) pro sály 1 a 2 a přílehlou chodbu a zázemí
- III. etapa - uvedení stavu úprav z II.etapy pro provoz OS 3 do původního stavu, příprava na rekonstrukci OS 3, zprovoznění sálů OS 1 a 2
- IV. etapa - kompletní rekonstrukce sálu 3
- bourané konstrukce
- nové konstrukce

Odvětrání operačních sálů

Architektonická studie

Půdorys 4.NP

Vypracoval : XXXXXXXXXX
 Odpovědný projektant XXXXXXXXXX

04

04/2023



TOULOVCOVO NÁM. 156
570 01 LITOMYŠL
