



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCHODNÍ PODMÍNKY

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:

„DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – dodávka nábytku“

v rámci projektu

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007908
Identifikační číslo EDS/SMVS:	117D03J000188
Název projektu:	DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
Prioritní osa IROP:	06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na tuto veřejnou zakázku.

Návrh
SMLOUVA O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ:
IČ: 00090352
jehož jménem jedná: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: Truhlářství JPS s.r.o.
sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12035
jednající: Jaroslav Spilka - jednatel
IČ: 25273655
DIČ: CZ25273655
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-7935800267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – dodávka nábytku“, realizovaného objednatelem v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ – dodávka nábytku“ a v souladu s vítěznou nabídkou vybraného dodavatele.
- 2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkami a montážemi jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:
 - 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.1.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení smluvené kvality a smluvených technických parametrů díla, zejména dosažení kvality a technických parametrů díla nabízených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky,
- 2.1.3.6. zřízení a odstranění zařízení místa provádění díla včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.3.7. odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními platných právních předpisů,
- 2.1.3.8. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- 2.1.3.9. důsledný úklid místa provádění díla a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.2. Prohlášení Zhotovitele

- 2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 2.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne účinnosti této smlouvy.
- 3.1.2. Místo provádění díla prosté práv třetí osoby bude předáno do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla.
- 3.1.3. Pokud zhotovitel do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla písemně neoznámí existenci překážek, které mu brání převzít místo provádění díla, platí, že převzal místo provádění díla dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatel k převzetí místa provádění díla.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.2.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 3.2.3. Zhotovitel je provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je budova depozitáře na adrese Velkomoravská 461/15, 695 01 Hodonín a sídlo objednatel.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

819.406,- Kč bez DPH

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy.
- 4.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatel na provedení díla, veškerými podklady, zejména se zadávacími podmínkami a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém Soupisu prací a dodávek ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno

předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v zadávací dokumentaci neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- Vyhotovení dílenské dokumentace dle čl. 2.1.3.3 této smlouvy
- vybudování, udržování a odstranění zařízení místa provádění díla;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
- opatření k ochraně životního prostředí;
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu.

4.2.5. Veškerá manipulace s materiálem a jeho uložením je obsahem nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v Soupisu prací a dodávek zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy.

4.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně po řádném dodání jednotlivých částí díla.

5.2.2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název díla
- text „„Účtováno pro projekt s názvem „DEPOZITÁŘ MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ“, číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007908.“.“
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle této smlouvy

5.5 Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

6. Majetkové sankce

- 6.1 Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.
- 6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dodáním celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2 Prodlení Zhotovitele s dodáním celého díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
- 6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 7.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
- 6.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.
- 6.5 Sankce za nedodržování BOZP na místě provádění díla
- 6.5.1 Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do montážního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.6 Sankce za nevyklizení místa provádění díla

6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo provádění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.7 Sankce za nepřítomnost montážního deníku na místě provádění díla

6.7.1 Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci montážní deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí práce na předmětném plnění této smlouvy.

6.8 Sankce za porušení povinností spojených se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek

6.8.1 Pokud Zhotovitel poruší závazek v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:

- a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému, nebo
- b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, nebo
- c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek,

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

6.9 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.9.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

7. Místo provádění díla

7.1. Zařízení místa provádění díla:

7.1.1. Zařízení místa provádění díla je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa provádění díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Předání a převzetí místa provádění díla

7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo provádění díla (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby ve lhůtě pro předání místa provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy. Splnění termínu předání místa provádění díla je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 7.2.2. O předání a převzetí místa provádění díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa provádění díla se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla ve lhůtě pro předání místa provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy.
- 7.3. Vykližení místa provádění díla
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa provádění díla a vyklidit místo provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo provádění díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa provádění díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Montážní deník

8.1 Povinnost vést montážní deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla o pracích, které provádí, montážní deník.
- 8.1.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu místa provádění díla, počasí, počtu pracovníků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách, majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup prací pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku.

8.2 Kontrolní dny

- 8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných

termínech, zpravidla 1x za dva týdny po dobu realizace v místě plnění, v přípravné době operativně dle dohody s objednatelem, nejméně však 1 x měsíčně.

- 8.2.2 O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

9 Provádění díla a bezpečnost práce

9.1 Pokyny Objednatele

- 9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje dodržovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předložit Objednateli rozpracované části díla zejména scénáře, návrhy zpracování obsahů, grafických ploch k odsouhlasení a pokračovat v provádění díla až po písemném odsouhlasení dalšího postupu ze strany Objednatele
- 9.1.3 Objednatel je povinen odsouhlasit rozpracované dílo nejpozději do tří pracovních dnů od předložení rozpracovaného díla Zhotovitelem.
- 9.1.4 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
- 9.1.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla zejm. na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.7 Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady, které vznikly při práci.

9.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při případném svařování.

9.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4 Provádění díla.

- 9.4.1 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky provádění díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2 Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost, či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- 9.4.3 Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání místa provádění díla nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu provádění díla (záznamem v montážním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru místa provádění díla.
- 9.4.4 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5 Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob.

- 9.4.8 Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla, ale i místa pro provádění díla zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí díla byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny a je již zahrnuto ve smluvené ceně díla.
- 9.4.9 Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.10 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.11 V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.12 Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.

10 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3 Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

11 Předání a převzetí díla

- 11.1 Organizace předání díla
- 11.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1 O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4 Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12 Záruka za jakost díla

12.1 Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2 Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 36 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, s výhradou výrobků, na něž výrobce poskytuje záruku 24 měsíců a jejichž seznam bude uveden v zápisu o předání díla.
- 12.1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 12.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1 Vlastnictví díla

13.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel

13.2 Nebezpečí škody na díle

13.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14 Pojištění díla

14.1 Pojištění zhotovitele

14.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.

14.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15 Vyšší moc

15.1 Definice vyšší moci

15.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16 Změna smlouvy

16.1 Forma změny smlouvy

16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17 Odstoupení od smlouvy

17.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 17.1.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do montážního deníku.
- 17.1.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 17.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 17.1.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

17.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 17.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 17.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.3 Den účinnosti odstoupení

- 17.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

17.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 17.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednanými v této smlouvě.

- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- e) Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

17.4.2 Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy.

18 Ostatní ujednání

18.1 Ostatní ujednání smlouvy

18.1.1 Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:

- d) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému,
- e) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky,
- f) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

18.1.2 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

18.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18.1.4 Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá Objednatel.

18.1.5 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

18.1.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

18.1.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Písemné vyhotovení smlouvy může být nahrazeno v souladu s § 211 ZZVZ 1 elektronickým originálem smlouvy s elektronickými podpisy.

18.1.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 18.1.9 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.1.10 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný Soupis prací a dodávek

V dne



Za Objednatele

V Havl. Brodě dne 16.05.2024



Za Zhotovitele

Jaroslav Spilka - jednatel

VYBAVENÍ NÁBYTKEM

Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně

1.PP

Číslo místnosti	Označení	Popis	Ks	Rozměry š x h / v [mm]	Materiál	Cena/ks bez DPH	Cen celkem bez DPH
						[Kč]	[Kč]
0.01	SP	STŮL PRACOVNÍ rozkládací (stavitelný) včetně rozkládacího kovového mechanismu atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1200(+400)x800/750	LDT laminová dřevotříška javor medový	4468	4468
0.03	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1300x600/750	LDT laminová dřevotříška javor medový	3083	6166
	ST2	STOLEK POD KOPÍRKU A3 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	750x600/750	LDT laminová dřevotříška javor medový	2350	2350
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1600x700/750	LDT laminová dřevotříška javor medový	3760	7520
	K _o	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdný kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	2	400x500/600	LDT laminová dřevotříška javor medový	5155	10310

0.03	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	2			5133	10266
	SP3	STŮL PRACOVNÍ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x800/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	ŽJ	ŽIDLE JEDNACÍ celomasiv (viz technická zpráva) područka celomasiv ohýbaný, sedák čalouněný - textilie (viz technická zpráva)	4		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	3932	15728
	Š	ŠATNÍ SKŘÍŇ otevíravé dveře včetně 1 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	1	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	4285	4285
	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevíravé dveře, 4 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	1	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	5053	5053
	K	KNIHOVNA skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	1	1200x400/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	9444	9444
0.06	SZ	KOVOVÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ PRO ZAMĚSTNANCE dvojdílná 180x60x50 cm,otočný uzávěr pro visací zámek, jmenovka, RAL 7035, police, tyč na ramínka, háčky na oděvy, háček na ručník, zrcátko RAL 9006 ŠEDÁ	11		Ocelový plech,	6035	66385

CENA CELKEM bez DPH [Kč]	145 735
MONTÁŽ	V ceně výrobků
DPH 21% [Kč]	30 604
CENA CELKEM včetně DPH [Kč]	176 339

VYBAVENÍ NÁBYTKEM

Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně

1.NP

Číslo místnosti	Označení	Popis	Ks	Rozměry š x h / v [mm]	Materiál	Cena/ks bez DPH	Cen celkem bez DPH
						[Kč]	[Kč]
1.02	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	3083
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	K ₀	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdny kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	1	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	5155
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133
	SP2	STŮL PRACOVNÍ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1200x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevírací dveře včetně 4x police, výsuvný kovový věšák, včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	3	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska	5053	15159
		STŮL FOTO			LDT laminová		

1.02	SF	atypický rozměr, spec.prac.deska tl. 36mm, ABS hrany 2mm, 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a kovová otevřená podnož (RAL 9006)	1	1200x1200/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	5223	5223
	V	VĚŠÁK samostatně stojící, ohýbaný, 5-ti ramenný, s odkládacím kruhem na deštníky	1		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	2021	2021
1.03	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	3083
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	K _o	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdný kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	1	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	5155
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133
	V	VĚŠÁK samostatně stojící, ohýbaný, 5-ti ramenný, s odkládacím kruhem na deštníky	1		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	2021	2021
	ST2	STOLEK POD KOPÍRKU A3 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	750x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	2350	2350

1.03	SP	STŮL PRACOVNÍ rozkládací (stavitelný) včetně rozkládacího kovového mechanismu atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1200(+400)x800/ 750	LDT laminová dřevotříska javor medový	4468	4468
	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevíravé dveře, 4 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	2	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	5053	10106
1.04	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevíravé dveře, 4 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	4	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	5053	20212
	K	KNIHOVNA skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	4	1200x400/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	9444	37776
	ŽJ	ŽIDLE JEDNACÍ celomasiv (viz technická zpráva) područka celomasiv ohýbaný, sedák čalouněný - textilie viz technická zpráva)	10		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	3932	39320
	SO	STŮL OVÁLNÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 36mm, ABS hrany 2mm rektifikace stavitelné, podnož uzpůsobené pro sedící, LUX provedení, zpevněná zátežová konstrukce	1	2700x1500/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	17906	17906
	KL	KUCHYŇSKÁ LINKA spodní skříňky, včetně rektifikace, sokl výšky 80mm, barva RAL 9006 -šedá, horní deska MDF včetně vestavěných zařizovacích předmětů - lednička 110l, no frost, nerez dřez hranatý, sklokeramická varná deska 600x600mm, příprava na stojánkovou baterii	1	2400x600/850	LDT laminová dřevotříska javor medový	40575	40575

1.05	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevírávé dveře, 4 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	7	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	5053	35371
1.06	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133
	Kk	KARTOTÉKA KOVOVÁ PRO DOKUMENTY A4 4 zásuvková 416 x 132 x 620, plný výsuv se soklem, uzamykatelná RAL 9006 - šedá	1	440x600/1300		5511	5511
	Ss	SPISOVÁ SKŘÍŇ KOVOVÁ 915 x 1950 x 463mm dveřová uzamykatelná se 4 policemi RAL 9006 - šedá včetně kovového soklu	3	950x400/1950		6099	18297
1.07	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	6166
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	7520
	K _o	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdňý kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	2	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	10310
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka	2			5133	10266

1.07		odolné látkové materiály, nosnost 150 kg					
	K	KNIHOVNA skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	2	1200x400/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	9444	18888
	Š	ŠATNÍ SKŘÍŇ otevíravé dveře včetně 1 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	2	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	4285	8570
	ST1	STOLEK POD KOPÍRKU A4 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2 x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	600x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	2350	2350
1.09	ŽS	ŽIDLE STOHOVATELNÁ - konferenční židle střední opěrák konického tvaru, plastový kryt sedáku bez područek, plastové kluzáky na koberce, 4 nohá ocelová podnož, černá prášková barva, nosnost 150 kg	6			2169	13014
	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	6166
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	7520
	K _o	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdný kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	2	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	10310
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	2			5133	10266
		KNIHOVNA			LDT laminová		

1.09	K	skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	2	1200x400/1950	dřevotříska javor medový	9444	18888
	Š	ŠATNÍ SKŘÍŇ otevírávé dveře včetně 1 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	2	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	4285	8570
	ST1	STOLEK POD KOPÍRKU A4 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2 x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnože a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	600x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	2293	4586
	ŽS	ŽIDLE STOHOVATELNÁ - konferenční židle střední opěrák konického tvaru, plastový kryt sedáku bez područek, plastové kluzáky na koberce, 4 nohá ocelová podnož, černá prášková barva, nosnost 150 kg	6			2226	13356
1.10	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133
	Š	ŠATNÍ SKŘÍŇ otevírávé dveře včetně 1 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	1	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	4285	4285

1.13	K	KNIHOVNA skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	1	1200x400/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	9444	9444
1.15	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133
	13	VELKÝ PRACOVNÍ STŮL s odládací policí pod prac.deskou atypický rozměr, prac.deska tl. 36mm, ABS hrany 2mm kovové hranaté podnože s plastovou krytkou včetně spojovací konstrukce pod plátem stolu	1	1400x2000/850	LDT laminová dřevotříska javor medový	17482	17482
	OS KL	ODKLÁDACÍ STŮL s policí, kovová konstrukce, vypalovaný lak odkládací plocha a 1x police – voděodolná úprava, police min. 70kg, výšku před výrobou doměřit dle reál. stavu	1	??1250x600/900 ??		14685	14685
1.26	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	3083
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	K _o	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdný kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	1	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	5155
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	2			5133	10266
	P	SKŘÍŇ S POLICEMI otevíravé dveře, 4 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	3	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	5053	15159

I.26	V	VĚŠÁK samostatně stojící, ohýbaný, 5-ti ramenný, s odkládacím kruhem na deštníky	2		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	2021	4042
	ST2	STOLEK POD KOPÍRKU A3 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	750x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	2293	2293
	SP	STŮL PRACOVNÍ rozkládací (stavitelný) včetně rozkládacího kovového mechanismu atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1200(+400)x800/ 750	LDT laminová dřevotříska javor medový	4468	4468
	SP KL	STŮL PRACOVNÍ- šířku před výrobou doměřit dle reál. stavu kovová podnož, prac. deska melamin, 1x kontejner 3x zásuvka - laminovaná dřevotříska, 1x držák PC	1	??3800x700/750 ??	melamin dřevotříska	27389	27389
I.27	SP3	STŮL PRACOVNÍ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	2	1600x800/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	7520

CENA CELKEM bez DPH [Kč]	599 274
MONTÁŽ	V ceně výrobků
DPH 21% [Kč]	125 848
CENA CELKEM včetně DPH [Kč]	725 122

VYBAVENÍ NÁBYTKEM

Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně

2.NP

Číslo místnosti	Označení	Popis	Ks	Rozměry š x h / v [mm]	Materiál	Cena/ks bez DPH	Cen celkem bez DPH
						[Kč]	[Kč]
2.02	SPC	STOLEK POD PC atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1300x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3083	3083
	ST1	STOLEK POD KOPÍRKU A4 (s tiskárnou a skenerem) atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2 x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	600x600/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	2293	2293
	SK	STŮL KANCELÁŘSKÝ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x700/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	Ko	KONTEJNER K PSACÍMU STOLU pojízdný kontejner se 4 zásuvkami včetně plastových tužkovníků a rozdělovníku, s centálním uzamykáním komplet 2mm ABS	1	400x500/600	LDT laminová dřevotříska javor medový	5155	5155
	ŽK	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ mechanika SYS, posuvný sedák, bederní a hlavová opěrka, hliníkový kříž F 40-N6, pogumovaná kolečka odolné látkové materiály, nosnost 150 kg	1			5133	5133

2.02	SP3	STŮL PRACOVNÍ atypický rozměr, prac.deska tl. 25mm, ABS hrany 2mm 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a podnože 18mm opatřeny ABS hranou 2mm	1	1600x800/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	3760	3760
	ŽJ	ŽIDLE JEDNACÍ celomasiv (viz technická zpráva) područka celomasiv ohýbaný, sedák čalouněný - textilie (viz technická zpráva)	4		Ohýbaný masiv buk mořený na javor medový	3932	15728
	Š	ŠATNÍ SKŘÍŇ otevřené dveře včetně 1 police, výsuvný kovový věšák včetně rektifikace, 18 mm lamino, ABS 2mm	1	600x500/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	4285	4285
	K	KNIHOVNA skříň - regál, 4x police mobilní, rektifikace stavitelná 30 mm, lamino 18mm, ABS 2mm	1	1200x400/1950	LDT laminová dřevotříska javor medový	9444	9444
	Kk	KARTOTÉKA KOVOVÁ PRO DOKUMENTY A4 4 zásuvková 416 x 132 x 620, plný výsuv se soklem, uzamykatelná RAL 9006 - šedá	3	440x600/1300		5511	16533
	SF	STŮL FOTO atypický rozměr, spec.prac.deska tl. 36mm, ABS hrany 2mm, 2x průchodka plastová, rektifikace stavitelné trnož a kovová otevřená podnož (RAL 9006)	1	1200x1200/750	LDT laminová dřevotříska javor medový	5223	5223

CENA CELKEM bez DPH [Kč]	74 397
MONTÁŽ	V ceně výrobků 0
DPH 21% [Kč]	15 623
CENA CELKEM včetně DPH [Kč]	90 020



Specifikace výrobků

Stoly s dřevěnými nohami

Stolové desky mají celkovou tloušťku 25 mm, hrany po obvodu ABS 2 mm. Boky i vzpěra jsou vyrobeny z LTD tl. 18 mm, na vnější i vnitřní straně jsou oplepeny ABS hranou tl. 2 mm v barvě dezénu LTD. Ostatní hrany dílců jsou oplepeny ABS hranou tl. v barvě dezénu LTD. Nohy jsou osazeny výškově stavitelnou rektifikací v rozsahu nastavení 15 mm. Průchodky v pracovních stolech (2 ks v jednom stole) jsou plastové v odstínu RAL k dekoru LTD.

Možno doplnit o sklopný mechanismus pro prodloužení desky, držák PC

Stoly s kovovými nohami

Stolové desky mají celkovou tloušťku min. 25 mm, hrany po obvodu ABS 2 mm. Stolové kovové podnože tvaru „C“, dokončeny práškovou vypalovací barvou s odstínem (antracit, bílá, stříbrná) umožňují přes snímatelný kryt svedení kabelů k podlaze. Podnože jsou opatřeny rektifikací v rozsahu nastavení 15 mm. Vzpěra je vyrobena z LTD min tl. 18 mm, oplepena ABS hranou tl. 2 mm v barvě dezénu LTD. Pokud je uvedeno v zadání může být vzpěra nahrazena spojovacím kanálem v odstínu a povrchové úpravě podnože. Průchodky v pracovních stolech (2 ks v jednom stole) jsou plastové v odstínu RAL k dekoru LTD.

Možno doplnit o držák PC

Kontejnery

Půda kontejneru z LTD tl. 18 mm naložená na bocích a zádech, hrany po obvodu ABS 2 mm. Dno z LTD min. 18 mm naložené na bocích a zádech, hrany po obvodu ABS 2 mm. Čela zásuvek a korpus vyroben z LTD tl. 18 mm. Čela zásuvek oplepeny hranou ABS 2 mm. Ostatní hrany dílců jsou oplepeny ABS hranou min. tl. 0,5 - 1 mm v barvě dezénu LTD. Počet vyjímatelných zásuvek 4 ks s centrálním zamykáním, výměnnou vložkou a systémem STOP - CONTROL, které znemožňuje otevření více zásuvek najednou a tím zabraňuje převrhnutí kontejneru. Rolničkové výsuvy zásuvek. Konstrukční spojení pevné lepené (kolíky). Otočná kolečka (přední s brzdou).

Doplněno o plastový vyjímatelný tužkovník a dva plastové rozdělovníky

Skříně

Korpus skříně včetně polic, přepážek, mezistěn a dveří LTD tl. 18 mm. U vysokých skříní min. 1 pevná police. Dveře, police a veškeré pohledové hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Ostatní nepohledové hrany oplepeny hranou tl. 0,5 mm. Zada z HDF bílé v tl. 3 mm vsazená do drážky nebo polodrážky. Skříně jsou opatřeny rektifikačními patkami výšky 27 mm (stavěcími nožkami) pro vyrovnání nerovností podlahy s dostatečnou únosností. Dveře jsou naložené, upevněny na kovových závěsech s možností seřízení ve třech směrech, počet závěsů na dveřích dle norem a doporučení výrobců. Konstrukční spojení – lepený spoj nebo na kolík a vhodné kování. Všechny případné spoje a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina. Dveře v případě požadavků na zamykání vybavené skříňovým zámkem s výměnnou vložkou, možnost použití jednoho klíče pro více vložek. V případě spojení více skříní do sestavy jsou spojeny spojovacími nábytkovými kovovými šrouby. Vrtání pro podpěrky polic rovnoměrně

s možností přemístění polic, podpěrky polic neumožňující náhodné vysunutí police. Šatní tyče i držáky šatních tyčí oválné kovové, v případě užších šatních skříní výsuvný věšák.

Kuchyňky

Korpus skříněk včetně polic, přepážek, mezistěn a dveří LTD tl. 18 mm. Půda i dno je vloženo mezi boky. Veškeré ostatní pohledové hrany oplepeny hranou tl. 0,5 mm. U vysokých skříní min. 1 pevná police. Dveře oplepeny ABS hranou tl. 2 mm. Veškeré ostatní hrany oplepeny hranou tl. min. 0,5 mm. Záda vyrobená z HDF bílé tl. 3 mm, nedělená. Dveře jsou naložené, upevněny na kovových závěsech s možností seřízení ve třech směrech, počet závěsů na dveřích dle norem a doporučení výrobců. Horní skříňky jsou přichyceny ke zdi na vhodných závěsech s možností regulace. Spodní skříňky jsou na rektifikačních plastových nožkách s dostatečnou nosností, na kterých je osazen volně snímatelný sokl s těsnicí plastovou lištou proti prachu a zatékání vody. Konstruktivní spojení – lepený spoj. V případě spojení více skříní do sestavy jsou spojeny spojovacími nábytkovými kovovými šrouby. Vrtání pro podpěrky polic rovnoměrně s možností přemístění polic, podpěrky polic kovové neumožňující náhodné vysunutí police. Pracovní deska (postforming) tl. 38mm se zaoblením v přední části. Součástí pracovní desky jsou krycí lišty proti zatékání vody. Doplněno o spotřebiče dle zadání

Součástí dodávky bude dřez s přípravou pro baterii



Vnější rozměry	480 x 480 mm
Rozměry vany	410 x 360 mm
Hloubka dřezu	180 mm

Kovová šatní skříňka na soklu, šedé dveře, otočný zámek

Rozměry v x š x h (mm) 1920 x 600 x 500

základna tvořena soklem vysokým 12 cm

svařované konstrukce z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm

výztužné prvky na dveřích jako ochrana proti násilnému vniknutí do skříňky

účinné větrání dle normy DIN 4547

každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky

kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu

otočný zámek pro použití kladky na číslo či na klíč

povrchová úprava práškovým lakem - RAL 7035

doplněno zrcátkem



Kovová kartotéka A4, 4 zásuvky, demontovaná, šedá

Rozměry v x š x h (mm) 1320 x 460 x 620

kartotéka z ocelového plechu se čtyřmi zásuvky

zásuvky jsou určeny pro formát A4 nebo obálky F4

centrální zámek uzamykající všechny 4 zásuvky - dodáváno se dvěma klíči

systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou a brání tak možnému převážení celé kartotéky

zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy

každá zásuvka má v levém předním rohu místo pro zasunutí popisku

nosnost zásuvky je 20 kg

povrchová úprava práškovým lakem - RAL 7035

vyrobena z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm



Dřevěný stojanový věšák s držákem deštníků, buk



Kovová spisová skříň, 4 police, šedá

Rozměry v x š x h (mm) 1950 x 950 x 400

kovová policová skříň s uzamykatelnými dveřmi

vyrobena z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm

4 nastavitelné police

nosnost jedné police je 35 kg

povrchová úprava práškovým lakem - korpus RAL 7035

uzamykání třibodovým zámkem se 2 klíči




Kancelářská židle

Šířka sedáku 51 cm

Nosnost 150 kg

Hmotnost 18 kg

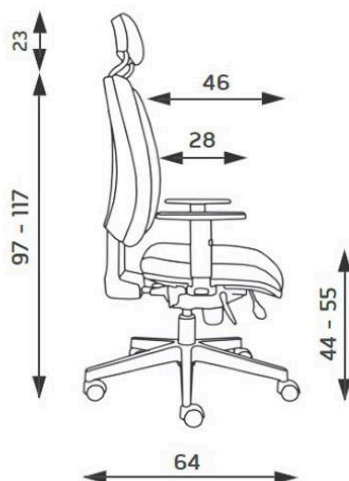

Podhlavník: Podhlavník YORK ŠÉF pevný.

Područky: P51 - Výškově stavitelné područky, PP – plastový top

Kříž: Plochý hliníkový leštěný kříž s průměrem 640 mm.

Kolečka: 50mm guma – 1KOL52 kolečko s tichým čepem na tvrdé podlahy – pogumované

Mechanika: T-SYNCHRO mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěráku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5 polohách. Horizontální posuv sedáku 5 cm. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem. Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění.

Výbava: Zvýšená pevná opěrka, umístěná v bederní části opěráku židle.

Materiály

Potah: SUEDINE - 024



Složení: 100% polyester, nemetalická barviva.

Gramáž: 190 g/m² ± 5%, 285 g/bm ± 5%.

Šířka: užitná šířka 150 cm ± 2%.

Odolnost vůči prodření: 40.000 cyklů.

Stálost na světle: 3-4 (EN ISO 105 - B02:1999).

Stálost při tření: za vlhka 4 - 5; za sucha 4 - 5 (EN ISO 105 - X12:1995).

Výběr z potahových látek



Suedine 46



Suedine 59



Suedine 65



Suedine 109



Suedine 1



Suedine 2



Suedine 7



Suedine 9



Suedine 11



Suedine 21



Suedine 22



Suedine 24



Suedine 29



Suedine 34



Suedine 41


Konferenční židle

Šířka sedáku 52,5 cm

Hmotnost 9 kg

Nosnost 150 kg

Stohovatelnost (ks) 8

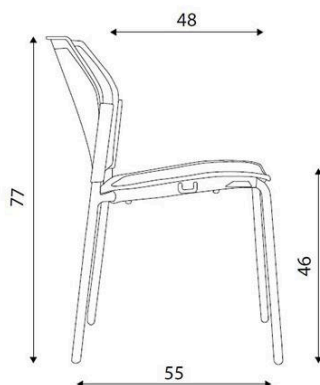

Výběr z plastů



Konferenční židle dřevěná

