

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2024\_0021**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [REDAKCE], supervizorem, VFS Čechy východ

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „CETIN“)

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.

Pr 162

zastoupená [REDAKCE], ředitelem

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 6. 5. 2024 vydané pod čj. 135344/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

**Zákon o vyvlastnění** je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Bohuňovice(SY),II/317 napojení D35**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

#### 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

##### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

##### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení Městského úřadu Litomyšl – rozhodnutí o schválení stavebního záměru pro stavbu „II/317 Bohuňovice, napojení na D35 Bohuňovice“ č.j. MěÚ Litomyšl 080837/2023 ze dne 15. 1. 2024, které nabylo právní moci dne 14. 2. 2024 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

##### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodloužení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodloužení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **330 705,- Kč** (slovy: tři sta třicet tisíc sedm set pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **31 278,- Kč** (slovy: třicet jedna tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Hana Holušová  
funkce: specialista pro výstavbu sítě

[REDACTED]

ve věcech technických: Tomáš Pekař  
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

[REDACTED]

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák  
funkce: ředitel

[REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Kristýna Vajerová  
funkce: technik přípravy

[REDACTED]

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti



se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoliv jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:


- Příloha č. 1 - CTN  
Příloha č. 2 - Společné povolení

CETIN

Stavebník

V Praze dne

**Luboš  
Minář**

 Digitálně podepsal Luboš Minář  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04084063,  
o=CETIN a.s., ou=70490, cn=Luboš  
Minář, sn=Minář, givenName=Luboš,  
serialNumber=P783117  
Datum: 2024.05.09 10:41:44 +02'00'

za CETIN a.s.

supervizor, VFS Čechy východ  
(podepsáno elektronicky)

V Pardubicích dne





Digitálně podepsal Ing.  
Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.05.21  
16:48:59 +02'00'


za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje

ředitel  
(podepsáno elektronicky)




BOHUŇOVICE  
Bohuňovice u Litomyšle

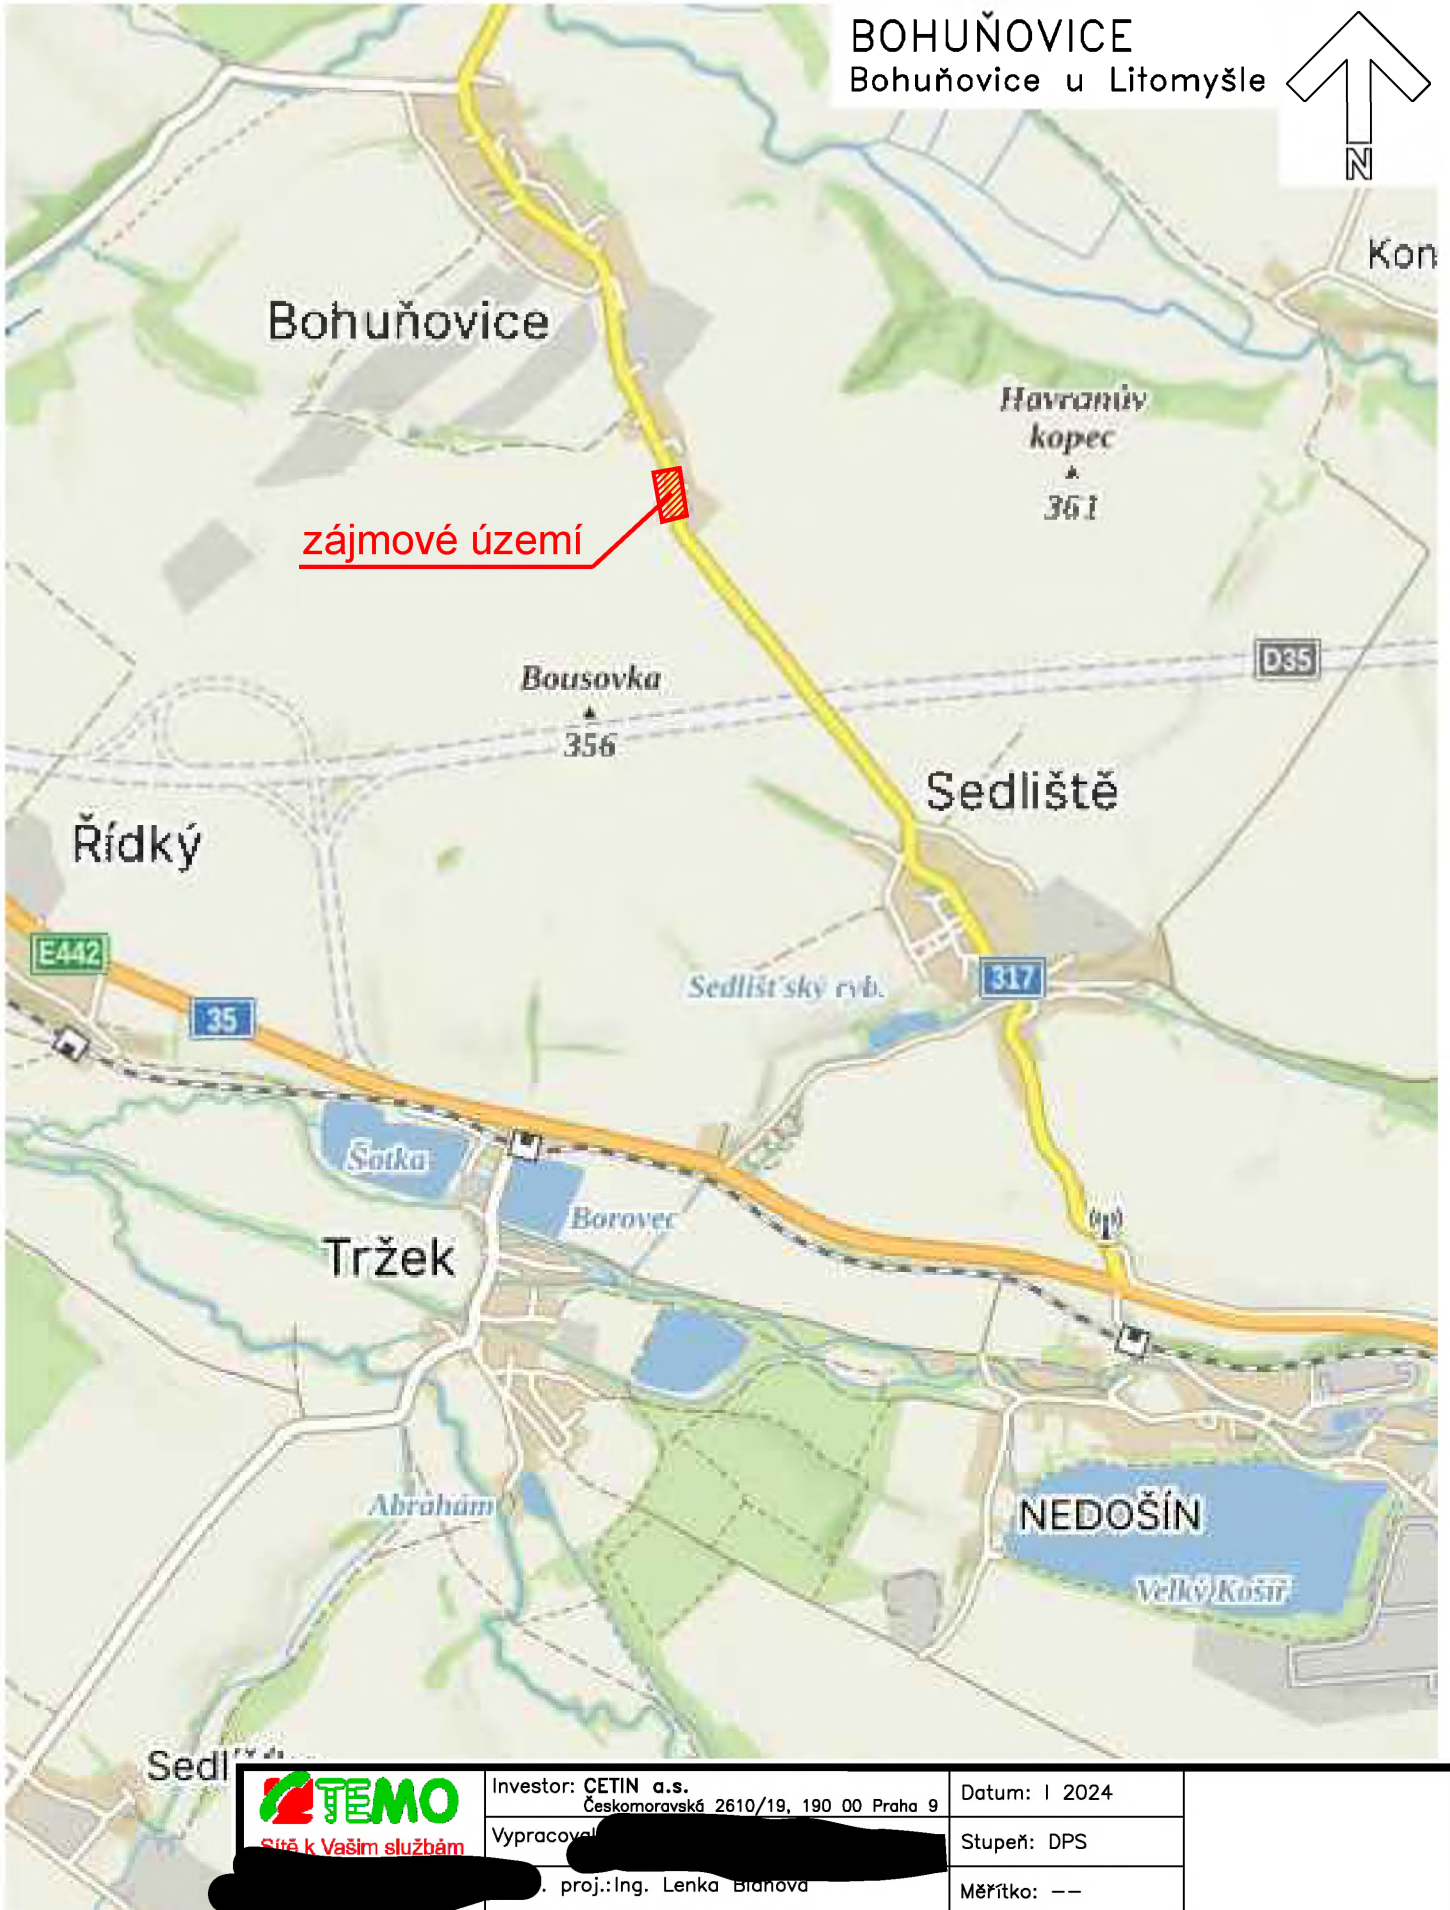

 Sítě k Vaším službám	Investor: CETIN a.s. Českomoravská 2610/19, 190 00 Praha 9	Datum: I 2024
	Vypracoval: [redacted] proj.: Ing. Lenka Bláhová	Stupeň: DPS
Název zakázky: <b>II/317 Bohuňovice, napojení na D35</b>		Měřítko: --
Název výkresu: <b>Orientační mapa</b>		Formát: A3
		SAP: ...
		Č. výkresu: <b>1C</b>



KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  
1: 1000

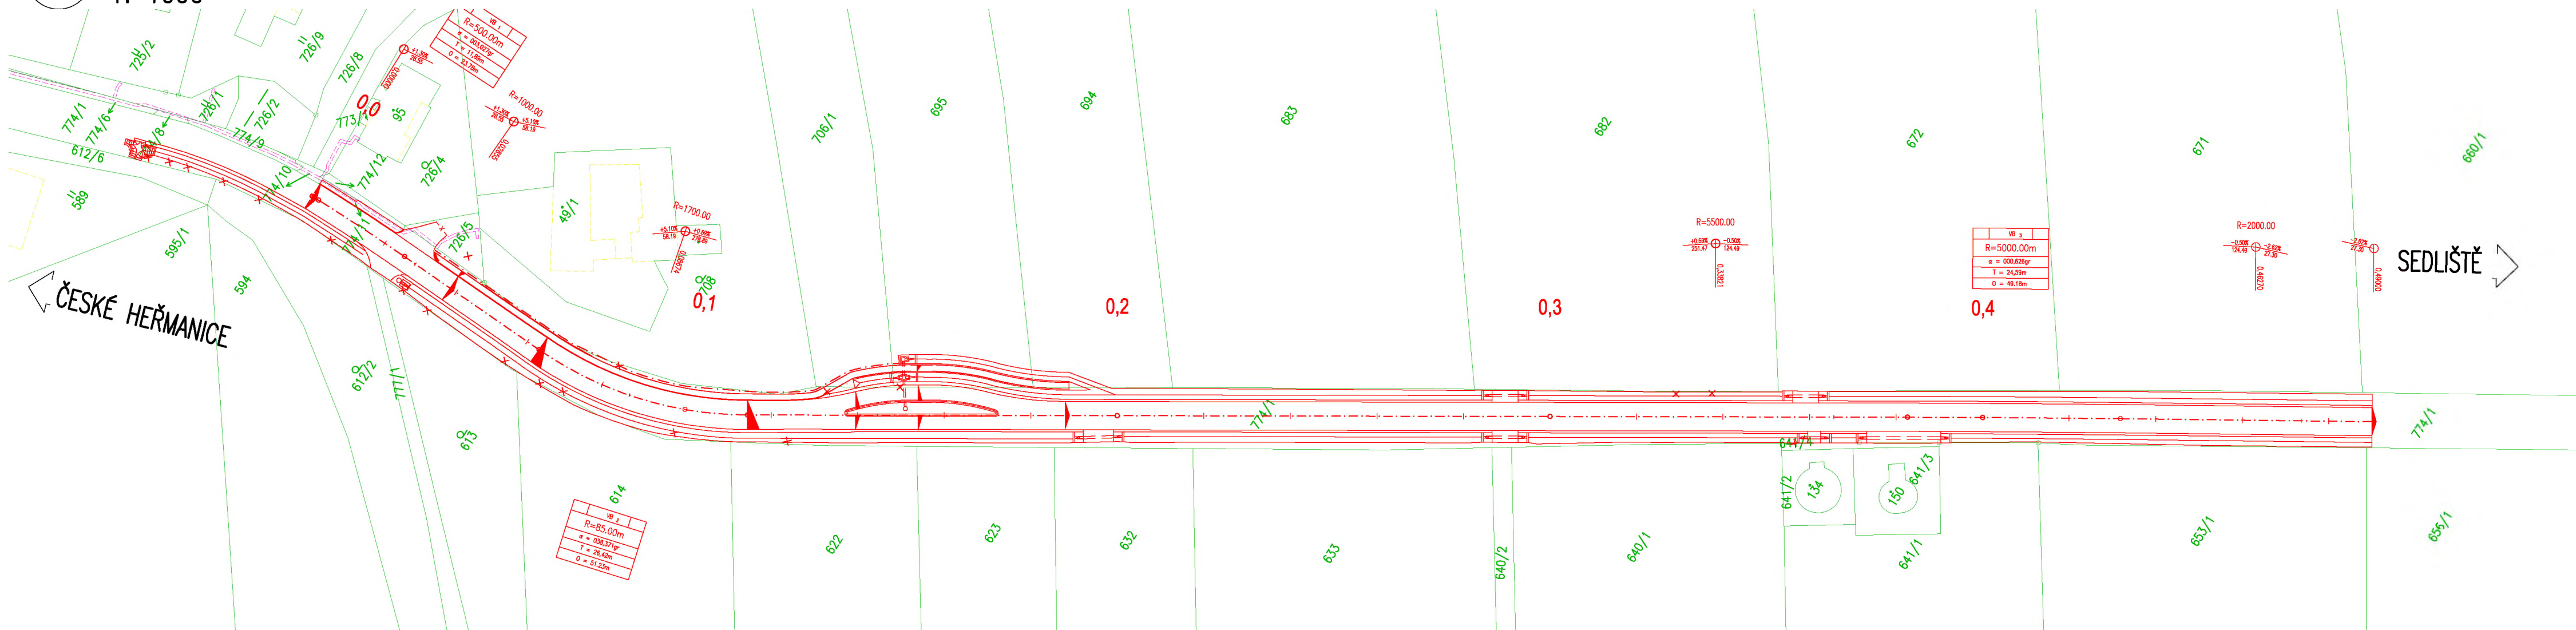


ČESKÉ HEŘMANICE

SEDLIŠTĚ

- LEGENDA NOVÝ STAV:**  
 - - - - - OSA KOMUNIKACE  
 - - - - - NOVÝ STAV
- LEGENDA KATASTR NEMOVITOSTÍ**  
 - - - - - HRANICE KAT. ÚZEMÍ  
 - - - - - HRANICE POZEMKU  
 - - - - - ČÍSLO POZEMKU  
 - - - - - VNITŘNÍ ČLENĚNÍ POZEMKU  
 - - - - - VĚCNÉ BŘEMENO
- LEGENDA NOVÝ STAV:**  
 - - - - - TRVALÝ ZÁBOR  
 - - - - - DOČASNÝ ZÁBOR


MĚŘITKO:

1:1000



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV



C.  
DUSP

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK	<i>J. Herynek</i>	<p>FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ</p>
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK	<i>J. Herynek</i>	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	<i>L. Tobeš</i>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	<i>J. Bursa</i>	STUPEŇ: DUSP
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	<i>J. Bursa</i>	ZAK.ČÍSLO: 2543-21-3
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOHUŇOVICE	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2543
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			DATUM: 12/2021
AKCE:	<b>II/317 BOHUŇOVICE, NAPOJENÍ NA D35</b>		FORMÁT: 3x4
OBJEKT: <b>C. SITUAČNÍ VÝKRESY</b>			MĚŘITKO: 1:1000
OBSAH:	<b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: <b>C.2.</b>



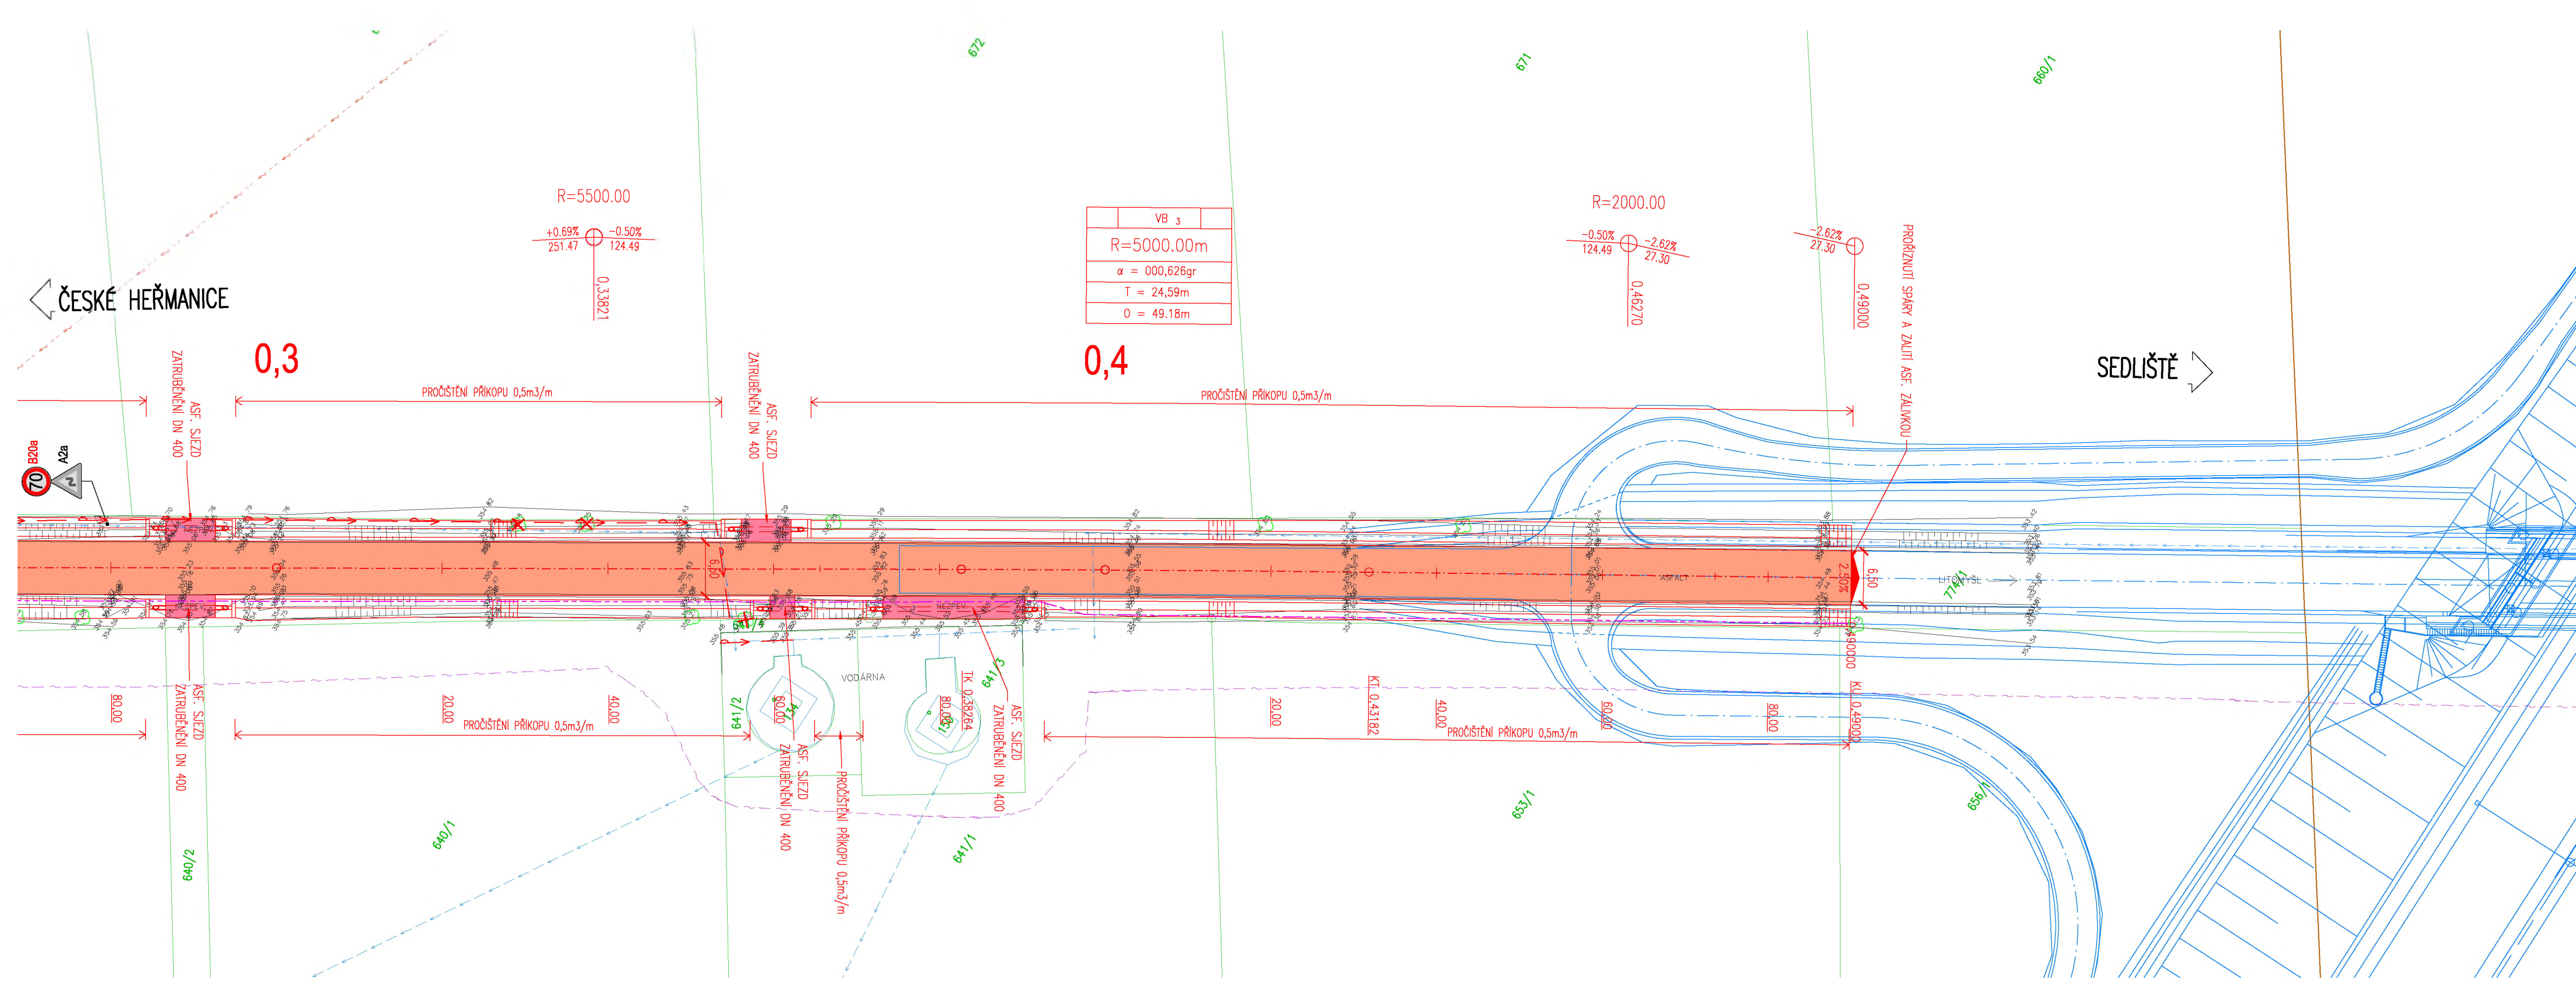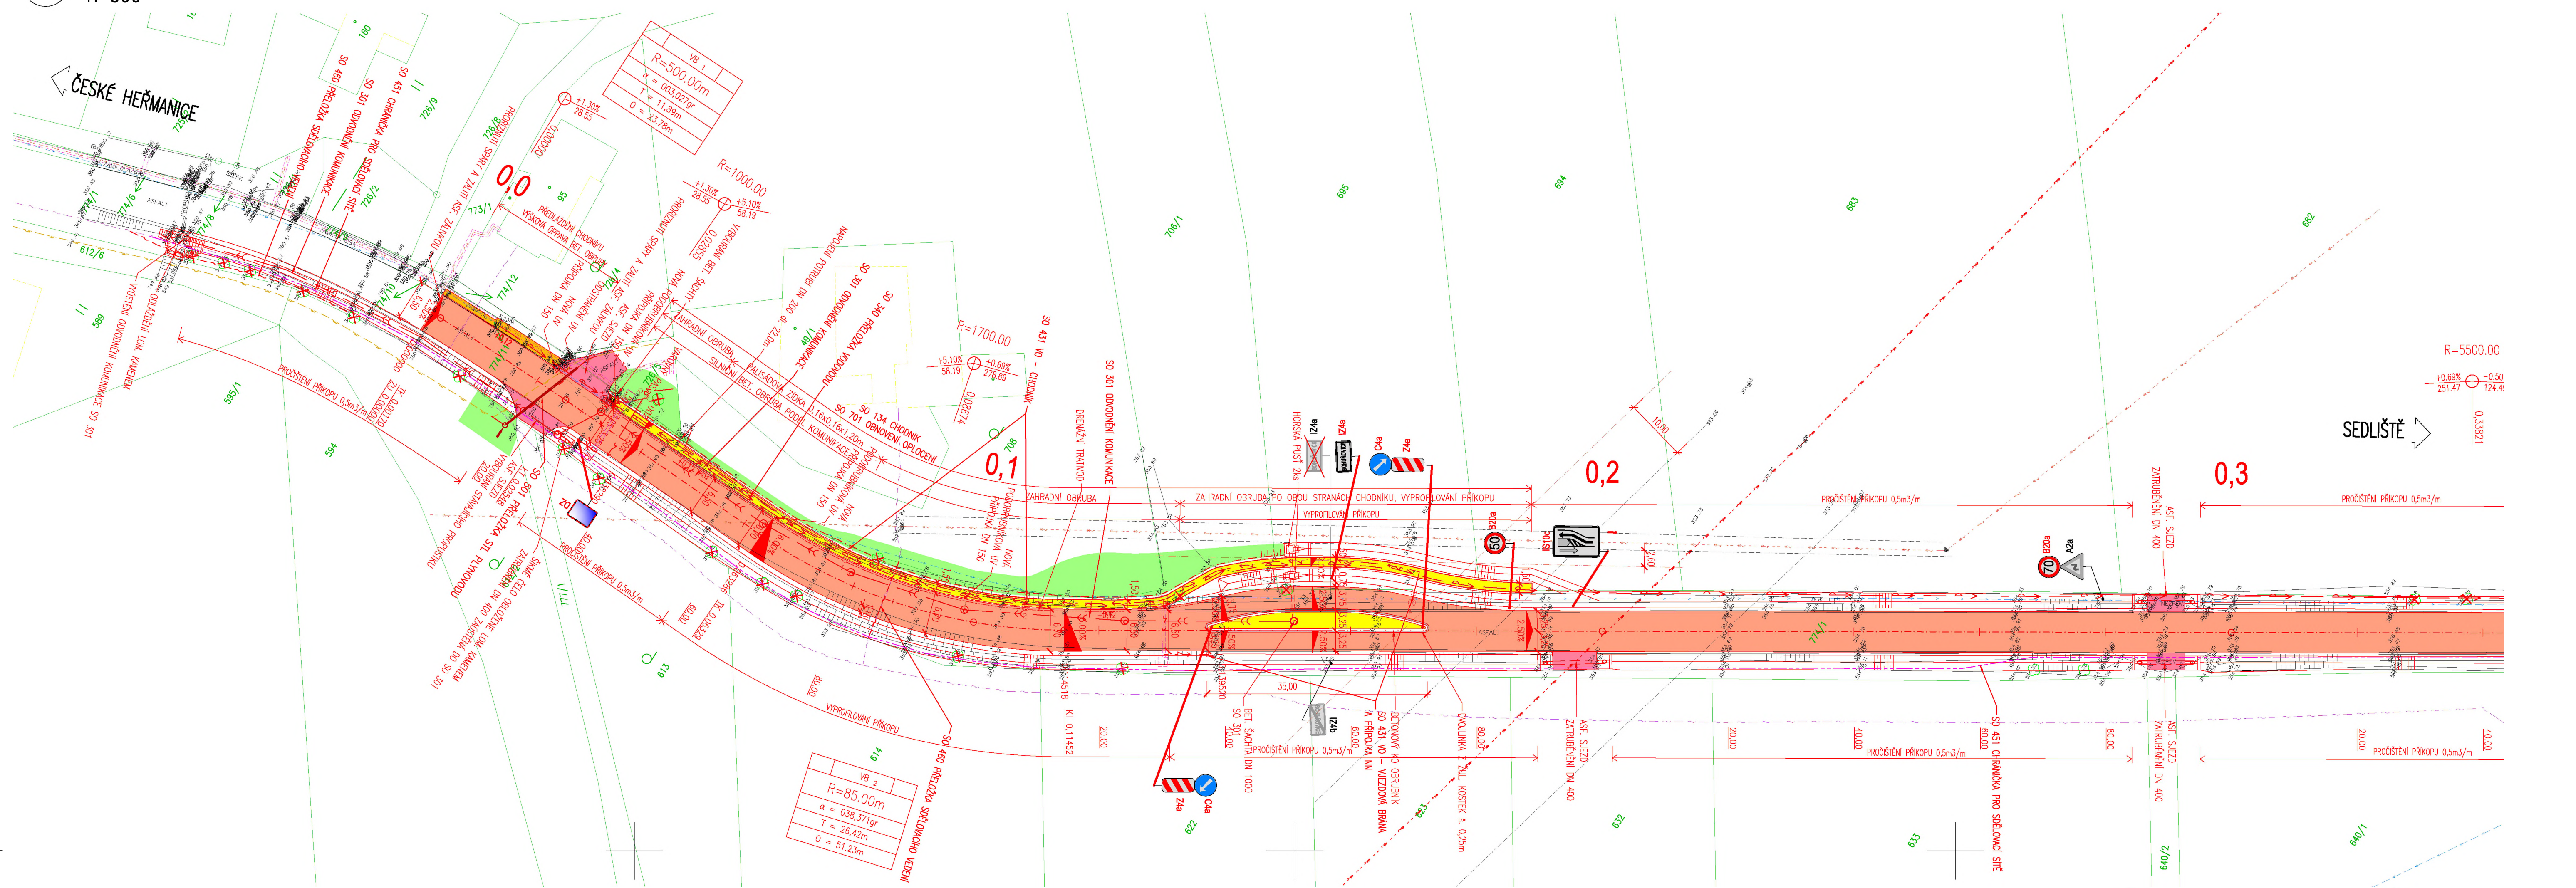

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 101 - SILNICE II/317
- SO 134 - CHODNÍK
- SO 181 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 301 - OJVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- SO 340 - PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 431 - VO - CHODNÍK
- SO 432 - VO - VJEZDOVÁ BRÁNA A PŘÍPOJKA NN
- SO 451 - CHRÁNIČKA PRO SĎELOVACÍ SÍŤ
- SO 460 - PŘELOŽKA SĎELOVACÍHO VEDENÍ
- SO 501 - PŘELOŽKA SÍTĚ PLYNOVODU
- SO 701 - OBNOVENÍ OPLCENÍ

LEGENDA NOVÝ STAV:

- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV
- KOORDINOVANÁ STAVBA D35
- DRENAŽNÍ TRATĚV
- ŘEZANÁ SPÁRA Š. 10 mm
- TL. 40 mm S ASF. ZÁLVKOU
- SVODIDLO
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- DRENAŽNÍ TRATĚV

LEGENDA NAVRŽENÝCH ČÁSTÍ:

- ULIČNÍ VPLVST
- NOVÝ STOŽAR VO
- STROM URČENÝ KE SKÁCENÍ
- NOVĚ NAVRŽENÉ SOZ
- IP1fc
- A2a
- I24a

LEGENDA STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN NAZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NAZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ ZVN NAZEMNÍ - ČEPS a.s.
- OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ
- SÍTĚ PODZEMNÍ PLYNOVOD - GRIDSERVICES, s.r.o.
- PODZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ - CETIN a.s.
- VODOVODNÍ ŘÁD - VHS a.s.

LEGENDA NOVĚ NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 301
- PŘELOŽKA VODOVODU SO 340
- NAVŘZENÁ TRASA VO SO 431
- NAVŘZENÁ TRASA NN SO 432
- NAVŘZENÁ TRASA CHRÁNIČEK PRO SĎELOVACÍ KABELY SO 451
- PŘELOŽKA SĎELOVACÍHO KABELU SO 460
- PŘELOŽKA PLYNOVODU SO 501



LEGENDA PLOCHŮ:

- KOMUNIKACE - KOMPLÉTNÍ NOVÁ KONSTRUKCE
- DLAŽĚNÁ PLOCHA - ŽULOVÉ KOSTKY
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BET. ŽÁMKOVÁ DLAŽBA
- SJEZD, NÁPOJENÍ - FREZING
- SJEZD, NÁPOJENÍ - ASFALT
- OHUMISOVÁNÍ, NÁSPY

LEGENDA KATASTR NEMOVITOSTÍ:

- HRANICE KAT. OZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ
- ČÍSLO POZEMKU
- VNITŘNÍ ČLENĚNÍ POZEMKU
- VEČNÉ BŘEMENO

MĚŘÍTKO:



KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		<p>FORSTEROVA ČP. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL: MOSS@MDSPROJEKT.CZ</p>
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: BOHUŇOVICE	STUPEŇ: DUSP
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE	ZAK.ČÍSLO: 2543-21-3		
AKCE: II/317 BOHUŇOVICE, NÁPOJENÍ NA D35	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2543		
OBJEKT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	DATUM: 12/2021		
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE	FORMÁT: Bx44		
	MĚŘÍTKO: 1:500		
	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.	

C.  
DUSP



bude-li to nutné,  
bude stávající  
účastnický rozvaděč  
LIMY434 posunut  
tak, aby byl min.  
0,5 m od hrany  
nového příkopu


trasa přeložky vedení SEK bude vedena  
min. 0,5 m od hrany nového příkopu,  
krytí přeloženého vedení SEK bude min.  
1,2 m, pod dnem odvodňovacího příkopu  
bude vedení SEK uloženo do chrániček  
PE, krytí chráničky bude min. 1,2 m

stávající vedení SEK bude odkopáno, bude-li to možné  
bude stávající vedení SEK v chráničce zahloubeno tak,  
aby krytí chráničky bylo min. 1,2 m pod dnem příkopu  
a pod niveletou silnice, nebude-li to možné, bude  
realizována kabelová vložka tak, aby krytí nové  
chráničky PE s novým vedením SEK bylo min. 1,2 m  
pod dnem příkopu a pod niveletou silnice


stávající vedení SEK bude odkopáno, bude-li to možné  
bude stávající vedení SEK v chráničce zahloubeno tak,  
aby krytí chráničky bylo min. 1,2 m pod dnem příkopu  
a pod niveletou silnice, nebude-li to možné, bude  
realizována kabelová vložka tak, aby krytí nové  
chráničky PE s novým vedením SEK bylo min. 1,2 m  
pod dnem příkopu a pod niveletou silnice

#### LEGENDA:

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ SEK
- - - ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK
- RUŠENÁ TRASA PODZEMNÍHO VEDENÍ SEK
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SEK

 <b>Sítě k Vaším službám</b> TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10	Investor: <b>CETIN a.s.</b> Českomoravská 2610/19, 190 00 Praha 9	Datum:   2024
	Vypracoval: Ing. Lenka Bláhová tel.: 724542369, bprojekt@hotmail.com	Stupeň: DPS
	Zodp. proj.: Ing. Lenka Bláhová	Měřítko: --
Název zakázky: <b>II/317 Bohuňovice, napojení na D35</b>	Formát: A3	
Název výkresu: <b>Polohopisný plán</b>	Č. výkresu: <b>1P</b>	



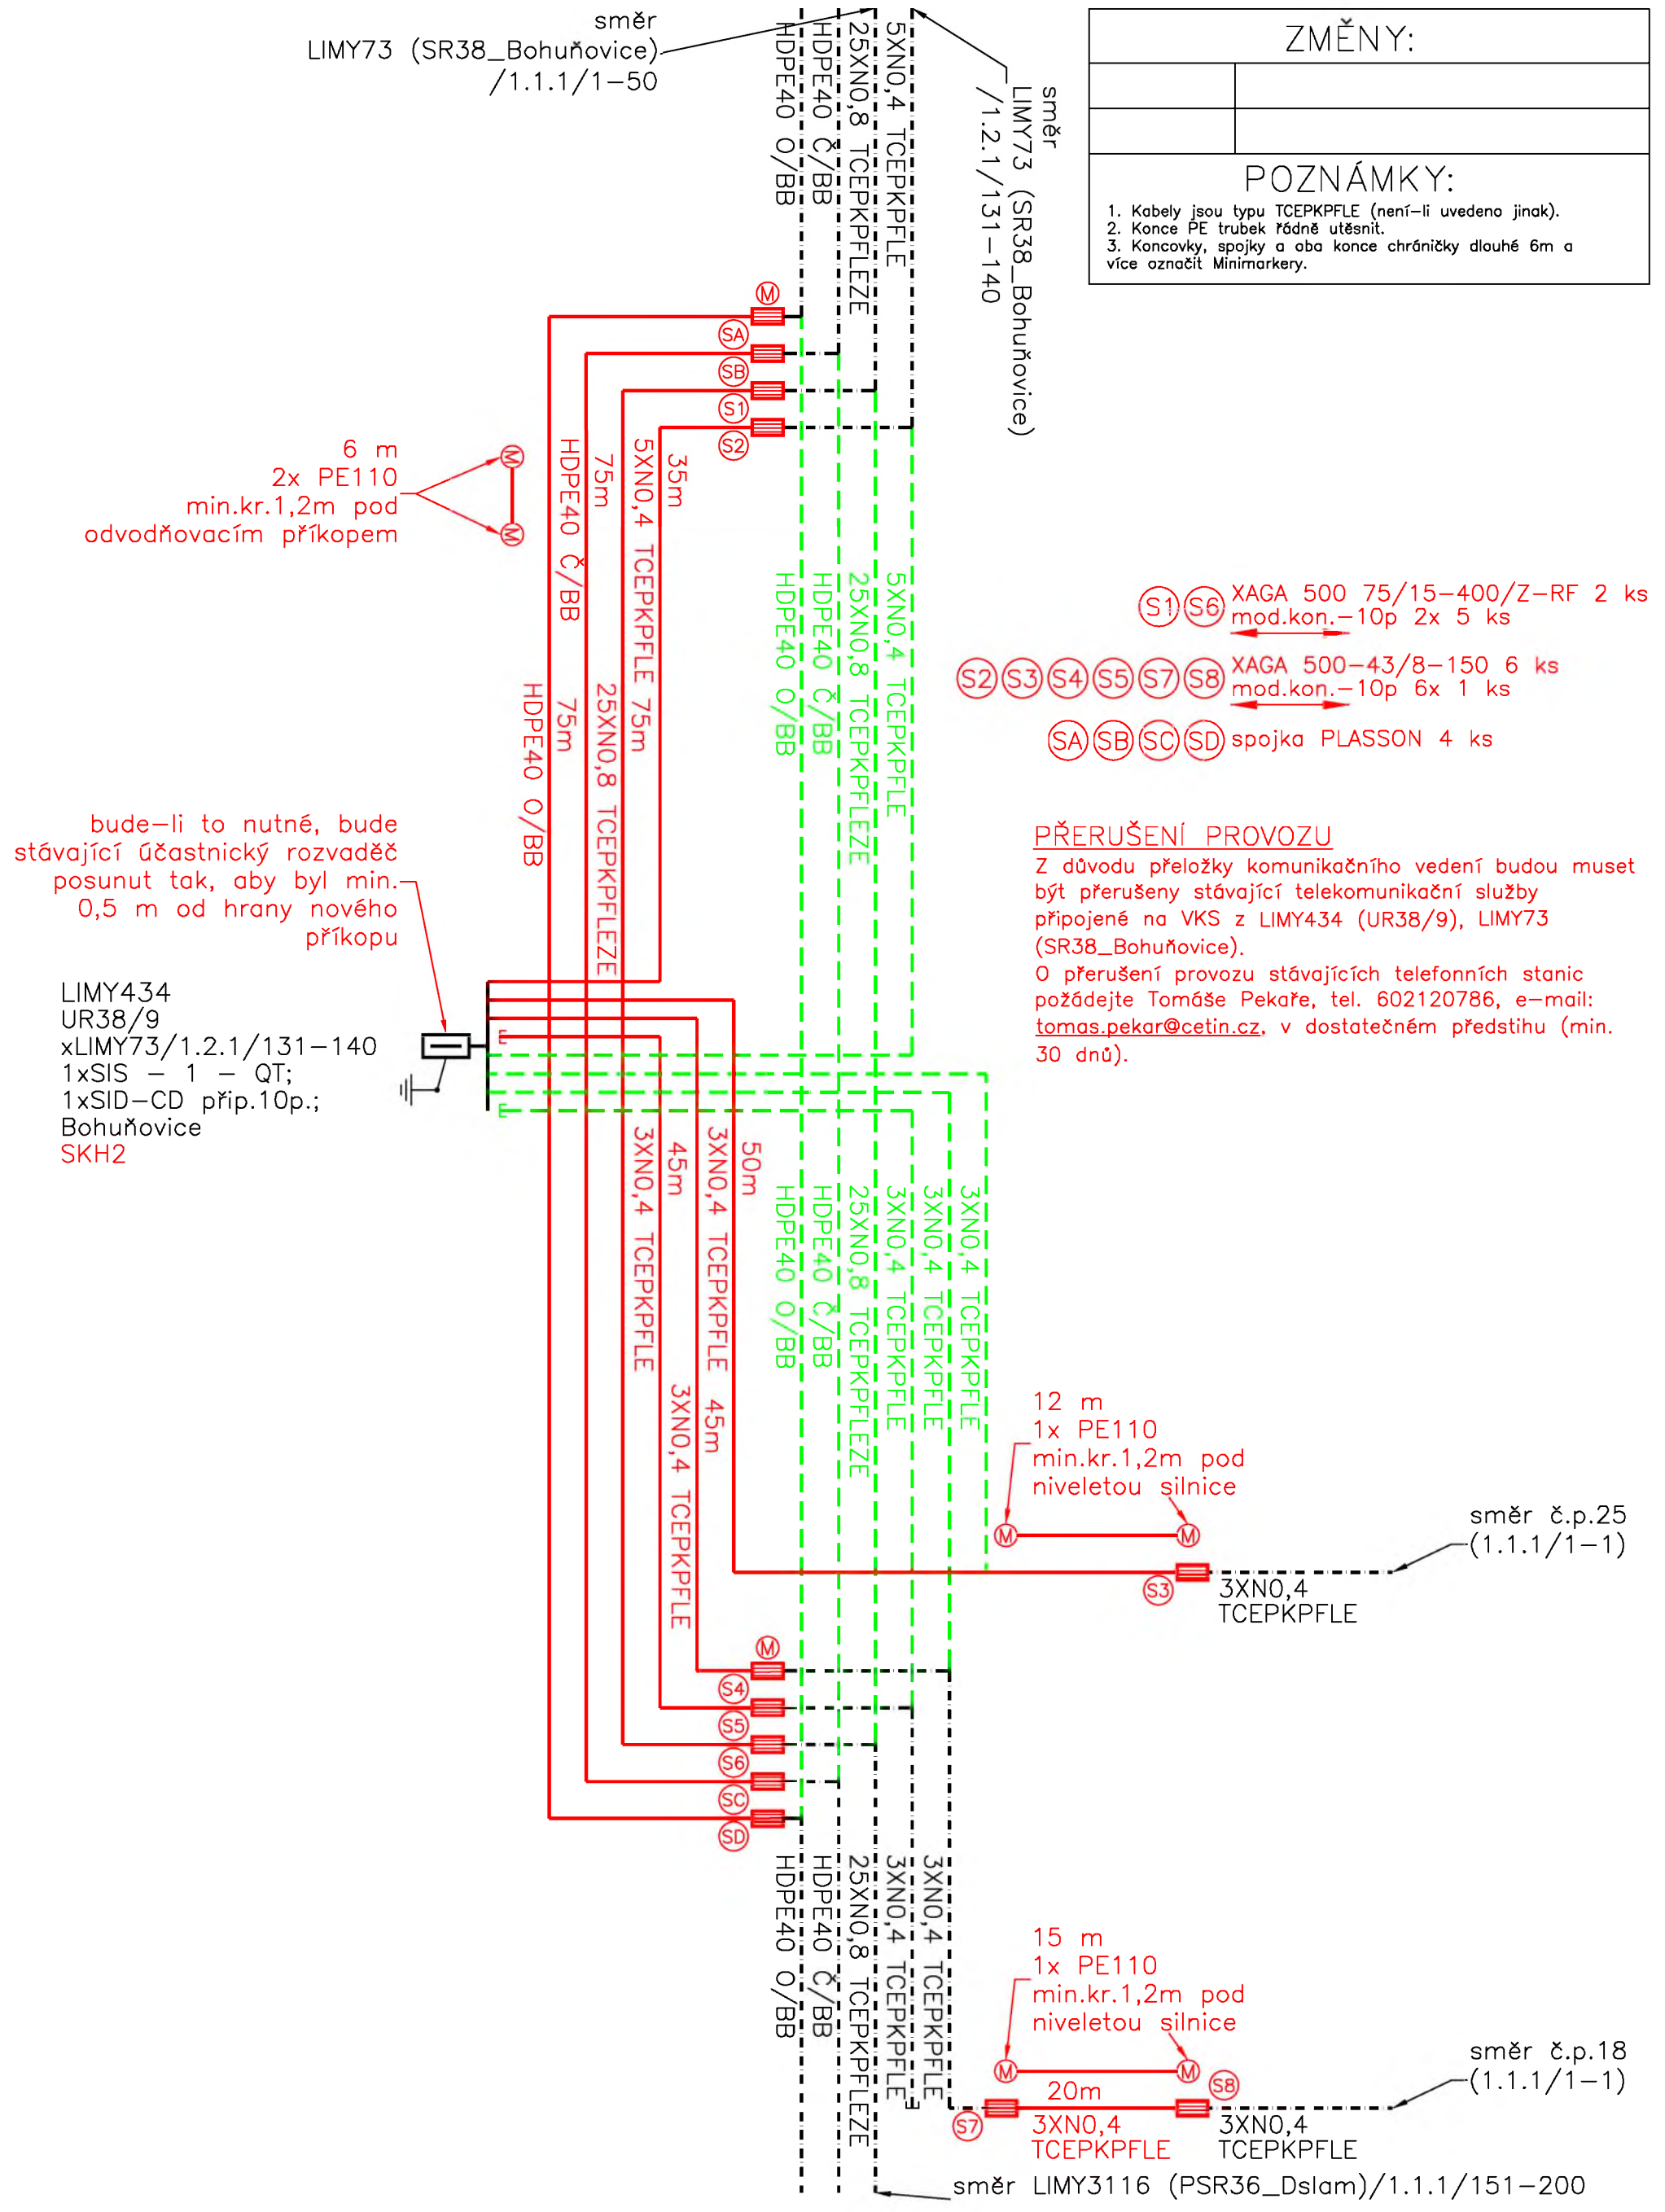

ZMĚNY:	
POZNÁMKY:	
1. Kabely jsou typu TCEPKPFLE (není-li uvedeno jinak). 2. Konce PE trubek řádně utěsnit. 3. Koncovky, spojky a oba konce chráničky dlouhé 6m a více označit Minimarkery.	

6 m  
2x PE110  
min.kr.1,2m pod  
odvodňovacím příkopem

bude-li to nutné, bude  
stávající účastnický rozvaděč  
posunut tak, aby byl min.  
0,5 m od hrany nového  
příkopu

LIMY434  
UR38/9  
xLIMY73/1.2.1/131-140  
1xSIS - 1 - QT;  
1xSID-CD příp.10p.;  
Bohuňovice  
SKH2

- (S1) (S6) XAGA 500 75/15-400/Z-RF 2 ks  
mod.kon.-10p 2x 5 ks
- (S2) (S3) (S4) (S5) (S7) (S8) XAGA 500-43/8-150 6 ks  
mod.kon.-10p 6x 1 ks
- (SA) (SB) (SC) (SD) spojka PLASSON 4 ks

**PŘERUŠENÍ PROVOZU**

Z důvodu přeložky komunikačního vedení budou muset být přerušeny stávající telekomunikační služby připojené na VKS z LIMY434 (UR38/9), LIMY73 (SR38\_Bohuňovice).  
O přerušení provozu stávajících telefonních stanic požádejte Tomáše Pekaře, tel. 602120786, e-mail: [tomas.pekar@cetin.cz](mailto:tomas.pekar@cetin.cz), v dostatečném předstihu (min. 30 dnů).

**LEGENDA:**

- NOVÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ
- RUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ
- NOVÁ ROVNÁ, ODBOČNÁ SPOJKA

Sítě k Vaším službám TEMO-TELEKOMUNIKACE o.s. U Záběhlického zámku 233/15 106 00 Praha 10	Investor: CETIN a.s. Českomoravská 2610/19, 190 00 Praha 9	Datum: I 2024
	Vypracoval: Ing. Lenka Bláhová tel.: 724542369, bprojekt@hotmail.com	Stupeň: DPS
Název zakázky: <b>II/317 Bohuňovice, napojení na D35</b>	Zodp. proj.: Ing. Lenka Bláhová	Měřítko: --
Název výkresu: <b>Schematický plán</b>	Formát: A3	SAP: ...
Č. výkresu: <b>1S</b>		



**Název stavby II/317 Bohuňovice, napojení na D35**

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	23 707,45 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	147 266,96 Kč
MONTÁŽ	57 808,36 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 570,23 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 570,23 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	7 570,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 347,76 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	1 012,10 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	60 851,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady:	330 705 Kč
z toho Příprava	31 278 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	276 756,19 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	53 949,06 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 523,13 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		18184.32 J	18 184,32 Kč
	Trasa úložná - do 0,100 km			
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		39.00 m	901,29 Kč
958767 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.50/130 rozš.o10cm		3.00 m	1 083,99 Kč
958766 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 50/130		1.00 m	1 625,96 Kč
958753 S	Rýha v trávě 50/130		79.00 m	63 594,21 Kč
958754 S	Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm		103.00 m	18 481,29 Kč
954962 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm		45.00 m	21 901,05 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		15.00 m	38 049,90 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		95.00 m	1 319,55 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks	309,72 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.		1.00 ks	1 210,56 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		150.00 m	774,00 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		4.00 ks	796,40 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		32.00 ks	1 466,88 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		28.00 ks	856,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		2.00 ks	214,34 Kč

955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	72.00 ks	2 751,84 Kč	
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	61,20 Kč	
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 630,88 Kč	
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické Projektová rezerva + koordinace	12300.00 J	12 300,00 Kč	
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.	2.00 ks	5 813,16 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	6.00 ks	8 723,46 Kč	
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozzeb	4.00 ks	241,84 Kč	
952602 S	Montáž trubky úložné	150.00 m	3 466,50 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	195.00 m	5 079,75 Kč	
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	75.00 m	2 406,00 Kč	
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	7.00 ks	211,61 Kč	
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 331,01 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	4674.00 JV	4 674,00 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 109,37 Kč	
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	7.00 ks	139,37 Kč	
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	549,39 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 570,23 Kč	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 570,23 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	7 570,64 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 247,02 Kč	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti	2000.00 JV	2 000,00 Kč	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 002,04 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	7 098,70 Kč	
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	238,43 Kč	
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	5.00 ks	214,45 Kč	
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	259,32 Kč	
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	5.00 ks	299,90 Kč	
POPLATKY				
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým Náhrada škod	2000.00 JV	2 000,00 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	16.00 m	64,64 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	79.00 m	365,77 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	438,00 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	160.00 m	3 012,80 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	35.00 m	816,90 Kč
300155 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8	75.00 m	26 908,50 Kč
316534 S		Koncovka smršt. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	68,11 Kč

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 928,08 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	16.00 ks	415,84 Kč
410636 S	Souprava čistící metallic. kabelů - velká	1.00 ks	482,02 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	6.00 ks	2 689,98 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	510,64 Kč
322270 S	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	2.00 ks	13 169,04 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	75.00 m	2 346,75 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	75.00 m	2 346,75 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	5.00 ks	4 246,90 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	12.00 m	639,48 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	4.00 ks	362,92 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	12.00 m	38,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč



Městský úřad Litomyšl  
odbor výstavby a územního plánování  
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 009115/2023  
Č.j. MěÚ Litomyšl 080837/2023  
Vyřizuje: Ing. Veronika Pitrová, tel. +420461653343

Litomyšl, dne 15.1.2024

## ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 stavebního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 8.2.2023 podal

**Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2,  
který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice  
č.p. 98, 533 53 Pardubice 19**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **II/317 Bohuňovice, napojení na D35 Bohuňovice**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 612/2 (trvalý travní porost), parc. č. 613 (trvalý travní porost), parc. č. 614 (orná půda), parc. č. 641/3 (trvalý travní porost), parc. č. 641/4 (trvalý travní porost), parc. č. 682 (orná půda), parc. č. 694 (orná půda), parc. č. 695 (orná půda), parc. č. 706/1 (orná půda), parc. č. 708 (zahrada), parc. č. 726/5 (ostatní plocha), parc. č. 774/1 (ostatní plocha), parc. č. 774/10 (ostatní plocha), parc. č. 774/11 (ostatní plocha), parc. č. 774/12 (ostatní plocha), parc. č. 777/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle.

Druh a účel stavby: dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostranství

#### **Stavba obsahuje:**

Stavba řeší směrovou a výškovou úpravu trasy komunikace II/317 na vjezdu do obce Bohuňovice ve směru od Sedliště, dále návrh vjezdové brány, chodníku, opravu zatrubněných sjezdů na pole, veřejné osvětlení, odvodnění vozovky, obnovu oplocení, přeložku vodovodu, plynovodu a sdělovacího vedení, návrh chrániček pro sdělovací kabely a objízdné trasy při stavbě.

Globální staničení je km 27,710 až 28,200. Silnice spadá do kategorie S7,5/90.

Oprava je započata v intravilánu obce Bohuňovice v místě sjezdu k RD č.p. 25 a je ukončena v extravilánu 60 m za vodojemy.

Celková délka úseku: 490 m

**STAVEBNÍ OBJEKTY:**

- SO 101 - Silnice II/317
- SO 134 - Chodník
- SO 182 - Dočasné dopravní opatření
- SO 301 - Odvodnění komunikace
- SO 340 - Přeložka vodovodu
- SO 431 - VO - Chodník
- SO 432 - VO Vjezdová brána a přípojka NN
- SO 451 - Chránička pro sdělovací sítě
- SO 460 - Přeložka sdělovacího vedení
- SO 501 - Přeložka STL plynovodu
- SO 701 - Obnovení oplocení

**SO 101 - SILNICE II/317**

Šířka asfaltového krytu je navržena 6,5 m + rozšíření ve směrovém oblouku. Směrově je silnice upravena ve směrovém oblouku km 0,063 - 0,114, zbývající část je zachována. Je navržena z přímých úseků s prostými kružnicovými oblouky o poloměrech 85-5000 m. Výškový návrh je upraven tak, aby průjezd byl plynulejší a bylo zlepšeno odvodnění příkopů. Podélný sklon silnice je 0,50 - 5,10%. Základní příčný sklon vozovky je 2,5% střechovitý, max. dostředný sklon je 6,0% u poloměru 85 m.

Je navržena kompletní konstrukce vozovky s krytem z asfaltového betonu. Zemní těleso bude upraveno do sklonu pláne min. 3,0%. Svahy budou ohumusovány v ti. 100m a osety travním semenem. Stávající betonové propustky budou vybourány - nově jsou navrženy plastové

**SO 134 CHODNÍK**

Jedná se o novostavbu chodníku podél komunikace II/317, který prodlužuje stávající chodník až na konec vjezdové brány.

Celková délka chodníku: 157 m

Šířka chodníku: 1,50 m

Chodník je navržen v příčném sklonu 2,0% spádovaném směrem do vozovky. Podél komunikace bude umístěna silniční bet. obruba převýšená 0,12 m, z druhé strany bude zahradní obruba. V km 0,045 - 0,075 bude místo zahradní obruby umístěna stěna z bet. palisády. V úseku km 0,130 - 0,189 bude chodník odpoután od silnice a po obou stranách lemován zahradními obrubami a příkopem. V km 0,151 bude provedena horská vpust.

**SO 182 DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky z důvodu výměny kompletní konstrukce vozovky a úpravě trasy.

**SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE**

Odvodnění krytu a pláne silnice je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do otevřených silničních příkopů nebo k bet. obrubě. Z příkopů je voda vedena do přirozených recipientů podél silnice, podél obrub jsou umístěny podobrubníkové vpusti.

Celkem je navrženo napojení 4 ks uličních vpustí, napojení propustku a připojení horských vpustí do koncové šachty s odváděním srážkových vod ze zpevněných ploch do vodoteče.

Stoka D1 je navržena z materiálu PP UR2 SN16 DN315 celkové délky 125,8 m. Napojení stoky do stávajícího odvodňovacího příkopu bude šachtou ŠD1-1 a ukončení stoky bude spojnou šachtou pro horské vpusti. Stoka D1 je ukončena šachtou ŠD 1-7. Do stoky jsou připojeny uliční vpusti, propustek a potrubí z horských vpustí do revizních šachet, popřípadě vysazením odbočky. Šachta ŠD1-2 slouží jako rozdělovací, ve dně šachty bude provedeno rozdělení do stávajícího příkopu a do obecní „nebezské nádrže“.

Odtok do obecní „nebezské“ nádrže je navržen z materiálu PP UR2 SN16 DN315 celkové délky 9,7 m. Začátek stoky je v šachtě ŠD1-2, rozdělením průtoku do obecní „nebezské“ nádrže a do silničního příkopu. Ukončení stoky je v průtočné uliční vpusti.

#### SO 340 PŘELOŽKA VODOVODU

Část stávající trasy vodovodu bude přeložena pod zpevněné plochy chodníku. Přeložka vodovodu bude napojena na stávající veřejný vodovod z LT DN125 přechodkou z litiny na plastové potrubí PE příslušné dimenze d140 s osazením šoupěte, trasa vodovodu je situována do zpevněné plochy nového chodníku. Výměna vodovodního potrubí bude provedena až na přírubu stávajícího vodojemu. Navrhovaný vodovodní řad bude z materiálu PE100 SDR11 RC D140 (DN125 v souběhu s kabelem veřejného osvětlení při dodržení odstupových vzdáleností). Vodovod nebude zokruhován.

#### SO 431 VO - CHODNÍK

Součástí toho SO je osvětlení chodníku v rozsahu od stávajícího osvětlovacího stožáru VO na p.č. 726/5 k vjezdové bráně (rozšiřující ostrůvek). Část od vjezdové brány k ceduli se začátkem obce je osvětlena v rámci SO 432.

Osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel instalovaných na 2 stožárech výšky 7 m, s osazením 2 m výložníku s 1 m vyložním. Napájení bude provedeno ze stávajícího stožáru VO na p.č. 726/5. Ze stožáru bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>.

#### SO 432 VO - VJEZDOVÁ BRÁNA A PŘÍPOJKA NN

Jedná se o osvětlení chodníku v rozsahu vjezdové brány v místě začátku obce. Současně s chodníkem bude osvětlena samotná brána (rozšiřující ostrůvek).

Součástí tohoto SO je i napájení vyhřívaného silničního zrcadla, které bude provedeno z nového rozvaděče RVO pomocí kabelu CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Napájecí kabely budou pod vozovkou vedeny pomocí protlaku DN1 s jednou chráničkou 110 mm.

#### SO 451 CHRÁNIČKA PRO SDĚLOVACÍ SÍŤ

Podél celé délky opravované komunikace dojde k umístění chrániček pro sdělovací kabely PVC110/94, do kterých budou umístěn 2xHDPE40/33.

#### SO 460 PŘEDLOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Z důvodu navrženého odvodnění SO 301 dojde k přeložení stávajícího sdělovacího kabelu spol. CETIN. Před staničením km 0,000 (tedy před začátkem trasy) bude stranově přeložen. V km 0,460 bude provedena výšková přeložka z důvodu snížení nivelety komunikace.

#### SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Jedná se o přeložku STL plynovodu PE d 63 RC SDR 11 o provozním přetlaku 0,3 MPa v délce cca 21 m. Dotčená jižní slepá větev stávajícího plynovodu PE d 50 je v konfliktní hloubce s plánovaným zatrubněním odvodnění komunikace, proto bude plynovod nově zahlouben tak, aby byl zajištěn vzájemný odstup obou zařízení při křížení min. 50 cm. Původní plynovod z PE bude zaslepen, odplyněn a ponechán v zemi.

#### SO 701 OBNOVENÍ OPLOCENÍ

Z důvodu vykácení souvislé řady lísky obecné podél komunikace v km 0,045 -0,130 bude provedena náhrada oplocením. Navržený betonový plot bude tvořen bet. sloupky tvaru H, do nichž se budou zasouvat bet. desky pohledově oboustranné s motivem štipaného kamene v šedé barvě. Výška plotu bude 2,5 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 612/2, 613, 614, 641/3, 641/4, 682, 694, 695, 706/1, 708, 726/5, 774/1, 774/10, 774/11, 774/12, 777/1 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle, st. p. 49/1, 95, 134, 150, parc.

č. 589, 622, 623, 632, 633, 640/1, 640/2, 641/1, 653/1, 656/1, 660/1, 671, 672, 683, 726/1, 726/2, 726/4, 726/8, 773/1, 774/6, 774/8 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle.

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou v 12/2021 vypracovala fi. MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto, pod zak.č. 2543-21-3, ověřil Ing. Jiří Herynek – ČKAIT 0701607, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel **oznámí** stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) po odstranění konstrukčních vrstev vozovky,
  - b) po provedení výkopových prací,
  - c) při provádění odvodnění komunikace,
  - d) při provádění přeložky vodovodu a STL plynovodu,
  - e) po dokončení úpravy zemní pláň – před pokládkou asfaltových souvrství,
  - f) **dokončení stavby**.
5. Stavba bude **dokončena do 5 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním polétavým prachem.
14. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
15. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
  - a) CETIN a.s. - č.j. 701817/22 ze dne 11.7.2022,
  - b) ČEPS, a.s. – zn. 04762/2022/TSV ze dne 24.5.2022,
  - c) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 001126024057 ze dne 30.5.2022,
  - d) GasNet Služby, s.r.o. - zn. 5002703277 ze dne 10.10.2022,
  - e) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, OMS Litomyšl – zn. SUSPK/5948/2022 a zn. SUSPK/5959/2022 ze dne 25.5.2022,
  - f) VHOS, a. s. – zn. Ing.MN/2022/9013572 a zn. Ing.MN/2022/9013571 ze dne 7.7.2022.

## 16. Budou dodrženy požadavky:

- a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko z hlediska vodního hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 035407/2022 ze dne 30.5.2022:**
- Je třeba koordinovat se stavbou Bohuňovice - řešení odvodnění silnice II/317, kterou vypracoval PČDP s.r.o. pro obec Bohuňovice. Stavba přeložky musí být řádně povolena.
- b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 035407/2022 ze dne 30.5.2022:**
- Při nakládání se stavebními a demoličními odpady je třeba dodržovat ust. § 42 vyhl. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
  - Doklady o způsobu využití případně odstranění odpadů vzniklých při stavebních předloží stavebník po ukončení prací na MěÚ Litomyšl, OŽP.
- c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - závazné stanovisko z hlediska vodního hospodářství sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl/046530/2022 ZP/Pac ze dne 17.8.2022:**
- Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace II/317 Bohuňovice, napojení na D35 SO 340 - Přeložka vodovodu, kterou vypracoval MDS projekt s.r.o. pod zak. č. 2543-21-3 v 12/2021 a autorizoval Ing. Milan Vopařl, DiS.
- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí - závazné stanovisko z hlediska ochrany ZPF č.j. MěÚ Litomyšl 067777/2022 ze dne 5.10.2022:**
- Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků**  
Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0392 ha). V tomto případě bude skrývána kulturní vrstva v tl. 25 cm o objemu 98 m<sup>3</sup>. Veškerá skrývka bude uložena na deponii na pozemku p.č. 613 v k.ú. Bohuňovice u Litomyšle. Po dokončení stavby bude rozprostřena a dále zemědělsky využívána na pozemcích p.č. 613 a 612/2 ve vlastnictví obce Vidlatá Seč. Než bude skrytá zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
  - V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její nepřekročení.
  - Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zem. půdní fond a jeho vegetační kryt.
  - Po dokončení výstavby, stavbu nechat geom. zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést do souladu se skutečností.
- e) **Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy - závazné stanovisko č.j. KHSPA 09342/2022/HOK-Sy ze dne 14.6.2022:**
- U kolaudace stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (včetně výluhových testů na tyto materiály).
  - U kolaudace bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části vodovodu.
- f) **Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství - závazné stanovisko č.j. KrÚ 84635/2022 ze dne 3.11.2022:**
- Další fáze projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se vznesenými požadavky správců inženýrských sítí, dotčených orgánů apod.
  - Před zahájením stavby bude dopravní situace projednána s příslušnými dotčenými orgány v dostatečném předstihu a to 45 dní.



- g) **Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti - závazné stanovisko č.j. KrÚ 55674/2022 ze dne 7.7.2022:**
- i) V případě neumožnění průjezdu autobusů přes stavbu dojde k narušení dopravní obslužnosti obcí Sedliště, Bohuňovice, Netřeby. Zhotovitel stavby je povinen zajistit na své náklady svoz cestujících a to do nejbližší obsluhované zastávky.
- h) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát - závazné stanovisko č.j. KRPE-46274-2/ČJ-2022-170906 ze dne 19.5.2022:**
- i) Při realizaci akce budou celkově dodrženy ČSN 736101+Z1 - projektování silnic a dálnic, ČSN 736110 - projektování místních komunikací, ČSN 736102+Z1 - projektování křižovatek, vyhláška MDS č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 736114 - Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování, TP 170 - Navrhování pozemních komunikací a TP 145 - Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.
- ii) Plocha vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle platné ČSN a TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Napojení mezi novou a stávající živičnou plochou musí být plynulé a bez převýšení.
- iii) U nové chodníkové plochy musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky MDS Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Základní šířka chodníkové plochy bude 1,50 m.
- iv) Při osvětlení komunikace a ostrůvku vjezdové brány budou dodrženy dále ČSN EN 13201 - Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120- TN/3 ze dne 2.2.2015, zvláště pak příloha č. 1 (str. 19): přisvětlování přechodů.
- v) Průjezd vjezdovou branou vychýleným jízdním pruhem musí být bezpečné i pro největší a nejdelší přípustné vozidlo. Má být dobře rozeznatelný i za snížené viditelnosti, proto bude osvětlen.
- vi) Při realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP 65 - Zásady pro dopravní značení na PK a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení a vodorovné DZ ČSN EN 14361-A1 Vodorovné dopravní značení.
- vii) Nové trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy s vyjádřením zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
- viii) Závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 1.10 Svitavy, Dopravního inspektorátu jako dotčeného orgánu bude třeba také k rozhodnutí příslušného správního úřadu ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ust. § 25, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích z důvodu:
- umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech na podkladě § 25 odst. 6 písm. d) nebo
  - umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 nebo
  - při provádění stavebních prací na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3.
  - V žádostech musí být mimo jiné uvedeno o jakou komunikaci se jedná - třída, číslo. U místní komunikace kategorie a parcelní číslo.

- ix) Při akci dojde k celkové uzavírcce předmětné komunikace, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, Dopravního inspektorátu jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
- Uzavírka musí být dle § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění projednána, proto doporučujeme v dostatečném předstihu vyvolat společné jednání pro stanovení objízdných tras. S návrhem dle PD předběžně souhlasíme.
- x) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.
- i) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát - závazné stanovisko č.j. KRPE-47835-2/ČJ-2022-170906 ze dne 24.5.2022:**
- i) Plocha připojení bude odvodněna tak, aby srážková voda nevytékala na silnici a naopak. Dešťové vody z připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením. Připojení bude zpevněné, bezprašné a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a znehodnocování silnice. Pokud budou u sjezdu umístěny brány nebo vrata, musí být jejich otevírání zajištěno tak, aby nezasahovalo do průjezdního profilu komunikace.
- ii) Nadále budou dodrženy rozhledové poměry podle ČSN 736110-1-Z1 (čl. 12.8). Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce  $\leq 0,15$  m a ve vzdálenosti  $> 10$  m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom).
- iii) Budou dodrženy podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím podle § 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí.
- iv) Připojení musí navazovat plynule na niveletu komunikace a jeho šířka musí umožňovat vozidlům, která jej budou využívat, plynulé odbočení ze silnice nebo místní komunikace a výjezd na ně.
- v) Během stavby nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na komunikaci silnice II/317. V opačném případě je nutné místa zásahu označit na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy, přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný pověřený silniční správní úřad.
- vi) Vlastník připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně případného propustku. Stavbou nesmí docházet ke znečištění a poškození silnice, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
- vii) Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily přechodné překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh). Tyto přechodné překážky budou v případě výskytu odstraňovány.
- j) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát - závazné stanovisko č.j. KRPE-47835-3/ČJ-2022-170906 ze dne 24.5.2022:**
- i) Při stavbě dojde k omezení uvedené komunikace silnice II/317, proto budou práce probíhat pod ochranou přenosného dopravního. Zhotovitelem bude třeba místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
- ii) Písemné závazné stanovisko a souhlas Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy bude třeba k rozhodnutí příslušného správního úřadu ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ust. § 25, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění v případě:

- umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.) na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2., nebo
  - při provádění stavebních prací na podkladě § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. cit. zákona.
- iii) Při akci je třeba dbát na bezpečnost práce zejména, aby nedošlo k poškození na majetku nebo na zdraví účastníků silničního provozu.
- iv) Zásahy do komunikace budou maximálně dostatečně zhutněny dle příslušných platných TP a ČSN a povrch dán do původního stavu dle TP170. Nelze připustit dodatečné propadání povrchu vozovky.
- k) **Ministerstvo obrany ČR**, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, **oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno - závazné stanovisko SpMO 22470/2022-1322-310 ze dne 27.5.2022:**
- i) Při uzavírci či omezení silnice II/317 požadují tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- ii) Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, email: obermajerovak@army.cz
17. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
18. **Dokončenou stavbu**, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu** (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
  - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury*),
  - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
  - d) další doklady stanovené právními předpisy.
20. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

III. V souladu s ustanovením § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebníkovi podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a v návaznosti na závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, které vydal Obecní úřad Bohuňovice dne 22.8.2022

### p o v o l u j e k á c e n í

dřevin dle níže uvedené tabulky:

p.p.č.	k.ú.	počet	druh	Obvod v 130 cm nad zemí	Vlastník pozemku
612/2	Bohuňovice u Litomyšle	3	jabloň	111, 110, 128	Obec Bohuňovice
641/4	Bohuňovice u Litomyšle	1	jabloň	154	Obec Bohuňovice

774/1	Bohuňovice u Litomyšle	14	jabloň	92, 110, 109, 149, 113, 138, 144, 110, 165, 105, 123, 96, 92, 95	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
774/1, 708	Bohuňovice u Litomyšle	160 m <sup>2</sup>	Líska obecná	Plošná zeleň 0,045-0,130	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Jiří Mikulecký

#### IV. Stanovuje podmínky pro provedení kácení:

1. Kácení i následný úklid je možné provést v době vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Protože se období vegetačního klidu v jednotlivých letech významným způsobem liší, je vždy nutné přihlídnout ke klimatickým podmínkám v daném roce (např. sdělení ohledně ukončení či začátku období vegetačního klidu, odlišného od obecně uznávaného - na webových stránkách vydává MŽP), kdy je nutné dbát zvýšeného ohledu především při jarním termínu provádění prací. **Kácení je však možné provést výlučně v období mimo hlavní období hnízdění ptactva tj. od 1.4. do 30.8. běžného roku.**
2. Žadatel je povinen veškerou dřevní hmotu zlikvidovat
3. Žadatel odpovídá za případné vzniklou škodu dle občanského zákoníku.

#### Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2  
 Obec Bohuňovice, Bohuňovice č.p. 13, 570 01 Litomyšl  
 Klára Hamerská, nar. 19.5.1983, Stanislava Manharda č.p. 3404/16, 796 01 Prostějov 1  
 David Prokeš, nar. 6.5.1992, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00 Praha 4-Nusle  
 Jiří Mikulecký, nar. 15.4.1966, Bohuňovice č.p. 18, 570 01 Litomyšl  
 Miroslav Jílek, nar. 11.12.1948, Bohuňovice č.p. 59, 570 01 Litomyšl  
 Antonín Podškubka, nar. 25.1.1945, Bohuňovice č.p. 45, 570 01 Litomyšl  
 Jana Podškubková, nar. 15.5.1946, Bohuňovice č.p. 45, 570 01 Litomyšl  
 David Prokeš, nar. 6.5.1992, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00 Praha 4-Nusle  
 Zemědělské obchodní družstvo Sedliště, Sedliště č.p. 73, 570 01 Litomyšl  
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
 CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
 GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
 VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1  
 ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 10

#### Odůvodnění:

Dne 8.2.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 612/2, 613, 614, 641/3, 641/4, 682, 694, 695, 706/1, 708, 726/5, 774/1, 774/10, 774/11, 774/12, 777/1 v katastrálním území Bohuňovice u Litomyšle,

- dokumentace, kterou v 12/2021 vypracovala fi. MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto, pod zak.č. 2543-21-3, ověřil Ing. Jiří Herynek – ČKAIT 0701607,
- závazná stanoviska sdělili:
  - a. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování – závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 036419/2022 ze dne 23.5.2022,
  - b. Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení stavebního úřadu - závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 062134/2022 ze dne 23.8.2022 a č.j. MěÚ Litomyšl 077751/2022 ze dne 17.10.2022,
  - c. Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 035407/2022 ze dne 30.5.2022 a č.j. MěÚ Litomyšl 092552/2022 ze dne 20.1.2023, závazné stanovisko sp.zn. SZ MěÚ Litomyšl/046530/2022 ZP/Pac ze dne 17.8.2022, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 067777/2022 ze dne 5.10.2022,
  - d. Obecní úřad Bohuňovice – závazné stanovisko k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 22.8.2022,
  - e. Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, OSH - závazné stanovisko č.j. KrÚ 84635/2022 ze dne 3.11.2022,
  - f. Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, ODO - závazné stanovisko č.j. KrÚ 55674/2022 ze dne 7.7.2022,
  - g. dne 3.11.2022,
  - h. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ, OIP - závazné stanovisko č.j. KrÚ 45958/2022/OŽPZ/Bü ze dne 7.6.2022,
  - i. Policie České republiky, Krajské ředitelství PPK, ÚO Svitavy, Dopravní inspektorát - závazné stanovisko č.j. KRPE-46274-2/ČJ-2022-170906 ze dne 19.5.2022, č.j. KRPE-47835-2/ČJ-2022-170906 ze dne 24.5.2022 a č.j. KRPE-47835-3/ČJ-2022-170906 ze dne 24.5.2022
  - j. Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, OOÚZ a SOD, OOÚZ, pracoviště OÚZ Brno - závazné stanovisko SpMO 22470/2022-1322-310 ze dne 27.5.2022,
  - k. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ÚP Svitavy - závazné stanovisko č.j. KHSPA 09342/2022/HOK-Sy ze dne 14.6.2022.
- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství vydal dne 23.8.2022 rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 37543/2022 o povolení komunikačních připojení,
- Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství vydal dne 23.8.2022 rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 37544/2022 o povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku,
- Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - stanovisko zn. KrÚ 40735/2022/OŽPZ ze dne 7.6.2022,
- Ministerstvo obrany ČR, agentura logistiky, RSVD Hradec Králové – stanovisko č.j. MO 195821/2022-5512HK ze dne 20.5.2022,
- Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. (NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.) vydalo dne 25.5.2022 stanovisko k projektové dokumentaci zn. 023220039,
- Regionální muzeum v Litomyšli vydalo dne 8.6.2022 sdělení k záměru č.j. RML/387/22/Ne-360/1,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: CETIN a.s., ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., SUS Pardubického kraje, OMS Litomyšl, VHOS, a. s.
- smlouvy s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury:
  - a. GasNet Služby, s.r.o. – smlouva č. 4000244740.

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,

- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- a) stavebníka (Pardubický kraj),
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Bohuňovice),
- c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Pardubický kraj, Obec Bohuňovice)
- d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Pardubický kraj, Obec Bohuňovice, Klára Hamerská, David Prokeš, Jiří Mikulecký, Miroslav Jílek, Antonín Podškubka, Jana Podškubková, David Prokeš, Zemědělské obchodní družstvo Sedliště, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., VHOS, a. s., ČEPS, a.s.)
- e) osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Obec Bohuňovice, AGRO 2000 s.r.o., Božena Dvořáková, Marcela Franková, Jan Chamas, Věra Chamasová, Jitka Janecká, Ing. Josef Jílek, Josef Kašpar, Jiří Mikulecký, Hana Pospíšilová, Marie Šilarová, Ing. Jan Vaňous, Zemědělské obchodní družstvo Sedliště).

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí nebo doručení veřejnou vyhláškou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu,

nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Podmínky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou soukromoprávního charakteru a které s předmětem tohoto řízení přímo nesouvisí, nelze na základě tohoto rozhodnutí vymáhat.

Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Veronika Pitrová, DiS.  
referentka odboru výstavby  
a územního plánování

#### **Přílohy:**

- grafická příloha - koordinační situace
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 15 tohoto rozhodnutí.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

účastníci dle § 94k odst. a) - žadatel (doručenky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  
Pardubice 2



účastníci dle § 94k odst. b) – obec (doručenky)

Obec Bohuňovice, IDDS: ha2btdi

sídlo: Bohuňovice č.p. 13, 570 01 Litomyšl

účastníci dle § 94k odst. d) – vlastníci pozemku nebo jiné věcné právo (doručenky)

Klára Hamerská, Stanislava Manharda č.p. 3404/16, 796 01 Prostějov 1

David Prokeš, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00 Praha 4-Nusle

Jiří Mikulecký, Bohuňovice č.p. 18, 570 01 Litomyšl

Miroslav Jílek, Bohuňovice č.p. 59, 570 01 Litomyšl

Antonín Podškubka, Bohuňovice č.p. 45, 570 01 Litomyšl

Jana Podškubková, Bohuňovice č.p. 45, 570 01 Litomyšl

David Prokeš, Pod pramenem č.p. 1504/4, 140 00 Praha 4-Nusle

Zemědělské obchodní družstvo Sedliště, IDDS: 37prj77

sídlo: Sedliště č.p. 73, 570 01 Litomyšl

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47

sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 10

účastníci dle § 94k odst. e) – vlastníci sousední stavby či pozemku nebo jiné věcné právo (doručenky)

AGRO 2000 s.r.o., IDDS: xfnm53t

sídlo: U Barborky č.p. 90/1, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Božena Dvořáková, Bohuňovice č.p. 21, 570 01 Litomyšl

Marcela Franková, V. K. Jeřábka č.p. 114, Záhradí, 570 01 Litomyšl

Jan Chamas, Libčická č.p. 312/29, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 8

Věra Chamasová, Libčická č.p. 312/29, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 8

Jitka Janecká, Svatý Jiří č.p. 31, 565 01 Choceň 1

Ing. Josef Jílek, Hrušová č.p. 109, 565 55 VM Hrušová

Josef Kašpar, Bohuňovice č.p. 10, 570 01 Litomyšl

Hana Pospíšilová, Dukelská č.p. 374, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Marie Šilarová, Králická č.p. 444, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

Ing. Jan Vaňous, Bažantnice č.p. 134, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

dotčené orgány

Obecní úřad Bohuňovice, IDDS: ha2btdi

sídlo: Bohuňovice č.p. 13, 570 01 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 1907/2, 568 02 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3



# POVĚŘENÍ

Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

## **Luboše Mináře**

Supervizor, VFS Čechy východ

os. č. 70490, nar. dne 12.1.1995, bytem Kostelecká 1128, Náchod, PSČ 547 01  
(„Zaměstnanec“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích a rozhodnutí odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

\*\*\*

*Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užítých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.*



Elektronicky podepsáno

CETIN a.s.  
12:18 14.11.2023  
RSA/4096

Elektronicky podepsáno

CETIN a.s.  
12:09 14.11.2023  
RSA/4096

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl Pr, vložka 162

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	28. srpna 2002
<b>Spisová značka:</b>	Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Název:</b>	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
<b>Sídlo:</b>	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
<b>Identifikační číslo:</b>	000 85 031
<b>Právní forma:</b>	Příspěvková organizace
<b>Předmět činnosti:</b>	<p>výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti Pardubického kraje,</p> <p>správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace,</p> <p>opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.</p> <p>Doplňková činnost:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej,</li><li>- provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování</li><li>- silniční doprava nákladní,</li><li>- inženýrská činnost v investiční výstavbě,</li><li>- ubytovací činnost.</li></ul>
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Ředitel:</b>	<p>Ing. ZDENĚK VAŠÁK, dat. nar. 12. dubna 1978 č.p. 111, 537 01 Tuněchody Den vzniku funkce: 1. září 2023</p>
<b>Způsob jednání:</b>	<p>Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace</p>
