

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2024/00049**

mezi

CETIN a.s.

a

Olomoucký kraj

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Gabrielem Peškem, manažerem výstavby a údržby fixní sítě ČR

(dále jen „**CETIN**“)

a

Olomoucký kraj

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc 779 00
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím Odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Ohrozim spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 24.11.2023 vydané pod čj. 326072/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II-150**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) podat žádost o vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a učinit nezbytné kroky směřující k vydání rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
- (iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky), vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **796.890,- Kč** (slovy: sedm set devadesát šest tisíc osm set devadesát korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do jednoho (1) měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **96.859,- Kč** (slovy: devadesát šest tisíc osm set padesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín
funkce: vedoucí Odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
e-mail: m.kubin@olkraj.cz, tel.: 585 508 532, 724 062 412

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
Registr smluv: ANO

systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00049
 Číslo smlouvy Stavebníka: 2024/02574/OI/DSM

SAP S/4 Hana: 8030005006
 Registr smluv: ANO

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu s unesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 05. 12. 2006 podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

12.16 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


CETIN:

V Praze dne _____

Stavebník:

V _____ dne _____

**Gabriel
Pešek**

 Digitálně podepsal Gabriel Pešek
Datum: 2024.06.10 11:44:06 +02'00'

CETIN a.s.
Gabriel Pešek
Manažer výstavby a údržby fixní sítě ČR

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí Odboru investic

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI – metalická a optická přístupová přístupová síť
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

66039/24/0009, VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II/150

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko

Zpracovatel

Předkladatel

Vedoucí:
Manažer:

Schvaluje

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	66039/24/0009, VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II/150
Kategorie:	AN - Přístupová síť
Podkategorie:	VPI - metalická a optická přístupová síť
Typ investice:	Přeložka stávajících metalických a optických kabelů
Důvod 1:	
Číslo interní:	
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0,000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0,000 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,000 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů	0,000 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	Stavební titul: Na základě komunikace se zást. investora – bude OL. kraj požadovat provedení přeložky včetně získání UR od CETINU
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	
Plánované ukončení přípravy:	
Plánované zahájení realizace:	2026
Plánované ukončení realizace:	
Nabídka k přejímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

SD stavby “ 66039/24/0009, VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II-150“.

V rámci stavby „**SILNICE II/150 OHROZIM - OBCHVAT**“ v obci Ohrozim, dojde k dotčení podzemních vedení sítí elektronických komunikací CETIN. Tento CTN řeší přeložku těchto sítí.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem.

2.2 Navrhované řešení:

Stávající stav

V prostoru projektované okružní křižovatky a obchvatu obce Ohrozim vedou dvě trasy metalických a optických kabelů, které budou dotčeny stavbou. Jedná se o trasu nové sítě kabelu PPFL100xn0,6 (pro SR PLML20) a HDPE trubek s OK 662.LAB a v druhé trase je starý neprovozovaný metalický kabel.

Technické řešení

Výkresy situace a návrhu přeložky byly převzaty z podkladů investora.
Před provedením je nutno provést vytýčení stávajících tras, včetně hloubek uložení.

Přeložka kabelů nové sítě a OK 66.LAB

Stávající trasa bude vytýčena. Nová trasa bude vykopána dle podkladů a koordinace s investorem.

Do nové trasy bude uložen kabel stejného typu a dimenze, tj. PPFL100XN0,6, který bude na stávající kabel přepojen v nových metalických spojkách XAGA500.

Dále budou do nové trasy uloženy HDPE40 O/BB a C/BB.

Následně na základě povolení PEW bude provedeno přeložení stávajícího OK 662.LAB (MIDIA 24f Cu).

DOK bude odpojen v optické spojce OS01 (Coyote DTC) a bude vyfouknut v délce cca 750 m pře přeložku.

Po propojení HDPE 40 O/BB na stáv. trasu bude zafouknut zpět a opět propojen ve spojce OS01.

Trasa kabelu a HDPE trubek povede pod projektovanou komunikací v PE 125 s krytím min 1,3m.

V PPD je křížení trasy komunikace navrženo řízeným protlakem – v případě koordinace se zhotovitelem stav. prací je možno provést výkopem – cena bude účtována dle skutečných prací

Při realizaci je nutné koordinovat trasu, a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu.

Přeložka kabelu neprovozovaného kabelu staré sítě

Stávající kabel již není uveden ve schéma (15XN0,6), proto bude vykopána trasa přeložky a do ní bude uložen kabel PPFL100XN0,6 pro možnost vytýčení rezervní HDPE40 O/BB. Na stávající kabel bude kabel propojen ve spojkách XAGA500.

Trasa kříží stávající komunikaci II/150 podvrtem v chrániče PE125.

Trasa přeložky je vedena v kat. území Ohrozim, vlastníci parcel jsou v příloze.

Po realizaci stavby, bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, budou vyhotoveny geometrické plány a budou uzavřeny konečné smlouvy o zřiz. VBŘ.

Konce chrániček budou označeny Minimarkery.

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ne
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Rezervy budou označeny Minimarkerem 3M, typ 1255.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení
POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření

2.6 Koordinace:

Akci nutno koordinovat se stavbou „SILNICE II/150 OHROZIM - OBCHVAT“.

2.7 Ostatní:

Stavebník: Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, zast. Ing.Miroslavem Kubínem, vedoucím odb. investic na základě pověření hejtmána ze dne 10.10.2017, IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka OL, č.ú. 2955812/0800,

e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky: [redacted]

Stavební titul: Na základě komunikace se zást. investora – bude Ol. kraj požadovat provedení přeložky včetně získání UR od CETINU

Realizace zahájení stavby / překládky stavebník předpokládá: 2026

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekcii práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

Navazující akce - vložené:







Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

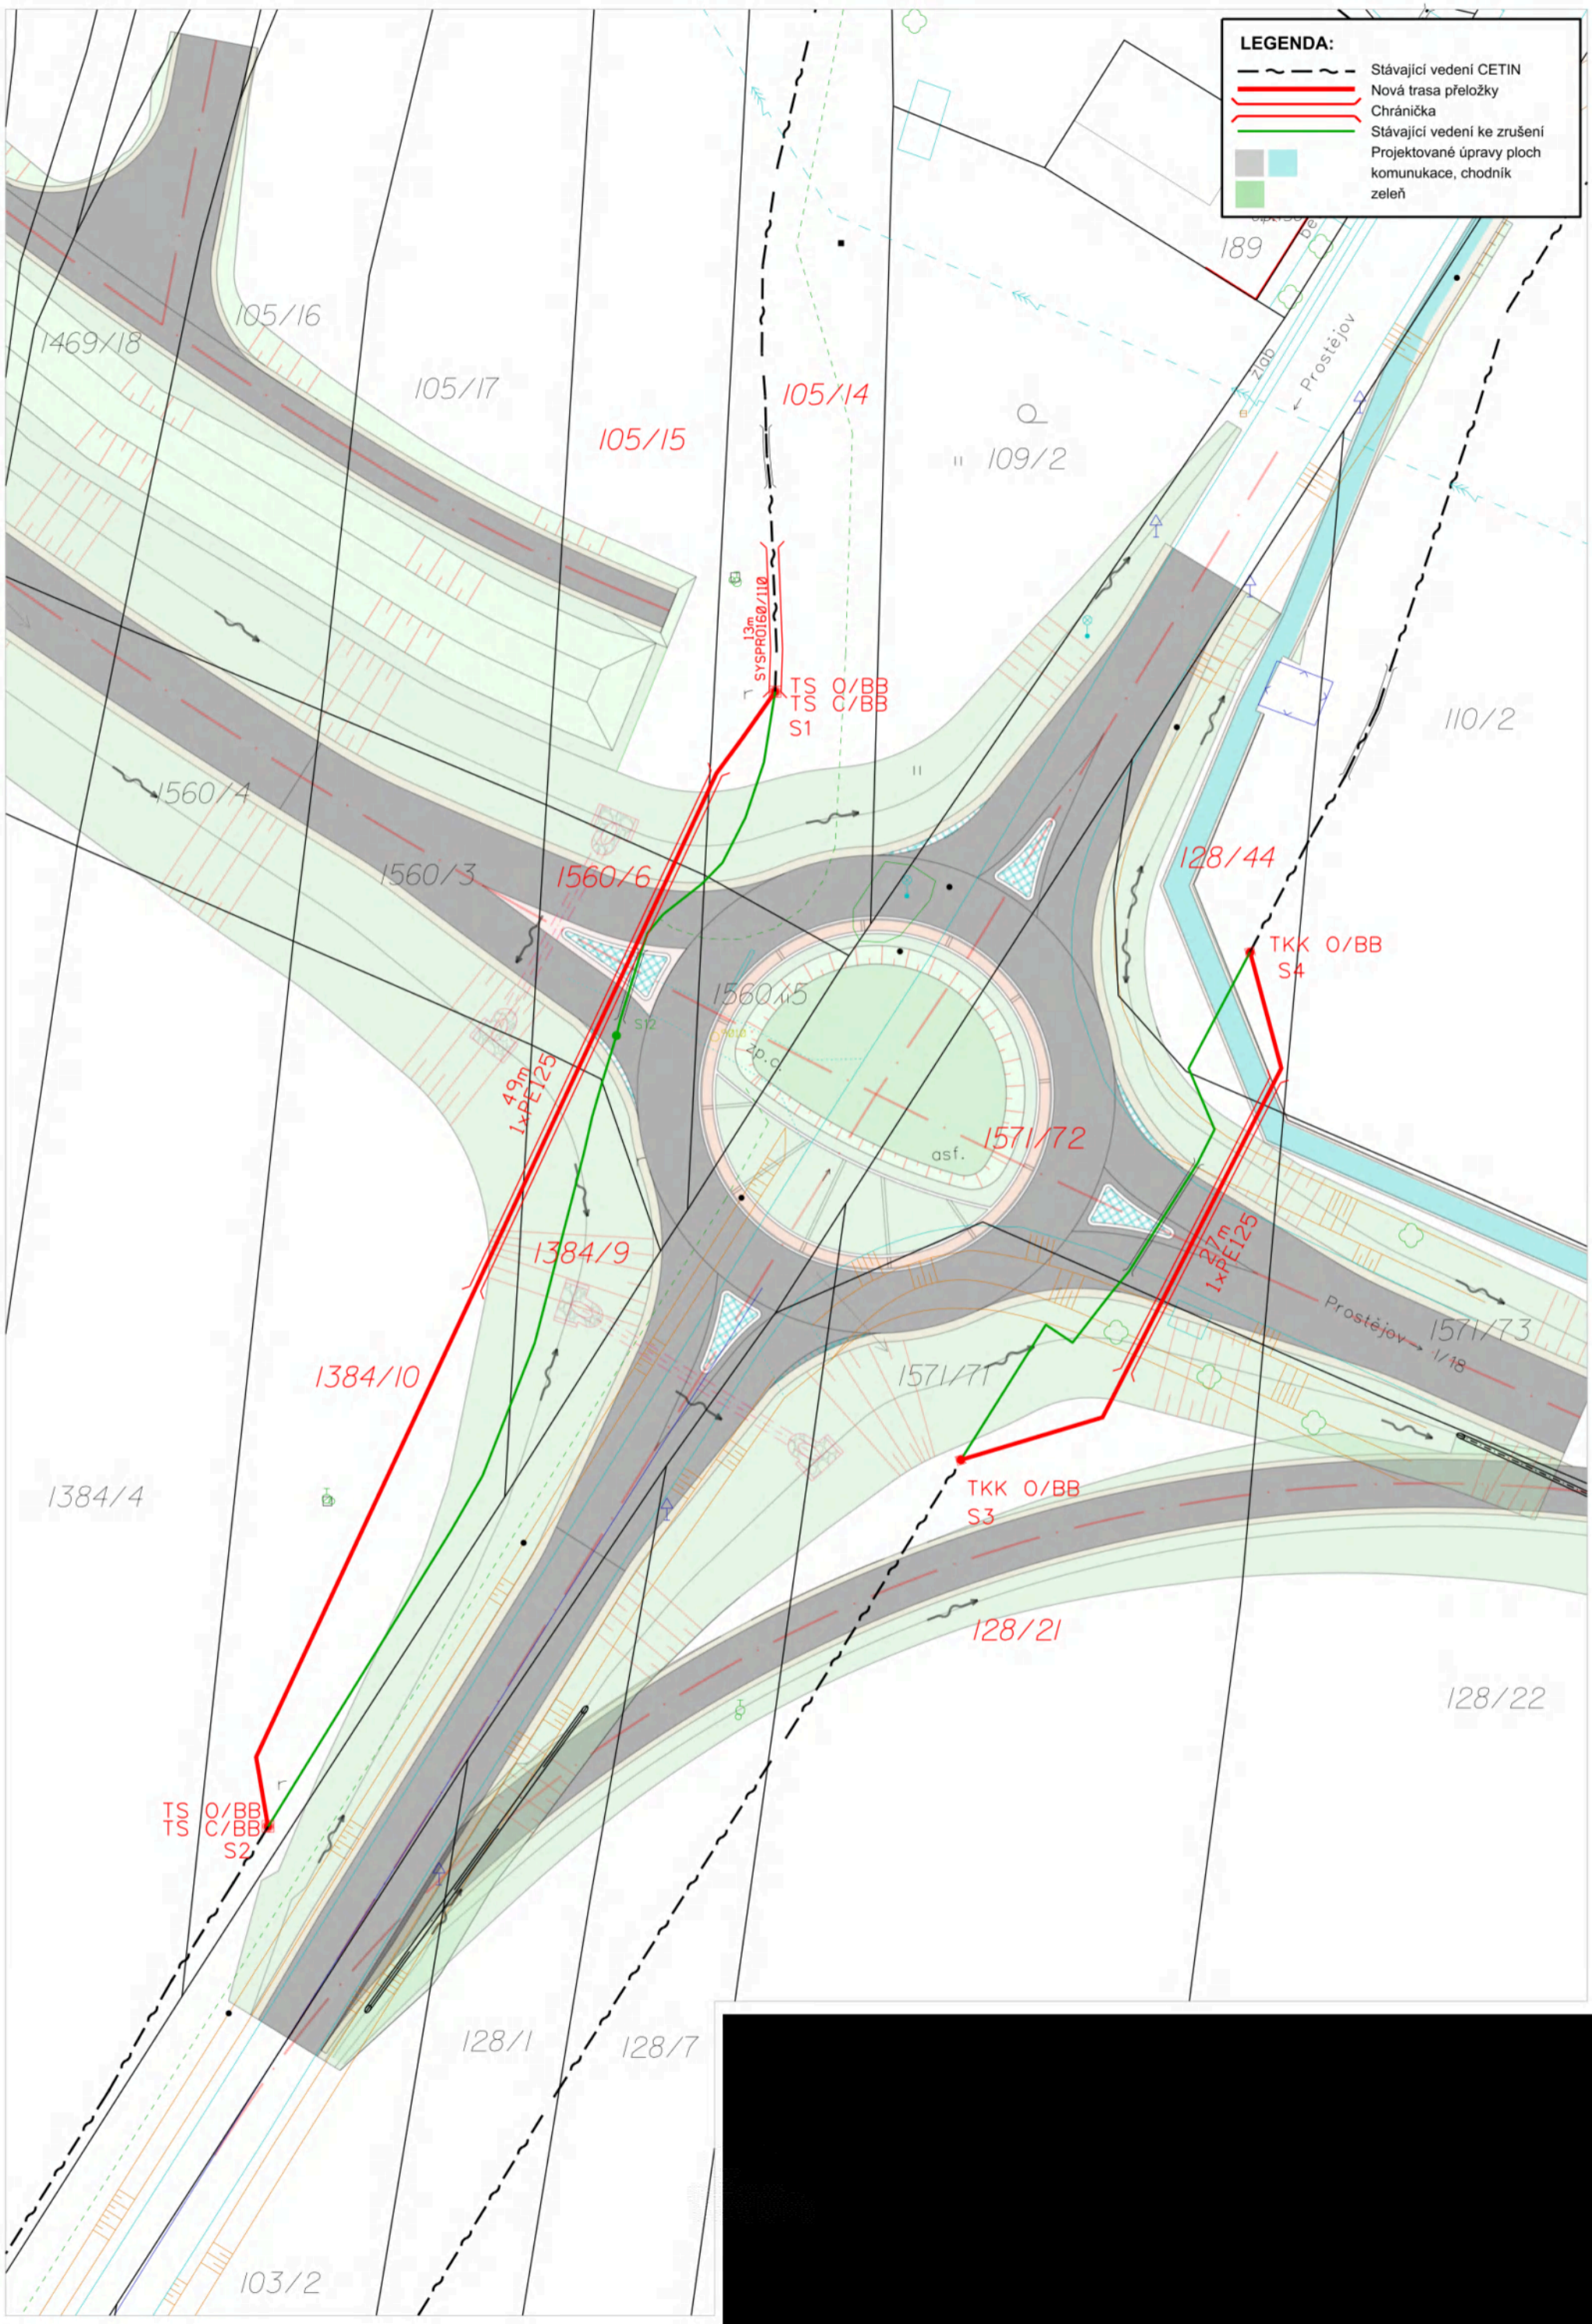
4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

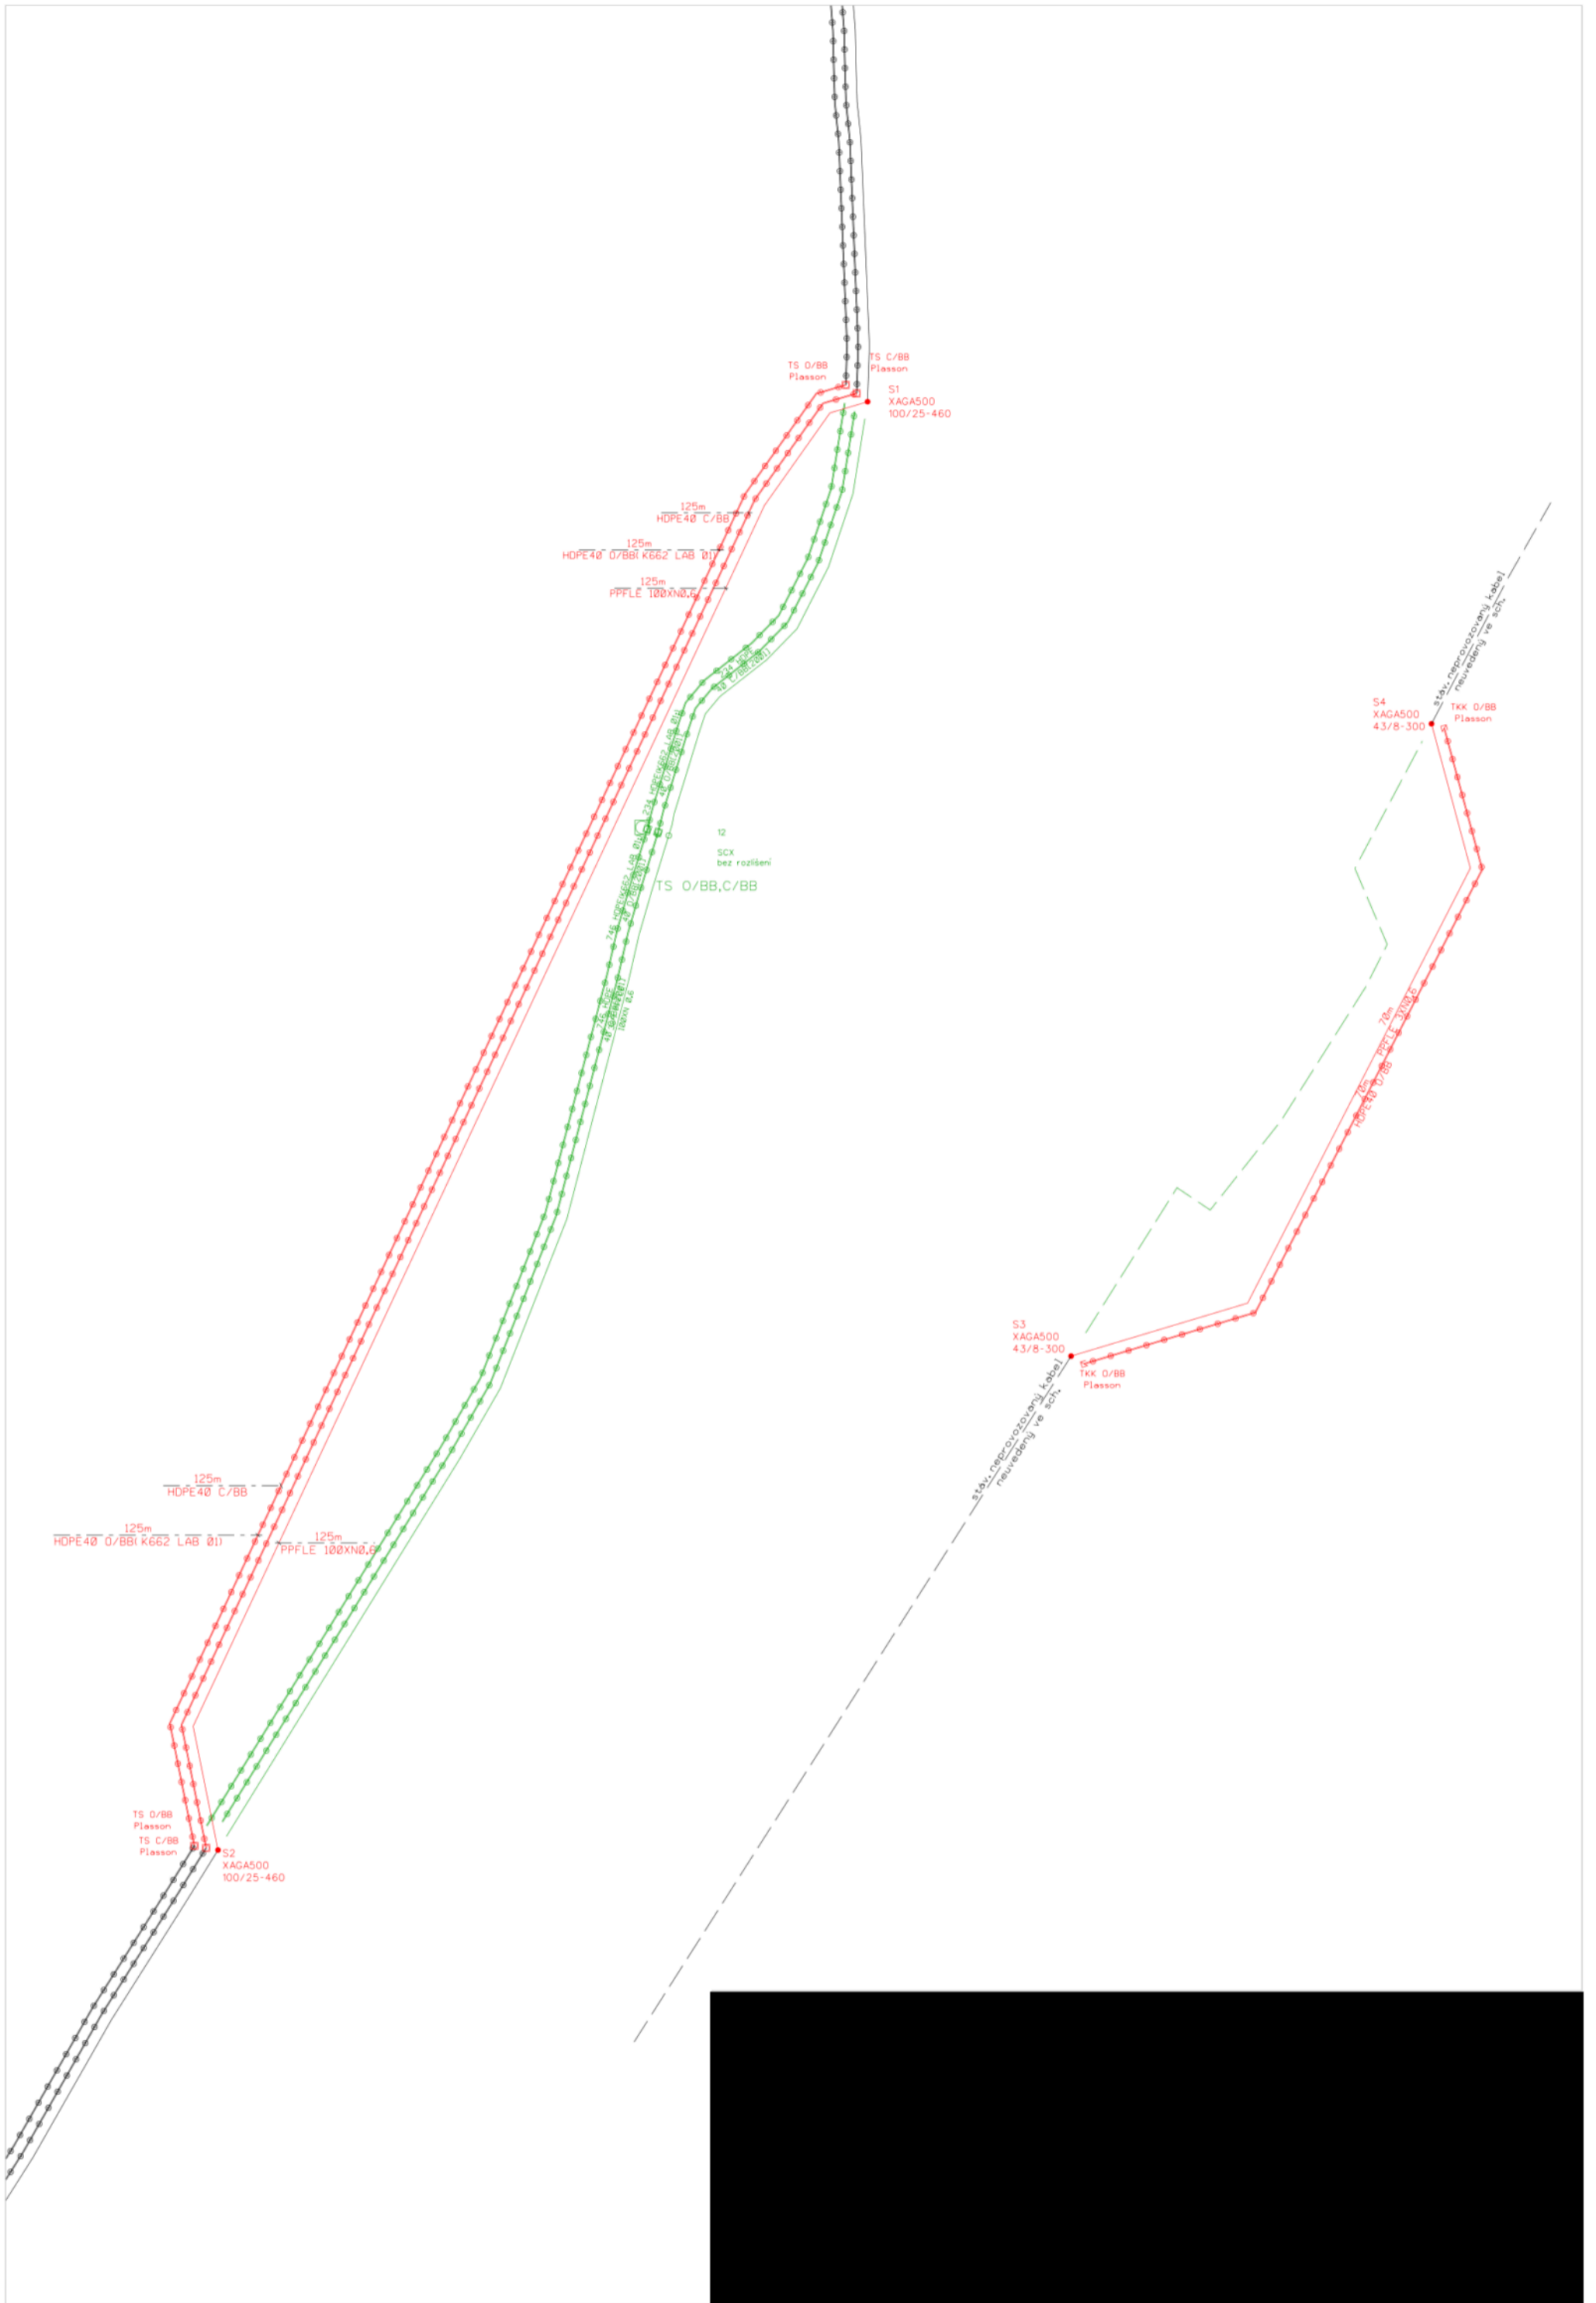
5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Situace polohopisná	SD
Schéma přeložky	SD
Informace o parcele	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD
Podklady dokumentace CETIN	SD

LEGENDA:

-  Stávající vedení CETIN
-  Nová trasa přeložky
-  Chránička
-  Stávající vedení ke zrušení
-  Projektované úpravy ploch komunikace, chodník
-  zeleň






Kabel: 662 LAB - OK RSU PLUMLOV - PLML20 (ON:10.12.2018 11:46:07)
 (PLML:BS:1 - OHRO:BS:1) Stránka: [K] Provozní



PLML:BS:1
 Plumlov-RSU


OS01
 00001
 COYOTE DTC

OHRO:BS:1
 Ohrozim-PLML20

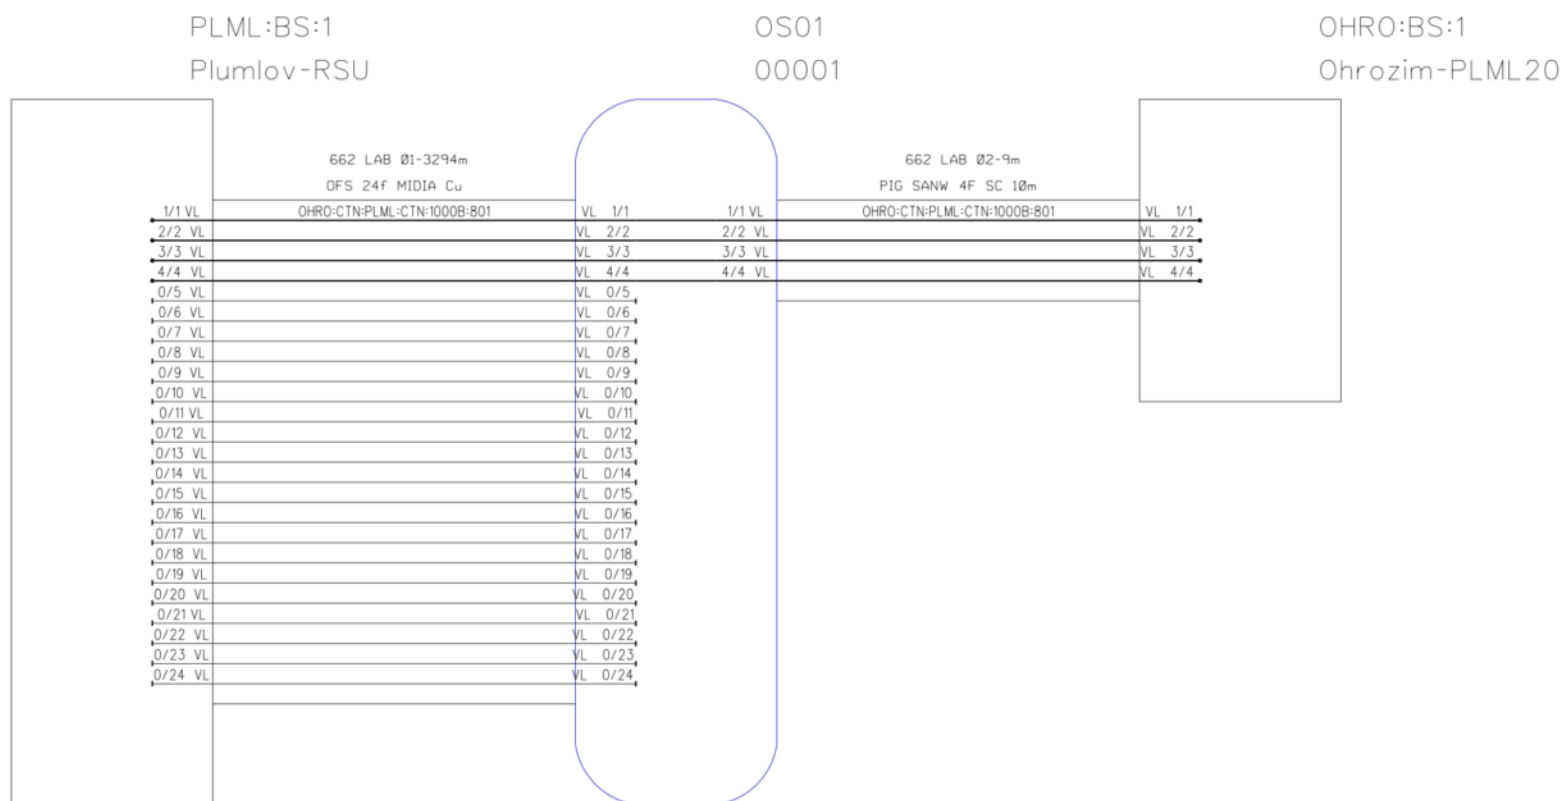




←
→
 výfuk před přeložku cca 750m
 záfuk zpět 750m

- LEGENDA:
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
 - ZRUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
 - ZMĚNA NA ZAŘÍZENÍ








Kabel: 662 LAB - OK RSU PLUMLOV - PLML20 (ON:10.12.2018 11:47:04)
 (PLML:BS:1 - OHRO:BS:1) Stránka: [K] Provozní





 výfuk před přeložku cca 750m
 záfuk zpět 750m

LEGENDA:

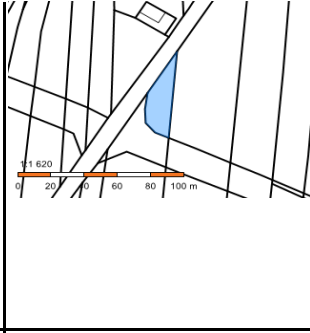
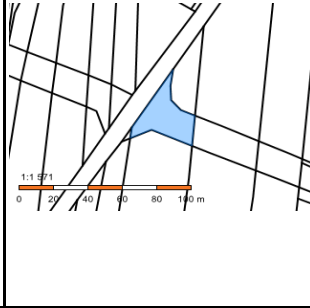
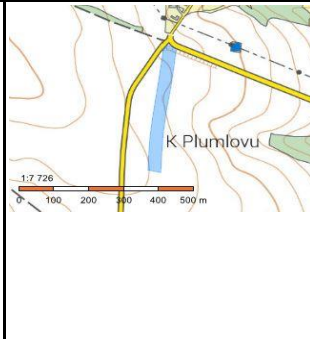
-  PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ
-  STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ
-  ZRUŠENÉ ZAŘÍZENÍ
-  ZMĚNA NA ZAŘÍZENÍ





VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II-150

<p>Parcelní číslo: 1384/10 Obec: Ohrozim [589802] Katastrální území: Ohrozim [709361] Číslo LV: 796 Výměra [m²]: 1386 Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti Mapový list: KMD Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Podíl Král Jiří Ing., Na chobotě 1344/4, Řepy, 16300 Praha 6 1/6 Král Ladislav, č. p. 48, 79803 Ohrozim 1/6 Král Vlastimil, č. p. 70, 79803 Ohrozim 1/3 Králová Eva, č. p. 39, 79803 Ohrozim 1/3 Způsob ochrany nemovitosti Název: zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ: Výměra 31000 1386</p> <p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p>	
<p>Parcelní číslo: 1384/9 Obec: Ohrozim [589802] Katastrální území: Ohrozim [709361] Číslo LV: 850 Výměra [m²]: 261 Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti Mapový list: KMD Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Podíl Dospivová Hana, Kníničky 24, 78344 Drahanovice 1/9 Heža Oldřich Ing., č. p. 183, 78501 Hnojice 1/9 Kristková Alena, Kníničky 25, 78344 Drahanovice 1/9 ROLS Lešany, spol. s r.o., č. p. 173, 79842 Lešany 2/3 Způsob ochrany nemovitosti Název: zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ: Výměra 31000 261</p> <p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p>	
<p>Parcelní číslo: 1560/6 Obec: Ohrozim [589802] Katastrální území: Ohrozim [709361] Číslo LV: 850 Výměra [m²]: 337 Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti Mapový list: KMD Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Způsob využití: silnice Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Podíl Dospivová Hana, Kníničky 24, 78344 Drahanovice 1/9 Heža Oldřich Ing., č. p. 183, 78501 Hnojice 1/9 Kristková Alena, Kníničky 25, 78344 Drahanovice 1/9 ROLS Lešany, spol. s r.o., č. p. 173, 79842 Lešany 2/3 Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p>	
<p>Parcelní číslo: 105/15 Obec: Ohrozim [589802] Katastrální území: Ohrozim [709361] Číslo LV: 850 Výměra [m²]: 1077 Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti Mapový list: KMD Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Podíl Dospivová Hana, Kníničky 24, 78344 Drahanovice 1/9 Heža Oldřich Ing., č. p. 183, 78501 Hnojice 1/9 Kristková Alena, Kníničky 25, 78344 Drahanovice 1/9 ROLS Lešany, spol. s r.o., č. p. 173, 79842 Lešany 2/3 Způsob ochrany nemovitosti Název: zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ: Výměra 31000 78 31010 999</p> <p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p>	
<p>Parcelní číslo: 105/14 Obec: Ohrozim [589802] Katastrální území: Ohrozim [709361] Číslo LV: 1 Výměra [m²]: 1103 Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti Mapový list: KMD Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě Druh pozemku: orná půda Vlastnické právo: Podíl Obec Ohrozim, č. p. 31, 79803 Ohrozim Způsob ochrany nemovitosti Název: zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ: Výměra 31000 96 31010 1007</p> <p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p>	
<p>Parcelní číslo: 128/44</p>	

<p>Obec: Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m²): Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Vlastnické právo Janeček Miroslav, Zikova 614/28, Nové Sady, 77900 Olomouc Janeček Stanislav, Politických vězňů 564/15, Neředín, 77900 Olomouc Způsob ochrany nemovitosti Název zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ</p>	<p><u>Ohrozim [589802]</u> <u>Ohrozim [709361]</u> <u>830</u> 606 Parcela katastru nemovitosti <u>KMD</u> Graficky nebo v digitalizované mapě orná půda Podíl 1/2 1/2</p> <p>Výměra <u>31000</u> 60 <u>31010</u> 546</p>	
<p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p> <p>Parcelní číslo: Obec: Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m²): Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastnické právo Janeček Miroslav, Zikova 614/28, Nové Sady, 77900 Olomouc Janeček Stanislav, Politických vězňů 564/15, Neředín, 77900 Olomouc Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ.</p>	<p><u>1571/72</u> <u>Ohrozim [589802]</u> <u>Ohrozim [709361]</u> <u>830</u> 773 Parcela katastru nemovitosti <u>KMD</u> Graficky nebo v digitalizované mapě silnice ostatní plocha Podíl 1/2 1/2</p>	
<p>Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení.</p> <p>Parcelní číslo: Obec: Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m²): Typ parcely: Mapový list: Určení výměry: Druh pozemku: Vlastnické právo Janeček Miroslav, Zikova 614/28, Nové Sady, 77900 Olomouc Janeček Stanislav, Politických vězňů 564/15, Neředín, 77900 Olomouc Způsob ochrany nemovitosti Název zemědělský půdní fond Seznam BPEJ BPEJ</p>	<p><u>128/21</u> <u>Ohrozim [589802]</u> <u>Ohrozim [709361]</u> <u>830</u> 14835 Parcela katastru nemovitosti <u>KMD</u> Graficky nebo v digitalizované mapě orná půda Podíl 1/2 1/2</p> <p>Výměra <u>31000</u> 12150 <u>31010</u> 2685</p>	

Specifikace nákladů_VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II/150

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP SITEL 2021 - STAND. 2024.04

Položková databáze: 2024.04

Název stavby: 66039/24/0009, VPIC_Ohrozim_obchvat silnice II/150

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	82 799,68 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	330 285,92 Kč
MONTÁŽ	181 594,22 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 478,29 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	14 059,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	56 577,92 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	116 094,41 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 796 890,20 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 650 667,08 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 146 223,12 Kč

Číslo SAP	Seznam položek		Množství	Celková cena
	Stavební činnost	Název položky		
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 331,81 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	24 655,35 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	12 575,52 Kč
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	1.00 ks	39 237,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	76.00 m	269 657,12 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40.00 m	928,80 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	13.00 m	1 148,68 Kč
952353 S		Rýha v poli 50/110	90.00 m	45 460,80 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	26.00 m	11 886,68 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	192.00 m	1 203,84 Kč
MONTÁŽ				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	320.00 m	1 494,40 Kč
958308 S		Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	20.00 ks	3 515,00 Kč
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	4.00 ks	1 696,04 Kč
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	4.00 ks	367,24 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	188,03 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	99.00 ks	4 295,61 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	99.00 ks	2 871,00 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	101,27 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	188,03 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	202.00 ks	5 858,00 Kč
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	84,30 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	4 050,78 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 748,04 Kč
955284 S		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	224,64 Kč
952602 S		Montáž trubky úložné	320.00 m	6 096,00 Kč
954990 S		Montáž úložných kabelů do 15 XN	70.00 m	1 720,60 Kč
954992 S		Montáž úložných kabelů do 300 XN	125.00 m	5 530,00 Kč
958592 S		Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	31 488,21 Kč
958557 S		Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	18 148,64 Kč

957753 S	Realizace tratě síťové dohodou rozpočtová rezerva 5% z nákladů projektu,	33210.00 JV	33 210,00 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	4.00 ks	1 755,00 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 791,88 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5141.40 JV	5 141,40 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1500.00 m	45 525,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 505,11 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové vytýčení trasy dle geo. bodů	6150.00 JV	6 150,00 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	92.00 m	2 974,36 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 353,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	14 059,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	7 214,24 Kč
954830	Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady Vbř - odhadované Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	25000.00 JV	25 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	10 707,04 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	13 656,64 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	26.00 ks	1 173,90 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	90.00 m	374,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	116.00 m	551,00 Kč
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	125.00 m	67 317,50 Kč
300116 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	70.00 m	2 213,40 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	113,85 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	1.00 ks	226,39 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	8.00 ks	14,64 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	557,28 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	495,66 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	16.00 ks	911,04 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	4.00 ks	21,40 Kč
410636 S		Souprava čistící metallic. kabelů - velká	1.00 ks	495,66 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECY	2.00 ks	1 154,60 Kč
320294 S		Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 774,04 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	525,12 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	78.00 ks	2 821,26 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	13.00 m	7 453,55 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	125.00 m	4 022,50 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	195.00 m	6 275,10 Kč
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	13.00 ks	14 280,24 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	2 191,60 Kč
308513 S		Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	6.00 ks	1 130,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	5.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	4.00 ks	0,00 Kč
