
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2024_0037**

mezi

CETIN a.s.

a

Královéhradecký kraj

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Lubošem Minářem, supervizor, VFS Čechy východ
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
ID DS: gcgbp3q
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-0345650287/0100
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, na základě
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Česká Skalice a Zlích spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 8. 9. 2023 vydané pod čj. 226225/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Zlíč(NA),most SÚS**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo jiné smlouvy dle ustanovení § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích, nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.4 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu dle ustanovení § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze stavebního povolení Městského úřadu Náchod pro stavbu silnice III. třídy „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. Etapa“ č.j. MUNAC 25284/2023/DSH/IHR ze dne 27. 3. 2023, pravomocné dne 3. 5. 2023 (dále jen „**Stavební povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti či jiné smlouvy a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností či jiná náhrada, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit

společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti či jiných smluv dle ustanovení § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **349 827,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc osm set dvacet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované

- dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:
- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **11 572,- Kč** (slovy: jedenáct tisíc pět set sedmdesát dva korun českých) bude společnostmi CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnostmi CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Hana Holušová

funkce: specialista pro výstavbu sítě

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Luboš Minář

funkce: supervizor, VFS Čechy východ

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Eva Vortelová

funkce: Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Irena Vaněčková

funkce: vedoucí přípravy a realizace staveb Náchod

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavebník potvrzuje, že za Stavebníka jedná ve věcech technických na základě plné moci ze dne 1.9.2022 společnost UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59//23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988 (dále jen "Zmocněnec Stavebníka").

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoli deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Stavebník potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání stanovené zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě usnesení č. RK/6/193/2024 z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 5. 2. 2024 bylo hejtmanovi Královéhradeckého kraje svěřeno rozhodnutí o uzavření Smlouvy.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 – Stavební povolení

Příloha č. 3 - Sdělení Městského úřadu Náchod č. j. MUNAC 66805/2024/DSH/IHR

Příloha č. 4 – Plná moc Zmocněnce Stavebníka

Příloha č. 5 – RK/6/193/2024

CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Hradci Králové dne

za **CETIN a.s.**

Luboš Minář

supervizor, VFS Čechy východ

(podepsáno elektronicky)

za **Královéhradecký kraj**

Mgr. Martin Červíček


hejtman Královéhradeckého kraje

(podepsáno elektronicky)

Polohopis 1.etapa

LEGENDA


- - - nová trasa met. kabelů
- stávající trasa met. kabelů a HDPE
- rušená trasa met. kabelů a HDPE
- ▣ nová koncovka na HDPE trubce
- nová spojka na metalickém kabelu
- ▬ chránička dle popisu
- ⊗ označovací Marker

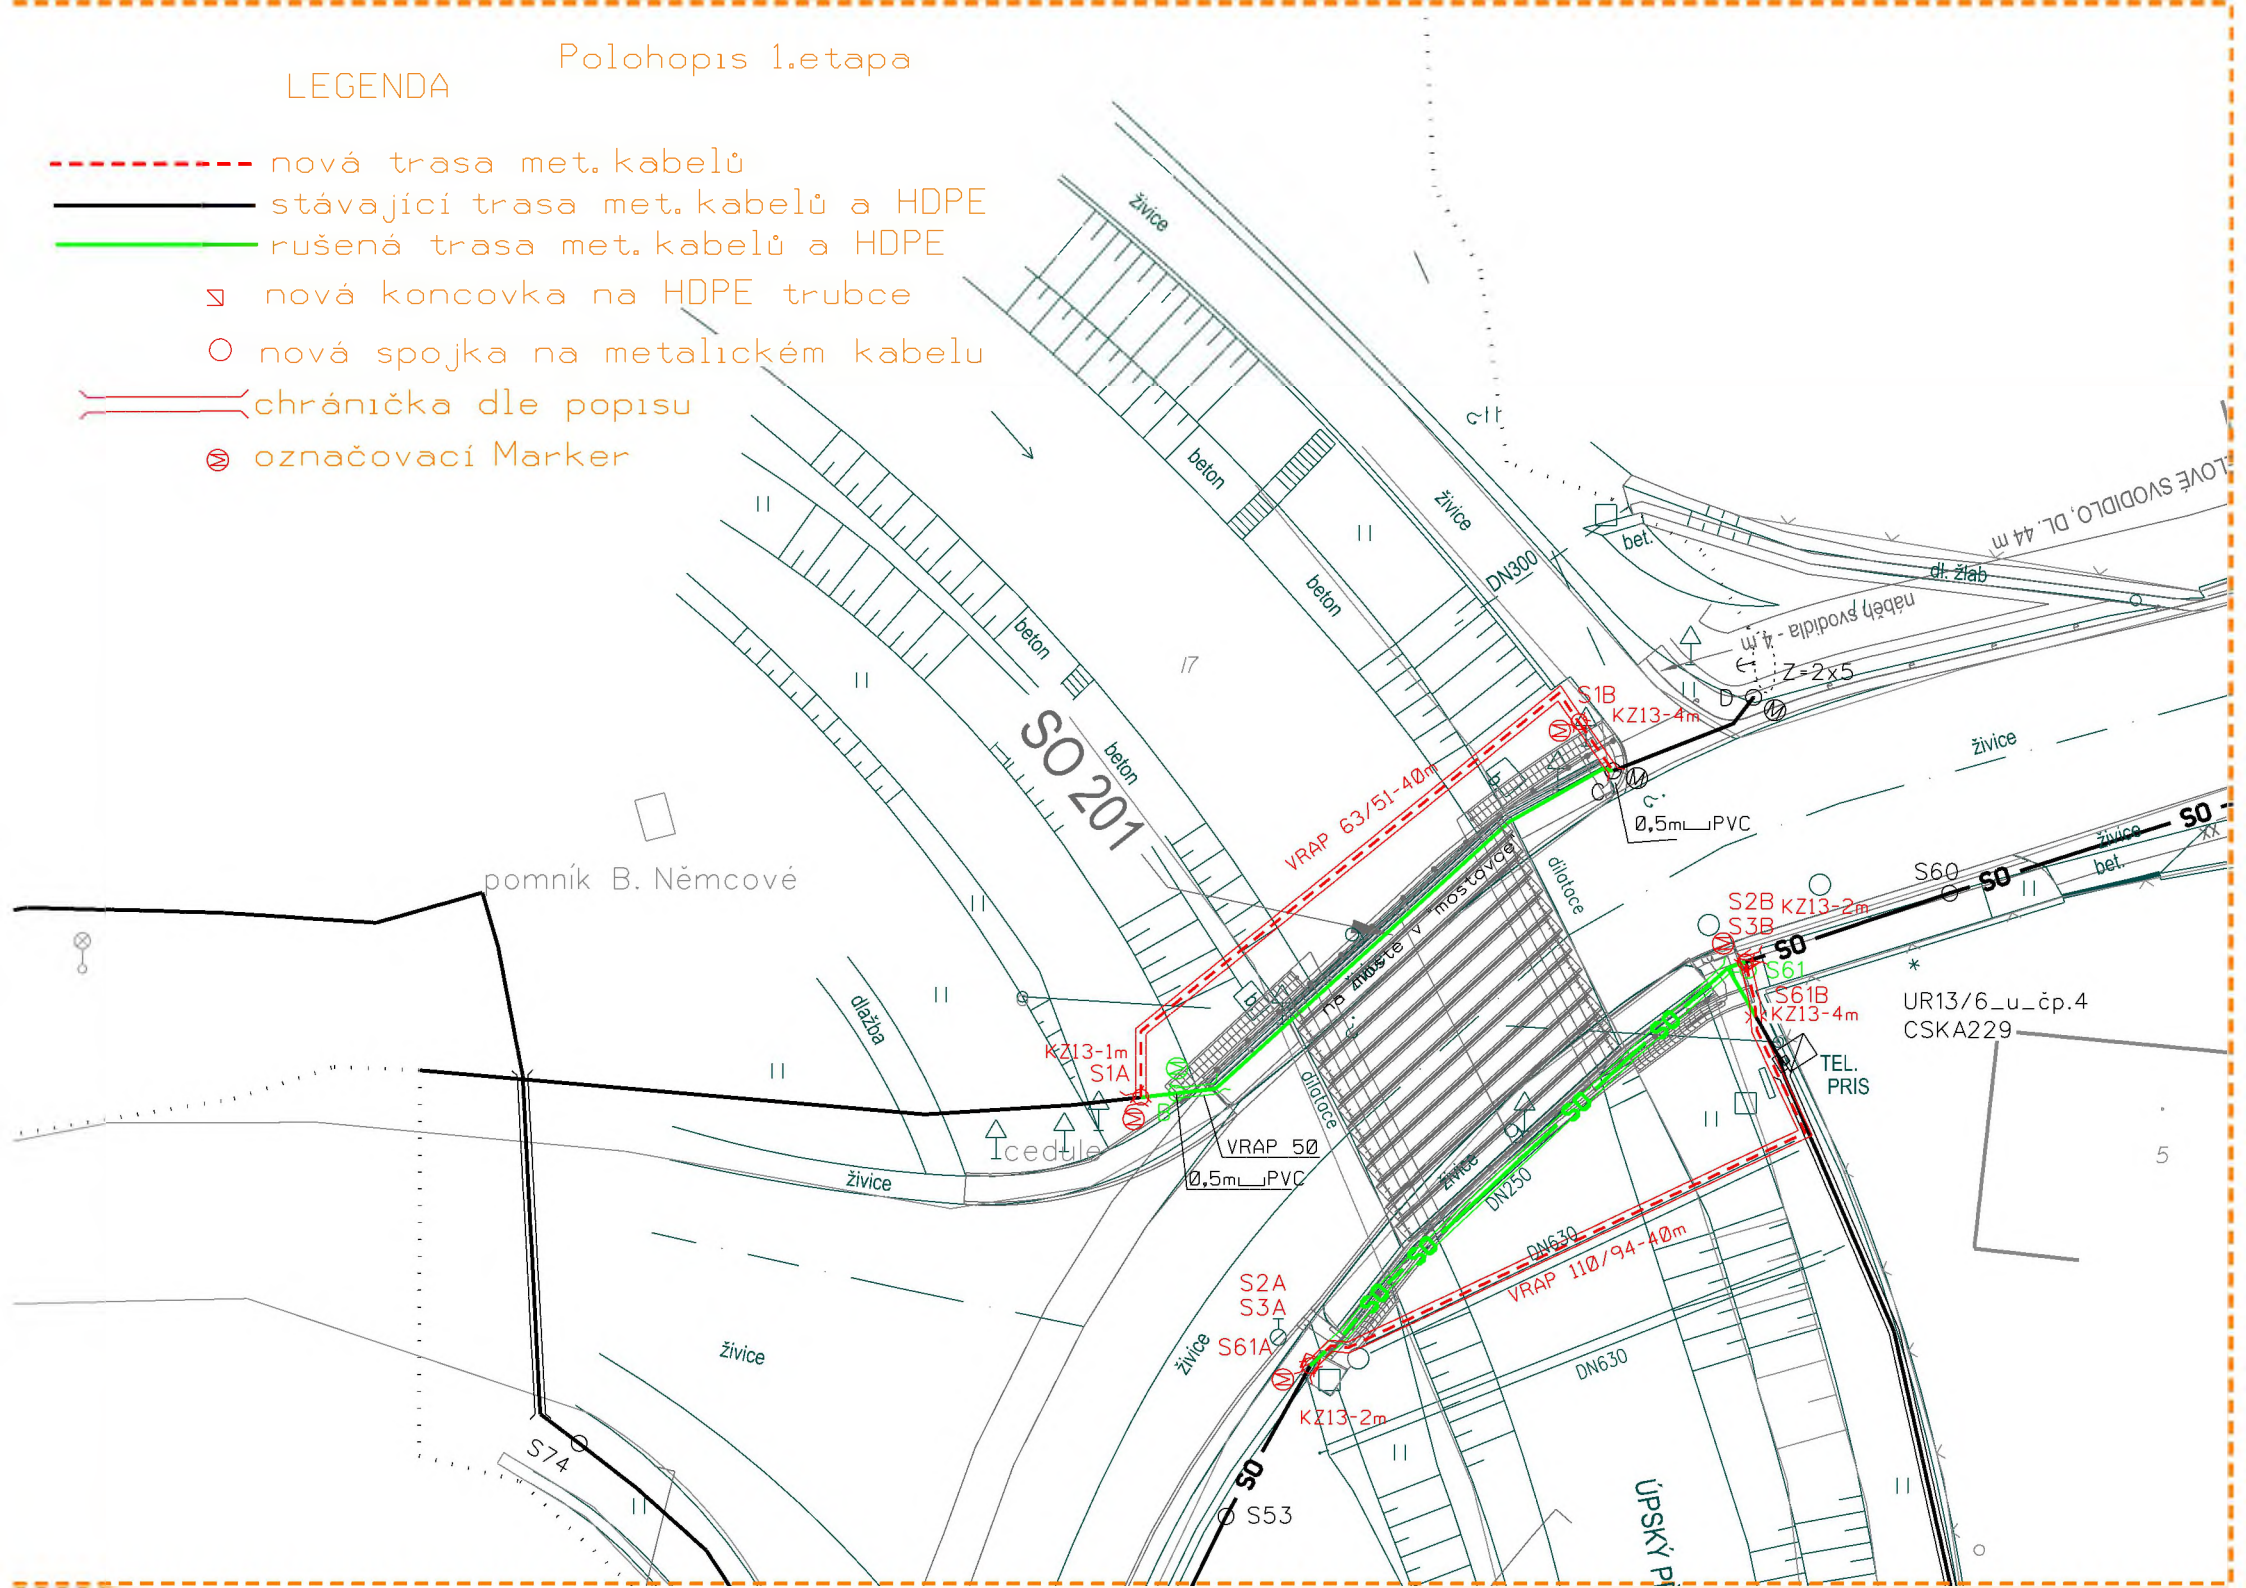

Polohopis 2.etapa

LEGENDA

- - - nová trasa met. kabelů a HDPE
- stávající trasa met. kabelů a HDPE
- rušená trasa met. kabelů a HDPE
- ◻ nová spojka na HDPE trubce
- ◻ rušená koncovka na HDPE trubce
- rušená spojka na metalickém kabelu
- nová spojka na metalickém kabelu
- chránička dle popisu
- ⊙ označovací Marker

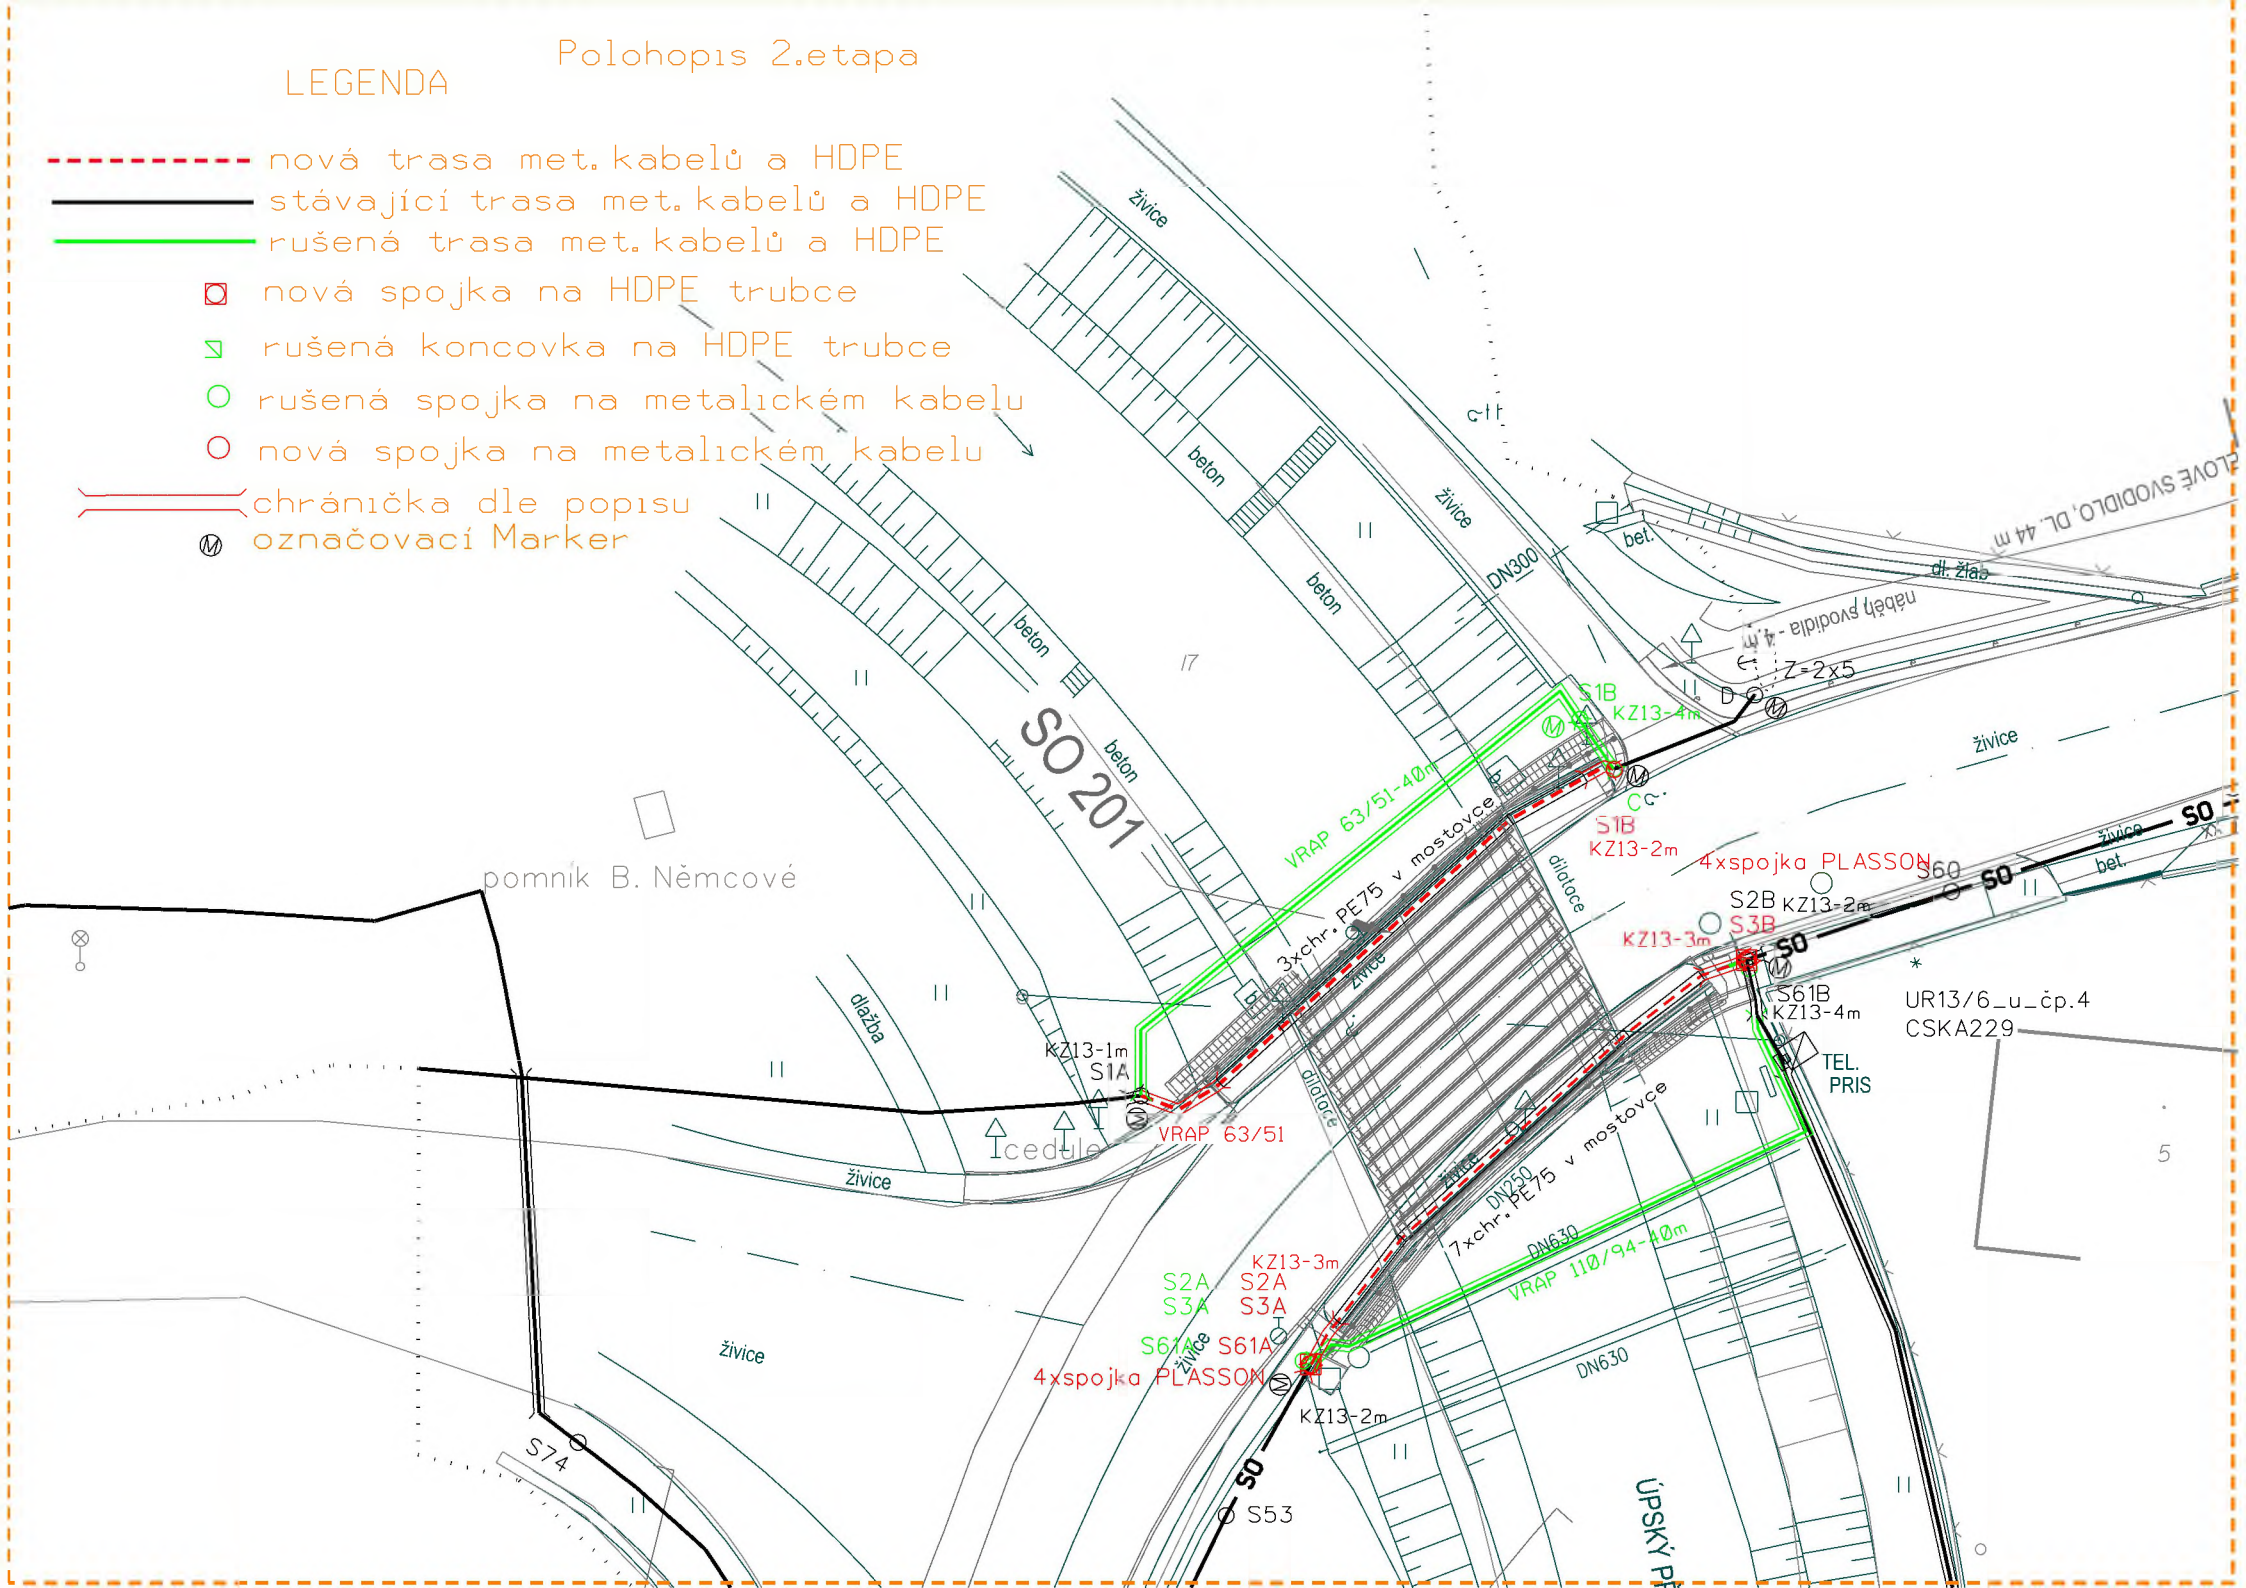


LEGENDA

SCHEMA 1.etapa

- stávající trasa met. kabelů CETIN a.s.
- nová trasa met. kabelů CETIN a.s.
- rušená trasa met. kabelů CETIN a.s.
- ⊙ stávající trasa HDPE 40 CETIN a.s.
- ⊙ rušená trasa HDPE 40 CETIN a.s.

- △ nová spojka na metalickém kabelu
- ⋄ nová trubková koncovka PLASSON

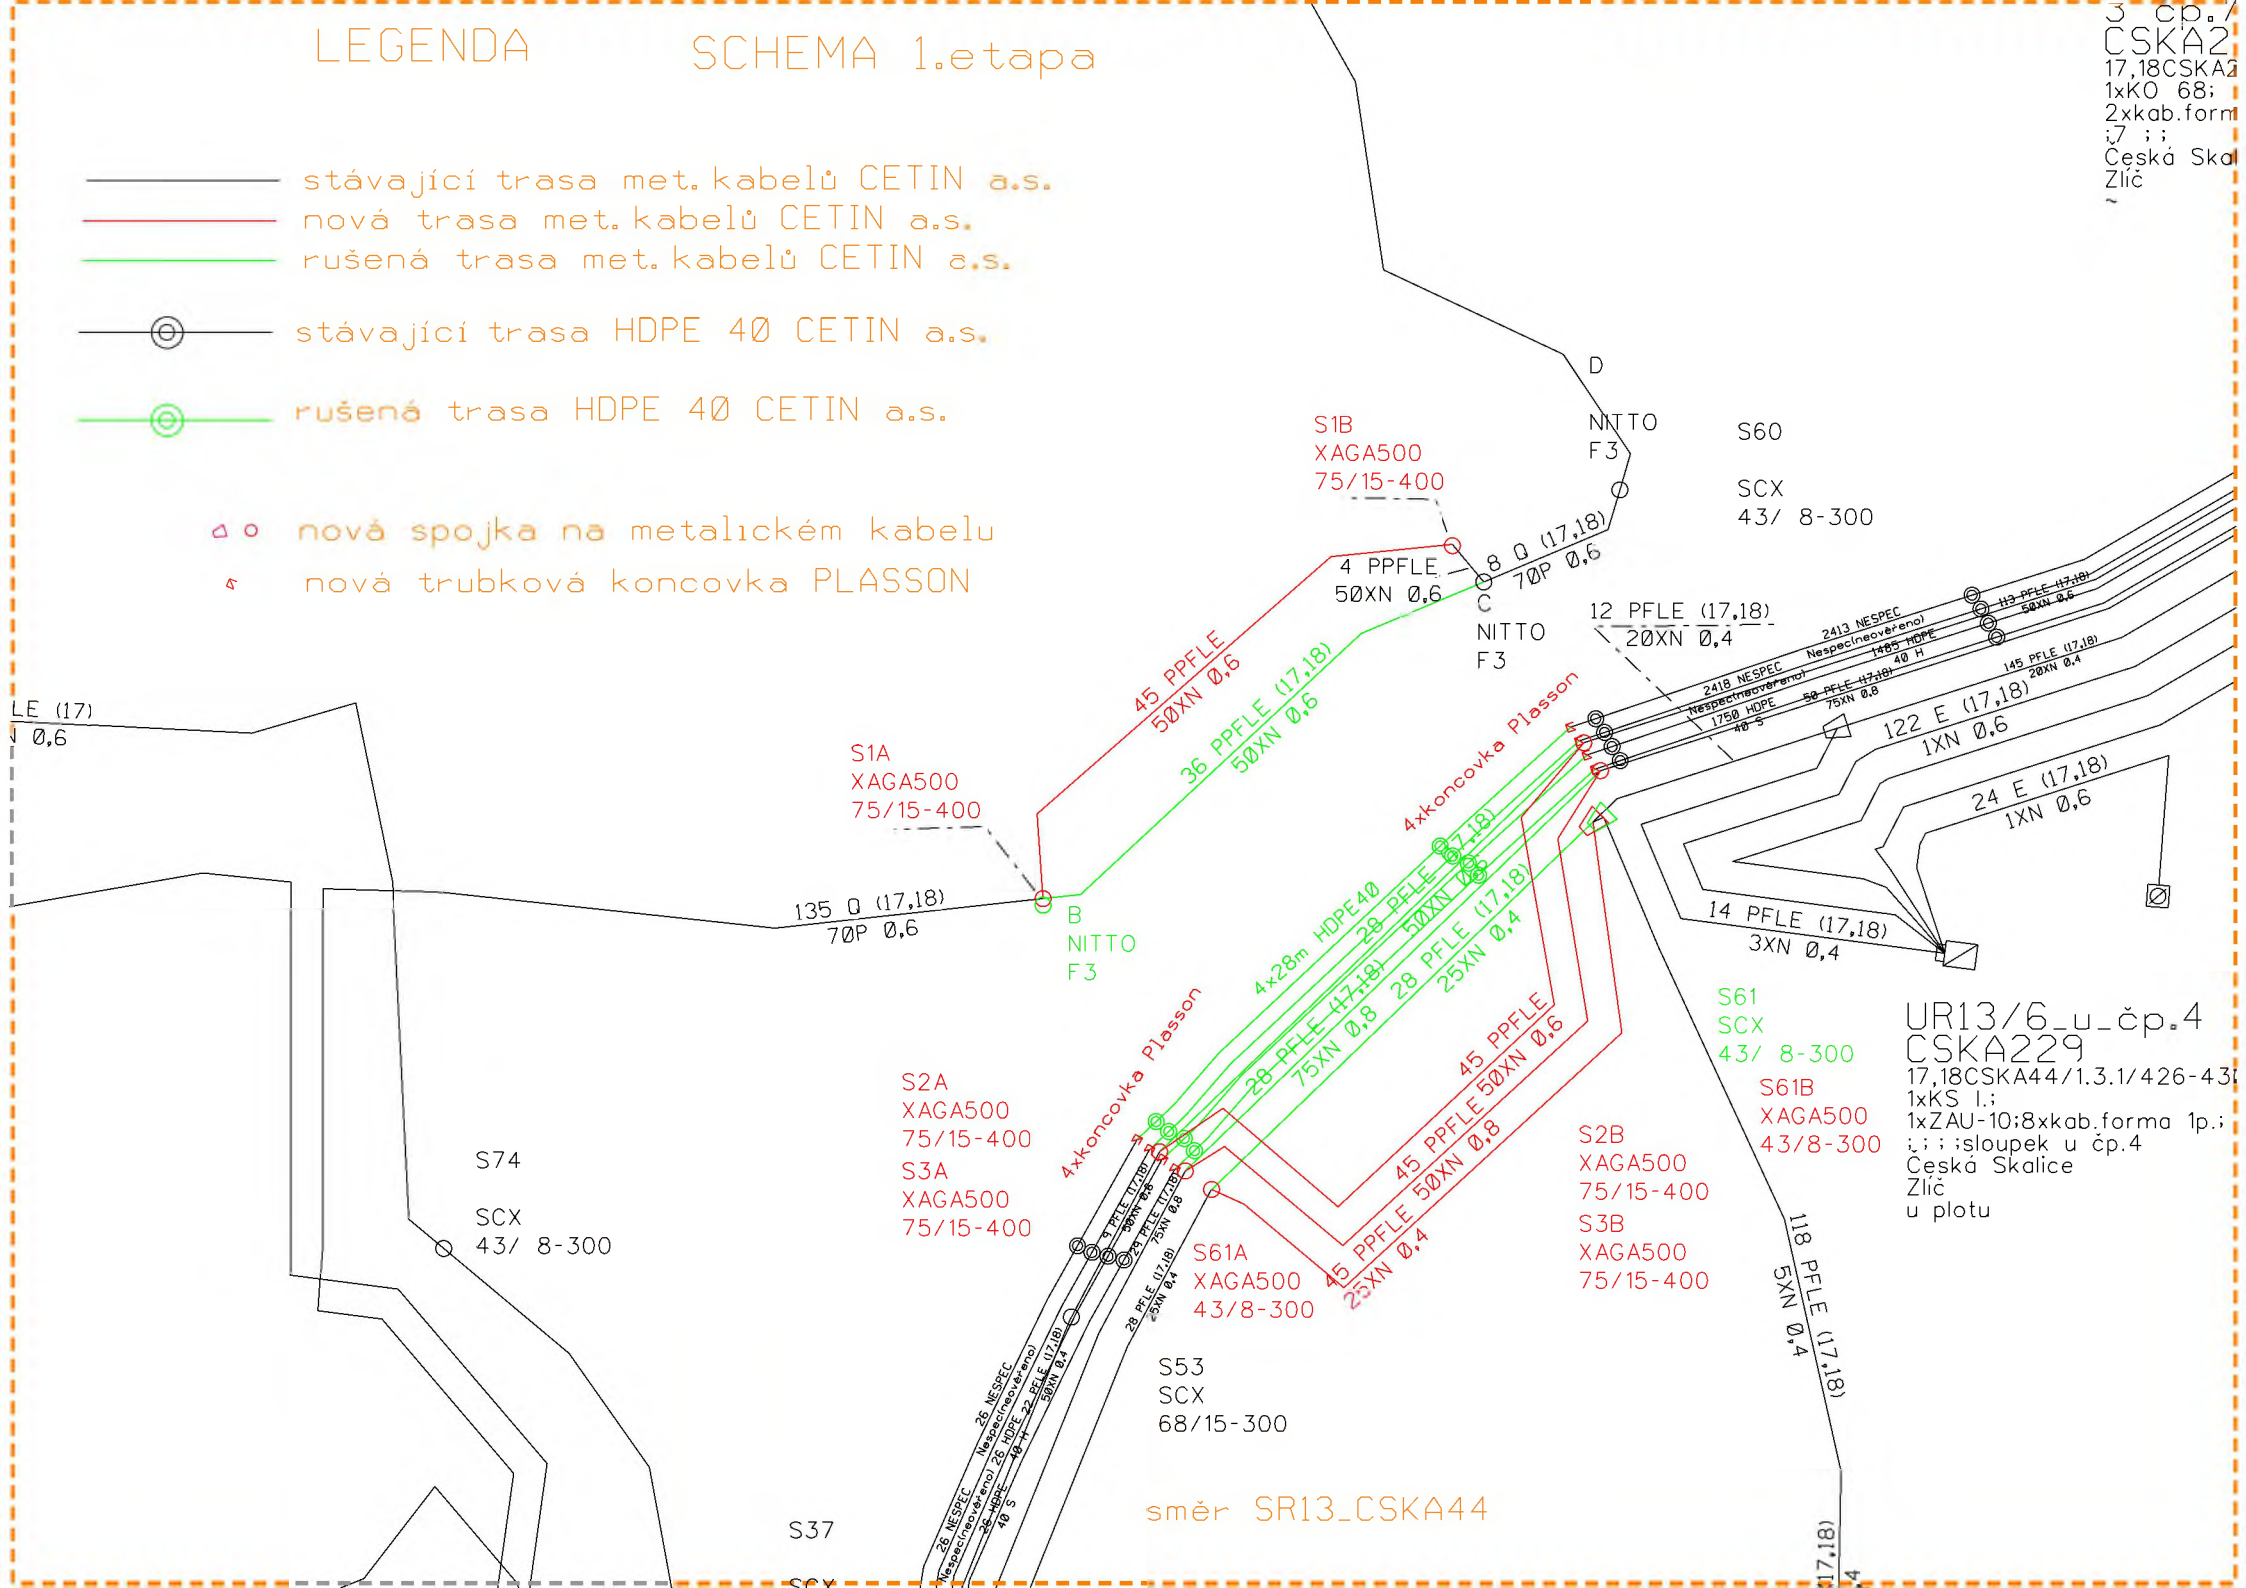








3 čp. 7
 CSKA2
 17,18CSKA2
 1xKO 68;
 2xkab.form
 i:7 ;;
 Česká Skal
 Zlič


UR13/6_u_čp.4
 CSKA229
 17,18CSKA44/1.3.1/426-43
 1xKS I.;
 1xZAU-10;8xkab.forma 1p.;
 ; ; ; sloupek u čp.4
 Česká Skalice
 Zlič
 u plotu

směr SR13_CSKA44

LEGENDA

SCHEMA 2.etapa

-  stávající trasa met. kabelů CETIN a.s.
-  nová trasa met. kabelů CETIN a.s.
-  rušená trasa met. kabelů CETIN a.s.
-  stávající trasa HDPE 40 CETIN a.s.
-  nová trasa HDPE 40 CETIN a.s.
-  nová spojka na metalickém kabelu
-  nová trubková spojka PLASSON

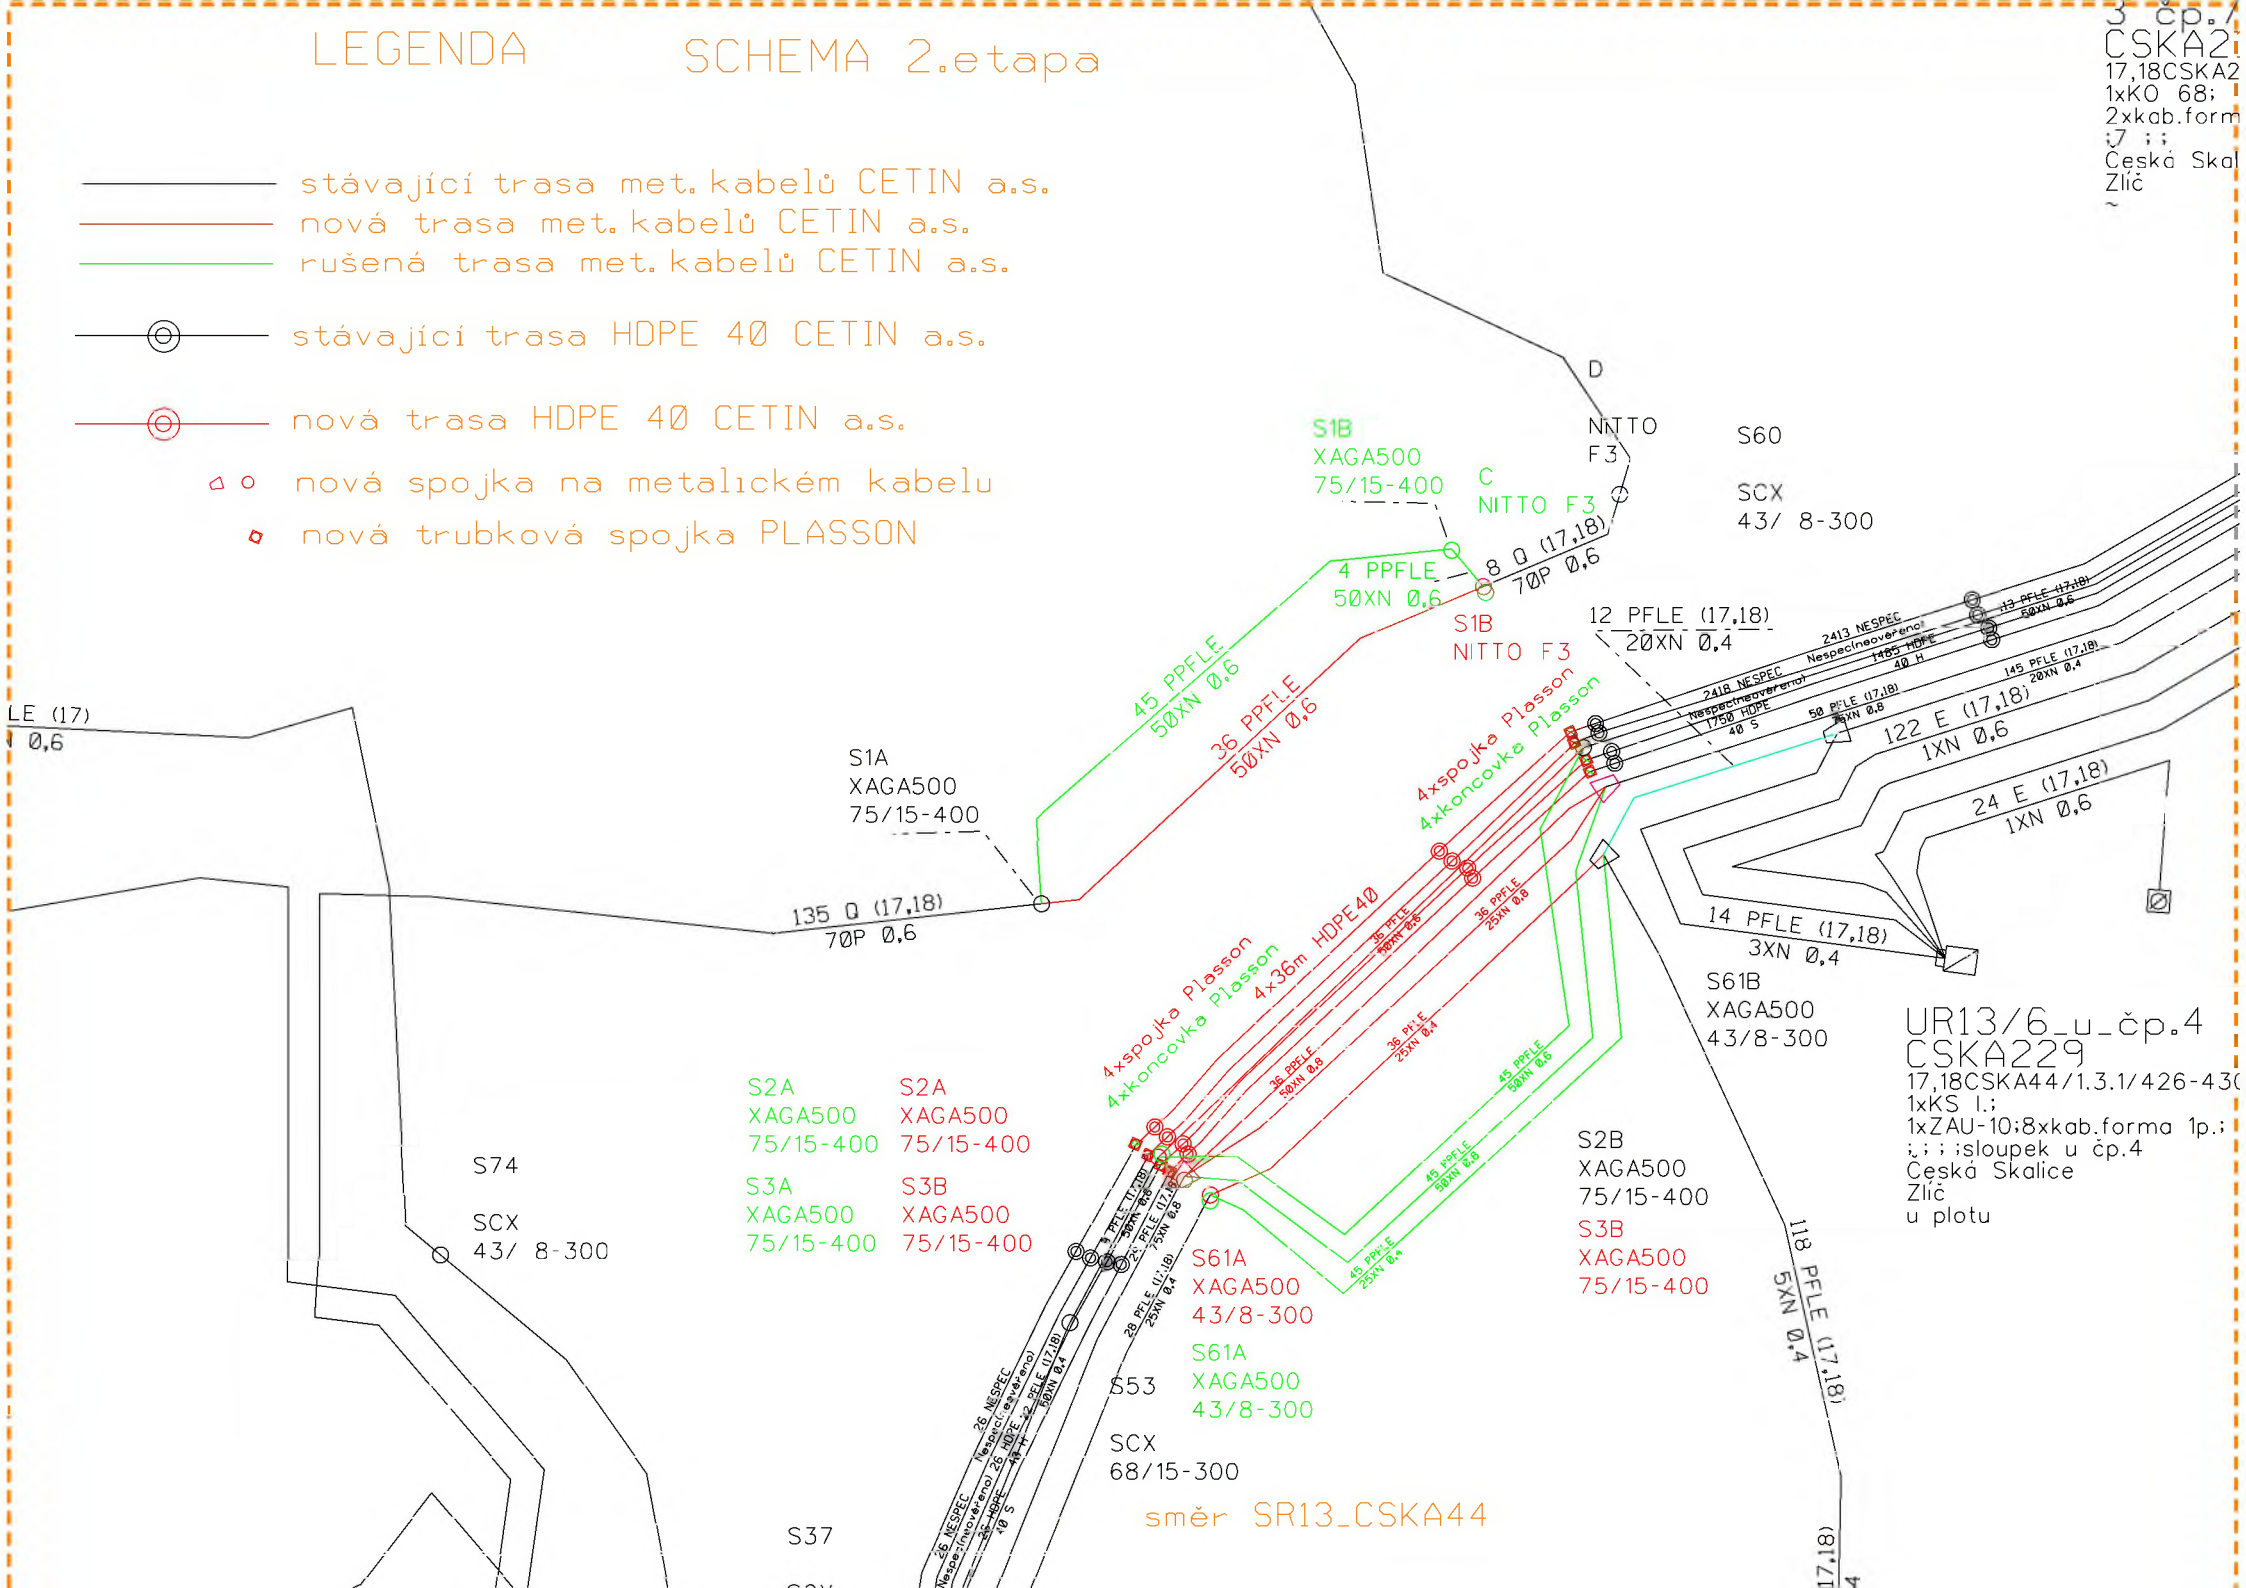

3 čp.7
 CSKA21
 17,18CSKA2
 1xKO 68;
 2xkab.form
 7 ; ;
 Česká Skal
 Zlíc

UR13/6_u_čp.4
 CSKA229
 17,18CSKA44/1.3.1/426-430
 1xKS I.;
 1xZAU-10;8xkab.forma 1p.;
 ; ; ; sloupek u čp.4
 Česká Skalice
 Zlíc
 u plotu

směr SR13_CSKA44

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

x VP TEMO 2021 - STAND. x 2024.04

Položková databáze: 2024.04

Název stavby: VPIC Zlíč(NA),most SÚS

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	11 572,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	56 103,95 Kč
MONTÁŽ	176 517,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 238,40 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	99 394,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	349 827 Kč
z toho Příprava	11 572 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	338 254,99 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	11 572,26 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks	11 572,26 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		80.00 m	1 848,80 Kč
952369 S	Pokládka žlabů ostatních		18.00 m	1 413,72 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		2.00 ks	11 682,86 Kč
958327 S	Rýha bez povrchu 35/70 -100		10.00 m	3 465,80 Kč
958329 S	Rýha bez povrchu rozšíření o10cm		20.00 m	1 853,40 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		10.00 m	2 359,70 Kč
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm		8.00 m	2 556,32 Kč
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		4.00 m	4 473,56 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		5.00 m	4 209,30 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		43.00 m	18 602,23 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		8.00 m	993,04 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		127.00 m	1 764,03 Kč
954972 S	Znovuosazení obrubníků chodníkových		3.00 m	881,19 Kč
MONTÁŽ				

955011 S	Demontáž trubky v kolektoru	112.00 m	3 674,72 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	28.00 m	1 111,32 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	272.00 m	7 488,16 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	144.00 m	743,04 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 592,80 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	367.00 ks	16 823,28 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	750.00 ks	22 950,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	8.00 ks	362,80 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	49200.00 J'	49 200,00 Kč
	Demontáž ocelové trubky z mostní konstr.		
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	12.00 ks	25 705,80 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 815,64 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	483,68 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	144.00 m	3 327,84 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	360.00 m	11 548,80 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	10578.00 J'	10 578,00 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	5 009,40 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	10.00 ks	10 102,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 238,40 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		12.00 ks	526,92 Kč
305781 S	Drát ocelový pozink. D 3,0 mm		2.00 kg	156,34 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		23.00 m	92,92 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		62.00 m	287,06 Kč
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4		45.00 m	3 370,95 Kč
300129 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8		36.00 m	9 034,20 Kč
300121 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6		90.00 m	24 750,00 Kč
300130 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8		45.00 m	21 238,65 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		8.00 ks	885,92 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		150.00 ks	3 898,50 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká		8.00 ks	3 856,16 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		4.00 ks	633,92 Kč
316631 S	Spojka kabelová NITTO F3 JCSA 300		2.00 ks	3 650,84 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		4.00 ks	2 245,64 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		10.00 ks	7 826,00 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		8.00 ks	1 021,28 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy		36.00 m	1 126,44 Kč
300024 S	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh		36.00 m	1 126,44 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		36.00 m	1 126,44 Kč
300032 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh		36.00 m	1 126,44 Kč

302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	2 131,60 Kč
302381 S	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem	40.00 m	1 016,40 Kč
316207 S	Žlab kabelový 120x16x14 cm KZ 13	15.00 ks	8 265,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304517 S	Pásek vázací 400x7,6 mm	20.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	16.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	16.00 ks	0,00 Kč

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX00VZU3T (PID)
KS 856/2023/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 25284/2023/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23.05.2023 a je vykonatelné.

Městský úřad Náchod, odbor dopravy
a silničního hospodářství dne 23.05.2023

podpis

Datum: 27.03.2023

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59,
Plačice, 500 04 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ Č. 13/23

Výroková část:

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 – 114 stavebního zákona, kterou podal dne 24.01.2023 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník Královéhradecký kraj, sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové, a rozhodl takto:

I. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ POVOLENÍ

pro stavbu silnice III. třídy „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“
v katastrálním území Zlích obsahující stavební objekty

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 185 – Dopravně inženýrská opatření

SO 201 – Most ev.č. 3049-2

a) Druh a účel stavby:

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury – silnice III. třídy.

Popis stavby:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Jedná se o silnici III/3049 v úseku od křižovatky se silnicí III/30412 v obci Zlič až po křižovatku s ulicí Jiráskova a třídy T.G. Masaryka v České Skalici. Celková délka úseku je 1780 m.

Objekt řeší opravu stávající konstrukce vozovky při rozšíření šířkového uspořádání na 6,5 m. Směrové řešení kopíruje stávající stav. Výškové uspořádání kopíruje stávající stav, v intravilánu bude zachována stávající niveleta, v extravilánu se niveleta zvýší o cca 9 cm.

Voda je z povrchu komunikace v extravilánu odváděna příčným a podélným sklonem do příkopů a do přilehlého terénu. V intravilánu je pak voda příčným a podélným sklonem odváděna do uličních vpustí, které budou obnoveny a doplněny. Příkopy budou v rámci stavby kompletně pročištěny, popř. prohloubeny tak, aby byl zajištěn odtok vody. Stávající vpusti, které slouží k odvodnění komunikace, budou kompletně vyměněny, včetně všech přípojek a zároveň dojde k výškovému vyrovnání všech šachet od inženýrských sítí umístěných ve vozovce.

SO 185 – Dopravně inženýrská opatření

Jde o provizorní stavební objekt. Jedná se o návrh objízdných tras.

SO 201 – Most ev.č. 3049-2

Most přemostňuje umělý vodní náhon (Úpský přivadeč) na silnici III/3049 v obci Zlič. Stavba se nachází uprostřed obce v místě křížení s komunikací III. třídy 30412.

S ohledem na příznivé výsledky diagnostického průzkumu mostu bude provedena celková rekonstrukce stávající spodní stavby a stávající nosné konstrukce.

V rámci nové vyrovnávací žb desky a v rámci mostního svršku bude provedeno plynulé vyrovnání směrového a výškového průběhu komunikace na mostě.

b) Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba povoluje

Katastrální území **Česká Skalice:**

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
941	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
885/1	ostatní plocha/silnice	Město Česká Skalice
1005/14	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
1005/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
1120/1	ostatní plocha/komunikace	Královéhradecký kraj
885/8	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
1803	zahrada	██████████
1206/9	orná půda	████████████████████
1212/3	orná půda	██████████████████
1206/10	trvalý travní porost	██████████████████
1005/1	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1005/13	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1005/9	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice

1005/6	ostatní plocha/silnice	Město Česká Skalice
1005/12	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1005/10	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1188/1	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1002/2	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1005/2	ostatní plocha/silnice	Město Česká Skalice
1004	ostatní plocha/zeleň	Město Česká Skalice
1798/5	ostatní plocha/jiná plocha	Město Česká Skalice
1945/5	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
1206/37	orná půda	Město Česká Skalice

Katastrální území Zlič:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
199/5	trvalý travní porost	██████████
183/2	ostatní plocha/neplodná půda	██████████
18	zahrada	██████████
st. 8	zastavěná plocha a nádvoří	██████████
20/2	zahrada	██████████
st. 54	zastavěná plocha a nádvoří	██████████
469/18	orná půdy	██████████
187/1	ostatní plocha/neplodná půda	PENZION BARUNKA s.r.o.
17/3	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
17/4	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
14/3	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
st. 170	zastavěná plocha a nádvoří	Povodí Labe, s.p.
14/2	vodní plocha	Povodí Labe, s.p.
st. 168	zastavěná plocha a nádvoří	Povodí Labe, s.p.
190	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj
425/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
436/2	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
413	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
423	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
st. 169	zastavěná plocha a nádvoří	Královéhradecký kraj

436/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
468/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
191/32	orná půda	Projekt Zlíč s.r.o.
183/3	ostatní plocha/neplodná půda	Město Česká Skalice
187/2	ostatní plocha/neplodná půda	Město Česká Skalice
424	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
469/15	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
417/1	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice
477	ostatní plocha/jiná plocha	Město Česká Skalice
469/14	ostatní plocha/komunikace	Město Česká Skalice

II. stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby, pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou ADVISIA, s.r.o., Praha pod zakázkovým číslem 19_033-A s datem 01/2021; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3 Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

§ 176 odst. 1 cit. Zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany a přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005.

8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

9. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení stavebník projedná s vlastníky, případně uživateli těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.

11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.

12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům.

13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací.

15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, popř. technický dozor, termín dokončení).

16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby.

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy

- dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního zákona)
 - prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:
 - stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát č.j. KRPH-52327/ČJ-2021-050506 ze dne 02.07.2021
 - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod: IČO: 708 82 525, sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí č.j. HSHK-3112-2/2021 ze dne 24.06.2021
 - koordinované závazné stanovisko Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování č.j. MUNAC 12003/2023 ze dne 08.02.2023)
 - stavební deník k nahlédnutí
 - geometrický plán
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
 - protokolární předání napojení silnice II. třídy
 - doklad o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, popř. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
 - zápis o odevzdání a převzetí pozemku
 - zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:
 - GasNet, s.r.o.
 - ČEZ Distribuce, a.s.
 - Českoskalické vodárny, s.r.o.
 - Rtyně.net s.r.o.
 - CETIN a.s.
18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
 19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 20. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.
 21. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 22. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou.

Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

1. sdělení ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem zn. 0101869136 ze dne 13.01.2023, vyjádření zn. 001131251971 ze dne 25.01.2023,
2. souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s činností a/nebo umístěním stavby zn. 001131252069 ze dne 25.01.2023
3. Stanovisko GasNet, s.r.o. zn. 5002401350 ze dne 12.07.2021
4. vyjádření CETIN a.s. č.j. 692870/21 ze dne 08.07.2021
5. vyjádření Českoskalické vodárny, s.r.o. zn. ČV/769-2021/VTÚ/Kle ze dne 19.07.2021, prodloužení zn. ČV/68-2023/VTÚ/Kle ze dne 19.01.2023

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

1. koordinované závazné stanovisko Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování č.j. MUNAC 12003/2023 ze dne 08.02.2023
 - dodržení podmínek z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změn některých zákonů (vodní zákon), v platném znění pro zajištění ochrany vodního toku a vodního díla Úpský přivaděč
 - dodržení podmínek z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 - z hlediska odpadového hospodářství bude dodržen zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
 - dodržení podmínek podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
2. stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát č.j. KRPH-52327/ČJ-2021-050506 ze dne 02.07.2021
 - na vyústění všech účelových komunikací bude umístěno vpravo i vlevo svislé dopravní značení č. Z11g „Směrový sloupek červený kulatý“
 - čela podélných propustků budou z obou stran pod úhlem 45° a na všech případných příčných propustcích budou v extravilánu umístěna ocelová svodidla, v intravilánu pak zábradlí s dopravním značením č. Z9 „Žluté a černé pruhy“, pokud se příčné propustky v tělese komunikace nacházejí
 - objízdná trasa bude v dostatečném předstihu konzultována s dopravním inspektorátem, aby nedošlo ke konfliktu s případnými dalšími stavbami a po dokončení stavby bude provedena revize objízdných tras, na kterých budou komunikace případně opraveny a uvedeny do původního stavu
 - před samotným zahájením stavebních prací musí být ze strany zhotovitele stavby předloženy dopravnímu inspektorátu aktuální návrhy dopravně inženýrského opatření používaného po dobu stavby, pro vydání stanoviska ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a závazného stanoviska pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník*):
 - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, Pláčice, 500 04 Hradec Králové

- podle § 109 písm. b), c) stavebního zákona (*vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

- Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED] bytem: [REDACTED]
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- PENZION BARUNKA s.r.o., IČO: 259 48 211, sídlo: Zlíč 46, 552 03 Česká Skalice
- Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Projekt Zlíč, IČO: 026 87 585, sídlo: Nádražní 92, 513 01 Semily
- Město Česká Skalice, IČO: 002 72 591, sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 55203 Česká Skalice
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- Českoskalické vodárny, s.r.o., IČO: 274 81 566, sídlo: Křenkova 57, 552 03 Česká Skalice
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Rtyně.net s.r.o., IČO: 076 43 730, sídlo: Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED] bytem: [REDACTED]
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]

Odůvodnění

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 24.01.2023 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové o stavební povolení na stavbu „III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa“ v katastrálním území Zlíč.

Dle dispoziční zásady vymezuje předmět řízení žadatel a správní orgán je tímto vymezením vázán a nemůže s ním sám nijak disponovat.

Dne 13.02.2023 pod č.j. MUNAC 13652/2023/DSH/IHR Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

ve znění pozdějších předpisů oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dne 16.02.2023 pod č.j. 14777/2023/DSH/IHR Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal oznámení o zahájení stavebního řízení – oprava a stanovil v tomto zahájení řízení nově lhůtu 10 dnů ode dne doručení.

Stavební úřad v oznámení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost po doplnění poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.

Současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, respektive nahlédnout do spisového materiálu, vyjádřit se k jeho úplnosti a navrhnout jeho doplnění. K tomuto správní orgán stanovil lhůtu 5 dnů od doručení tohoto sdělení.

Účastníci byli oprávněni navrhopvat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky) podle správního řádu, jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 2 a 3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona, tedy dotčených orgánů a účastníků řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Těmto se doručuje jednotlivě.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník*):

- Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové

- podle § 109 písm. b), c) stavebního zákona (*vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

- Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

- [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
- [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]

- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED] bytem: [REDACTED]
- PENZION BARUNKA s.r.o., IČO: 259 48 211, sídlo: Zlích 46, 552 03 Česká Skalice
- Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- (stanovisko č.j. PLa/2022/040315 ze dne 12.10.2022)
- Projekt Zlích, IČO: 026 87 585, sídlo: Nádražní 92, 513 01 Semily
- Město Česká Skalice, IČO: 002 72 591, sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 55203 Česká Skalice
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
- (stanovisko zn. 5002401350 ze dne 12.07.2021)
- Českoskalické vodárny, s.r.o., IČO: 274 81 566, sídlo: Křenkova 57, 552 03 Česká Skalice
- (vyjádření zn. ČV/769-2021/VTÚ/Kle ze dne 19.07.2021, prodloužení zn. ČV/68-2023/VTÚ/Kle ze dne 19.01.2023)
- ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
- (sdělení zn. 0101869136 ze dne 13.01.2023, vyjádření zn. 001131251971 ze dne 25.01.2023, zn. 001131252069 ze dne 25.01.2023)
- CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- (vyjádření č.j. 692870/21 ze dne 08.07.2021)
- Rtně.net s.r.o., IČO: 076 43 730, sídlo: Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší
- [REDACTED] datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- [REDACTED], datum narození: [REDACTED] bytem: [REDACTED]

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*)
katastrální území Česká Skalice

1212/3, 1212/6, 1212/5, 1212/4, 1212/2, 1210/7, 1211/3, 1210/3, 1210/6, 1206/33, 1206/34, 1206/35, 1206/36, 1207/1, 1206/50, 1206/10, 1206/9, 1206/37, 1206/38, 1206/6, 1200/1, 1198/4, 1198/1, 1198/2, 1201/1, st. 1196, st. 1176, st. 1178, st. 1180, 1183, st. 1153, st. 1155, st. 1157/1, st. 1159, st. 1161/1, 1161/3, 1147/3, st. 1146/3, st. 1146/1, 1147/4, 1147/7, 1147/9, 1145/2, 1145/1, st. 1144, 1143/1, st. 1141, 1140/2, 1140/1, st. 1136, st. 1133, 1134, st. 1105/3, st. 1105/2, 1105/1, 1058, 1010/6, st. 1010/8, 1008, 1003/1, st. 1106, 1107, st. 1132, st. 1130, st. 1128, 1129, 1119, 1164, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/4, 1168/2, 1169/1, st. 1169/2, 1171/1, st. 1170, st. 1173, 1175/1, 1175/4, 1788/14,

1788/8, 1793, 1788/6, 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1797/3, 1797/5, 1798/5, 1799/2, 1800/12, 1800/11, 1800/9, 1800/8, 1800/6, 1800/5, 1800/4, 1800/51, 1801/1, 1801/3, 1801/2

katastrální území Zlích

st. 95, 473, st. 9, 186/3, st. 75, st. 52/1, 188/1, 191/16, 191/29, 191/21, st. 3, 14/1, st. 5, 478, 10/3, 10/2, 10/1, 9/2, 153/8, 26/2, 27/2, 469/1, 469/12, 469/16, 469/13, st. 83

- a další fyzické či právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být stavbou dotčena.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací:

Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování v koordinovaném závazném stanovisku č.j. MUNAC 12003/2023 ze dne 08.02.2023 uvádí, že podle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, nedojde ke změně v území a v daném případě závazné stanovisko nevydává.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Předmětná stavba je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby a bude umožňovat bezbariérový přístup a bezbariérové užívání stavby.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby. K tomu je třeba uvést, že stavební úřad nepovažuje za nutné na tomto místě uvádět kompletní přehled jednotlivých ustanovení a jejich konkrétní splnění. Ztotožňuje se tak s názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.05.2009 č.j. 1As 16/2009 – 115, k dispozici na www.nssoud.cz, kde je uvedeno: „Samozřejmě nelze po správních orgánech rozumně požadovat, aby do textu rozhodnutí o umístění stavby popisovaly posouzení jednotlivých hledisek umístění stavby, která vypočítává vyhláška č. 137/1998 Sb., Pokud je však narušení určitých hodnot včas namítáno, mají správní orgány povinnost se s nimi v odůvodnění svých rozhodnutí řádně vypořádat.“ Tento princip lze aplikovat i na stavební řízení a vyhlášky, které nahradily již neplatnou vyhlášku č. 137/1998 Sb.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na silničních pozemcích. Stavba bude realizována na pozemcích dotčených stavbou dle této projektové dokumentace. Vybavení staveniště bude omezeno na minimální skládky materiálu, nezbytně nutné vybavení pro zaměstnance zhotovitele stavby a dočasné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti v okolí staveniště.

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-kvalitativních podmínek, popřípadě podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. Staveniště je dopravně dostupné ze silnice....

Stavebník zajistí projednání dopravně inženýrských opatření před zahájením stavby.

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na silnicích III/3036, III/3049 a přilehlých pozemních komunikacích (uzavírkou – prováděním prací na komunikaci, pohybem staveništní

dopravy atd.), požádá zhotovitel v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová dokumentace – návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním orgánem s místně příslušným dopravním inspektorátem.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Vzhledem k druhu stavby, kdy se jedná o opravu stávající silnice, nevyvolává stavba negativní vlivy na své okolí. Odtokové poměry v území navržený stavební záměr nemění, nenavýšuje bilanci srážkových vod ani nemění způsob odvodnění území.

Dále bude obnoveno a aktualizováno svislé a vodorovné dopravní značení. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. KRPH-52327/ČJ-2021-050506 ze dne 02.07.2021,
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Hradec Králové č.j.,
- vyjádření CETIN a.s., Praha č.j. 692870/21 ze dne 08.07.2021,
- vyjádření Českoskalické vodárny, s.r.o. zn. ČV/769-2021/VTÚ/Kle ze dne 19.07.2021, zn. ČV/68-2023/VTÚ/Kle ze dne 19.01.2023,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0101869136 ze dne 13.01.2023, souhlas zn. 001131252069 ze dne 25.01.2023, souhlas zn. 001131251971 ze dne 25.01.2023, souhlas zn. 001116840394 ze dne 05.07.2021,
- sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s. zn. 0201515067 ze dne 13.01.2023,,
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700651051 ze dne 13.01.2023,
- stanovisko GasNet, s.r.o., Brno zn. 5002401350 ze dne 12.07.2021,
- stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové č.j. PLa/2022/040315 ze dne 12.10.2022,
- vyjádření Rtně.net s.r.o., Ryzně v Podkrkonoší č.ž. 2021/47 ze dne 20.06.2021,
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s., Praha č.j. 1202111907 ze dne 10.06.2021,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odbor výstavby a územního plánování č.j. MUNAC 12003/2023 ze dne 08.02.2023,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odboru životního prostředí č.j. MUNAC 27416/2023/ŽP ze dne 21.03.2023,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod č.j. HSHK-3112-2/2021 ze dne 24.06.2021,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod č.j. KHSHK 17600/2021/HOK.NA/Va ze dne 11.06.2021,
- stanovisko Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové č.j. MO 168023/2021-5512Hk ze dne 08.06.2021,
- sdělení Městského úřadu Česká Skalice, Odboru výstavby a životního prostředí č.j. MUCS/6767/2021/VÝST/Ře ze dne 17.06.2021.

Stavebník dále doložil:

- 2x paré projektové dokumentace zpracované
- dokladou složku
- plnou moc stavebníka Královéhradeckého kraje pro společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. a pověření jejího zaměstnance Petra Vaněčka

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo do projektové dokumentace, popř. jsou uvedeny v podmínkách povolení. Mezi těmito stanovisky nebyly žádné rozpory, které by bylo třeba řešit. K záměru byla doložena stanoviska vlastníků správců sítí technického vybavení dotčených stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany veřejných sítí nacházejících se v blízkosti stavby a podmínky vlastníků a správců ostatních komunikací. Za tímto účelem byly v rozhodnutí stanoveny podmínky na splnění požadavků vlastníků a správců sítí technického vybavení obsažených v jednotlivých vyjádřeních. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podmínka správců (vlastníků) sítí technického vybavení, toků apod. stavební úřad uvedl pouze odkazem na příslušné stanovisko, neboť tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v její dokladové části.

Formu odkazu na vydaná vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury stavební úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.02.2004 č.j. 5A 137/2000-37: „Stejně tak má Nejvyšší správní soud zato, že zapracování vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců inženýrských sítí u liniových staveb by znamenalo neúměrné zvětšení rozsahu správního rozhodnutí na úkor jeho přehlednosti. Není účelem odůvodnění správního rozhodnutí opisovat obsah spisu, ale jasně a stručně popsat skutkový stav, označit důkazy a rozebrat důvody, které vedly k rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy každý z účastníků řízení má možnost nahlédnout do správního spisu, seznámit se s obsahem listinných důkazů zde uložených, a kdy ze správního rozhodnutí je zřejmé, o jaké důkazy se správní orgán při svém rozhodnutí opíral, nelze dovozovat jeho přezkoumatelnost.“

Dle ustanovení § 17 odst. 1 silničního zákona je stavba silnice, její součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšná, pro kterou ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona (§ 184a odst. 3 stavebního zákona – souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem).

Speciální stavební úřad uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu – silnici, jak je výše uvedeno, nedokládá se pro vydání povolení souhlas vlastníka pozemku.

Stavby zařízení stavenišť nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavba nesmí být zahájena, pokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavbu nelze zahájit, nebude-li stavebník disponovat souhlasem vlastníka pozemku k provedení stavebního záměru (není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo práva stavby).

Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho planosti. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upustil; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Doba platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka vydanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Stavebník je dle ustanovení § 79 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.



ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ
Ivana Hradecká

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení
Ivana Hradecká



Ing. Radka Konárková v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:


Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Městský úřad Česká Skalice tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu pod dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.

Příloha:

Situační výkres širších vztahů

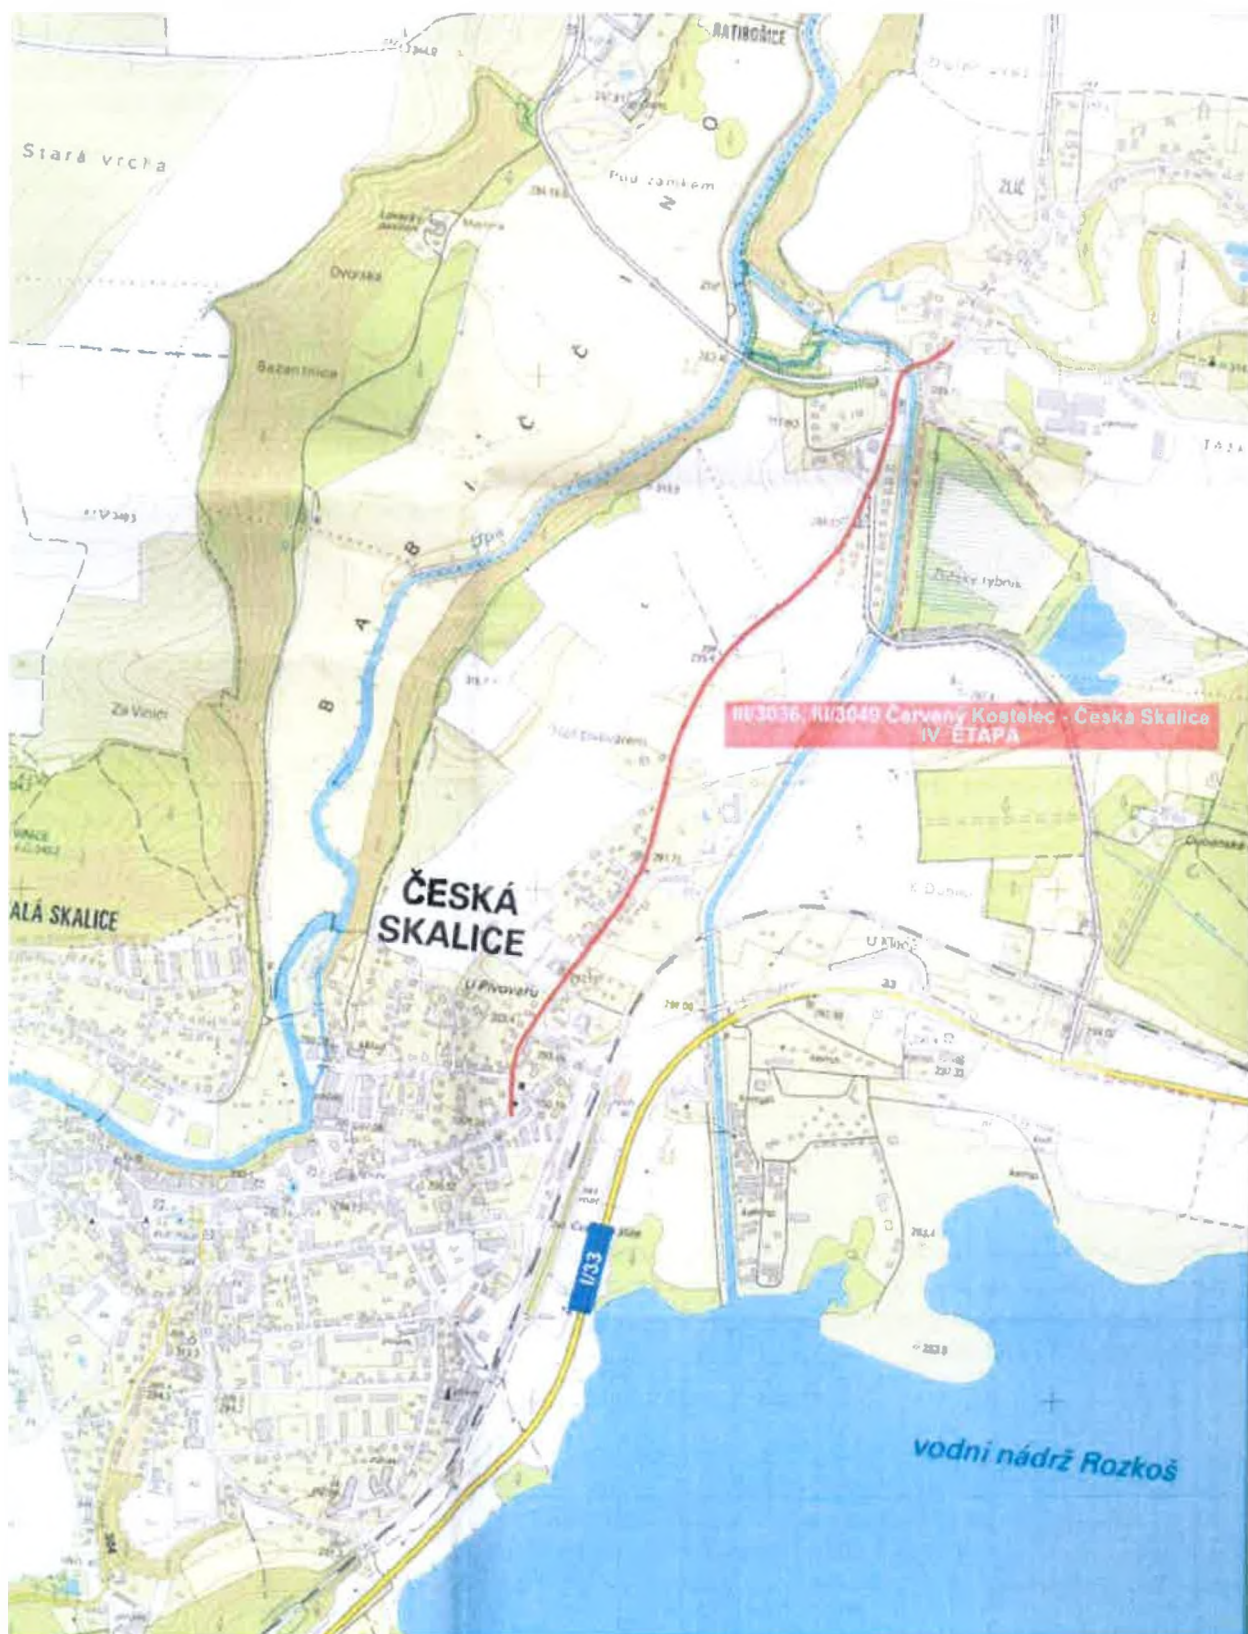

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručí se do vlastních rukou)

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (*stavebník*):
 - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s., IČO: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové

- podle § 109 písm. b), c) stavebního zákona (*vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):
 - Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČO: 709 47 996, sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - [redacted], datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - [redacted], datum narození: [redacted], bytem: [redacted]
 - [redacted], datum narození: [redacted], bytem: [redacted]
 - PENZION BARUNKA s.r.o., IČO: 259 48 211, sídlo: Zlíč 46, 552 03 Česká Skalice
 - Povodí Labe, s.p., IČO: 708 90 005, sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 - Projekt Zlíč, IČO: 026 87 585, sídlo: Nádražní 92, 513 01 Semily
 - Město Česká Skalice, IČO: 002 72 591, sídlo: Třída T.G.Masaryka 80, 55203 Česká Skalice
 - [redacted], datum narození: [redacted], bytem: [redacted]
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - [redacted] datum narození: [redacted], bytem: [redacted]
 - [redacted], datum narození: [redacted] bytem: [redacted]

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]
 - GasNet, s.r.o., IČO: 272 95 567, sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
 - Českoskalické vodárny, s.r.o., IČO: 274 81 566, sídlo: Křenkova 57, 552 03 Česká Skalice
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín
 - CETIN a.s., IČO: 040 84 063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 - Rtně.net s.r.o., IČO: 076 43 730, sídlo: Hronovská 573, 542 33 Rtně v Podkrkonoší
 - [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]

- [redacted] datum narození: [redacted], bytem: [redacted]

- [redacted] datum narození: [redacted] bytem: [redacted]

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručí se veřejnou vyhláškou)

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*)

katastrální území Česká Skalice

1212/3, 1212/6, 1212/5, 1212/4, 1212/2, 1210/7, 1211/3, 1210/3, 1210/6, 1206/33, 1206/34, 1206/35, 1206/36, 1207/1, 1206/50, 1206/10, 1206/9, 1206/37, 1206/38, 1206/6, 1200/1, 1198/4, 1198/1, 1198/2, 1201/1, st. 1196, st. 1176, st. 1178, st. 1180, 1183, st. 1153, st. 1155, st. 1157/1, st. 1159, st. 1161/1, 1161/3, 1147/3, st. 1146/3, st. 1146/1, 1147/4, 1147/7, 1147/9, 1145/2, 1145/1, st. 1144, 1143/1, st. 1141, 1140/2, 1140/1, st. 1136, st. 1133, 1134, st. 1105/3, st. 1105/2, 1105/1, 1058, 1010/6, st. 1010/8, 1008, 1003/1, st. 1106, 1107, st. 1132, st. 1130, st. 1128, 1129, 1119, 1164, 1166/3, 1167/1, 1167/2, 1168/4, 1168/2, 1169/1, st. 1169/2, 1171/1, st. 1170, st. 1173, 1175/1, 1175/4, 1788/14, 1788/8, 1793, 1788/6, 1789/1, 1789/2, 1789/3, 1789/4, 1797/3, 1797/5, 1798/5, 1799/2, 1800/12, 1800/11, 1800/9, 1800/8, 1800/6, 1800/5, 1800/4, 1800/51, 1801/1, 1801/3, 1801/2

katastrální území Zlích

st. 95, 473, st. 9, 186/3, st. 75, st. 52/1, 188/1, 191/16, 191/29, 191/21, st. 3, 14/1, st. 5, 478, 10/3, 10/2, 10/1, 9/2, 153/8, 26/2, 27/2, 469/1, 469/12, 469/16, 469/13, st. 83

Dotčené orgány (doručí se do vlastních rukou)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČO: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod: IČO: 708 82 525, sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
- Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování

K vyvěšení na úřední desce:

Městského úřadu Náchod, Němcové 2020, 547 01 Náchod

Městský úřad Česká Skalice

Vypraveno dne: 27. 03. 2023

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp.zn.: MUNAX0115BBV (PID)
KS 856/2023/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 66805/2024/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Datum: 21.05.2024

Adresát:

CETIN a.s., IČO: 04084063, sídlo: Českomoravská 251/19, Libeň, 190 00 Praha 9

SDĚLENÍ

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 17.05.2024 žádost společnosti CETIN a.s., sídlem Českomoravská 251/19, Libeň, Praha 9 o stanovisko k překládce telekomunikačního vedení a zařízení.

Tato překládka je vynucena stavbou „**III/3036, III/3049 Červený Kostelec – Česká Skalice, IV. etapa**“ v katastrálním území **Zlích**, pro kterou bylo vydáno Městským úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 27.03.2023 pod č.j. MUNAC 25284/2023/DSH/IHR stavební povolení s nabytím právní moci dne 13.10.2023.

Během stavby bude vytvořena provizorní trasa metalických kabelů mimo prostor rekonstrukce mostu. V tělese mostu budou umístěny chráničky pro trvalé umístění tras metalického kabelu společnosti CETIN a.s.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stavební zákon mění a doplňuje (dále jen „stavební zákon“) a příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) Vám tímto sděluje, že provizorní umístění trasy metalických kabelů během stavby nevyžaduje umístění ani povolení stavebního úřadu.

Konečné umístění tras metalického kabelu společnosti CETIN a.s. je v souladu s výše uvedeným stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Uložení těchto sítí se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení a veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

otisk úředního razítka
za správnost vyhotovení
Ivana Hradecká

Ing. Vlastimil Fiala v. r.
zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Rozdělovník:

- CETIN a.s., IČO: 04084063, sídlo: Českomoravská 251/19, Libeň, 190 00 Praha 9



92518/2022/KHK



KUKHK-30373/MJ/2022

Královéhradecký kraj

Mgr. Martin Červíček
hejtmán

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-30373/MJ/2022

VYŘIZUJE: Mgr. Ludmila Šimová
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor majetkoprávní | Majetkové
MOBIL: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 01.09.2022

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupený hejtmánem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 03. 2022,

u d ě l u j e p l n o u m o c

společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**, IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jířím Brandejsem, ředitelem společnosti, **k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci (včetně rekonstrukcí a odstranění) staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:**

- a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- b) jednání s územními samosprávnými celky, právníckými a fyzickými osobami ve věcech týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků

- a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými pozemky;
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;
- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů, umístění a realizaci staveb (řízení o odstranění stavby, územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právními osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

poř. č. legalizace 1714/2022

vlastnoručně podepsal* - uznal podpis na listině za vlastní*

Mgr. Martin Červíček

jméno a příjmení, datum a místo narození zadatele

VYSOKOV 186, OKR. NÁCHOD

adresa místa trvalého pobytu* - adresa místa pobytu na území České republiky*-

adresa bydliště mimo území České republiky*-

druh a místo, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

v Hradci Králové dne 01.09.2022

Michela Klimešová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby



Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje



USNESENÍ
z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje,

konané dne 5.2.2024

Pověření k rozhodování dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

USNESENÍ RK/6/193/2024

Rada Královéhradeckého kraje

I. r u š í

usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.2.2023

II. p r o j e d n a l a

možnosti svěřeni rozhodování na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), hejtmanovi Královéhradeckého kraje nebo Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

III. s v ě ř u j e

hejtmanovi Královéhradeckého kraje rozhodování

1. o zřizování, změnách a rušení věcných břemen, pokud finanční plnění spojené s takovým jednáním nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH
2. o uzavírání, změnách a rušení smluv o právu provést stavbu případně smluv o smlouvách budoucích o právu provést stavbu, pokud finanční plnění s nimi spojené nepřesáhne 100.000 Kč bez DPH
3. o založení, změnách a zrušení zástupčího vztahu k jednání za Královéhradecký kraj a udělení plné moci nebo pověření, není-li pro právní jednání, které má být provedeno zástupcem, nutné rozhodnutí jiného orgánu kraje
4. o udělování souhlasů a podávání námitek Královéhradeckým krajem, a to:
 - a) o udělení souhlasu kraje, nebo podání námitek kraje jako vlastníka dotčených nemovitých věcí v případě postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména v územních a stavebních řízeních, a dále v případě postupů podle zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů,
 - b) o udělení souhlasu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a nakládání s nimi;
 - c) o udělení souhlasu vlastníka nemovité věci s nahlížením do historických dokumentů, spisových materiálů a pořizování jejich kopií;
5. o dispozicích s pozemky ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, a to:
 - a) o žádosti o vydání rozhodnutí o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu;
 - b) o žádosti o vydání souhlasu s odnětím pozemku ze ZPF;

- c) o žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území;
 - d) o návrhu na změnu využití nebo změnu druhu pozemků;
 - e) o návrhu na sloučení či dělení pozemků;
 - f) o žádosti o vydání rozhodnutí v pochybnosti dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona o lesích;
6. o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a o uzavírání dohod a smluv o zajištění bezplatné odborné praxe
7. o uzavírání smluv o poskytnutí a ochraně datových sad s obcemi Královéhradeckého kraje
8. o uzavírání smluv v oboru zdravotnictví a lékařství, a to:
- a) o uzavírání smluv na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů (popř. dalších pohotovostních služeb dle potřeb Královéhradeckého kraje);
 - b) o uzavírání smluv o zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou a úhradě nákladů s tímto spojených, nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění;
 - c) o uzavírání smluv o poskytnutí zdravotnických služeb při mimořádných událostech (nasmlouvání dopravně zdravotní služby, domácí zdravotní péče, lůžkových zdravotnických zařízení, lékáren);
 - d) o uzavírání smluv o provádění prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti osob pro potřeby odvodního řízení v Královéhradeckém kraji dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;
9. o bezplatném užívání prostor využívaných Královéhradeckým krajem v Regiocentru Nový pivovar, včetně movitých věcí s užíváním těchto prostor souvisejících, a to místností P1.906, P1.118, P1.412, P1.411, P1.443, P1.437, P1.907, P1.921, N2.906, N2.902, N2.903, N2.901, N2.905a, N2.905b, N2.904, N2.923, N2.922, N2.926, N2.924, N2.921
10. o zahájení postupu v jednacím řízení bez uveřejnění a následném zadávání veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
11. uzavírání smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, případně smluv o smlouvách budoucích o realizaci přeložek inženýrských sítí, a smluv o převodu práv a povinností z těchto smluv, vznikla-li potřeba jejich realizace v souvislosti s prováděním stavebních akcí Královéhradeckého kraje
12. uzavírání smluv o poskytování služeb souvisejících s užíváním nemovitých věcí vlastněných Královéhradeckým krajem, jsou-li dané nemovité věci předané k hospodaření příspěvkové organizaci a smlouva o poskytování služby musí být uzavřena s vlastníkem nemovité věci
13. o nabývání a převodu movitých věcí včetně peněz, nabývání a převodu práv duševního vlastnictví Královéhradeckým krajem a pořizování služeb pro Královéhradecký kraj v maximální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě (včetně smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod a smluv o dodávkách elektrické energie, tepla a plynu), zejména v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

14. o pořizování stavebních prací pro Královéhradecký kraj v maximální hodnotě 6.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě, v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
15. o uzavírání dodatků ke smlouvám uzavřeným Královéhradeckým krajem, včetně smluv schválených Radou Královéhradeckého kraje, pokud jimi dochází k úpravě předmětu smlouvy (např. vícepráce nebo méněpráce), změně termínu plnění, k opravě nesprávností nebo ke změně pověřených osob, jestliže těmito dodatky založené plnění kraje v případě stavebních prací nepřesáhne částka navýšení 3.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě, v ostatních případech (služby a dodávky) nepřesáhne částka navýšení 1.000.000 Kč bez DPH, v jednotlivém případě, zejména v souladu s pravidly dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek
16. o otevírání a rušení běžných účtů u finančních ústavů
17. o podání příslušných vyjádření, řádných (zejména odvolání či stížnost) či mimořádných opravných prostředků, a to v rámci příslušných soudních, trestních, správních či jiných řízení včetně případného uplatnění náhrady škody či jiné újmy v příslušných řízeních
18. o přidělení služebního vozidla členu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro služební a soukromé účely včetně rozhodování o uzavírání, změně či zrušení příslušné smlouvy
19. o schvalování nabídek na provádění akcí a činností na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v maximální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH v jednotlivém případě.

IV. s v ě ř u j e

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje

1. oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví rozhodování o uzavírání dohod o provedení práce podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hodnota plnění bude v jednotlivém případě maximálně 20.000 Kč a jejichž předmětem bude:
 - a) účast členů výběrové komise na výběrových řízeních před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
 - b) zpracování odborných stanovisek, posudků či vyjádření k podnětům, přezkumům nebo stížnostem dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně pořizování výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace a její posuzování pro účely archivace;
 - c) účast členů nezávislé odborné komise v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) účast na kontrolách prováděných dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů
2. odboru investic rozhodování o uzavírání, změnách a rušení nájemních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům třetích osob v souvislosti s realizací stavebních akcí Královéhradeckého kraje, kdy má kraj v daném smluvním vztahu vystupovat jako nájemce, resp. vypůjčitel
3. odboru dopravy a silničního hospodářství rozhodování v následujících

věcech:

- a) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje autobusovému nebo drážnímu dopravci, který zajišťuje dopravní obslužnost na základě uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s Královéhradeckým krajem z důvodu realizace řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve veřejném zájmu nebo zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení nouzového stavu ze strany vlády ČR, případně jiných regulačních opatření znamenající omezení nebo zákaz volného pohybu osob s dopadem na hybnost obyvatelstva) po projednání s členem rady kraje odpovědným za oblast dopravy, a za podmínky nepřekročení maximální výše kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti schváleného pro příslušný kalendářní rok
 - b) schvalování změn Objednávky Královéhradeckého kraje se Středočeským, Pardubickým nebo Libereckým krajem, který objednává podle podmínek uvedených v mezikrajské smlouvě pro autobusovou a drážní dopravu u smluvních dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti části území Královéhradeckého kraje, a to z důvodu realizace řádné nebo mimořádné změny jízdních řádů ve veřejném zájmu nebo zásahem třetí moci (např. v případě vyhlášení nouzového stavu ze strany vlády ČR, případně jiných regulačních opatření znamenající omezení nebo zákaz volného pohybu osob s dopadem na hybnost obyvatelstva) po projednání s členem rady kraje odpovědným za oblast dopravy a za podmínky nepřekročení maximální výše kilometrického rozsahu dopravní obslužnosti schváleného pro příslušný kalendářní rok
 - c) podávání žádostí o dotaci z rozpočtu obcí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,
 - d) schvalování plánu zimní údržby silnic I., II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje pro příslušné zimní období dle ustanovení Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
 - e) schvalování Výrobního plánu Královéhradeckého kraje na příslušný rok dle ustanovení Příkazní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 - f) schvalování výjimek z Technických a provozních standardů veřejné dopravy v autobusové a drážní dopravě dle podmínek vyplývajících z uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.
4. oddělení majetkovému odboru majetkosprávnímu a krajskému živnostenskému úřadu Královéhradeckého kraje rozhodování o uzavírání, změnách a rušení smluv (včetně vyhotovování a odesílání objednávek, týkajících se zejména zadávání znaleckých posudků a geometrických plánů) souvisejících se správou a údržbou majetku, jejichž plnění nepřesáhne částku 20.000 včetně DPH

V. p o v ě ř u j e

1. vedoucí/ho oddělení zdravotnictví odboru zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování smluv, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto podle bodu IV. odst. 1 tohoto usnesení
termín: 31.12.2024
2. vedoucí/ho odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podepisování smluv, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto podle bodu IV. odst. 2 tohoto usnesení
termín: 31.12.2024

3. vedoucí/ho odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování dokumentů vyhotovených při rozhodnutích učiněných na základě bodu IV. odst. 3 tohoto usnesení
termín: 31.12.2024
4. vedoucí/ho oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podepisováním žádostí o dotaci z rozpočtu obcí na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou dle bodu IV. odst. 3 písm. c) tohoto usnesení
termín: 31.12.2024
5. vedoucí/ho oddělení majetkového odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podepisování smluv (dokumentů), o jejichž uzavření bylo rozhodnuto, nebo které byly vyhotoveny podle bodu IV. odst. 4 tohoto usnesení
termín: 31.12.2024

VI. u k l á d á

1. hejtmanovi Královéhradeckého kraje
 - a) zajistit realizaci přijatého usnesení
termín: 31.12.2024
 - b) čtvrtletně předkládat Radě Královéhradeckého kraje seznam všech rozhodnutí, která byla přijata na základě § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
termín: 31.12.2024
2. vedoucím odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 - a) zajistit jednoznačné vizuální odlišení předkládacích návrhů k písemnostem vyhotoveným na základě §59 odst. 4 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jejich podepsání příslušným gestorem
 - b) do deseti dnů od konce každého třetího kalendářního měsíce zaslat seznam všech předkládacích návrhů k písemnostem vyhotoveným na základě tohoto usnesení příslušné osobě z odboru kancelář hejtmána Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Luboše Mináře

Supervizor, VFS Čechy východ

os. č. [REDAKCE] nar. dne [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích a rozhodnutí odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.
