

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**  
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO : 708 85 371  
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH  
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem  
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1  
Číslo účtu :   
Telefon :   
Fax :   
ID DS :   
Podatelna : 

(dále jen "objednatel")

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:



a

2. Zhotovitel : **Král Elektro s.r.o.**  
Sídlo : Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka 385365  
IČO : 19360550  
DIČ : CZ19360550  
Zastoupený : Miloš Král, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu :   
Telefon :   
ID DS : ansfz68  
E-mail :   
(dále jen „zhotovitel“)

Pověřené osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech týkajících se předání předmětu smlouvy:



Pověřené osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy:



## Článek II.

### Podklady pro uzavření smlouvy

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-4310/2024-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu, a bylo realizováno uzavřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo N006/24/V00017998.
3. Všechny objednatelům zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou zhotovitele s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy zhotovitel nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro objednatel), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a objednatel je prokazatelně akceptoval.

## Článek III.

### Základní ustanovení

1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a odborných znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. Zároveň prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu občanského zákoníku /např. § 5 a § 2950/.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Zhotovitel zajistí a garantuje, že veškeré práce na předmětu smlouvy budou provedeny v souladu s předmětem smlouvy souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů požární ochrany, platnými v době realizace díla. Při realizaci díla budou použity výhradně materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu odstraněním těchto materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Postup prací bude vždy předem projednán s veliteli jednotlivých hasičských stanic (kontakty jsou uvedené v Příloze č. 1). Objednatel si vyhrazuje právo schválení zpracované a předložené projektové dokumentace, a to bez zbytečného odkladu. V případě, kdy bude předložená projektová dokumentace v rozporu se zájmy objednatele je zhotovitel povinen projektovou dokumentaci bezodkladně upravit v souladu s požadavkem objednatele. V případě, že by požadavek objednatele byl v rozporu s právními nebo technickým předpisy, je zhotovitel povinen na toto objednatel písemně upozornit. Objednatel vrátí zhotoviteli dvě paré projektové dokumentace pro každou hasičskou stanicí samostatně s podpisem oprávněné osoby jako projev souhlasu s obsahem projektové dokumentace.

5. Zhotovitel odpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel dále odpovídá za to, že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v části, kde jsou umístěny prostředky HZS. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit, vyčistit prostor staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu a vzhledu. Do pěti (5) kalendářních dnů staveniště protokolárně předá zhotovitel objednateli zpět. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, škody a práce prováděné jeho poddodavateli, je jediným odpovědným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel seznámí své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací, jakož i věcným a časovým harmonogramem prací.
7. Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit za objednatele stavby, veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně prováděcích předpisů, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.
8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě u Raiffeisenbank a.s. na částku 5 000 000 za jedno pojistné plnění.
9. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, hygieny apod. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.
10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé vadou díla, užitých materiálů a prováděných prací, a to včetně škod na životech, zdraví i jiných věcech.
11. Zhotovitel je povinen v místě plnění bezodkladně odstranit na své náklady odpady (včetně likvidace nebezpečných odpadů) a nečistoty vzniklé jeho činností na staveništi a na dalších pozemcích potřebných k realizaci předmětu smlouvy a staveniště udržovat v řádné čistotě. V případě porušení povinnosti odstranění těchto odpadů a nečistot vzniklých činností zhotovitele a neudržování staveniště v řádné čistotě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou.
12. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení apod.), se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, včetně dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí dodávky zboží splnění předmětného požadavku či dodání předmětného dokumentu.

#### Článek IV.

##### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: **Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie** (dále též „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo, nebo jeho části bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu ve výši dle čl. VII. odst. 2, této smlouvy.
2. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) připojovacích bodů pro 8 hasičských stanic (dále jen „8 stanic“) **v rozsahu prováděcí PD** – ve čtyřech (4) vyhotoveních a zároveň 1x v elektronické podobě na externím nosiči ve formátu PDF a DWG (nativní formát souborů – výkresů programu AutoCad či jiného obdobného softwaru pro 2D a 3D projektování a konstruování) pro každou hasičskou stanicí samostatně. Součástí PD bude projektantem oceněný položkový výkaz výměr v jednom vyhotovení

a zároveň 1 x v elektronické editovatelné podobě na externím nosiči USB flash disk, rovněž pro každou hasičskou stanici samostatně.

3. Dílo se zavazuje zhotovitel realizovat v rozsahu vymezeném touto smlouvou včetně přílohy č. 2 k této smlouvě. V částech, ve kterých se shoduje nabídka zhotovitele se zadávací dokumentací a jejími přílohami, je dílo specifikováno nabídkou zhotovitele, v ostatním je dílo specifikováno zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zhotovitel je s touto skutečností zcela srozuměn a je plně vázán zhotovit dílo v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací v případě, že jeho nabídka není plně totožná s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

## Článek V.

### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo, specifikované v čl. IV. této smlouvy, v době:  
Termín zahájení: nejpozději **do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**  
Termín kompletního dokončení prací na stanicích: **nejpozději do 30. 11. 2024**
- 2.1. Místem předání „PD“: **Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno.**
- 2.2 Místem plnění díla jsou: **hasičské stanice podle Přílohy č. 1**
- 2.3 Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli harmonogram podle jednotlivých hasičských stanic. V harmonogramu budou uvedeny konkrétní termíny provádění prací (projektová dokumentace, vlastní realizace a výchozí revize) - Příloha č. 4.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místa plnění důkladně prohlédl, jsou mu jasné a zřejmé podmínky předmětu smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, současně zvážil všechny objektivní podmínky realizace díla a v souladu s těmito skutečnostmi je plně schopen bez dalšího realizovat dílo v místě plnění. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení nabídkové ceny, zvláště pečlivě posoudil všechny skutečnosti rozhodné pro provedení díla a garantuje, že dílo je v čase a místě na základě jeho zjištění realizovatelné bez víceprací.
4. O předání a převzetí stavení na jednotlivých stanicích mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti o stavu stavení, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky stavení nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise.
5. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli.
6. O předání a převzetí díla na jednotlivých stanicích bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla či jiný odpovídající doklad (dále jen „předávací protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
7. Pokud zhotovitel připraví celé dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto celé dílo v nabídnutém zkráceném termínu při dodržení všech ustanovení této smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje, že dokončené celé dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
9. Podmínkou převzetí je taktéž předání atestů a certifikátů, které jsou požadovány dle právních předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace stavby a dále dle požadavků objednatele. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek a revizí osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách, respektive

kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle platných právních předpisů a technických norem a podmínek stanovených touto smlouvou a po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ve smlouvě ujednané.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku. Dobu pro zhotovení díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění této smlouvy, způsobeným epidemií, válečným konfliktem nebo zásahy veřejné moci. V případě, že zhotovitel nebude moci dodat bezvadné dílo v době podle čl. V odst. 1 této smlouvy, z důvodu vyhlášení krizového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu dodání díla.
12. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání díla musí tuto skutečnost oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby dodání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro její obnovení. Změna doby dodání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XVI. odst. 2. této smlouvy. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku krizového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy neexistuje problém s nedostatkem personálu či věcí ve smyslu odst. 11 výše. Důvod pro postup podle odst. 11 a 12 musí prokazatelně nastat po podpisu smlouvy s důkazním břemenem jdoucím k tíži zhotovitele.

#### Článek VI.

##### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy náleží od počátku objednateli po celou dobu realizace díla a po jeho dokončení.
2. Nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran po předání bezvadného a řádně dokončeného díla.

#### Článek VII.

##### Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, úplná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele.
2. Cena za zhotovené dílo podle čl. IV. odst. 1. činí:

Stavební připravenost – přípojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
	<b>HS Hořovice</b>			
2.1.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.2.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 307 470,-	b) 64 568,70	c) 372 038,70

<b>HS Roztoky u Prahy</b>				
2.3.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.4.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 307 470,-	b) 64 568,70	c) 372 038,70
<b>HS Jílové u Prahy</b>				
2.5.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.6.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 229 050,-	b) 48 100,50	C) 277 150,50
<b>HS Český Brod</b>				
2.7.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.8.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 307 470,-	b) 64 568,70	c) 372 038,70
<b>HS Kralupy nad Vltavou</b>				
2.9.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.10.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 307 470,-	b) 64 568,70	c) 372 038,70
<b>HS Benátky nad Jizerou</b>				
2.11.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.12.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 229 050,-	b) 48 100,50	c) 277 150,50
<b>HS Mnichovo Hradiště</b>				
2.13.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.14.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 229 050,-	b) 48 100,50	c) 277 150,50
<b>HS Poděbrady</b>				
2.15.	Projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb.	a) 32 600,-	b) 6 846,-	c) 39 446,-
2.16.	Realizace (dodávka, montáž, revize)	a) 229 050,-	b) 48 100,50	c) 277 150,50
<b>2.17.</b>	<b>Cena celkem za všechny HS</b>	<b>a) 2 406 880,-</b>	<b>b) 550 444,80</b>	<b>c) 2 912 324,80</b>

**Cena celkem slovy: Dvamiliondevětsetdvanácttisíctřistadvacetčtyři korun českých 80/100**

3. Cena díla byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako maximální a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady související s realizací díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, čímž se vylučuje aplikovatelnost § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel akceptuje zvláště významné upozornění objednatele, že změna cen vstupů, surovin, materiálů apod. není důvodem k navýšení ceny díla.
4. Součástí plnění jsou veškeré práce, dodávky a montáže, které sice nejsou uvedeny v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, ale jsou nezbytné pro kompletní provedení, zprovoznění a bezvadné předání díla v souladu s požadavky na kompletní dodávku díla dle požadavků objednatele a zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti musel v době podání nabídky a podpisu této smlouvy předpokládat. Pokud nabídka zhotovitele neobsahuje všechny náklady, které jsou nutné pro řádné dokončení plně funkčního díla bez vad bránícímu užívání a nedodělků, je toto riziko zhotovitele.
5. Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
6. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, než je stanoveno, je neprodleně povinen o této skutečnosti prokazatelně informovat kontaktní osobu uvedenou v čl. I a započaté práce na provádění díla přerušit do doby vyjádření objednatele (výslovný písemný souhlas objednatele). Za dodatečné práce (vícepráce) lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla a které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru. V této informaci je zhotovitel povinen uvést soupis předpokládaných změn, tyto změny ocenit a podat informaci o dopadu dodatečných prací na termín plnění. Provedení dodatečných prací musí být písemně odsouhlaseno zástupcem objednatele a musí být sepsán dodatek k této smlouvě o dílo.
7. Smluvní strany se dohodly, že fakturováno bude podle Přílohy č. 4 po dokončení a převzetí části díla bez vad a nedodělků, připomínek či zjištěných nesrovnalostí, které by nebyly v souladu se zadáním díla, a to za každou hasičskou stanicí zvláště.
8. Úhrada za provedené jednotlivé části díla bude uskutečněna na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s náležitostmi uvedenými v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku (zejména § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která bude prokazatelně doručena objednateli.
9. Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po řádném předání a převzetí jednotlivých částí díla objednatelům a zašle elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf do datové schránky objednatele, popřípadě na e-mailovou adresu: [redacted] z e-mailové adresy zhotovitele: [redacted] nebo v listinné podobě do sídla objednatele. Fakturační adresa bude sídlo objednatele. Přílohou faktury za realizační část musí být položkový soupis použitého materiálu včetně jeho ocenění (cena za kus, cena za počet kusů celkem) a soupis oceněných prací (cena za hodinu, cena za počet hodin celkem). Nedílnou součástí faktury bude též kopie předávacích protokolů či jiných odpovídajících dokladů podepsaných oběma smluvními stranami. Projektová dokumentace bude předána samostatně před realizací stavby.
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla

uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třicet) kalendářních dnů.

11. Závěrečné vyúčtování provede zhotovitel formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací faktuře budou zúčtovány všechny dílčí fakturace, které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle této smlouvy, které se vztahují k požadavkům na fakturaci zhotovitele.
12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třicet) kalendářních dnů.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při prodlení s dokončením díla (čl. V odst. 1) či doručení faktury (čl. VII odst. 14) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla; v tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit fakturu (daňový doklad) doručenou v období od druhé poloviny prosince 2024 do konce první poloviny března 2025.
14. Faktura musí být doručena objednateli **nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání jednotlivých částí díla.**
15. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.

#### Článek VIII.

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděného díla.
3. Objednatel je oprávněn upozornit zhotovitele na prokázané nedostatky při provádění díla.
4. Povinnosti zhotovitele – zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, řádně v patřičné kvalitě a včas, na svůj náklad a nebezpečí, a to v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

#### Článek IX.

##### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě, ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek X.

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného celého díla bez vad a nedodělků podle čl. V. této smlouvy ze strany zhotovitele, dále při porušení povinností uvedených v čl. III. odst. 5 a odst. 11, dále v případě nepřevzetí celého díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. VII odst. 2, pododst. 2.17, písm. c) za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně a oprávněně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 5 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok objednatele na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti zhotovitele).
6. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu objednatele započíst oproti ceně díla. Dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu objednatele a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).
7. Za splnění podmínek uvedených v čl. V. odst. 11 a 12 může objednatel obdobně ustoupit od uplatnění nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XI.

##### Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného celého díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
  - b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;
  - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. této smlouvy;
  - d) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele;
  - e) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně;
  - f) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s touto smlouvou.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Objednatel je povinen zhotoviteli vyrovnat provedené práce dokončené ke dni doručení výpovědi.
  5. Účinky každého odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.


## Článek XII.

### Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude dílo, jakož i jeho veškeré části, jednotlivé komponenty, dodané materiály a práce, způsobilé k sesmluvněnému a stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla, jeho jakost a vlastnosti v souladu požadavky na jeho vlastnosti dle této smlouvy a souvisejících právních předpisů a norem České republiky po celou záruční dobu, která u díla a všech jeho součástí a materiálů počíná běžet teprve dnem předání a převzetí celého díla objednateli, které bude předáno objednateli ve stavu plně způsobilém k jeho řádnému užívání.
3. Záruka za jakost díla a veškeré provedené práce se sjednává na dobu 72 měsíců a na dodaný materiál s vlastními záručními listy se sjednává na dobu 36 měsíců od řádného převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo nebo jeho komponenta či část bude po uvedené dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břemeno k tíži zhotovitele.

## Článek XIII.

### Postup při uplatnění vad

1. Reklamáce vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě na adresu zhotovitele: Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, nebo e-mailem na adresu . V reklamaci vady musí být popsány, anebo musí být popsáno, jak se projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
2. Na písemné oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí se způsobem a termínem odstranění vad uvedených v oznámení.
3. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává; nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, musí nastoupit k odstranění vady do patnácti (15) dnů ode dne obdržení reklamáce.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s termínem pro odstranění vady.

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do patnácti (15) dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu.
7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany reklamační protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
10. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené touto smlouvou. V případě, že takovým jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má současně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli, a to v plném rozsahu.
11. Po dobu od oznámení vady do jejího odstranění neběží záruční doba.
12. Veškeré náklady objednatele spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárok uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a zhotovitel je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

#### Článek XIV.

##### **Odpovědnost za škodu**

1. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností ze strany zhotovitele nebo vad díla škoda na majetku, odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností ze strany zhotovitele nebo vad díla škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu na zdraví včetně smrti nebo za škodu na jiné věci, způsobenou vadou díla vzniklou objednateli nebo třetí osobě a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).
4. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám.

#### Článek XV.

##### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední

části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského zákoníku. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele přístup na staveniště.

#### Článek XVI.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, prorogují smluvní strany pro jejich řešení české právo.
4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými kogentními českými právními předpisy a normami.
8. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, návody, faktury, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně v českém jazyce.
9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“
10. Zhotovitel bude s údaji týkajícími se díla dle této smlouvy zacházet šetrně, bude o nich zachovávat

mlčenlivost a nebudou jím zneužity ve vlastní prospěch. Zapůjčené podklady řádně předá zpět objednateli společně s předáním díla.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy se zavazuje dodržovat úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich porušování.
12. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
13. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací týkajících se této smlouvy postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě uveřejněn na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.
14. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; **tuto smlouvu uveřejní objednatel**. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a prohlašuje, že skutečnosti v ní uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Kontakty na velitele stanic

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2024

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy (doloží zhotovitel před podpisem smlouvy)

Příloha č. 4 – Harmonogram provádění podle jednotlivých hasičských stanic

Příloha č. 5 – Vzor předávacího protokolu

V případě rozporu mezi Přílohou č. 2 a touto smlouvou o dílo platí ujednání obsažená ve smlouvě o dílo.

V Praze 10.7.2024

Za zhotovitele:




**Milos Krai**  
jednatel společnosti  
Kral Elektro s.r.o.

V Kladně

11. 07. 2024

Za objednatele:



**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje

vrchní rada

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970 13  
272 01 Kladno  
2

**Příloha č. 1 Kontakty na velitele stanic**

	Adresa stanice:	Velitel stanice:	Pracovní telefonní číslo:	Pevná linka:
			e-mail velitel:	Fax
				e-mail stanice:
<b>Hořovice</b>	Nám. B. Němcové 811, Hořovice 268 01			
<b>Roztoky</b>	Máchova 449, Roztoky u Prahy 252 63			
<b>Jílové</b>	Rudných dolů 460, Jílové u Prahy 254 01			
<b>Český Brod</b>	Tyršova 73, Český Brod 282 01			
<b>Kralupy nad Vltavou</b>	Přemyslova 935, Kralupy nad Vltavou 278 01			
<b>Benátky n. Jizerou</b>	Jiráskova 362, Benátky nad Jizerou 294 71			
<b>Mnichovo Hradiště</b>	Hřbitovní 29, Mnichovo Hradiště 295 01			
<b>Poděbrady</b>	Krátká 1000, Poděbrady 290 01			

**Stavební připravenost - připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie****Rekapitulace**

hasičská stanice	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Hořovice	340070	71414,7	411484,7
Roztoky	340070	71414,7	411484,7
Jílové	261650	54946,5	316596,5
Český Brod	340070	71414,7	411484,7
Kralupy nad Vltavou	340070	71414,7	411484,7
Benátky nad Jizerou	261650	54946,5	316596,5
Mnichovo Hradiště	261650	54946,5	316596,5
Poděbrady	261650	54946,5	316596,5
<b>celkem</b>	<b>2 406 880,00 Kč</b>	<b>505 444,80 Kč</b>	<b>2 912 324,80 Kč</b>

celkem:


Zpracoval: Miloš Král  
dne: 24.06.2024


117

118

119







## Abstract

As a result of the 2008 financial crisis, the U.S. economy has experienced a significant decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.

The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.


The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.


The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.

The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.

The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.

The 2008 financial crisis had a profound impact on the U.S. economy, leading to a sharp decline in output and employment. This paper examines the impact of the crisis on the U.S. economy, focusing on the role of the financial system. We find that the crisis led to a sharp decline in output and employment, and that the financial system played a key role in this decline. We also find that the crisis led to a significant increase in government spending and a decrease in private investment.

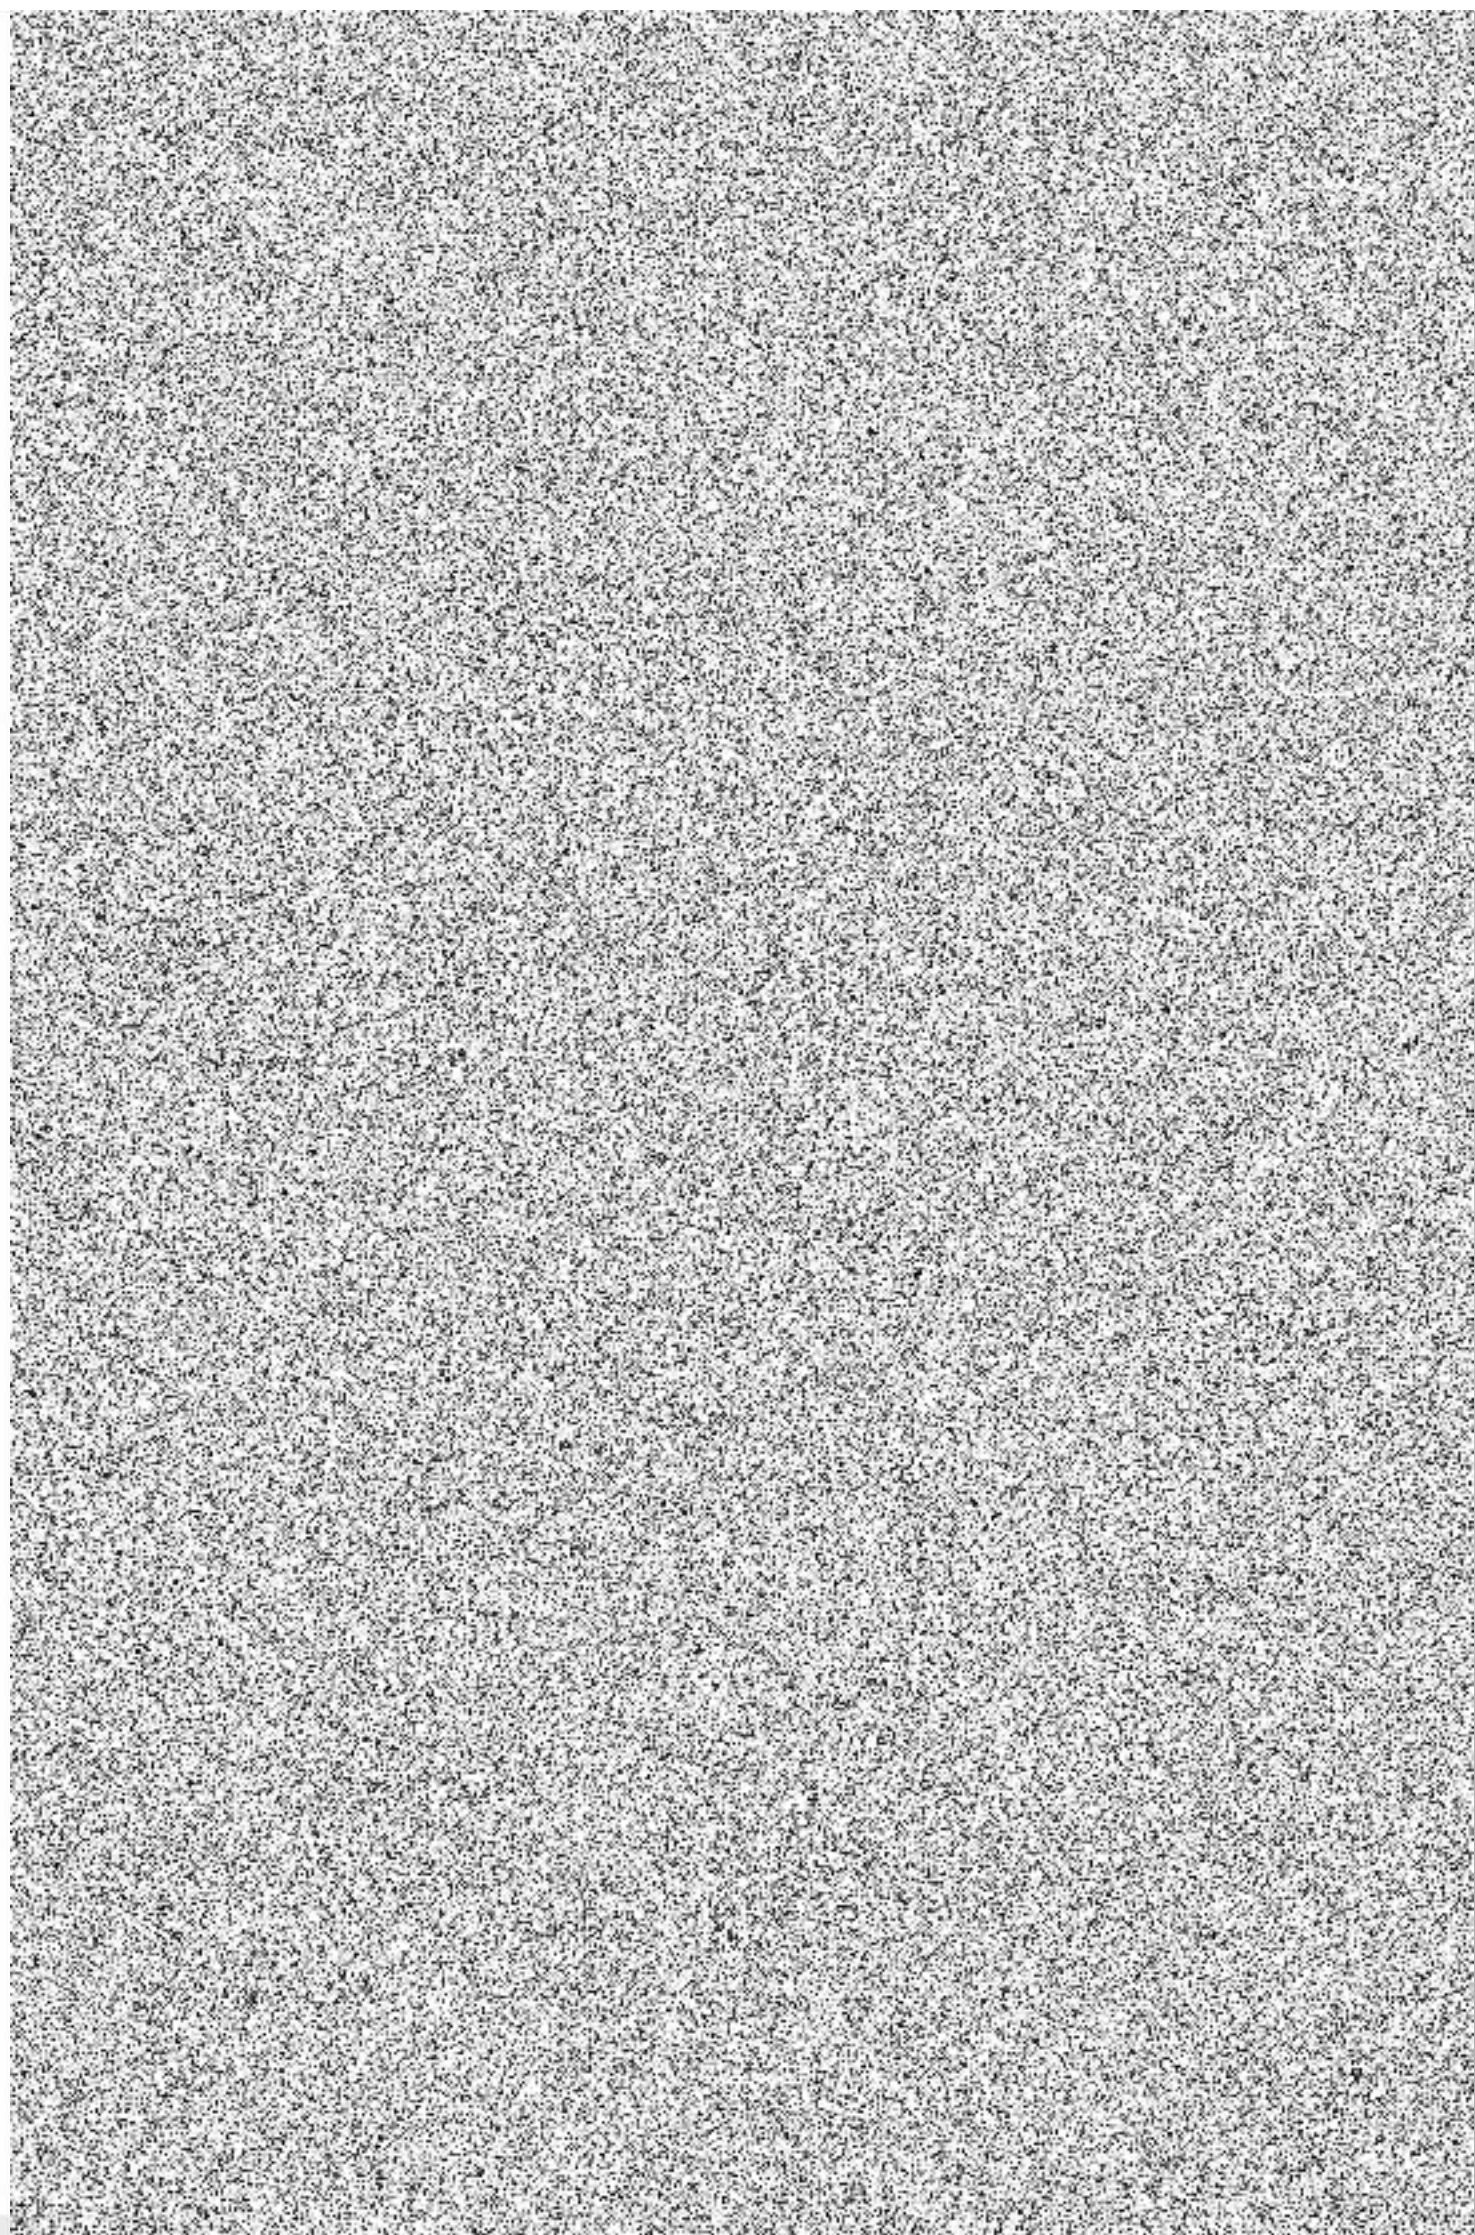

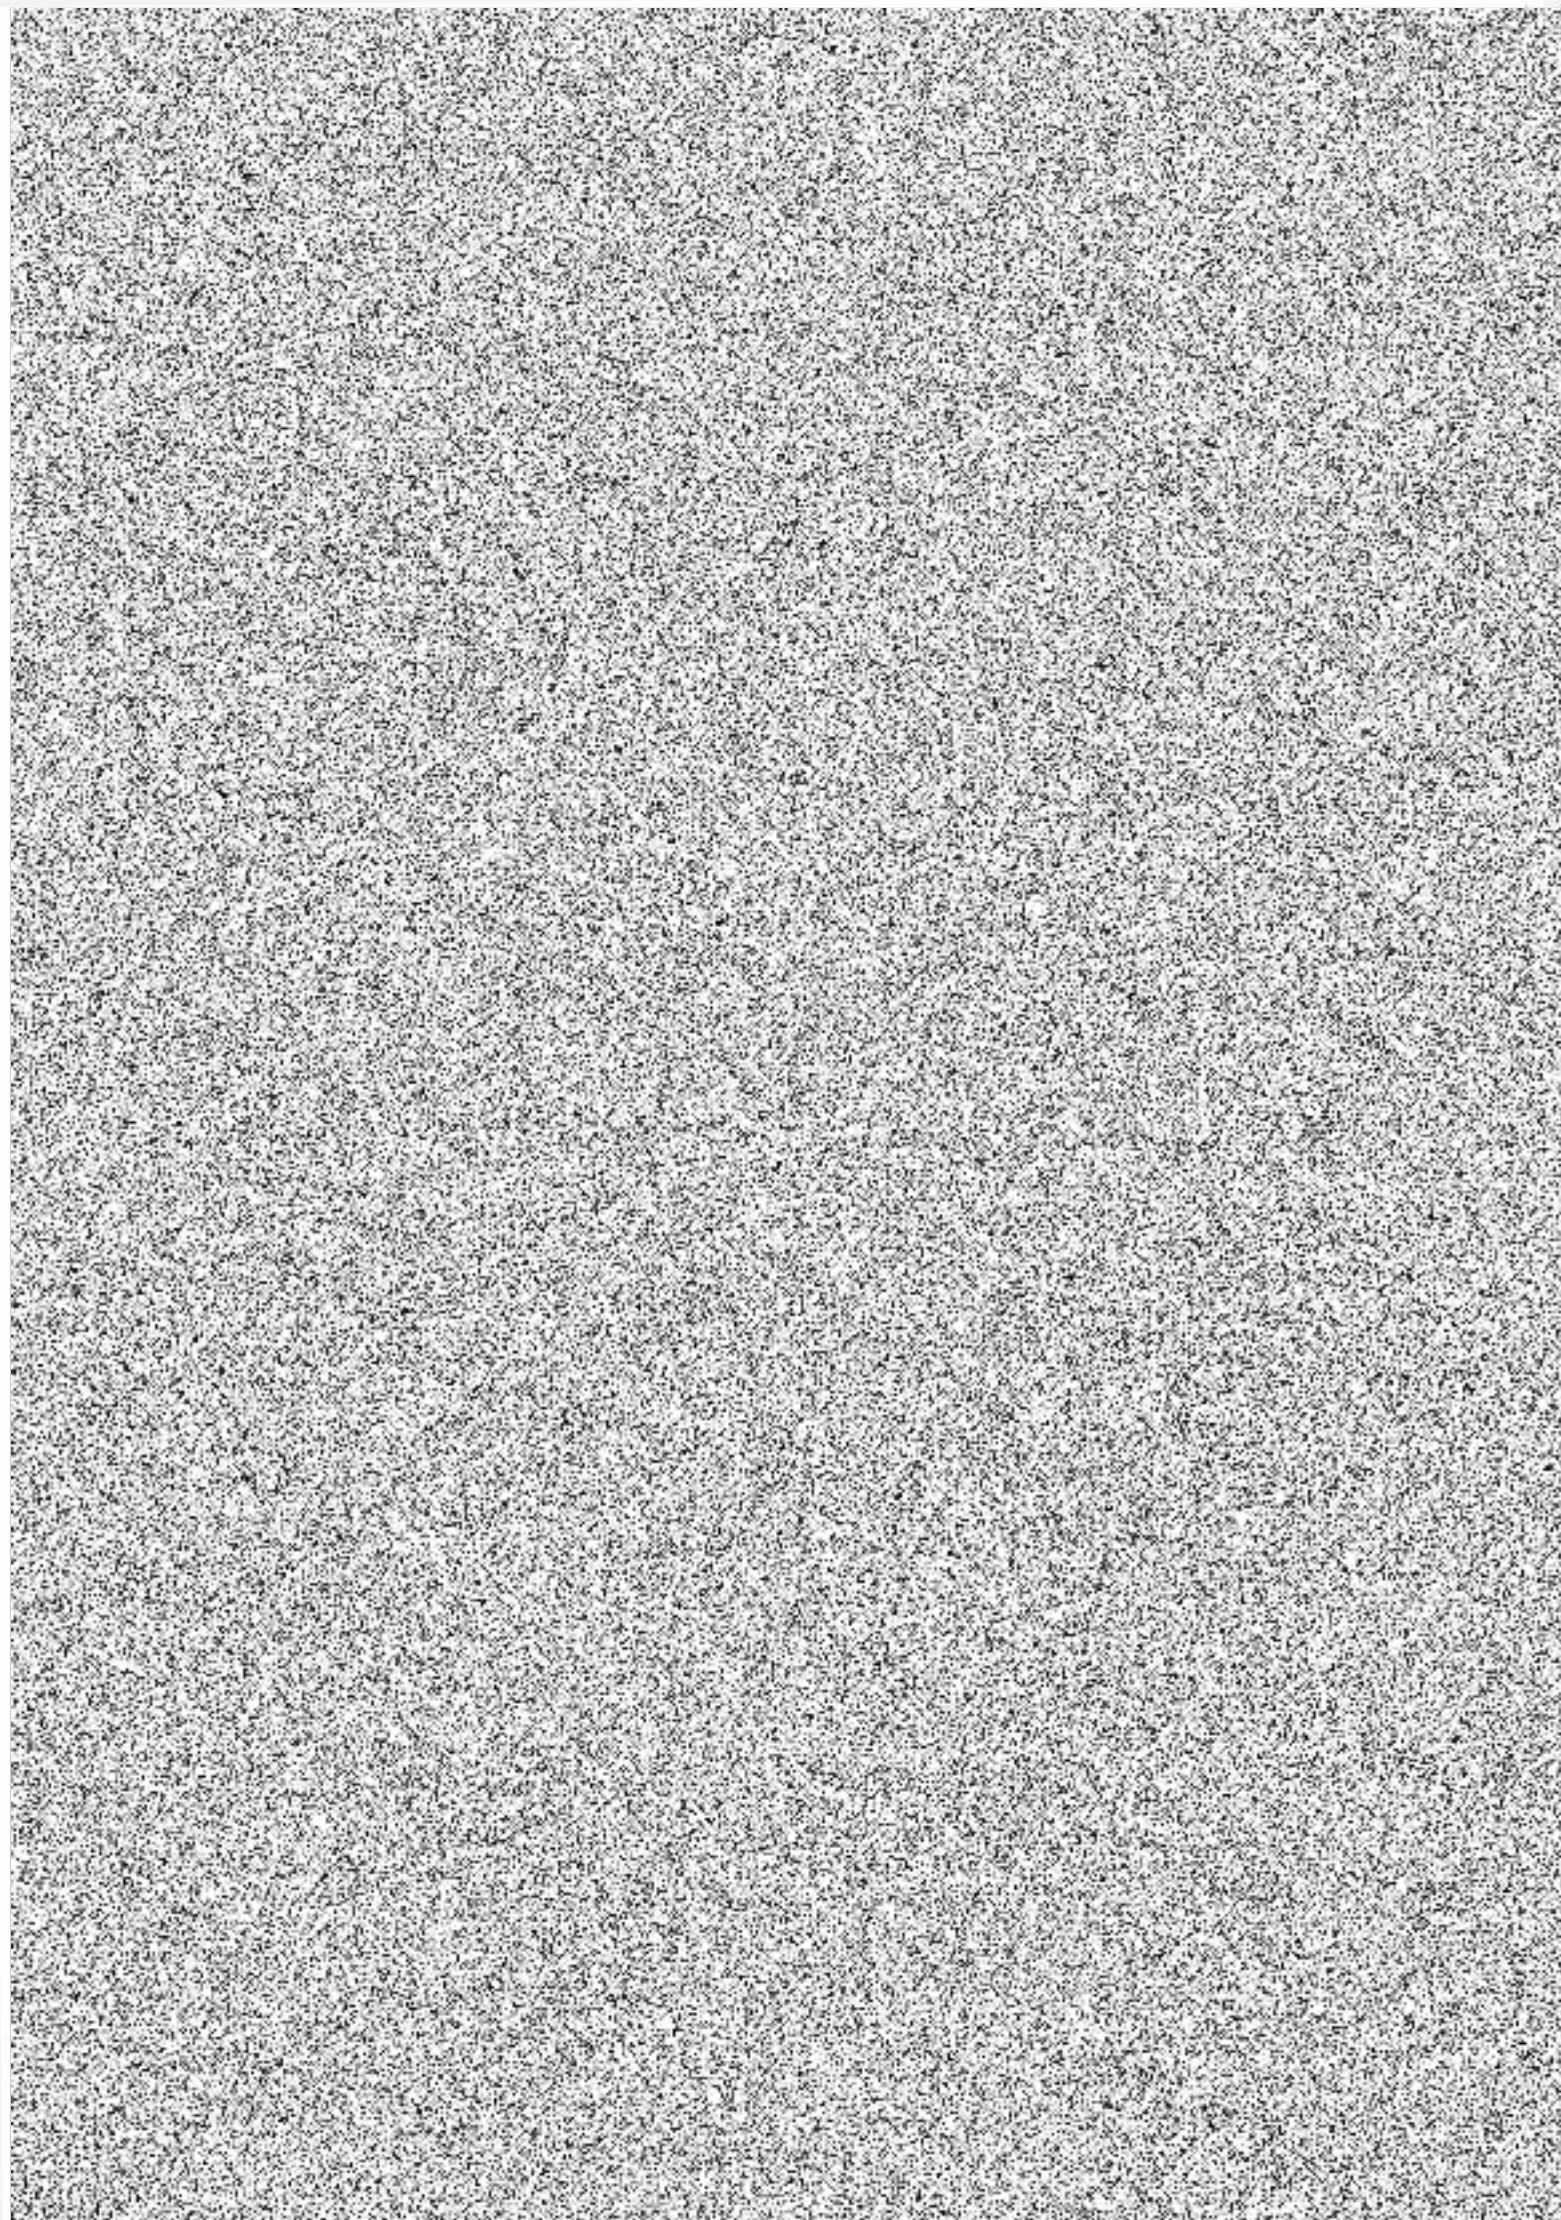

**Příloha č.4 Harmonogram prací – seznam hasičských stanic**

	<b>Adresa stanice:</b>	<b>Vypracování projektu</b>	<b>Začátek realizace:</b>	<b>Konec realizace</b>
<b>Hořovice</b>	Nám. B. Němcové 811, Hořovice 268 01	<b>7-8/2024</b>	<b>1.9.2024</b>	<b>15.9.2024</b>
<b>Roztoky</b>	Máchova 449, Roztoky u Prahy 252 63	<b>7-8/2024</b>	<b>16.9.2024</b>	<b>30.9.2024</b>
<b>Jílové</b>	Rudných dolů 460, Jílové u Prahy 254 01	<b>7-8/2024</b>	<b>1.11.2024</b>	<b>7.11.2024</b>
<b>Český Brod</b>	Tyršova 73, Český Brod 282 01	<b>7-8/2024</b>	<b>1.10.2024</b>	<b>15.10.2024</b>
<b>Kralupy nad Vltavou</b>	Přemyslova 935, Kralupy nad Vltavou 278 01	<b>7-8/2024</b>	<b>16.10.2024</b>	<b>30.10.2024</b>
<b>Benátky n. Jizerou</b>	Jiráskova 362, Benátky nad Jizerou 294 71	<b>7-8/2024</b>	<b>8.11.2024</b>	<b>14.11.2024</b>
<b>Mnichovo Hradiště</b>	Hřbitovní 29, Mnichovo Hradiště 295 01	<b>7-8/2024</b>	<b>15.11.2024</b>	<b>22.11.2024</b>
<b>Poděbrady</b>	Krátká 1000, Poděbrady 290 01	<b>7-8/2024</b>	<b>23.11.2024</b>	<b>29.11.2024</b>

+

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství

Adresa: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

## Předávací protokol – **dílčí/závěrečný**

mezi smluvními stranami

### 1) Objednatel díla

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno  
IČO: 70885371

osoby oprávněné převzít dílo:  
xxx (doplnit velitele příslušné hasičské stanice)

### Zhotovitel

XXX  
xxxx  
IČO: 12345678

osoba oprávněná předat dílo: xxx, **funkce** (např. **jednatel**) (tel. číslo: +420 xxx xxx xxx)

### 2) Smlouva

SoD ze dne xx. x. 2024

Počet platných a účinných dodatků k SoD ke dni podpisu tohoto předávacího protokolu: 0

### 3) Název stavby „Stavební připravenost – připojovací body pro náhradní zdroje elektrické energie“

- 4) Číslo a název předávaného objektu „2105033/1“ Hořovice, Náměstí B. Němcové 811  
„2104991/1“ Roztoky, Máchova 449  
„2105060/1“ Jílové, Rudných dolů 460  
„2105042/1“ Český Brod, Tyršova 73  
„2105048/1“ Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 935  
„2105053/1“ Benátky nad Jizerou, Jiráskova 362  
„2105052/1“ Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 29  
„2105055/1“ Poděbrady, Krátká 1000

### 5) Technický popis předávaného díla (objektu)

Předání díla v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo ze dne xx. x. 2024.

Zhotovení připojovacího bodu pro náhradní zdroj elektrické energie, včetně prováděcí projektové dokumentace a výchozí revize. Materiál a práce jsou uvedeny v příloze č. 2 SoD. Součástí díla je rovněž bezodkladná likvidace veškerého odpadu (včetně nebezpečného) vzniklého při jeho provádění v souladu s platným zákonem o odpadech.

IČ  
Bankovní spojení (bank connection)  
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

70885371



6) **Zhodnocení kvality provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami**

Všechny provedené práce odpovídají technickým požadavkům, standardům a ČSN platným v době realizace díla.

7) **Zhotovitel předal objednateli dílo bez vad a nedodělků.**

8) **Termín úplného vyklizení staveniště**

Staveniště/pracoviště bylo vyklizeno ke dni **xx. xx. 202x.**

9) **Cena provedeného díla**

cena prováděcí projektové dokumentace bez DPH:	xxx.xxx,00 Kč
cena realizace bez DPH:	xxx.xxx,00 Kč
celková cena provedeného díla vč. DPH:	xxx.xxx,00 Kč
k vyúčtování:	xx.xxx,00 Kč
<b>vícepráce ve výši bez DPH:</b>	<b>xx.xxx,00 Kč</b>
vícepráce (+) – méněpráce (-) za dílo:	

Částka k vyúčtování je uvedena dle platné SoD ze dne xx. x. 2024.

10) **Datum zahájení přejímkového řízení dne** **xx. xx. 202x**

11) **Zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přejímají provedení díla dnem**

**xx. xx. 202x**

12) **Záruční doba**

Na jakost díla včetně dodaného materiálu na dobu 24 měsíců do

**xx. xx. 202x**

13) **Oprávněné osoby dílo předat – převzít**

1. **Zástupci zhotovitele**

Jméno a příjmení	Funkce	Předání stavby podpis a razítko	Odstranění vad a nedodělků podpis a razítko
Xxx xxxx	<i>např. jednatel</i> xxxx		



## 2. Zástupci objednatele

Jméno a příjmení	Funkce	Převzetí stavby podpis a razítko	Odstranění vad a nedodělků podpis a razítko
XXXX	Velitel stanice XXX		

14) Případné reklamace díla uplatněte na adrese:

**XXXXX@XXXX.CZ**

XXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

WORLD
