
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. PN 2024_0045**

mezi

CETIN a.s.

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [REDACTED]
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
Zastoupená: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem
IČO: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn.. Pr 737
zastoupena Mgr. Martinem Vítem, MPA, na základě pověření č.j. 20971/22/SÚSPK-P ze dne
26.09.2022
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Záluží u Třemošné spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 23.01.2024 vydané pod č.j. 22168/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Záluží, II/180 přeložka MK**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městského úřadu Třemošná – rozhodnutí o umístění stavby „II/180 Záluží, stabilizace svahu silnice, SO 110 komunikace, SO 310 kanalizace, SO 410 úprava kabelu CETIN a.s., SO 810 sadové úpravy“ č.j. MUTE-2278/2018/STO/IKo ze dne 6.6.2018, které nabylo právní moci dne 27.6.2018 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy
- (c) Stavebník předá společnosti CETIN rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení čj. OD-Fro/27169/2019 – R ze dne 30.8.2019.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **163 078,00 Kč**, (slovy: jedno sto šedesát tři tisíc sedmdesát osm korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

- vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na

Faktuře.

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: Vedoucí přípravy a realizace staveb Plzeň - sever
tel. [REDACTED]

ve věcech technických : [REDACTED]
funkce: Technik přípravy a realizace staveb Plzeň -. sever
tel. [REDACTED]

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním

ze Smlouvy.

- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající

ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu [REDACTED].

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu Třemošná – o umístění stavby č.j. MUTE-2278/2018/STO/IKo ze dne 6.6.2018

Příloha č. 3 - rozhodnutí Městského úřadu Nýřany - stavební povolení čj. OD-Fro/27169/2019 – R ze dne 30.8.2019, nabytí PM 15.4.2020

CETIN

Stavebník

V Praze dne


V Plzni dne

za CETIN a.s.

Jiří Syrový
Supervizor, VFS Čechy jih
(podepsáno elektronicky)

za Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Mgr. Martin Vít, MPA
Technický ředitel
(podepsáno elektronicky)

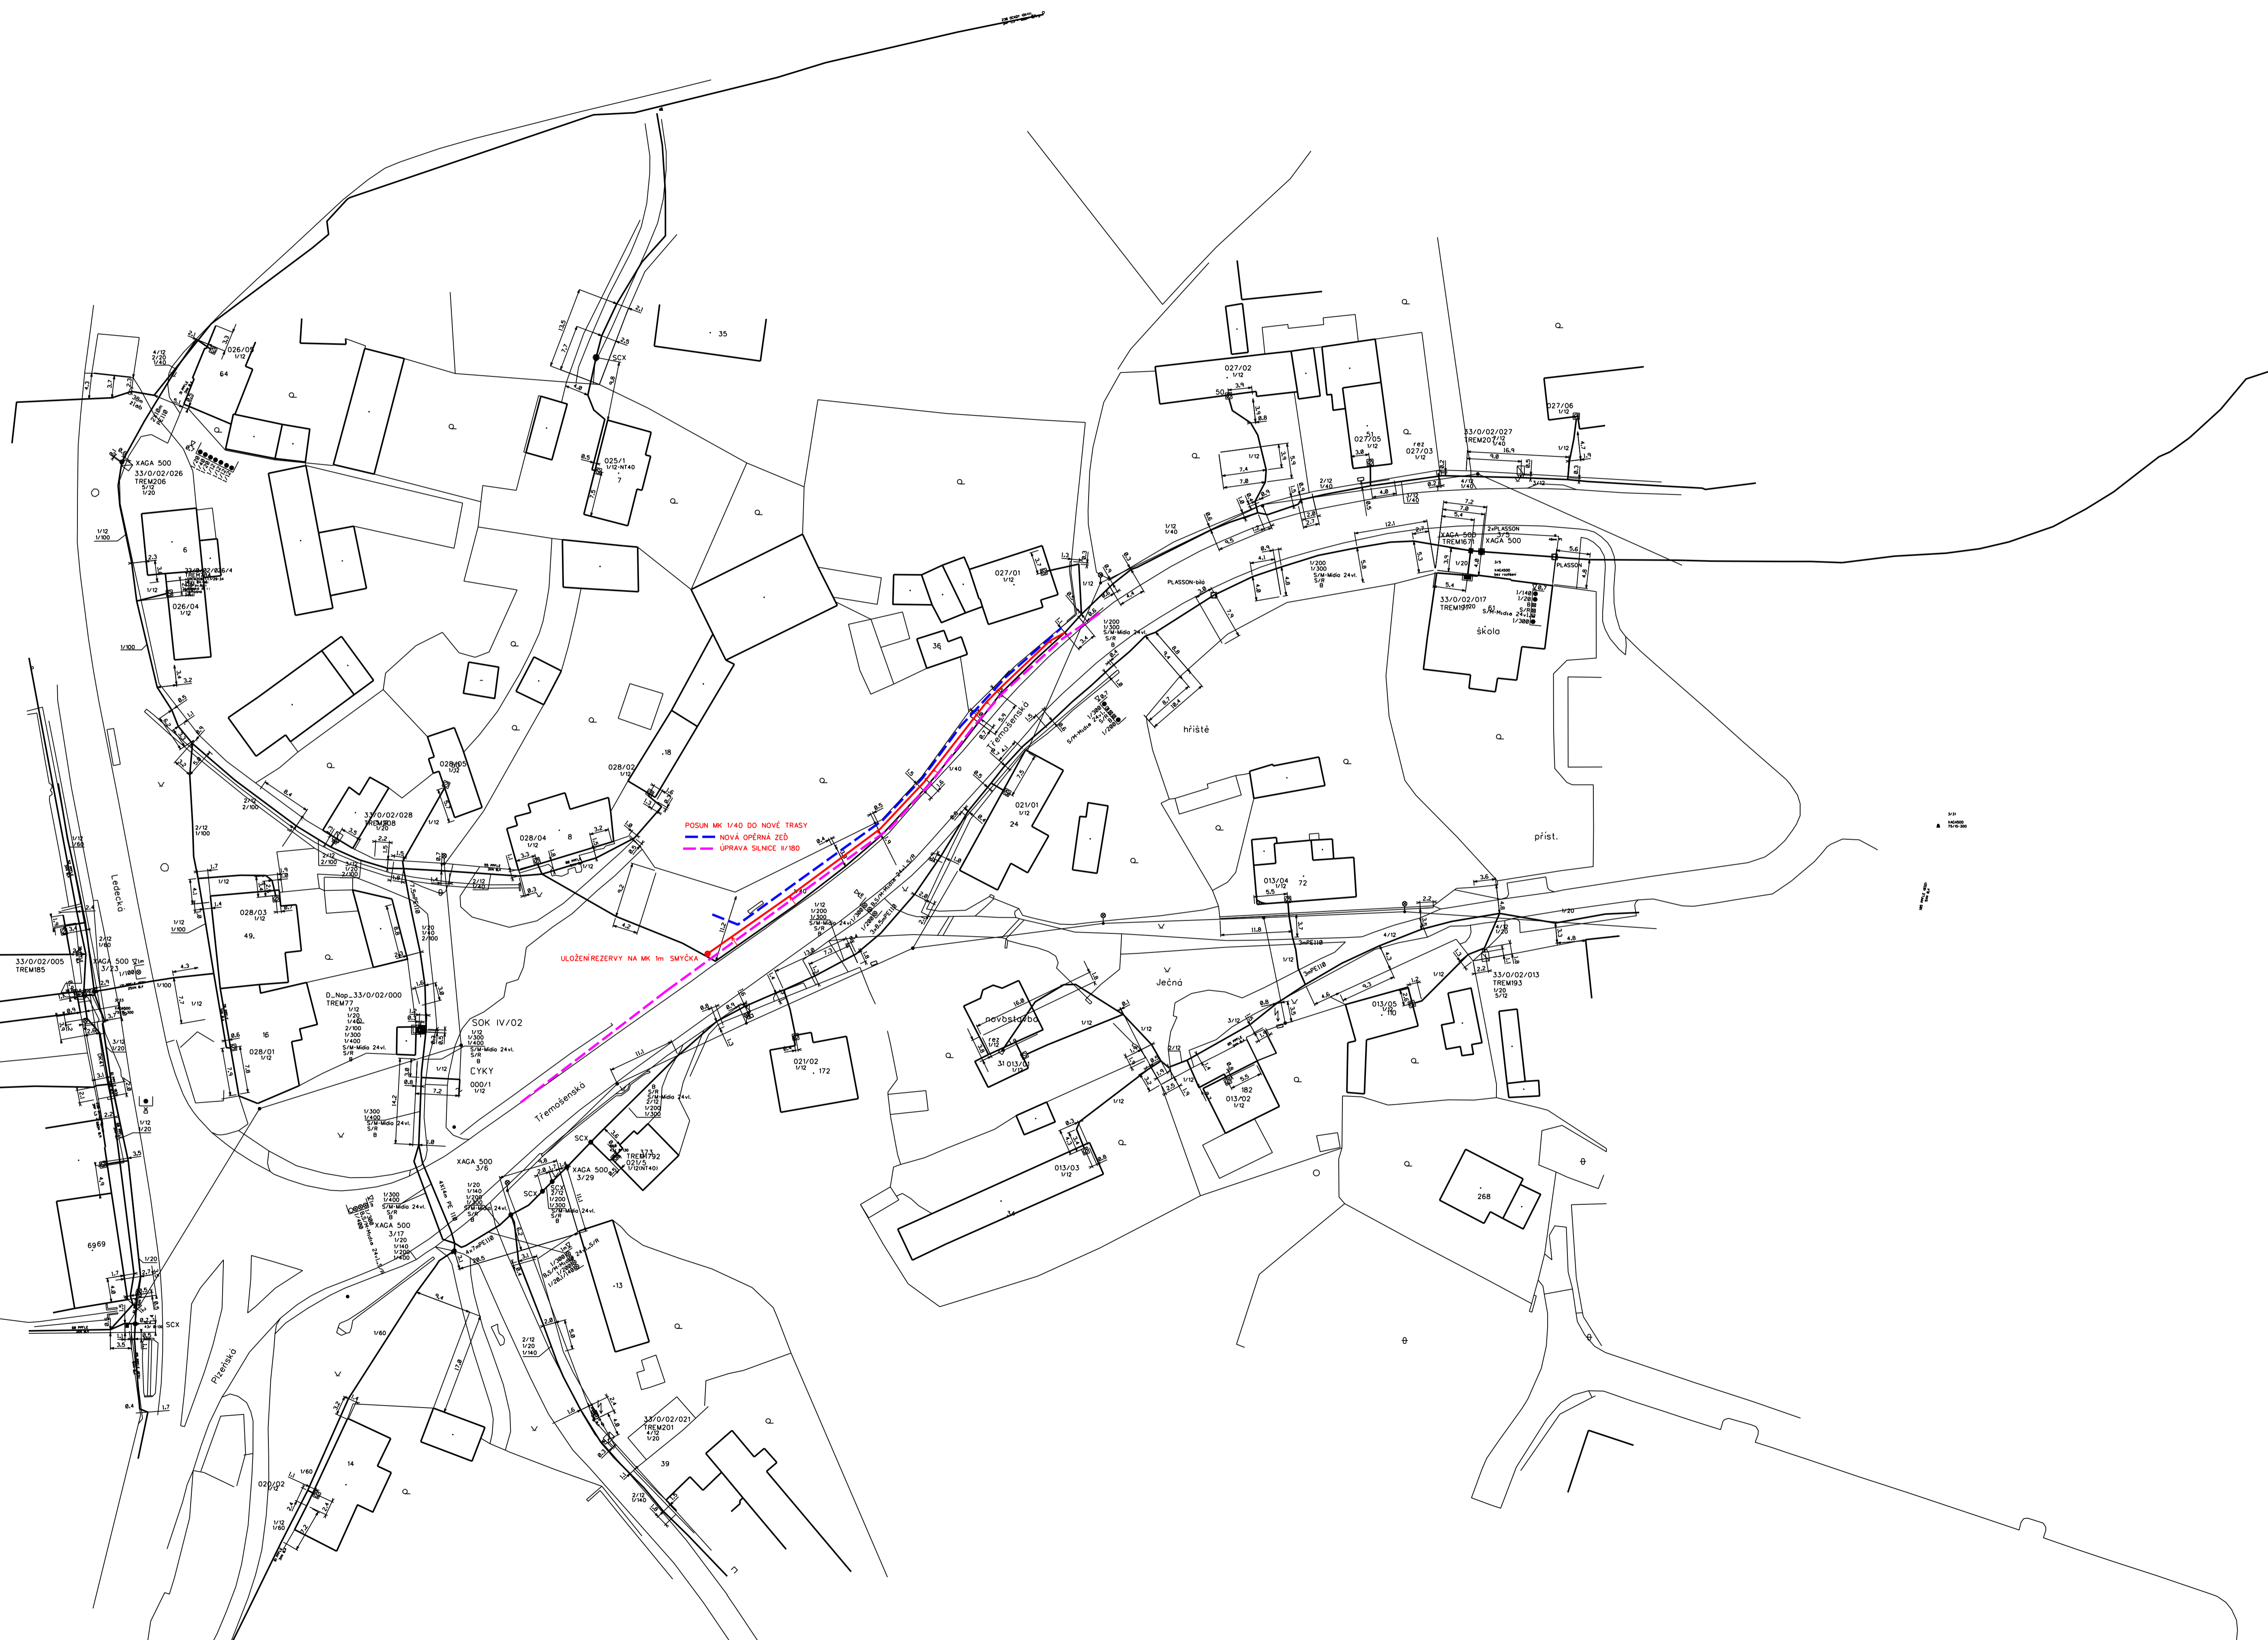

POSUN MK 1/40 DO NOVE TRASY
 NOVA OPERNÁ ZED
 UPRAVA SLUNCE 1/180

ULOZENI REZERVY NA MK 1m SVYČKA



Název stavby: VPIC Záluží, II/180 přeložka MK
 Číslo SPP prvku: 16010-054911
 Zhotovitel PD: XXXXXXXXXX
 KPO: Plzeňsko
 HOST: Plzeň
 VUJ: Třebošná

Technické údaje:

KMVYK:	0.080	KMP:	0.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	21 480,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	48 838,38 Kč
MONTÁŽ	20 045,99 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 265,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	42 276,99 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady: **163 078 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	123 061,77 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	40 015,97 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	6150.00 JV	6 150,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	15 330,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 983,18 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	80.00 m	40 704,80 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	80.00 m	1 150,40 Kč

MONTÁŽ

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	213,85 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	445,77 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	296,46 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	115,53 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	213,85 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	80.00 m	2 252,00 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV	6 765,00 Kč

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 942,24 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 801,29 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 227,75 Kč
----------	-----------------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 942,64 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 672,66 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2000.00 JV	2 000,00 Kč

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 066,36 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 015,15 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	511,27 Kč

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč
--------	--	------------	-------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
319092 S		Díl ohybový Syspro 160/110	3.00 ks	1 026,09 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	80.00 m	383,20 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	10.00 ks	365,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	70.00 m	40 502,70 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ

Sídlíště 992, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR

Č.j.: MUTE-2278/2018/STO/IKo

Třemošná, dne 6.6.2018

Spis. zn.: 743/2018/Koš

Vyřizuje: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.6.2018
Městský úřad Třemošná
Stavební odbor



②

Výroková část:

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.2.2018 podal

V Třemošné dne 28.6.2018 Podpis [REDAKCE]

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

II/180 Záluží, stabilizace svahu silnice

SO 110 komunikace
SO 310 kanalizace
SO 410 úprava kabelu CETIN a.s.
SO 810 sadové úpravy

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 179/39 (ostatní plocha), parc.č. 210/6 (ostatní plocha), parc.č. 210/8 (ostatní plocha), parc.č. 210/9 (ostatní plocha), parc.č. 218 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 219 (zahradka), parc.č. 220 (ostatní plocha), parc.č. 225 (zahradka) v katastrálním území Záluží u Třemošné, Město Třemošná.

Druh a účel umísťované stavby:

- SO 110 komunikace II/180, ul. Třemošenská – úpravy s rozšířením komunikace (chodníky, vjezdy, parkovací stání, odvodňovací žlaby), stabilizace svahu, nová opěrná zeď s odvodňovacím žlabem.*
 - Stavební úpravy stávající obousměrné komunikace šířky 6,5 m mezi obrubníky v délce 115,95 m. Na vozovku navazují po pravé straně chodníkové úpravy, po levé straně budou obrubníky doplněny s návazností na zeleň, vjezdy, parkovací stání a chodníkové úpravy.
 - Stabilizace severní strany komunikace II/180 spojena se zřízením nové opěrné zdi z betonových tvárnic v délce 55,25 m.
 - Umístění odvodňovacího žlabu, nových vjezdů, parkovacího stání a chodníku z betonové dlažby.

2. SO 310 kanalizace

- Prodloužení stávající dešťové kanalizace stoka „A“ situované mezi stávající koncovou šachtou ŠN a novou kanalizační šachtou Š5 z důvodu odvodnění komunikace v délce 146,50 m.
- V trase umístěny šachty Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 v následujících vzdálenostech ŠN, Š1 - 30,55 m, Š1, Š2 - 35,95 m, Š2, Š3 - 26,90 m, Š3, Š4 - 37,50 m, Š4, Š5 - 15,60 m.
- Na stoku budou napojeny uliční vpusti a odvodňovací žlaby.

3. SO 410 úprava kabelu CETIN a.s.

- Stávající metalický kabel TCEPKPFLE 10x4x0,4, bude obnažen a provizorně po dobu výstavby opěrné zdi vyvěšen, podchycen, následně bude umístěn do nové polohy cca 1 m od původní trasy směrem k opěrné zdi.

4. SO 810 sadové úpravy

- Ve věci povolení kácení a náhradní výsadby vydal MěÚ Třemošná, odbor hospodářsko-správní Rozhodnutí dne 9.4.2018 pod č.j. MUTE-1385/2018/HSO/EDI.

Umístění stavby na pozemku:

1. SO 110 komunikace je umístěna na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.

- *Chodník navazuje na pozemek parc.č. 2226/1 (č.p. 36) umístěn na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.*
- *Vjezdy určeny pro pozemek parc.č. 218 (č.p. 18) a parc.č. 226/2 umístěny na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.*
- *Parkovací stání je umístěno podél pozemku parc.č. 226/2 a současně navazuje na vjezd pro tento pozemek, je umístěno na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.*
- *Opěrná stěna je umístěn na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.*
- *Zeleň (zatravnovací plochy) zasahují na pozemky parc.č. 210/8, parc.č. 210/9, parc.č. 220, parc.č. 210/6, parc.č. 219, parc.č. 218, parc.č. 225 a parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.*

2. SO 310 kanalizace navazuje na stávající upravenou šachtu ŠN a novou Š5, je umístěna v komunikaci na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.

3. SO 410 úprava kabelu CETIN a.s. je umístěn podél komunikace na pozemku parc.č. 179/39 v katastrálním území Záluží u Třemošné.

Určení prostorového řešení stavby:

1. SO 110 komunikace obousměrná, dvoupruhová šířka 2 x 3,25 m, s asfaltobetonovým povrchem o celkové tl. skladby konstrukce 550 mm. Plochy komunikace o příčném spádu 2,50 %, chodníkové části se spádem 2,0 %, místa vjezdu s proměnným spádem. V místě svahového tělesa jsou doplněny georochože a protierozní sítě.

- *Chodník vyspádován do odvodňovacích žlabů, případně do vozovky, proveden u pochozích ploch z betonové dlažby tl. 60 mm (skladba konstrukce v tl. 240 mm), lemován betonovými obrubníky.*
- *Parkovací stání a vjezdy (betonová dlažba tl. 80 mm, skladba konstrukce v tl. 460 mm) odváděny spádem k lemujícím prvkům (obrubníky a přídlažba) následně do uliční vpusti.*
- *Zeleň v místě vysvahování opatřena výztužnými rohožemi, doplněna ornici a zeminou, oseta travním semenem.*
- *Opěrná stěna vyžděna z tvárnic ztraceného bednění (výplň beton s výztuží) do výšky cca 1,55 m od terénu, na betonovém základu šířky 1,50 m a výšky 1,20 m, doplněna železobetonovou římsou 550 x 350 mm. Do římsy bude kotveno oplocení a zábradlí. Výška stěny je proměnná v návaznosti na terén.*
- *Oplocení z ocelových sloupků s výplní z poplastovaného pletiva, výšky 1,50 m, doplněno dvoukřídlovými vjezdovými vraty (2,10 x 1,50 m).*

2. SO 310 kanalizace dešťová z trub s plným žebrem PP DN 300 (prodloužení kanalizačního řadu) s odbočkami pro napojení uličních vpustí (přípojky z PVC DN 150 mm, PN 8) a odvodňovací betonové žlaby kryty litinovým roštem. Vstupní šachty z prefabrikátu o průměru 1,00 m s kónusovým horním dílem s těžkým poklopem, vpusti v betonovém provedení o vnitřním průměru 450 mm, kryty mříží.

3. *SO 410 úprava kabelu CETIN a.s. v místě rekonstrukce opěrné zdi dochází ke styku metalického kabelu. V úseku cca 70 m při komunikaci budou probíhat zemní práce ve dvou etapách po cca 35 m. Dojde k odkopání stávající opěrné zdi a metalického kabelu, který bude mechanicky zajištěn a podepřen proti poškození, následně dojde k demolici opěrné zdi včetně základů. Před zásypem opěrné zdi se uloží metalický kabel do nové polohy cca 1 m od původního uložení směrem k opěrné zdi.*

Bourací práce – demolice stávající opěrné zdi ze smíšeného zdiva, vybourání betonového čela výusti stávající dešťové kanalizace, odstranění dopravního značení, demontáž stávajících poklopů, mříží a uzávěrů jednotlivých sítí, odfrézování a vybourání povrchu komunikace včetně podkladních vrstev až na úroveň pláně a ostatních zpevněných a nezpevněných ploch.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací z 9/2017, která je součástí rozhodnutí, zpracovatel [redacted] – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby, ČKAIT 0201282. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora BOZP. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel stavby doručit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce v Plzni.
3. Umístění stavby musí být provedeno dle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. Umístění stavby musí být v souladu se stanovisky jednotlivých správců podzemních sítí, před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských sítí, podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány:

- *Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2/143, 317 68 Plzeň – stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. 2017/06953 ze dne 1.12.2017 - podmínky*

1. Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNA PLZEŇ a.s., provozu rozvodu vody v Plzni, vedoucí p. [redacted].
2. Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu v prostoru stavby, které na objednávku provede [redacted].
3. Stávající vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek od všech objektů nesmí být stavbou poškozeny.
4. S návrhem stavby souhlasíme s podmínkou, že při ukládání kabelů bude dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a respektována ochranná pásma vodovodu a kanalizace, která stanovuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.
5. V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího vodovodního a kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned informovat pracovníky objednatele a pracovníky provozu vodovodů a kanalizací VODÁRNY PLZEŇ a.s.

- *ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly – vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. 1095753739 ze dne 27.11.2017 – nachází se nadzemní síť NN - podmínky*

V zájmové oblasti stavby se nachází vzdušné vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., které je potřeba respektovat.

Při provádění terénních úprav u venkovního vedení nesmí být porušena stabilita opěrných bodů, zvláště pak těch, na kterých dochází k jednosměrným vrcholovým tahům.

Je zakázáno provádět činnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Pokud by stavba vyžadovala úpravy el. vedení je potřeba požádat o přeložku zařízení DS ČEZ Distribuci, a.s., oddělení Připojování, Guldenerova 19 (§47 zákona č.458/2000Sb. v platném znění) v dostatečném časovém předstihu.

- *GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – povolení stavby – územní režim pod zn. 5001627328 ze dne 11.12.2017– se nachází plynárenská zařízení - podmínky*

Při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005,TPG 702 04,TPG 702 01,zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ, viz.odst.3 (tel:377097527) - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.

Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto

posuzováno jako přeložka a náklady budou hrazeny investorem stavby.

Dojde-li ke křížení kanalizačního potrubí s plynovodem nebo plynovodní přípojkou v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.

Úhel křížení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší nejméně však 60°.

Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 - kanalizační zařízení bude uloženo pod STL plynovodním zařízením ve vzdálenosti 500 mm - souběh kanalizace a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005.

Před provedením záspy výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.

V případě nepředvídaných kolizních situací při realizaci stavby, které nelze při zpracování PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s projektantem stavby, popřípadě s pracovníky GridServices.s.r.o.

V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Uliční vpusti dešťové kanalizace požadujeme umístit tak, aby jejich obrys byl min.0,5 m od skutečné polohy plynovodů a přípojek.

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření s podmínkami pod zn.POS-PD-1169-17 ze dne 8.12.2017 - podmínky
- 1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj.1m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
- 2. Kabelová trasa je v místě kolize tvořena 1 kabel. Souhlasíme se způsobem překládky.
- 3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. Uvedenou ochranu může naše společnost realizovat tzv. na klíč. K zajištění realizace nás v předstihu alespoň 60 dnů kontaktujte. V případě realizace ochrany přímo ze strany stavby, musí být z naší strany zajištěn odborný dozor. Kontakt pro zajištění realizace i odborného dozoru - p.Dobeš, tel.: 724 026 274.
- 4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
- 5. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050 Zemné práce, v případě křížení sítí technického vybavení je nutno dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 6. Pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou respektovány podmínky dotčených orgánů, ostatních organizací a správců sítí dle jejich stanovisek, které vydali k územnímu rozhodnutí.
- 7. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
- 8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby v souladu s §152 stavebního zákona, včetně povinnosti oplocení staveniště dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.
- 9. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 10. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Při provádění stavby musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečištění komunikací.
- 11. Pro stavbu budou použity pouze výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
- 12. Podmínky požadované účastníkem řízení panem [REDAKCE], ve věci zajištění bezbariérového přístupu k pozemku parc.č. 226/1 (č.p. 36), budou předmětem řízení ve věci povolení stavby.
- 13. Vytýčení prostorové polohy stavby bude provedeno odborně způsobilými osobami.
- 14. Stavebník je již od doby přípravy povinen podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči § 22 odst. 2, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu je podle § 23 zák. č. 20/87 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne.

15. Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
16. Výstavba musí být provedena tak, aby co nejméně narušovala organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území.
17. Stavbou nebudou dotčeny a ohroženy vodní a odtokové poměry v území.
18. Při stavbě budou dodrženy požadavky dotčených orgánů uvedených v závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních:

- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň. odbor územního plánování – souhlasné koordinované závazné stanovisko – pod č.j. OÚP-Dol/320132017/2018 ze dne 19.1.2018 - Stanovisko orgánu památkové péče

Stavba se s největší pravděpodobností nachází na území s archeologickými nálezy a při zemních pracích by mohlo dojít k jejich narušení. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen podle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči § 22 odst. 2 tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Archeologický ústav je prostřednictvím oprávněné organizace podle § 22, odst. 1 výše uvedeného zákona povinen uzavřít s vlastníkem nemovitosti, na které se mají archeologické výzkumy provádět, dohodu o podmínkách archeologického výzkumu. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zák. č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění dodatků a novel, po předchozí dohodě s oprávněnou organizací. Nedojde-li k dohodě, rozhodne Krajský úřad o povinnostech vlastníka strpět provedení archeologického výzkumu a o podmínkách, za nichž má být archeologický výzkum proveden. V případě archeologického nálezu je podle § 23 zák. č. 20/87 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne.

- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň. odbor dopravy – stanovisko pod č.j. OD- Fro/32315/2017 ze dne 11.1.2018 - podmínky:

1. Stavba se všemi objekty, součástmi i příslušenstvím (PD i realizace) bude v koordinaci se sousedními (veřejnými) stavbami v místě, vč. komunikací a jejich připojení (vč. uvedené plánované stavby), a předem projednána s vlastníky dotčených PK, obcí, s dotčeným orgánem Policie ČR (DI Plzeň-venkov) a s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK, OD), jejichž podmínky budou obsahem povolení příslušného stavebního úřadu, příp. podle nich upravena PD, tak, aby stavba byla samostatně schopná bezpečného užívání k určenému účelu bez závad (v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy zejm. ČSN 736110, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb.; projektant odpovídá za /PD jako celku/ správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost, proveditelnost a technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby, vč. vlivů na životní prostředí, s cílem užívání k určenému účelu bez závad /a to jak po dobu výstavby, tak k trvalému užívání/).
2. Stavba nebude tvořit pevnou překážku v dopravním prostoru (pěším ani řidičům; příčné uspořádání prostoru PK zůstane zajištěno zcela bez překážek). Stavbou nebude narušena dopravní obsluha sousedních nemovitostí (pozemků) vč. komunikací, ani ohroženy rozhledové podmínky v komunikačních připojeních (v rozhled, trojúhelníkových nebude umísťována/ponechána žádná překážka, např. stavební materiál, parkování, oplocení, vyšší zeleň, reklamní ani jiná technická zařízení, apod.).
3. DSP bude zpracována mj. v souladu s plat. vyhl. č.146/2008 Sb., vč. návrhu dopravně inženýrských opatření (s PČR projednaného), tj. přechodné/místní úpravy provozu na PK (v souladu s platnými zvláštními i technickými předpisy, zejm. vyhl. č. 294/2015 Sb., TP 66, vč. změn). Všechny dotčené pozemky budou pro stavební řízení identifikovány; stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva (založená smlouvou nebo věcným břemenem) ke všem stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám.

- NIPI - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s. Havlíčkova 4481/44. 586 01 Jihlava – stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. 111170108 ze dne 6.12.2017- podmínky:

1. Další stupeň projektové dokumentace musí být zpracován dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. PD musí obsahovat přílohu B.6. Bezbariérové užívání.
2. Předložit další stupeň dokumentace k posouzení.
19. Zřízení staveniště – staveniště bude umístěno na pozemku, jehož se týká výstavba.
20. Před zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, je třeba provést místní šetření na místě stavby a dořešit sklonové poměry pro plynulý vstup a vjezd na pozemek parc.č. 226/1 a parc.č. 226/2 v katastrálním území Záluží u Třemošné, jejímž vlastníkem je pan [REDAKCE].
21. Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména na porostech. Použitá část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
22. Podle § 94 stavebního zákona lze na žádost oprávněného změnit územní rozhodnutí, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky

v území. Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.

23. Územní rozhodnutí dle § 93 stavebního zákona platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
24. Ve věci sadových úprav je třeba respektovat Rozhodnutí k povolení kácení a náhradní výsadby, které vydal MěÚ Třemošná, odbor hospodářsko-správní dne 9.4.2018 pod č.j. MUTE-1385/2018/HSO/EDI.
25. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podá stavebník žádost o povolení stavby speciální stavební úřadu – MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy.

Účastníci řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Město Třemošná, IČO 00258415, Sidliště 992, 330 11 Třemošná

Plzeňský kraj, IČO 70890366, Škroupova č.p. 1760/18, 301 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 14.2.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 26.2.2018 vyzván pod č.j. MUTE-883/2018/STO/HŠk k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Žádost byla doplněna dne 9.5.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dne 15.5.2018 pod č.j. MUTE-2030/2018/STO/IKo, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Předložený záměr řeší rekonstrukci stávající komunikace v délce 115,95 m a navazujících ploch beze změny charakteru využití území. Jedná se o stabilizaci severní strany komunikace 11/180 spojenou se zřízením opěrné zdi v délce 55,25 m, násypového tělesa a částečnou rekonstrukcí vlastní vozovky. Komunikace je navržena jako obousměrná v š. 6,5 m, opěrná stěna je řešena z betonových tvárnic.

Odvodnění komunikace je řešeno do stávající dešťové kanalizace obce, pomocí nové kanalizační stoky „A“ v délce 146,50 m. Stoka je situována mezi stávající koncovou šachtou ŠN a novou kanalizační šachtou Š5. Nová stoka „A“ je v podstatě prodloužení stávající kanalizační dešťové stoky, která byla navržena v rámci akce „Rekonstrukce křižovatky a ul. Třemošenská, Ledecká a Pod Hůrkou“. Na stoku budou napojeny uliční vpusti a odvodňovací žlaby.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním plánem obce Třemošná (nabytí účinnosti 4.10.2016). Stavba je umístěna v ploše dopravní infrastruktury, v ploše veřejných prostranství a v ploše obytné smíšené venkovské. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jedná se o stavební úpravy s rozšířením stávající komunikace a navazujících ploch, opěrné zdi s oplocením, úpravy svahu zajišťující komunikaci.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

*Stanoviska sdělili:**Dotčené orgány, správci sítí a ostatní:*

- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor územního plánování – závazné stanovisko – pod č.j. OÚP-Kre/7091/2018 ze dne 21.3.2018.
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor územního plánování – souhlasné koordinované závazné stanovisko – pod č.j. OÚP-Dol/320132017/2018 ze dne 19.1.2018.
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko – pod č.j. OŽP-REI/33600/2017 ze dne 19.12.2017.
- MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy – stanovisko pod č.j. OD- Fro/32315/2017 ze dne 11.1.2018.
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – souhlasné závazné stanovisko pod č.j. HSPM-5861-2/2017 ÚPP ze dne 14.12.2017.
- Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje – stanovisko – pod č.j. KRPP-178428-2/ČJ-2017-031106-47 ze dne 30.11.2017.
- NIPI - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. 111170108 ze dne 6.12.2017.
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – souhlasné závazné stanovisko – pod č.j. KHSPL/32043/21/2017 ze dne 28.11.2017.
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň – souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci bez podmínek, pod zn. 1925/17/SÚSPK-PS/MP ze dne 3.12.2017.
- MěÚ Třemošná, odbor hospodářsko-správní, Sídliště 922, 330 11 Třemošná – rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
- Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2/143, 317 68 Plzeň – vyjádření k existenci sítí pod č.j. 735/07/17 ze dne 27.7.2017.
- Vodárna Plzeň a.s., Malostranská 2/143, 317 68 Plzeň – stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. 2017/06953 ze dne 1.12.2017.
- ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly – sdělení o existenci sítí pod zn. 0100778284 ze dne 24.7.2017 – nachází se nadzemní síť NN.
- ČEZ Distribuce a.s, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly – vyjádření k projektové dokumentaci pod zn. 1095753739 ze dne 27.11.2017 – nachází se nadzemní síť NN.
- Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – vyjádření pod zn. 0200627391 ze dne 24.7.2017 – nenachází se komunikační zařízení.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – předprojektová příprava pod zn. 5001554422 ze dne 15.8.2017.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – povolení stavby – územní režim pod zn. 5001627328 ze dne 11.12.2017 – se nachází plynárenská zařízení.
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – vyjádření k existenci sítí pod č.j. 671569/17 ze dne 21.7.2019 nachází se síť elektronických komunikací.
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření s podmínkami pod zn. POS-PD-1169-17 ze dne 8.12.2017.
- Vyjádření obce Třemošná – stanovisko ze dne 16.1.2018.
- Souhlas se stavbou potvrzena starostou obce Třemošná v situačním výkresu ze dne 13.3.2018.

- Souhlas s kácením zeleně vlastníka pozemku parc.č. 219, parc.č. 225 v k.ú. Záluží u Třemošné – I [redacted]
- Souhlas se stavbou potvrzena [redacted] v situačním výkresu.
- [redacted] k zastupování dle § 30 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace ze dne 20.3.2018.
- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 1 – vyjádření správce povodí – pod zn. 66069/2017/342/Kai, SP-2017/15137 ze dne 29.11.2017.
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – usnesení – změna sídla na adresu Koterovská 462/162, Koterov, 326 0 Plzeň ze dne 26.1.2018.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření účastníků řízení, správců sítí a dotčených orgánů s předloženou dokumentací, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, které zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci řízení: účastníci řízení dle §85 odst.1 písm.a), písm b):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Město Třemošná, IČO 00258415, Sídliště 992, 330 11 Třemošná u Plzně

účastníci řízení dle §85 odst.2 písm.a) – vlastník pozemku nebo stavby, není-li sám žadatelem:

Město Třemošná, Sídliště 992, 330 11 Třemošná u Plzně

[redacted]
Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 1

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, oddělení dopravní inspektorát,

sídlo: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Žižkov-Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce a.s, IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 2/143, 317 68 Plzeň

účastníci řízení dle §85 odst.2 písm.b) - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

[redacted]
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci uplatnili návrhy a námitky.

1. Ve lhůtě určené stavebním úřadem k podání návrhu a námitek účastníků řízení, se paní [redacted] dne 28.5.2018 přišla seznámit s projektovou dokumentací a zjistit, jakým způsobem by jí mohla ovlivnit.

Stanovisko stavebního úřadu:

- Účastnice se seznámila se záměrem a neuplatnila žádné návrhy a námitky.

2. Ve lhůtě určené stavebním úřadem k podání návrhu a námitek účastníků řízení, se pan [REDAKCE], dne 30.5.2018 přišel seznámit s projektovou dokumentací. Je vlastníkem pozemku parc.č. 226/2 a parc.č. 226/1 v k.ú. Záluží u Třemošné. Na hranici pozemku parc.č. 226/2 jsou umístěná vjezdová vrata a projekt řeší vjezd a parkovací stání před tímto pozemkem. Zároveň řeší bezbariérovou návaznost mezi parkovacím stáním, vjezdem a chodníkem ústící do vstupní branky na pozemku parc.č. 226/1 (rodinný dům č.p. 36 Záluží). Stavební úřad zprostředkoval komunikaci s projektantem [REDAKCE], který vysvětlil sklonové poměry v návaznosti na komunikaci a doporučil projednat a dořešit sklonové poměry mezi parkovacím stáním, vjezdem, chodníkem a vstupem na pozemek parc.č. 226/1 v dalším stupni projektové dokumentace.
- [REDAKCE] požaduje zrealizovat místní šetření na místě stavby s příslušným projektantem dalšího stupně projektové dokumentace z důvodu dořešení sklonových poměrů pro plynulý vstup a vjezd na jeho pozemek.

Stanovisko stavebního úřadu:

- Stavební úřad shledal důležitost bezbariérového přístupu k objektu vlastníka, jelikož zde bydlí nepohyblivý člen rodiny a při mobilním převozu je nutné ho k autu dopravit cestou bez výškových překážek. Podmínky uvedené ve vyjádření účastníka byly zapracovány do podmínky rozhodnutí bod 20.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci uplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: -

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 94 stavebního zákona lze na žádost oprávněného změnit územní rozhodnutí, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území. Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje dle položky 17, Osvobození.

Obdrží:*účastníci řízení*

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Město Třemošná, IDDS: vmbbv6

sídlo: Sídliště 992, 330 11 Třemošná u Plzně

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 1

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, oddělení dopravní inspektorát, , IDDS: 5ixai69

sídlo: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Žižkov-Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce a.s, IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Vodárna Plzeň a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 2/143, 317 68 Plzeň

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň - odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq

sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 9, 320 68 P.O.Box 18-Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 15, 303 22 Plzeň

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Plz. kraje, IDDS: 5ec62h6

sídlo: Nám.Republiky č.p. 28, 301 00 Plzeň 1

na vědomí

Městský úřad Třemošná, IDDS: vmbbv6

sídlo: Třemošná č.p. 992, 330 11 Třemošná u Plzně


Městský úřad Třemošná, odbor hospodářsko-správní, Sídliště 992, 330 11 Třemošná u Plzně

Vlastní

příloha :

Ověřená projektová dokumentace bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí.



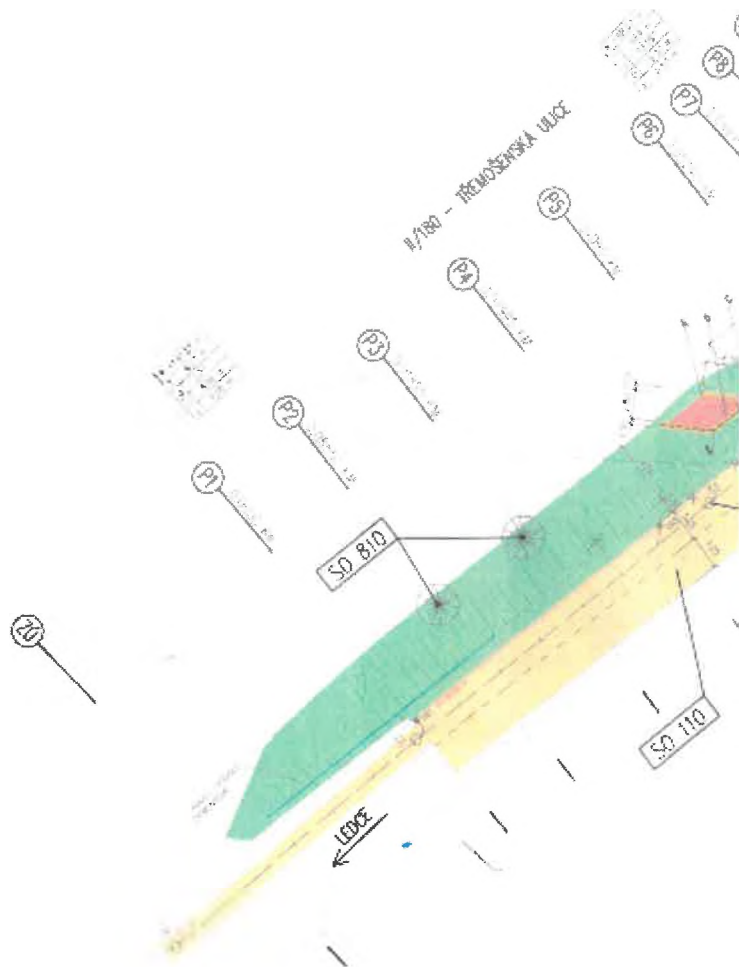

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Americká 39, 304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 30.8.2019
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TEL.: [REDAKCE]
FAX: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/27169/2019 - R
DATUM: 19.3.2020
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

Plzeňský kraj, prostřednictvím:
Správa a údržba silnic Plzeň. kraje, p.o. IČ: 72053119
Koterovská 462/162, okres Plzeň-sever
306 13 PLZEŇ a
Město Třebošná, IČ: 00258415
Sídliště 992
330 11 TŘEBOŠNÁ

SOUHLASÍ
S PŮVODNÍM
ORIGINÁLEM

ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.4.2020

O POVOLENÍ STAVBY

Toto rozhodnutí je vykonatelné dne [REDAKCE]

Městský úřad
Odbor dopravy

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy jako silniční správní úřad/orgán (SSÚ, SSO) a speciální státní orgán příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) a ust. § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o komunikacích, v platném znění (PK, ZPK), a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon, SZ), v řízení o žádosti ze dne 30.8.2019 stavebníka (spoluinvestoři, žadatel):

Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace (p.o.): Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., (SÚSPK p.o.) IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres Plzeň-sever (P-S) - v zastoupení právnickou osobou: MENE Industry s.r.o., IČ: 61171344, Lobežská 47/53, 326 00 Plzeň, a Město Třebošná, IČ: 00258415, Sídliště 992, 330 11,

podle ust. § 110 stavebního zákona, o vydání stavebního povolení (SP) podle projektové dokumentace (PD) ze souboru stavebních objektů (SO) stavby:

„Třebošná. Záluží – stabilizace svahu silnice II/180“, se všemi součástmi a příslušenstvím, v úseku ul. Třebošenská, U Kapličky, v celkové délce PK cca 115 m (stanič. v PD 114,95 m, ZÚ-KÚ vč. úpravy odvodnění v dl. cca 150 m, zákl. šíře PK 6,5 m mezi obrubníky-bez pravé strany se stávajícím chodníkem i obrubníky),

členěné na SO:

- SO 110 Komunikace
- SO 310 Kanalizace
- SO 410 Úprava kabelu Cetin a.s.
- SO 800 Sadové úpravy,

(související se sousední samostatně povolovanou stavbou téhož investora: „Třebošná. Záluží – rekonstrukce křižovatk v II/180 a III/180 8 v ulicích Třebošenská, Ledecká a Pod Hůrkou“).

umístěné podle (územního rozhodnutí-ÚR, PD a souhlasu obecního stavebního úřadu-SÚ) KN v obci Záluží, k.ú. Záluží u Třebošné na p.p.č.:

LV 10001- 210/6, 210/8, 210/9, 220, LV 803- 179/39, LV 1822- 218, 219, 225,

kde dalšími účastníky řízení jsou podle ust. § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věčnému břemenu, dále vlastníci sousedních

pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (*sousední p.p.č. zejm.: 179/28, 244/3, 210/7, 51/27, 179/17, 28/1, 8/1, 179/26, 7/1, 217, 226/1, 226/2, v k.ú. Záluží u Třemošné*),

po přezkoumání v souladu ust. §§ 109 - 111 stavebního zákona a se souhlasem obecního stavebního úřadu ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona,

rozhodl takto:

Podle ust. § 115 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejm. ust. § 18c vyhl. č.503/2006 Sb., v platném znění, **v y d á v á**

stavební povolení.

Stavba obsahuje:

soubor SO s úpravami uspořádání uličního prostoru veřejně přístupných PK, motoristických (*f.sk. C-základní šíře silnice III/180 mezi obrubníky 6,5 m*) i nemotoristických (*PK f.sk. D, podsk. D2-chodník*), a jejich úrovněového křížení i s ostatními PK (*místní-MK a účelové-ÚK*), vč. konstrukcí i povrchů, stabilizačních prvků/opěr/stěn/obrub, odvodnění vč. propustku, uličních vpustí (*UV*), místa pro přecházení pěších (*MPP*), osvětlení vybraných prvků PK, dopravního značení a zařízení (*DZZ*), sadových úprav vč. regulace i obnovy zeleně v dotčeném prostoru PK, úpravy v rozhledech připojení na PK nebo ve směrovém/výškovém oblouku, dále vč. vstupů, vjezdů/sjezdů, propojení pěších tras s návaznou částí obce, úpravy bezbariérové, úpravy umožňující užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (*OOSPO*), a dále vč. nezbytných úprav stavbou narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (*staveniště*), v návaznosti na ostatní PK i sousední stavby.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba, včetně souvisejících, přípravných, bouracích, odstraňovacích, sanačních apod. prací, bude provedena podle upravené PD (*PD k realizaci, provedení stavby, RDS/PDPS*), ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí, zpracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří autorizovaného projektanta, autorizovanou osobou (*AO*) pro dopravní stavby (*DS*): [REDACTED]
Bude realizována návazně, resp. následně a současně v koordinaci se sousedními veřejnými stavbami i zařízeními v místě vč. komunikací a připojení na ně, i odtokových poměrů, v homogenním provedení jednotlivých objektů podle určeného účelu a funkce v uspořádání uličního veřejného prostoru PK, s tím, že nedojde ke zhoršení současných podmínek a to i z hlediska bezpečnosti všech uživatelů předmětné stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před započítím stavby musí být rovněž vyřešena majetkoprávní podstata stavby (*staveniště*). V případě každého dotčeného cizího pozemku předmětnou stavbou je stavebník povinen zajistit předem včas pro celou dobu výstavby platné oprávnění k provedení každé potřebné části stavby tak, aby nevznikla překážka pro realizaci ani následně bezpečné trvalé užívání žádného stavebního objektu nebo součástí ze souboru povolovaných staveb.
3. Stavba bude realizována v souladu s ust. § 115 SZ, s platnými technickými i zvláštními předpisy vč. jejich změn, zejm. ČSN 736110, 736102, 736101, TP 65, 133, stavebním zákonem, ZPK, zák. č. 361/2000 Sb. (*ZPPK*), a jejich prováděcími předpisy, vč. vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č.104/1997 Sb., vyhl. č.294/2015 Sb., tak, aby stavba nebo její část uváděná do provozu byla samostatně schopná bezpečného trvalého užívání k určenému účelu bez závad.

4. Umístění vpustí i vjezdů vždy mimo plochu převádění pěších i mimo hmatné prvky. Ochranná zařízení, sloupy VO a rovněž i pilíře technické infrastruktury apod. budou umístěny v potřebném, nezbytném úseku, mimo dopravní prostor a tak, aby netvořily překážku v provozu, v rozhledech ani ve vjezdech a křižovatkách a současně tak, aby byla odpovídajícím způsobem osvětlena místa křižovatek, DZ, MPP. Vjezdy v místech dlážděných chodníkových tras budou v homogenním provedení chodníkovým přejezdem se zesílenou dlažbou, i protismykovými vlastnostmi, s varovnými pásy u snížené silniční obruby vozovky, v parametrech a sklonech odpovídajících podmínkám bezpečného užívání podle skutečného stavu-dopravní obslužnosti konkrétní nemovitosti; v místech, kde to umožní místní a technické podmínky, lze vedle sjezdu resp. na plochách mimo chodníkové trasy užívané osobami s OSPO a mimo dopravní prostor PK zřídit plochu pro parkování osobního vozidla.
Vrata přilehlých sousedních nemovitostí nebudou otevíraná-umístěná do dopravního prostoru (DP) PK. Zeleň- zejména keřová a stromová bude zregulována tak, aby nezasahovala do DP ani rozhledových trojúhelníků a nezakrývala dopravní značení. Likvidace dešťových nebo jiných odpadních vod, zejména z okolních nemovitostí, střech, zpevněných nebo jiných ploch, bude zajištěna na pozemku vlastní dotčené nemovitosti nebo svedena-zaústěna do kanalizačního sběrače/systemu.
5. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§152 SZ) se zřetelem na ochranu života a zdraví, životního prostředí, majetku, i šetrnost k sousedství. Práce, příprava, výstavba, dokončování apod. budou prováděny tak, aby nenarušily a nepoškodily sousední objekty a pozemky. Veškeré plochy, konstrukce a stavby, narušené v důsledku provádění prací je stavebník povinen neprodleně uvést na vlastní náklady do původního/předchozího stavu.
6. Etapizace výstavby, resp. postup prací bude předem koordinován – POV/plán organizace výstavby, PKP/ plán kontrolních prohlídek, časový HMG/harmonogram prací, a evidován např. zápisem do stavebního deníku nebo obdobným vhodným způsobem vedeným na místě stavby-staveništi; stavební deník vede zhotovitel, resp. stavbyvedoucí v souladu s ust. § 153, resp. s §157 SZ. Vyhotovení podrobného plánu KP zajistí stavebník předem v dostatečném předstihu před započítím prací ve spolupráci nebo prostřednictvím vybraného zhotovitele stavby a rovněž tak bezodkladně zaslání jeho stejnopisu, popř. aktualizace zdejšímu správnímu orgánu.
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové plochy/stavby včetně všech sítí technické infrastruktury podle PD. Staveniště bude zřizováno a vymezeno v nezbytném rozsahu, hospodárně, s ohledem na bezpečnost pracovníků, okolního provozu i životní prostředí.
8. Při provádění stavby, vč. přípravy, odstraňování, výstavby, dokončovacích a jiných souvisejících pracích a úpravách, bude zajištěno dodržování ustanovení o obecně technických požadavcích na výstavbu, příslušné vztahující se platné technické normy a zásady, bude zabezpečeno dodržování předpisů z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, osob i majetku.
9. Při provádění stavby budou dodržena platná ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a předpisy týkající se bezpečnosti práce a zařízení včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na staveništi.
10. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby, stavebník/investor povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, ve smyslu platného ustanovení §14 zákona č.309/2006 Sb. Budou-li při realizaci stavby překročeny limity pro celkovou předpokládanou dobu trvání nebo objem prací a činností, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací na předepsaném formuláři oblastnímu inspektorátu práce v Plzni podle ust. § 15 uvedeného zákona.
11. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splňují ust. SZ- §§ 156 SZ Požadavky na stavby, § 160 Provádění staveb, § 169 Obecné požadavky na výstavbu, a dále i technické požadavky nařízení vlády ČR č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č.163/2002 Sb. vč. NV č. 215/2016 Sb. s účín. od 1.1.2017, č.190/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
12. Pro zajištění podmínek bezpečnosti budou plněny základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. č.48/1982 Sb. a vyhl. č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění - v dohodě zajišťuje stavebník a stavbyvedoucí.
13. Po dobu výstavby i ostatních prací bude umožněn přístup na přilehlé a sousední pozemky nacházející se v blízkosti staveniště; příjezd na sousední pozemky nebo parkování OA vlastníků těchto nemovitostí bude

- umožněn vždy individuálně v dohodě se zhotovitelem stavby v závislosti na postupu prací. Pro stavbu, resp. staveniště a jeho zařízení bude vždy zajištěn staveništní příjezd, rovněž tak i pro vozidla IZS.
14. Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, s důrazem na bezpečnost pěších i ostatních účastníků provozu na PK.
 15. Při provádění stavby, pomocných pracích i při odstraňování odpadů musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací přilehlých ani okolních, zejm. MK, ÚK, II/180, III/180 8.
 16. Likvidace odpadů bude prováděna řádně v souladu s ustanovením zák. č.185/2001 Sb., v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zejména vyhl. MŽP č.381/2001 Sb.- Katalog odpadů. Pro likvidaci odpadů musí být užito určených řízených skládek pro zvláštní, tříděný odpad, např. skládka Chotíkov, popříp. v dohodě - stavební dvůr, areál investora, obce apod., vždy vyjma nebezpečného odpadu.
 17. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přípustnou hladinu hluku, vibrací a prachu; individuálně v dohodě se zhotovitelem, v závislosti na postupu prací a v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, bude upravena pracovní činnost v okolí míst trvalého bydlení, resp. obytné zástavby - z hlediska dodržování nočního klidu a klidu i v době ve dnech pracovního klidu a volna, tzn. soboty, neděle, svátky.
 18. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména stavebníka, projektanta, zhotovitele stavby a odpovědného stavbyvedoucího, včetně štítku „Stavba povolena“.
 19. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do kolaudace stavby.
 20. Před zahájením stavby, cca 2 týdny před započatím prací, nutno ohlásit stavbu organizaci Západočeské muzeum v Plzni, oddělení záchranných archeologických výzkumů, Zborovská 40, tel.: [REDAKCE]. Při případných archeologických nálezích při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, a to zejména ust. § 23-nálezce je povinen učinit oznámení nejpozději do druhého dne.
 21. Před zahájením stavby budou znovu ověřeny a vytýčeny všechny inženýrské sítě; v průběhu projektové přípravy a oznámení zdejšího úřadu o zahájení této stavby byla v místě nebo v blízkosti ověřena/potvrzena existence sítí: plynovodní, telekomunikační, energetické, vodohospodářské.
 22. Budou dodrženy podmínky/stanoviska/souhlasy apod. o ochraně sítí na stavbě a v její blízkosti, vlastníků, správců, provozovatelů těchto stavbou dotčených sítí a zařízení, v rozsahu PD stavby, zejména:
 - GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, ze dne 10.4.2019 zn.: 5001899865
 - CETIN/Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 12.7.2019, ze dne 29.7.2019 /č. smlouvy společnosti CETIN: PN 2019_0011
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 1.4.2019 zn.: 1103436560
 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 9.4.2019 zn.: 2019/02245.
 23. Budou respektovány podmínky/stanoviska/souhlasy apod. dalších účastníků, dotčených orgánů, subjektů, z hlediska ochrany oprávněných, právem chráněných, resp. veřejných zájmů, v rozsahu PD, a to zejména:
 - odboru ŽP MÚ Nýřany, ze dne 16.8.2018 čj. OŽP-Čel/22930/2018, ze dne 9.4.2019 čj.: OŽP-PRO/10744/2019, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
 - odboru hospodářsko-správního MÚ Třemošná, ze dne 9.4.2018 čj.: MUTE-1385/2018/HSO/EDI, z hlediska chráněného zájmu na úseku ochrany přírody-kácení dřevin rostoucích mimo les
 - ČR- Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 9.4.2019 zn.: 22526/2019/342/Kai SP-2019/6291
 - HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 9.4.2019 čj.: HSPM-5861-4/2017 ÚPP
 - KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 3.4.2019 č.j.: KHSPL/7928/21/2019
 - Policie ČR DI Plzeň-venkov, ze dne 8.4.2019 č.j.: KRPP-50108-3/ČJ-2019-031106-47.
 24. Po dokončení stavby požádá investor o povolení užívání stavby podle platného stavebního zákona (§122. kolaudační souhlas). Ke kolaudaci / k závěrečné prohlídce stavby, musí být předloženy všechny doklady, zejména zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, vyhovující výsledky laboratorních zkoušek,

- certifikáty výrobků, protokoly o odevzdání a převzetí dokončených objektů stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán pro oddělení-rozdělení nebo změnu pozemků a jejich vlastníků, změna využití nebo druhu pozemku, zápis Katastrálním úřadem PK Plzeň - sever, vklad do katastru, tj. majetkoprávní vypořádání dotčených stran.
25. Místní úpravu provozu (*MÚP*) na dotčených PK dopravním značením a zařízením (*DZZ*) jako nedílnou součást, resp. příslušenství stavby, stanoví zdejší silniční správní orgán v souladu s ust. § 77 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na PK a o změnách některých zákonů, v platném znění, na základě předem podané žádosti stavebníkem, investorem nebo zhotovitelem stavby, spolu s předložením upraveného kompletního návrhu zpracovaného v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5, 1436 vč. změn, TP 65, 133 a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, v platném znění, po předchozím projednání s dotčeným orgánem PČR DI Plzeň-venkov, a to nejpozději před dokončením stavby.
 26. *DZZ* pro realizaci stavby, resp. přechodnou úpravu provozu (*PÚP*) na dotčených PK stanoví zdejší silniční SO na žádost vybraného zhotovitele stavby, který je držitelem oprávnění k požadované činnosti, podanou předem před započítím stavby, nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, spolu s přílohou kompletního návrhu DIO, po předchozím projednání s uvedeným dotčeným orgánem Policie ČR.
 27. Stavbu bude provádět oprávněná odborně způsobilá osoba – zhotovitel, stavební podnikatel v souladu s ustanovením §160 stavebního zákona, na základě výběru investora. Název zhotovitele včetně dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby oznámí písemně stavebník zdejšímu odboru včas předem před zahájením stavby.
 28. Stavba se všemi součástmi a příslušenstvím bude dokončena do 24 měsíců od nabytí právní moci tohoto povolení.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.8.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení (*ÚR bylo vydáno obecným SÚ MÚ Třemošná ze dne 6.6.2018 č.j.: MUTE-2278/2018/STO/IKo, nabytí právní moci (NPM) dne 27.6.2018; souhlas v souladu s ust. § 15 odst.2 stavebního zákona byl vydán tíméž úřadem ze dne 27.6.2018 č.j.: MUTE-2715/2018/STO/IKo*).

Stavební úřad oznámil v souladu s ust. § 112 stavebního zákona zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru/navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Podle ust. § 114 stavebního zákona stanovil, že mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, popřípadě důkazy, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení písemnosti – námitky nebyly uplatněny.

V průběhu stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení (vč. *PD*) z hledisek uvedených v ust §§ 109 - 111, 115 stavebního zákona, zejména splnění podmínek ochrany veřejných zájmů, ochrany zdraví, života a životního prostředí, z hlediska obecných, technických požadavků na výstavbu, základní i vybrané stavební výrobky a z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o OTP na zabezpečení užívání staveb osobami s OSPO, v platném znění, dále z hlediska komplexnosti, plynulosti a koordinace výstavby včetně zajištění jejího odborného provedení (v *uvedeném dohodnutém termínu*) i vedení oprávněnou osobou. Řádné provedení stavby je zajištěno v ověřené *PD (RDS, PDPS)*, resp. v podmínkách tohoto povolení.

V řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená, práva vlastníků těchto pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení v souladu ust. § 109 stavebního zákona - viz rozdělovník.

Stavební úřad, vázán záměry územního plánování v obci, podmínkami územního rozhodnutí, souhlasem obecného stavebního úřadu, stejně jako i zajištěním souladu se zvláštními předpisy, při svém rozhodování vycházel ze znalosti místních poměrů a rozsahu PD přizpůsobené těmto poměrům.

Současně zajistil soulad a koordinaci předložených uvedených stanovisek dotčených orgánů a ostatních subjektů, se zaměřením na věcnou stránku výstavby a na její účinky na okolí tak, aby bylo současně hospodárné vedení správního řízení i vlastní realizace stavby (v *uvedeném dohodnutém termínu*), a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí;

stanoviska sdělili/bylo doloženo:

- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 10.4.2019 zn.: 5001899865
- CETIN/Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 12.7.2019, ze dne 29.7.2019 /č. smlouvy společnosti CETIN: PN 2019_0011
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 1.4.2019 zn.: 1103436560
- VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 2, 317 68 Plzeň, ze dne 9.4.2019 zn.: 2019/02245.
- odbor ŽP MÚ Nýřany, ze dne 16.8.2018 čj. OŽP-Čel/22930/2018, ze dne 9.4.2019 čj.: OŽP-PRO/10744/2019, z hlediska ochrany životního prostředí tj. přírody a krajiny, o vodách, půdě ZPF, lesích, ovzduší, o odpadovém hospodářství
- odbor hospodářsko-správní MÚ Třemošná, ze dne 9.4.2018 čj.: MUTE-1385/2018/HSO/EDI, z hlediska chráněného zájmu na úseku ochrany přírody-kácení dřevin rostoucích mimo les
- ČR- Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň, ze dne 9.4.2019 zn.: 22526/2019/342/Kai SP-2019/6291
- HZS Plzeň. kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň, ze dne 9.4.2019 čj.: HSPM-5861-4/2017 ÚPP
- KHS Plzeň. kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, ze dne 3.4.2019 č.j.: KHSPL/7928/21/2019
- Policie ČR DI Plzeň-venkov, ze dne 8.4.2019 č.j.: KRPP-50108-3/ČJ-2019-031106-47.

Stavební úřad dále zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy obecné zájmy ani nepřiměřeně omezena a ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a konstatuje, že byly splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, a že dále neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení předmetné stavby.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů (§81 odst.1, §83 odst.1 zák. č.500/2004 Sb., správní řád, dále i „správní řád“) ode dne jeho oznámení doručením (§72 odst.1 správního řádu), ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni prostřednictvím zdejšího odboru dopravy (§86 odst.1 správního řádu).

Lhůta pro podání odvolání počíná dnem následujícím (§40 odst.1 správního řádu).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení; odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§82 odst.1 správního řádu).

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v §37 odst.2 správního řádu; podává se s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis; nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto účastníka (§82 odst.2 správního řádu).

Účastník si může zvolit jednoho zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí (§33 odst.1 správního řádu).

Případně včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§85 odst.1 správního řádu).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§73 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§115 stavebního zákona).



silniční správní orgán MÚ Nýřany

Obdrží: viz rozdělovník

ROZDĚLOVNÍK:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

(stavebník; vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- Plzeňský kraj, prostřed.: SÚSPK, p.o., IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, okres P-S (LV 803) - v zast.:

MENE Industry s.r.o., IČ: 61171344, Lobežská 47/53, 326 00 Plzeň

- Město Třemošná, IČ: 0025415, Sídliště 992, 330 11 (LV 10001)

(vlastníci technické infrastruktury)

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
- CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno
- Vodárenská a kanalizační a.s., IČ: 49786709, Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný, p.p.č. zejm.: 179/28, 244/3, 210/7, 51/27, 179/17, 28/1, 8/1, 179/26, 7/1, 217, 226/1, 226/2, v k.ú. Záluží u Třemošné)

-
-
-
-

Dotčené orgány:

PČR KŘP Plzeň. kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI, Anglické nábř.7, 301 00 Plzeň

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OŽP, Americká 39, 304 66

MÚ Nýřany, prac. Plzeň, OÚP, Americká 39, 304 66

MÚ Třemošná, SÚ, Plzeňská 98, 330 11

HZS Plzeň. kraje, IČ: 70883378, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň

KHS Plzeň. kraje, IČ: 71009299, Skrétova 15, 303 22 Plzeň

ČR - Povodí Vltavy, s.p., IČ: 70889953, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 - závod Berounka, Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň

Na vědomí:

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ: 25205625, Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČ: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava - středisko Plzeň, Nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň

Za vydání stavebního povolení se správní poplatek podle položky 18 odst.1.písm.f) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, nevyměňuje/nevybírá.

Příloha: 1 x ověřená PD, štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

STAVBA POVOLENA

(podle §18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění)

rozhodnutím odboru dopravy Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň

ze dne: 19.3.2020

č.j.: OD-Fro/27169/2019 - R

nabytí právní moci dne: 15.4.2020

Označení stavby, účel stavby: „**Třemošná, Záluží - stabilizace svahu silnice II/180**“

Označení stavebníka: **Plzeňský kraj, prostřednictvím příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., IČ: 72053119, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, a Město Třemošná, IČ: 00258415, Sídliště 992, 330 11**

Označení stavebního podnikatele:

stavebník zde uvede údaje o vybraném stavebním podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu

Stanovený termín dokončení stavby: **do 15.4.2022**



otisk úředního razítka

silniční správní orgán MÚ Nýřany

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana


Supervizor, VFS Čechy jih


(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích v rámci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozem přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata užítých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

č.j.: 20971/22/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737 se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň – Koterov
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem

tímto pověřuje pana **Mgr. Martina Víta, MPA,**

nar.:

trvale bytem:

k tomu, aby ji zastupoval při právních jednáních, a to v rozsahu kompetencí generálního ředitele organizace, včetně podepisování smluv či dohod, a to:

1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo reálného břemene);
2. Smlouva o zřízení věcného břemena (služebnosti nebo reálného břemene);
3. Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka – PK investor;
4. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení;
5. Smlouva o provedení překládky telekomunikačního zařízení;
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
7. Smlouva o zajištění přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie;
8. Smlouva o zvláštním užívání silnic (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje) třetími stranami dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
9. Smlouva o omezení užívání nemovitosti (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje), jejímž předmětem je stanovení podmínek při provádění stavebních prací v komunikaci anebo pozemku a uložení inženýrské sítě do silničního pozemku, na něm nebo na mostních objektech za účelem zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
10. Dohoda o technických podmínkách při zvláštním užívání komunikace (v nichž je organizace v postavení správce komunikace, resp. vykonává vlastnické oprávnění Plzeňského kraje).

Toto pověření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Plzni dne

26 -09- 2022

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00
IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

V Plzni dne

Pověření přijímám

Mgr. Martin Vít, MPA

Zapsaná v OR vedeném
oddíl Pr, vložka č. 737
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Koterovská 162
326 00 Plzeň

Tel.
E-m
