

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2024/00083**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Kravaře

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření [REDACTED] supervizorem VFS Morava sever

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Kravaře

se sídlem Náměstí 43, Kravaře 747 21

IČO: 00300292

DIČ: CZ 00300292

zastoupená starostkou Mgr. Monikou Brzeskovou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Kravaře ve Slezsku spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 4.4.2024 vydané pod čj. 70267/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do šesti (6) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **206.745,- Kč** (slovy: dvě stě šest tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
 Registr smluv: ANO

- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **15.331,- Kč** (slovy: patnáct tisíc tři sta třicet jedna korun českých) bude společnostmi CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnostmi CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: [REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Bc. Lucie Vehovská
funkce: referentka odboru místního hospodářství a IV
e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Walter Kocián
funkce: vedoucí odboru místního hospodářství a IV
e-mail: [REDACTED]

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
Registr smluv: ANO

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
 Registr smluv: ANO

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
 Registr smluv: ANO

- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00083
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005100
 Registr smluv: ANO

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka


Smlouva byla schválena Radou města Kravaře na schůzi č. 31. dne 24.06.2024.

CETIN:

Stavebník:

V Ostravě dne _____

V Kravařích dne _____




CETIN a.s.
 Petr Truhlář
 Supervizor, VFS Morava sever

Obec Kravaře
 Mgr. Monika Brzesková
 Starostka

CETIN a.s.

Souhrnný pohled XXXX
Rozhodnutí dosud neprovedeno.
stupeň - Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní

Schvalování akce 2-kolové schvalování

Název

VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku

Budoucí uživatel

GMo-ZLOS

Zpracovatel

Předkladatel

role: Vedoucí

role: Manažer

Schvaluje

Obsah:

1. Identifikační údaje stavby

1.1. Krycí list

1.1.1. Základní identifikační údaje projektu

1.1.2. Stručný popis technického řešení

1.1.3. Požadavky

1.2. Základní údaje o projektu

1.2.1 Identifikační údaje

1.2.2 Kapacitní údaje

1.2.3 Rekapitulace nákladů

1.2.4 Termíny

2. Účel a zdůvodnění stavby

2.1. Stručný popis technického řešení

2.2. Poznámka

2.3. Podmiňující, související a navazující stavby

2.4. Vyjádření a záznamy

2.5. Průběh schvalování

3. Přílohy

1. Identifikační údaje stavby

1.1. Krycí list

1.1.1. Základní identifikační údaje projektu

Název projektu:	VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku		
SPP:			
Investiční kategorie:			Podkategorie:
Příprava od:	28.05.2024	do:	6.6.2024 (SoSB dodatečně)
Realizace od:	01.03.2025(upřesní investor)	od:	31.10.2025
Nabídka k přejímce(RFA):	31.12.2025		
Zodpovědná osoba:			

1.1.2. Stručný popis technického řešení

Z důvodu výstavby nové příjezdové komunikace k Aquaparku v Kravařích na ul. Kostelní je nutno realizovat překládku PVSEK CETIN a.s.. Dojde k dotčení stávajícího podzemního sdělovacího vedení – místních kabelů (TCEPKPFLE 10XN0,4 a 3XN0,4) a 1ks volné HDPE40mm O/BB trubky v majetku a užívání CETIN a.s.. Jedná se o vynucenou překládku.

Zpracováno CTN (velké) + bude uzavřena SoSB s Městem Kravaře.

ÚR - vyřídí zákazník.

VBŘ - vyřídí CETIN.

Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.

Vytýčení hranic pozemků - CETIN.

Termín CTN - do 6. 6. 2024 (SoSB bude doložena dodatečně).

Náklady na realizaci:	PD	VBŘ	INRC	INC
	0	0	0	0

Technické řešení schválil:

Datum, podpis:

1.1.3. Požadavky

Název polygonu: VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

1.2. Základní údaje o projektu

1.2.1. Identifikační údaje:

Název: VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku
Kategorie:
Podkategorie: Metalické kab. vč. HDPE a výkopů
Typ investice: Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Číslo interní:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATÚ: RSU Kravaře

1.2.2. Kapacitní údaje:

Průměrný náklad na:

100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů:	0 km
100800_Délka HDPE trubek pro OK:	0 km
101300_Délka trubiček:	0 km
101000_Délka optických kabelů:	0 km
Délka optických vláken:	0 km
100900_Počet bytových domů:	0 BD
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech:	0 bj
100500_Počet rodinných domů:	0 RD
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech:	0 bj
OK MiDia 12vl,DC:	0 km
OK 24vl. s Cu párem Sterlite:	0 km
Kabel optický 24vl. dial Sterlite:	0 km
OK 48vl. s Cu párem Sterlite:	0 km
OK DuctSaver FX 96vl, 9,1mm:	0 km
OK MiDia 96vl, Cu 10,5 mm:	0 km
Kabel opt.LT MiDia GX,96vl.AWFlex 6,3mm CU:	0 km
OK DuctSaver 144vl, DC:	0 km
OK Sterlite 144vl,Cu:	0 km
OK MiDia 2FX 144vl., DC 6,3mm :	0 km
OK DuctSaver 288vl,DC :	0 km
OK DuctSaver 576vl,DC :	0 km
OK 12vl.AW 2xribb.:	0 km
OK 24vl.AW 4xribb.:	0 km
OK 48vl.AW 8xribb.:	0 km
Mikrokabel FU 2f:	0 km
Mikrokabel FU 6f:	0 km
Mikrokabel FU 12f:	0 km
Mikrokabel 48f 4mm BIRLA:	0 km
Mikrokabel 144f HFCL:	0 km
Mikrokabel MiDia 2GX 192f OD 6,0mm AWFle:	0 km
Mikrokabel opticky samonosny OFS12vl.:	0 km
Kabel RISER KTPLine 12xG657A2:	0 km
Kabel RISER KTPLine 24xG657A2:	0 km
Kabel RISER OFA 48xG657A2:	0 km
OK LuT 72vl, 12xribb int:	0 km
OK LuT 144vl, 12xribb int:	0 km
OK vnitřní RISER 24vl :	0 km
OK MiDia 24vl,Cu :	0 km
OK MIDia 48vl,Cu:	0 km
OK vnitřní EZ-Bend 1vl :	0 km
Kabel opt.EZ-Bend,CORDAGE,3mm,bílý,1 vlák:	0 km
OK MiDia 24vl,DC:	0 km
OK DuctSaver 144vl,Cu:	0 km

OK DuctSaver FX 96vl, Cu 9,1mm:	0 km
OK MiDia 96vl,DC:	0 km

1.2.3. Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis.Kč
Materiál – přímá dodávka:	0 tis.Kč
Materiál dodavatele:	0 tis.Kč
Montáž:	0 tis.Kč
Zemní práce:	0 tis.Kč
GOZ:	0 tis.Kč
Poplatky:	0 tis.Kč
VBŘ:	0 tis.Kč
Ostatní práce:	0 tis.Kč
Ostatní:	0 tis.Kč
OPEX:	0 tis.Kč

Celkové investiční náklady včetně přípravy: 0 tis.Kč

Příprava:	0 tis.Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis.Kč
Provozní náklady podle PD:	0 tis.Kč

1.2.4. Termíny:

Platnost ÚR od:	Bude upřesněna po vydání
Platnost ÚR do:	Bude upřesněna po vydání
Plánované zahájení přípravy:	28.05.2024
Plánované ukončení přípravy:	06.06.2024 (SoSB bude uzavřena později)
Plánované zahájení realizace:	01.03.2025
Plánované ukončení realizace:	31.10.2025
Plánovaný termín nabídky k přejímce(RFA):	31.12.2025

2. Účel a zdůvodnění stavby

2.1. Stručný popis technického řešení

Z důvodu výstavby nové příjezdové komunikace k Aquaparku v Kravařích na ul. Kostelní je nutno realizovat překládku PVSEK CETIN a.s.. Dojde k dotčení stávajícího podzemního sdělovacího vedení – místních kabelů (TCEPKPFLE 10XN0,4 a 3XN0,4) a 1ks volné HDPE40mm O/BB trubky (MOK) v majetku a užívání CETIN a.s.. Jedná se o vynucenou překládku.

Na dotčeném stávajícím kabelu TCEPKPFLE 10XN0,4 (mezi stáv. S45/KVRE77 a stáv. S2/KVRE2036, KVRE2038) bude provedena nová kabelová vložka TCEPKPFLE 10XN0,4 a 2x nová kabelová spojka XAGA 500-43/8-150 s minimarkerem 3M 1255.

Na dotčeném stávajícím kabelu TCEPKPFLE 3XN0,4 (mezi stáv. KVRE 57 a stáv. KVRE516) bude provedena nová kabelová vložka TCEPKPFLE 3XN0,4 a 2x nová kabelová spojka XAGA 500-43/8-150 s minimarkerem 3M 1255.

Na dotčené stávající volné MOK HDPE40mm O/BB trubce (mezi stáv. REZ PLASSON40mm u stáv. S1 a stáv. REZ PLASSON40mm u KVRE2036) bude provedena nová vložka HDPE40mm O/BB a 2x nová spojka PLASSON40mm s minimarkerem 3M 1255.

V místě křížení nové komunikace budou uloženy 2ks PE110mm chráničky, do jedné PE110mm chráničky budou zataženy 2ks překládaných kabelů a 1ks HDPE40mm trubky, druhá PE110mm chránička bude rezervní.

V nové trase překládky budou MK a HDPE40mm trubka ukládány v celé délce trasy do výkopu s min. krytím 1,2m pod niveletou budoucí příjezdové komunikace.

Navrhovanou trasou přeložky dojde k dotčení nemovitostí:
Parc.č. 4356/1 a 3715/2 k.ú. Kravaře ve Slezsku – Město Kravaře

Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníkem dočasných nemovitostí – Městem Kravaře.

Přeložku SEK je nutno koordinovat s připravovanou generální stavbou nové příjezdové komunikace k Aquaparku a inženýrských sítí v Kravařích na ul. Kostelní.

V dostatečném předstihu bude dle potřeby projednána výluka z provozu PEW na MK.

Dle potřeby bude v dostatečném předstihu na MK projednána výluka z provozu PEW.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů. Stavbu je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“.

Zpracováno CTN (velké) – před realizací bude uzavřena SoSB s Městem Kravaře ve Slezsku.

ÚR - vyřídí zákazník.

VBŘ - vyřídí CETIN.

Výkopy včetně kabelového lože - CETIN.

Vytýčení hranic pozemků - CETIN.

Termín CTN – 06/2024.

2.2. Poznámka:

Zpracováno CTN (velké), ÚR - vyřídí zákazník, VBŘ - vyřídí CETIN, výkopy - CETIN, vytýčení hranic pozemků - CETIN.

Kontakt:

Investor: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, Mgr. Monika Brzesková - starostka, IČO: 00300292

Projektant: SHB, akciová společnost [REDACTED]

Zpracovatel CTN: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. – [REDACTED]
[REDACTED]

Předpokládaný termín realizace: 2025 (upřesní zákazník).

Připomínky [REDACTED]

2.3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce – vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce:


Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


2.4. Vyjádření a záznamy


2.5. Průběh schvalování

3. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Technická zpráva CTN	SD
Rozpočet stavby PPD	SD
Dokumentace CETIN	SD
Informace o pozemcích	SD
Výkresová část – situační výkresy	SD
Výkresová část - schémata	SD
Vyjádření o existenci SEK + příloha	SD
Ostatní	SD

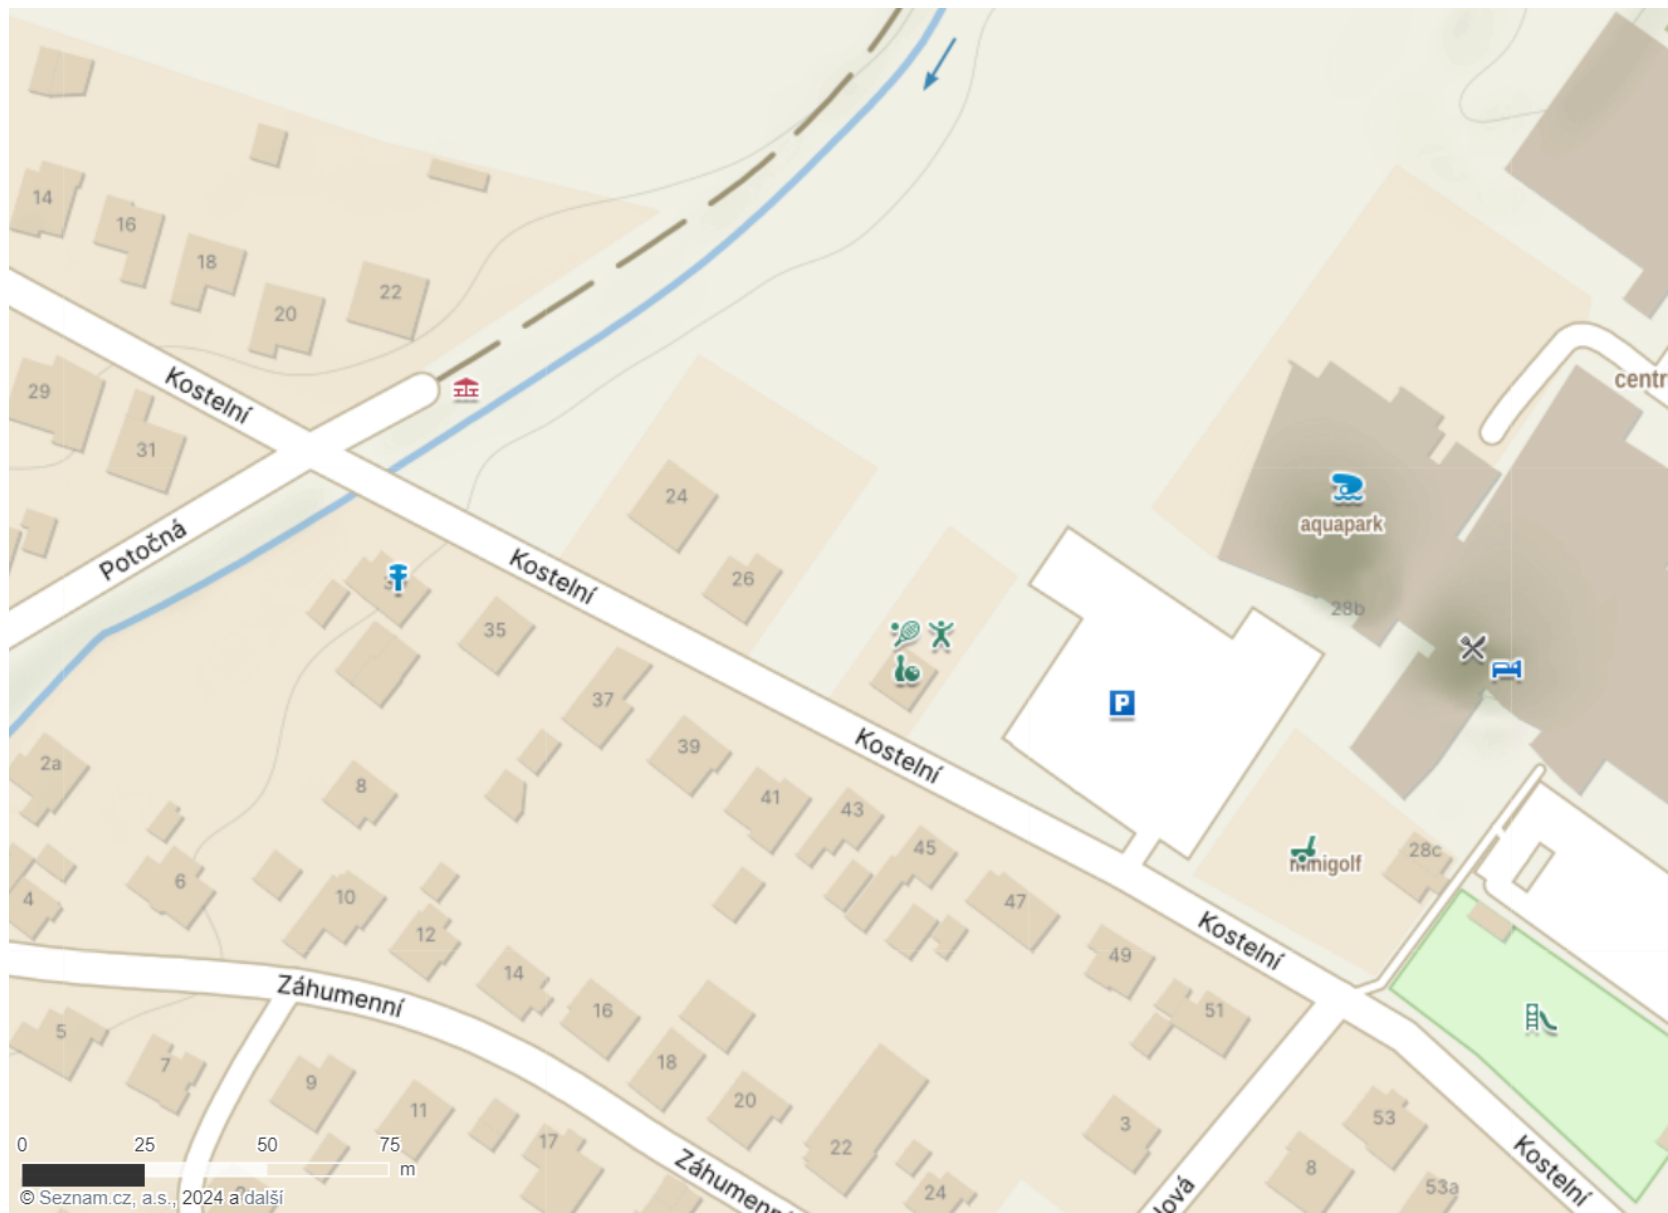

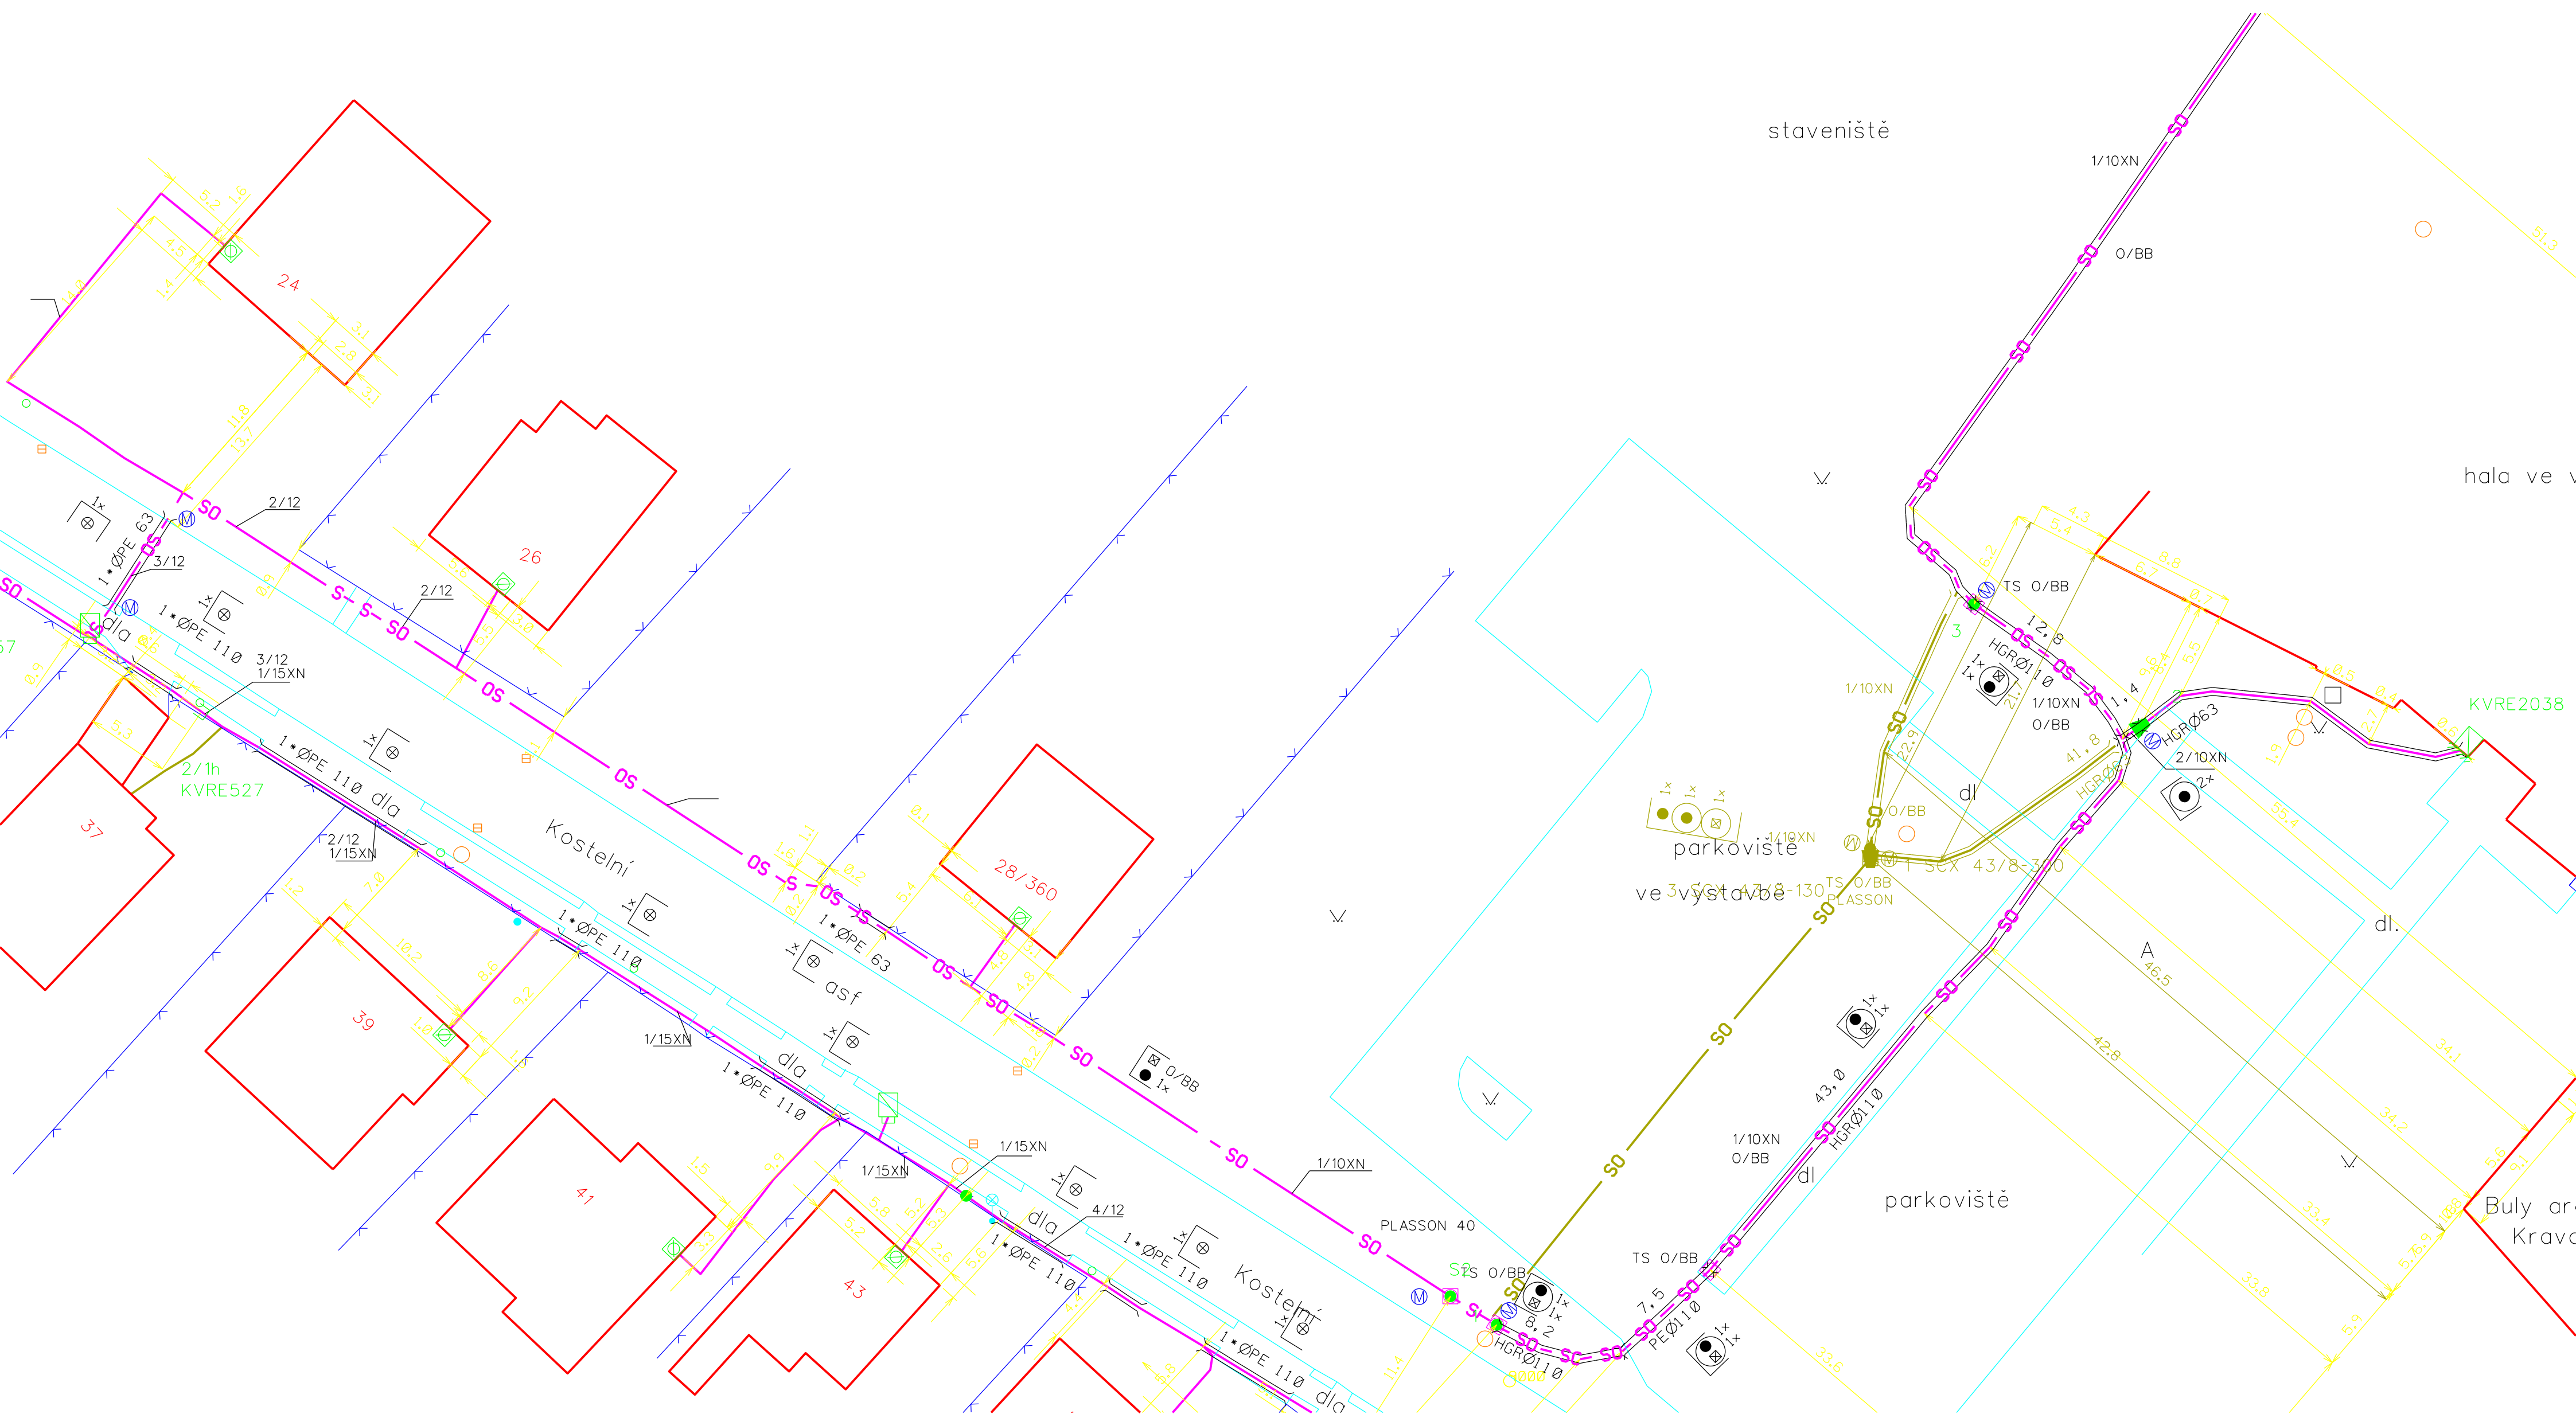

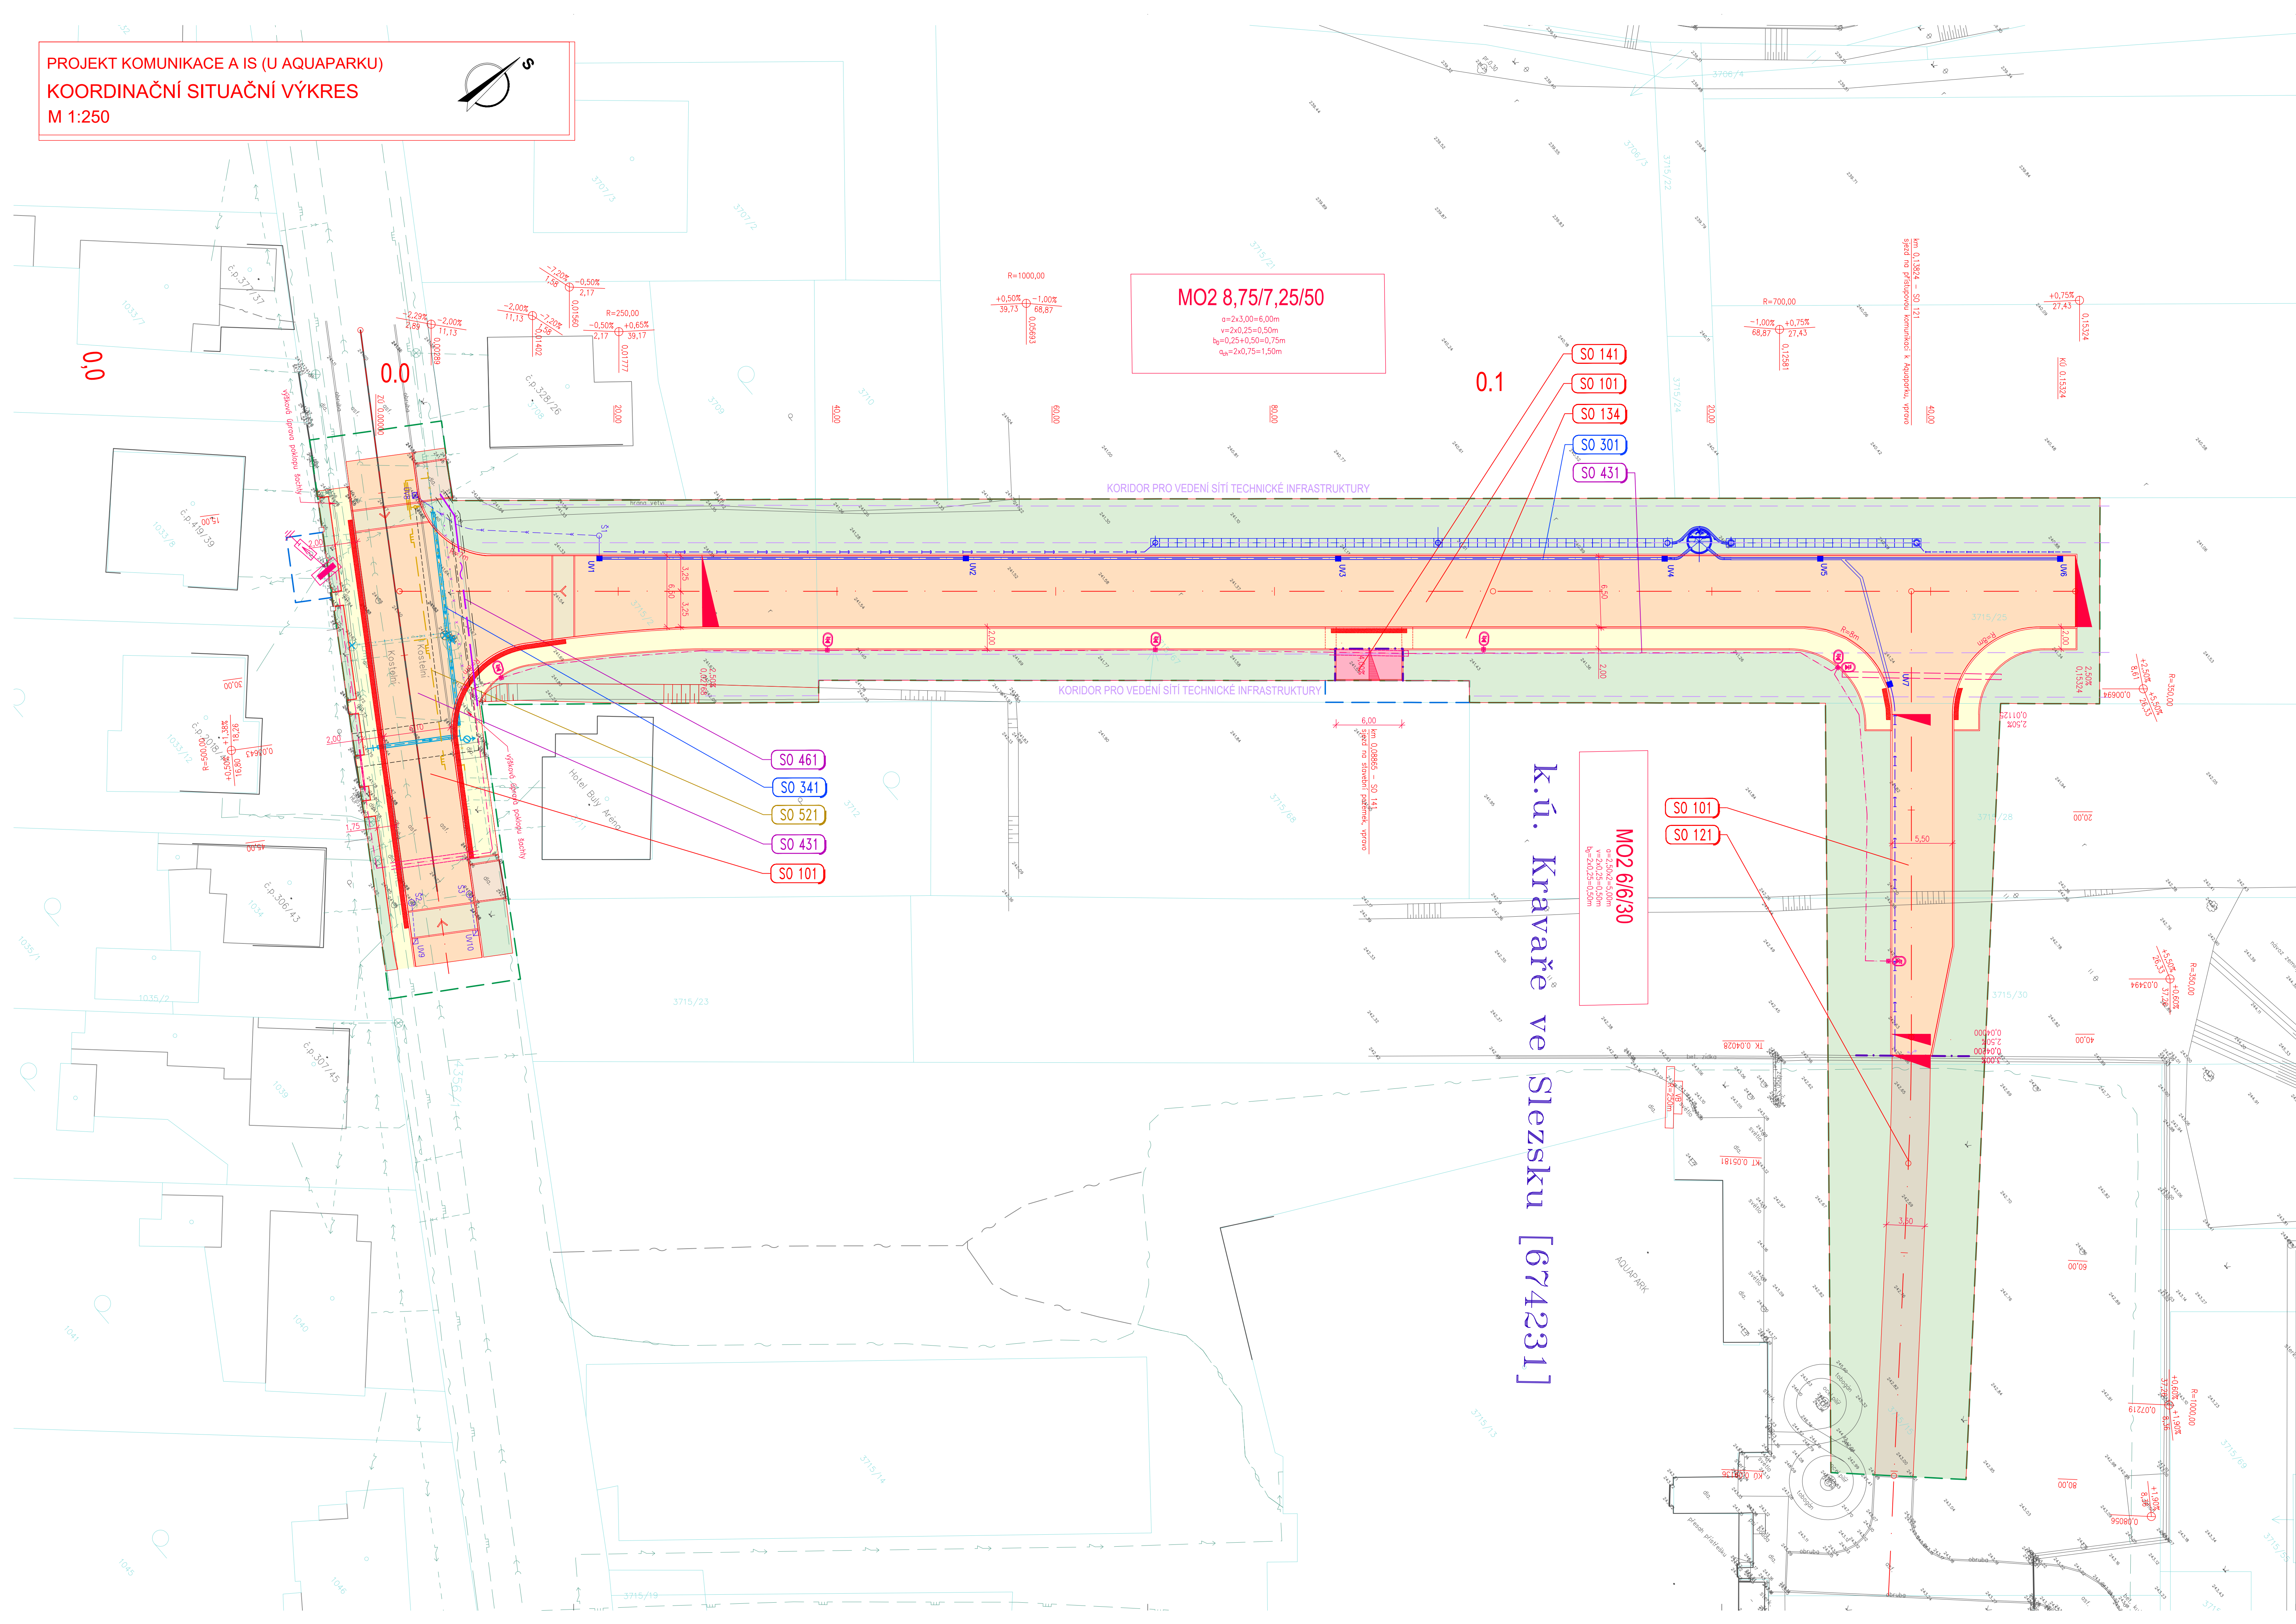

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- | | |
|--|--------------------------|
| | STL PLYNOVOD |
| | EL. VEDENÍ NN (nadzemní) |
| | EL. VEDENÍ NN (podzemní) |
| | VODOVODY SVAK |
| | SDĚLOVACÍ KABELY |
| | SDĚLOVACÍ KABELY |
| | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |

LEGENDA PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- — — — — DEŠŤOVÁ KANALIZACE
— — — — — STL PLYNOVOD
— — — — — VODOVOD
— — — — — SDĚLOVACÍ VEDENÍ
— — — — — V. O. — — — — — VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- Objekty řady 100
 - SO 101 Místní obslužná komunikace
 - SO 121 Přístupová komunikace k Aquaparku
 - SO 134 Chodníky podél navrhovaných komunikací
 - SO 141 Sjezd na pozemek č. 3715/68
- Objekty řady 300
 - SO 301 Odvodnění
 - SO 341 Přeložka stávajícího vodovodu SmVak
- Objekty řady 400
 - SO 431 VO místní komunikace
 - SO 461 Přeložka stávajícího sdělovacího vedení CETIN a.s.
- Objekty řady 500
 - SO 521 Přeložka stávajícího STL plynovodu

OBJEDNATEL

Město Kravaře
NÁMĚSTÍ 43, 747 21 KRAVAŘE



ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 064
--------------	----------

C

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Brn

Projekt komunikace a IS (u Aquaparku)

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



DATUM	04/2024
FORMÁT	10x A4
MĚŘÍTKO	1:250
ÚČEL	DUSP
ČÍS. ZAKÁZKY	5/23 064
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	C.3

2/1₁
KVRE529
xKVRE57/1.1.1/39-40
1xVVD 10;
1xzár.sv.6p.;
Kostelní:328 :26 ;
Kravaře
Kouty

43 PFLE
3xN Ø.4

Nová S1
1xXAGA 500 43/8-150
1xmodul 10p
1xminimarker 1255

Nová S2
1xXAGA 500 43/8-150
2xmodul 10p
1xminimarker 1255

2x MK + 1x HDPE40mm MOK
zatáhnout do společné 1xPE110mm x 22m chráničky
Připolozit 1x PE110mm x 22m chráničku rezervní

26 PFLE
3xN Ø.4

26 PFLE
10xN Ø.4

25 HDPE
40 Ø/BB

Nová S3
1xXAGA 500 43/8-150
1xmodul 10p
1xminimarker 1255

Nová S4
1xXAGA 500 43/8-150
2xmodul 10p
1xminimarker 1255

2/1_{ch}
KVRE516
xKVRE57/1.1.1/37-38
1xVVD 10;
1xzár.sv.6p.;
Kostelní:360 :28 ;
Kravaře
Kouty

Nová TS1
1xPLASSON40mm
1xminimarker 1255

Nová TS1
1xPLASSON40mm
1xminimarker 1255

81 PFLE
3xN Ø.4

47 PFLE
3xN Ø.4

Investor:		Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. Příčná 2828/10 746 01 Opava	
Místo :		obec Kravaře ve Slezsku, kraj Moravskoslezský	
Název akce :		VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquoparku	Datum : 06/2024
Příloha :		Kabelové schéma přeložky	Stupeň : CTN
			SAP :
			VÝKRES Č.: S2

ÚPRAVA KŘIŽOVATKOVÉ PLOCHY



Specifikace nákladů_VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku

PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.06
Položková databáze: 2024.06

Název stavby: VPIC Kravaře, Kostelní - k Aquaparku
Číslo SPP prvku: CTN
Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
KPO: Moravskoslezsko
HOST:
VUJ:

Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	15 330,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	74 721,56 Kč
MONTÁŽ	40 924,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 227,75 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 365,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 264,23 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	20 590,28 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	21 150,00 Kč

Celkové náklady: 206 744,99 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	151 401,27 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	55 343,72 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	15 330,55 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958839 S		Odvoz a ruční nakládka výkopku do kont.	18.00 m	2 876,04 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	44.00 m	1 249,16 Kč
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	6 983,18 Kč
958755 S		Rýha v chodníku 50/130	22.00 m	36 771,68 Kč
958789 S		Výměna materiálu pro zához rýhy-vozovka	18.00 m	26 170,38 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	22.00 m	351,56 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	319,56 Kč
MONTÁŽ				
955010 S		Demontáž úložné trubky	20.00 m	282,80 Kč
955029 S		Demontáž úložných kabelů do15 XN	40.00 m	988,40 Kč
955824 S		Instal.metal. kab. do stávajících trubek	52.00 m	3 432,00 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	25.00 m	120,00 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	855,40 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	445,77 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	296,46 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	462,12 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	855,40 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	26.00 ks	1 073,80 Kč

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 380,00 Kč
	Koordinace přeložky s generální stavbou komunikace a IS		
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	6 267,92 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	125,62 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	25.00 m	537,75 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	4 920,00 Kč
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí		
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 942,24 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 674,72 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 227,75 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 672,66 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	100.00 JV	100,00 Kč
	Předpoklad finanční náhrady za VBŘ - Město Kravaře ve Slezsku		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 066,36 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 015,15 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	511,27 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 264,23 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	15 000,00 Kč
955366	Projekt dopravně inženýrského opatření	1.00 ks	6 150,00 Kč

Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	6.00 ks	273,36 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	22.00 m	92,18 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	22.00 m	105,38 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	50.00 m	114,00 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	26.00 m	1 047,28 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	26.00 m	537,16 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	24.00 ks	44,16 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové	5688.00 ks	5 688,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	6.00 ks	1 784,52 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	161,88 Kč
407797 S	Páska PVC 25mmx10m antikorozi NITTO	2.00 ks	298,26 Kč
410636 S	Souprava čistící metalic. kabelů - velká	1.00 ks	500,21 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	4.00 ks	1 902,68 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	12.00 ks	535,32 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	264,96 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	25.00 m	747,00 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	7.00 ks	6 170,01 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	4.00 m	221,20 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	102,72 Kč

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063

zastoupená na základě pověření [REDACTED] specialistou pro výstavbu sítě –
překládky SEK
(„**CETIN**“)

a

[•]

(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ („Dohoda“)

Čl. I PŘEDMĚT DOHODY

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

Čl. II PŘEVOD PRÁV

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,
 - b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně

oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.
7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).
8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

za **CETIN a.s.**

specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK

za [•]

Jméno: [•]

Funkce: [•]
