

Smlouva o dílo

***uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů***

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Velké Meziříčí**, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
IČ: 00295671,
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo
DiS. Lenkou Vítkovou

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.** se sídlem Rubeška 215/1, 119 00 Praha 9, IČ: 26177005,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6556,
zastoupený Ing. Vítem Weselým na základě plné moci, která je přílohou č. 1 a
nedílnou součástí této smlouvy

II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko a
odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Oprava komunikací 2024“

tj.: provedení těchto oprav komunikací ve Velkém Meziříčí:

Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí

Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí

Oprava komunikace podél řeky Balinky 1

Oprava komunikace pod Jordánkem

Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková

Oprava komunikace pod Světláčkem

Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD

Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice

Oprava komunikace směr Loupežník

Oprava komunikace podél řeky Balinky 2

Místa plnění jsou vymezena v situacích, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.

Bližší specifikaci díla obsahuje cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2024, která je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla zabezpečit místa provádění díla a zajistit dopravně inženýrská opatření.

(2) Zhotovitel se seznámil s místem plnění i podklady pro provedení díla a výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými znalostmi, aby mohl dílo provést na základě stávajících podkladů převzatých od objednatele.

(3) Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, předání všech dokladů, vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu provádění díla.

(4) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.

(5) Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i za jednání svých poddodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené.

(6) Zhotovitel potvrzuje, že se důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(7) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III. Cena díla

(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu, která je stanovena takto:

Cena bez DPH - oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí	404 697,47 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí	115 975,26 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace podél řeky Balinky 1	215 154,96 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace pod Jordánkem	909 441,16 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková	386 702,28 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace pod Světláčkem	388 986,00 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD	682 218,84 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice	274 960,00 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace směr Loupežník	73 711,50 Kč
Cena bez DPH - oprava komunikace podél řeky Balinky 2	136 694,50 Kč
Cena celkem bez DPH	3 588 541,96 Kč
DPH	753 593,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 342 135,77 Kč

(2) Podkladem pro stanovení ceny je cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 7. 2024, která je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.

IV. Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

(2) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení dané části díla vždy až po řádném provedení a předání části díla bez vad a nedodělků.

(3) Úhrady za plnění z této smlouvy budou realizovány bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

(4) Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm) nebo na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny

v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

(5) Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude na dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

(6) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

(7) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči pohledávce zhotovitele.

(8) Objednatel zaplatí zhotoviteli do 30 dnů od doručení faktury.

V. Termín plnění

(1) Nejpozději do 31. 8. 2024 je zhotovitel povinen provést a předat objednateli tyto části díla:

- Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí
- Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí
- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1
- Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková
- Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD
- Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice
- Oprava komunikace směr Loupežník
- Oprava komunikace podél řeky Balinky 2

(2) Nejpozději do 30. 9. 2024 je zhotovitel povinen provést a předat objednateli tyto části díla:

- Oprava komunikace pod Jordánkem
- Oprava komunikace pod Světláčkem.

(3) Zhotovitel je povinen vždy informovat objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem o zahájení provádění díla či jeho částí, a to na e-mail zástupců objednatele ve věcech technických.

VI. Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do tří dnů ode dne dokončení díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(4) Pokud zhotovitel neodstraní případné vady nebo nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(5) Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé nesplnění povinnosti.

(6) Všechny tyto smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po jejich vyúčtování.

(7) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

VII. Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy budou odstraněny poslední vada či nedodělek uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.

(2) Zápisy do stavebního deníku provádí a podepisuje stavbyvedoucí, u něhož bude tento stavební deník uložen, nebo jím určený zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Kromě stavbyvedoucího nebo jím určeného zástupce může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce.

(3) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(4) Nesouhlasí-li objednatel se zápisem, který učinil stavbyvedoucí nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(5) Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.

(6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu či doplnění smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII. Provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a platným technickým normám. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit.

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby.

(4) Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. V zápisu bude uveden termín, do kterého se má objednatel ke kontrole dostavit.

(5) Pokud se objednatel ke kontrole dle předchozího odstavce nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

(6) Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

(7) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné pracovní podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení

veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

(8) Zhotovitel musí nakládat se všemi odpady, které při provádění díla vzniknou, dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.

IX. Předání díla

(1) Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- stavební deník,
- atesty dodávaných materiálů.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(3) O průběhu převjímacího řízení sepíše smluvní strany protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků, pokud jej dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto protokolu uvedeném, o odstranění vad a nedodělků sepíše smluvní strany protokol o odstranění všech vad a nedodělků. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Za důvody, které objednatele opravňují odmítnout převzetí díla, jsou vady či nedodělky, které brání užívání díla.

(4) Dílo je považováno za dokončené jeho převzetím objednatelem a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání nedodělky tak až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Dokončením díla přechází nebezpečí škody na věci na objednatele.

(5) Objednatel převezme i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí.

(6) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

X. Záruka za jakost a záruční podmínky

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a právními předpisy a technickými normami stanovené.

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně bezvadné provedení díla při dodržení veškerých směrnic, norem a obecně závazných právních předpisů, kvalitu dodaných materiálů a konstrukcí (materiálová záruka), jakož i bezvadné, věcně správné a včasné splnění dodávek a výkonů, které vyplývají z jeho převzatých závazků.

(3) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedených prací u těchto částí díla:

- Oprava komunikace parc. č. 4770/16 k. ú. Velké Meziříčí
- Oprava komunikace parc. č. 4807/4 k. ú. Velké Meziříčí
- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 (v části živičný nátěr)
- Oprava komunikace Karlov – přilehlá komunikace u RD

- Oprava komunikace směr Loupežník – zpevnění krajnice
- Oprava komunikace směr Loupežník
- Oprava komunikace podél řeky Balinky 2

po dobu 24 měsíců.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedených prací u těchto částí díla:

- Oprava komunikace podél řeky Balinky 1 (v části balená)
- Oprava komunikace ul. Mírová, Čermáková
- Oprava komunikace pod Jordánkem
- Oprava komunikace pod Světláčkem

po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná vždy běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dané části díla bez vad a nedodělků, má-li dílo v době předání vady a nedodělky, začíná záruční doba běžet až podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

(4) Zhotovitel je povinen v průběhu stanovené záruční doby bezodkladně odstranit reklamované vady bez jakýchkoliv dodatečných nákladů pro objednatele (tj. bezplatně). Termíny na odstranění vad zjištěných a písemně oznámených v záruční době činí dvacet dnů ode dne jejich uplatnění, pokud nebude smluvními stranami pro daný případ písemně sjednáno jinak. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

(5) V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění (za předpokladu vhodných klimatických podmínek). Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli do 14 dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

(6) Nenastoupí-li zhotovitel do 30ti dnů po obdržení písemné reklamace objednatele, či v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, na odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla, a to na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury.

(7) O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol.

(8) Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem doručení písemné reklamace zhotoviteli a končící dnem podpisu protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek, je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.

XI. Součinnost smluvních stran

Objednatel poskytne tuto součinnost:

- předá zhotoviteli staveniště, pokud bude stavba prováděna za provozu, provede taková organizační opatření, aby nedošlo k ohrožení majetku a zdraví pracovníků obou účastníků smlouvy,
- určí pracovníka pro styk se zhotovitelem oprávněného zastupovat jeho zájmy a řešit případné změny a dodatky.

XII. Změna smlouvy

(1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

(2) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům a nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen vést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navržených cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Po jeho věcném a cenovém odsouhlasení uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, na základě kterého vznikne zhotoviteli právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

(3) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.

XIII. Ostatní podmínky smlouvy

Výkonem technického dozoru objednatele byli pověřeni Jaroslav Hladík, Bc. Antonín Šilhavý nebo DiS. Lenka Vítková, kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v rozsahu:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

XIV. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(3) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(4) Tato smlouva je podepsána elektronicky.

(5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě

v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

(6) O uzavření této smlouvy rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

(7) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí

V Jihlavě

.....
Město Velké Meziříčí
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
objednatel

.....
COLAS CZ a.s.
Ing. Vít Weselý
zhotovitel



2024/019/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Vítu Weselému



(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Vysočina. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

21




2024/019/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Vysočina, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne15.12. 2023



Ing. Vít Veselý

W

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost


Dokument 161589393-464252-231215082811.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161589393-464252-231215082811**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





0 50 m 100 m

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



0 25 m 50 m

1 : 944

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK





0 50 m 100 m

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



Komunikace ul. Mírová, Čermáková

11. 7. 2024



0 50 m 100 m

1 : 1 887

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



0 25 m 50 m

1 : 1 564

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



Karlov - přilehlá komunikace u RD

11. 7. 2024



0 25 m 50 m

1 : 1 500

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



0 100 m 200 m

1 : 4 076


Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



0 100 m 200 m

1 : 3 774

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

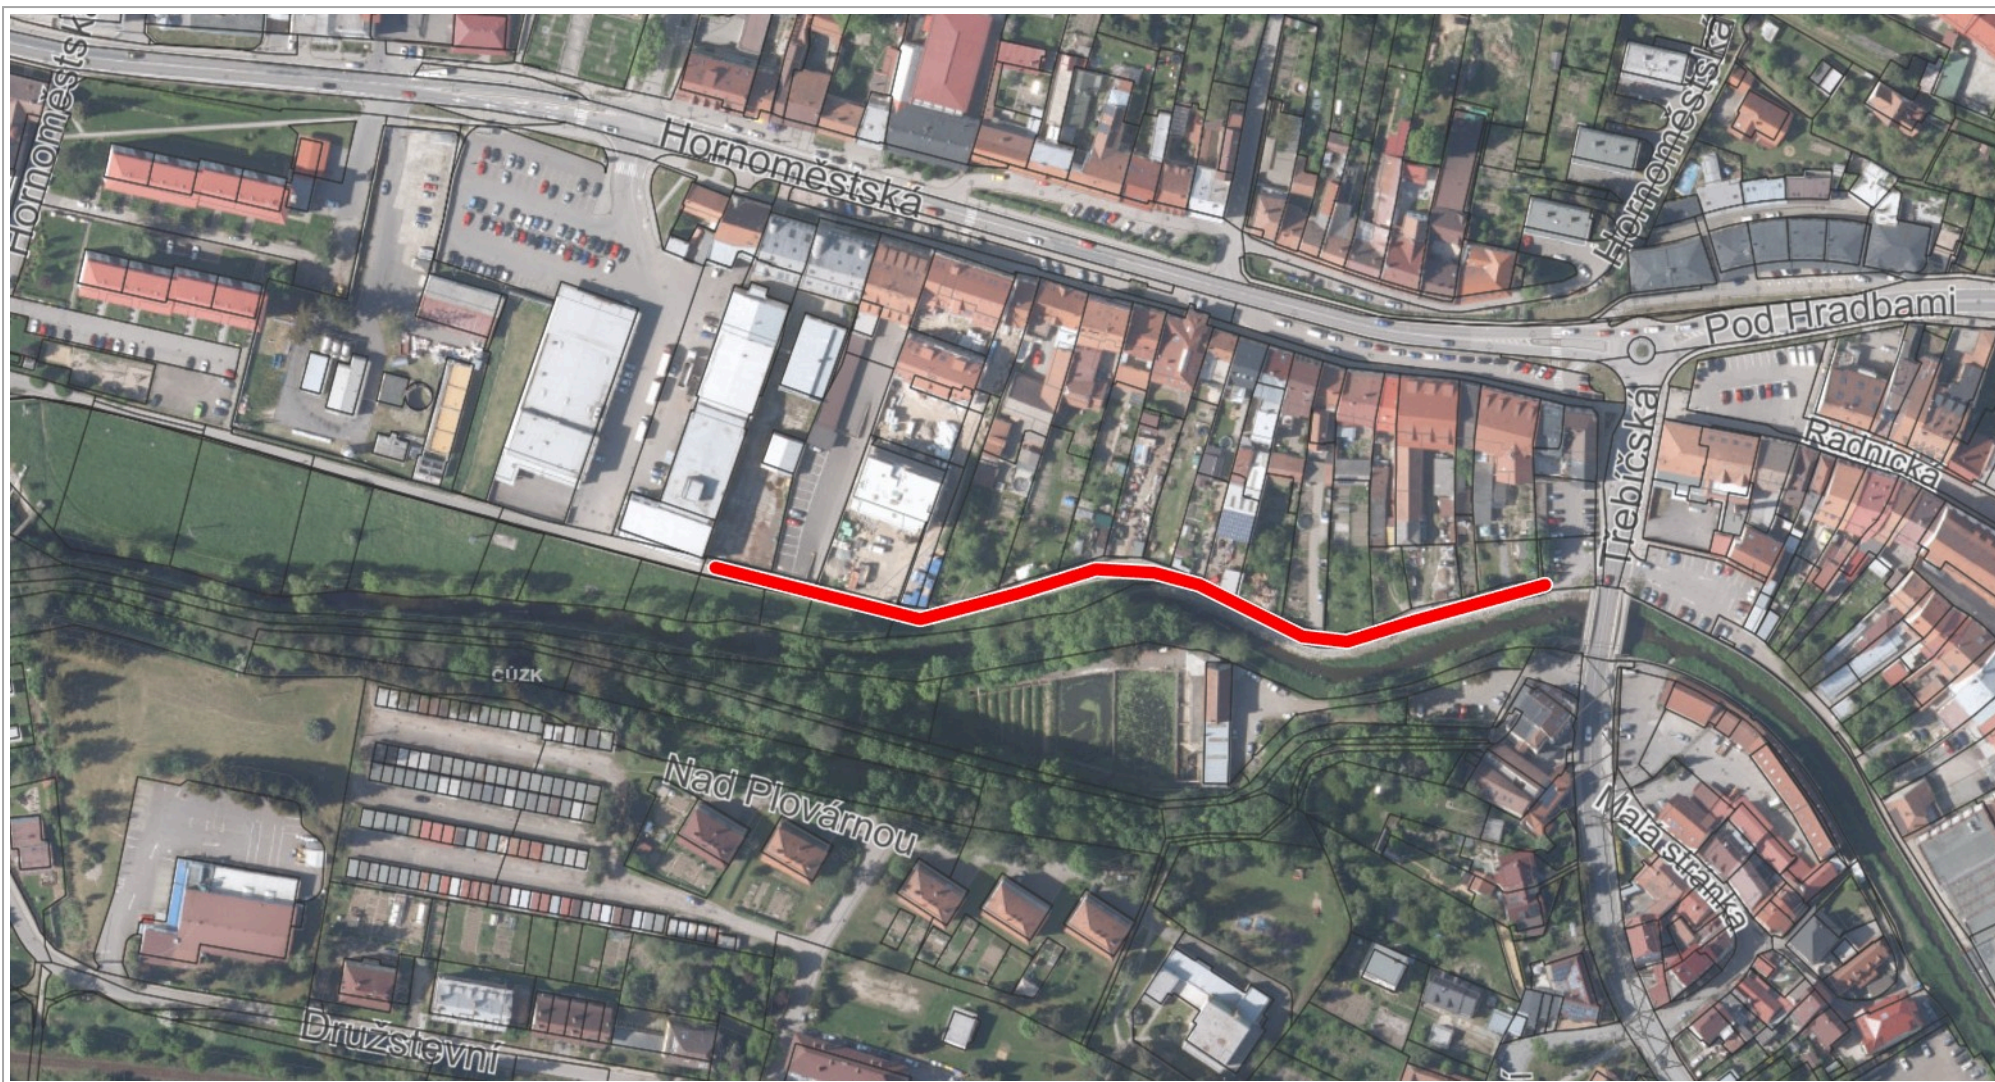

0 50 m 100 m

1 : 2 439

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Stavba: 241121729 - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

Objednatel: Město Velké Meziříčí

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	3 588 541,96
DPH:	753 593,81
Celkem Odbyt s DPH:	4 342 135,77

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	3 588 541,96

Vypracoval zadání:**Datum zadání:** středa 26. červen 2024**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** úterý 23. červenec 2024

I: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS

Rekapitulace

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I	3 588 541,96	753 593,81	4 342 135,77
SO02.1 - Komunikace parc. č. 4770/16 -var. NA	404 697,47	84 986,47	489 683,93
1 - Zemní práce	40 486,00	8 502,06	48 988,06
5 - Komunikace - var PMH + 2xNA	277 525,00	58 280,25	335 805,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot	86 686,47	18 204,16	104 890,62
SO04 - Komunikace parc. č. 4807/4	115 975,26	24 354,80	140 330,06
5 - Komunikace	115 975,26	24 354,80	140 330,06
SO05 - Komunikace podél Balinky 1	215 154,96	45 182,54	260 337,50
5.1 - Parkoviště - hluboká nerovnost	89 399,08	18 773,81	108 172,89
5.2 - Komunikace	125 755,88	26 408,73	152 164,61
SO06 - Komunikace pod Jordánkem	909 441,16	190 982,64	1 100 423,80
1 - Zemní práce	114 328,00	24 008,88	138 336,88
5 - Komunikace	749 586,00	157 413,06	906 999,06
8 - Trubní vedení	20 375,00	4 278,75	24 653,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot	25 152,16	5 281,95	30 434,11
SO07 - Komunikace Mírová, Čermáková	386 702,28	81 207,48	467 909,76
1 - Zemní práce	63 288,00	13 290,48	76 578,48
5 - Komunikace	284 356,50	59 714,87	344 071,37
8 - Trubní vedení	5 687,00	1 194,27	6 881,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot	33 370,78	7 007,86	40 378,64
SO08 - Komunikace pod Světláčkem	388 986,00	81 687,06	470 673,06
1 - Zemní práce	44 096,00	9 260,16	53 356,16
5 - Komunikace	308 880,00	64 864,80	373 744,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot	36 010,00	7 562,10	43 572,10
SO12 - Karlov - přilehlá komunikace u RD	682 218,84	143 265,96	825 484,80
1 - Zemní práce	77 252,00	16 222,92	93 474,92

5 - Komunikace	529 550,00	111 205,50	640 755,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot	75 416,84	15 837,54	91 254,38
SO14.1 - Komunikace směr Loupežník - zpev. krajnice	274 960,00	57 741,60	332 701,60
1 - Zemní práce	62 160,00	13 053,60	75 213,60
5 - Komunikace	212 800,00	44 688,00	257 488,00
SO14.2 - Komunikace směr Loupežník	73 711,50	15 479,42	89 190,92
5 - Komunikace	73 711,50	15 479,42	89 190,92
SO15 - Komunikace podél Balinky 2	136 694,50	28 705,85	165 400,35
5 - Komunikace	136 694,50	28 705,85	165 400,35
Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I			

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I									
241121729. - Město Velké Meziříčí - Opravy komunikací 2024 - CÚ RTS 2024/I						3 588 541,96	753 593,81	4 342 135,77	
SO02.1 - Komunikace parc. č. 4770/16 -var. NA						404 697,47	84 986,47	489 683,93	
1 - Zemní práce						40 486,00	8 502,06	48 988,06	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	653	21,00	62,00	40 486,00	8 502,06	48 988,06
5 - Komunikace - var PMH + 2xNA						277 525,00	58 280,25	335 805,25	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	566201111R00	Úprava stávajícího krytu se zhutněním (bez dodávky kameniva)	m2	653	21,00	39,00	25 467,00	5 348,07	30 815,07
003	573411114R.	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	653	21,00	58,00	37 874,00	7 953,54	45 827,54
004	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	653	21,00	72,00	47 016,00	9 873,36	56 889,36
005	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm	m2	653	21,00	256,00	167 168,00	35 105,28	202 273,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot						86 686,47	18 204,16	104 890,62	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 80cm	m	67	21,00	391,00	26 197,00	5 501,37	31 698,37
007	592270030	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	68,34	21,00	281,00	19 203,54	4 032,74	23 236,28
008	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	146,925	21,00	79,00	11 607,08	2 437,49	14 044,56
009	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	440,775	21,00	6,00	2 644,65	555,38	3 200,03
010	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	146,925	21,00	163,00	23 948,78	5 029,24	28 978,02
011	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	146,925	21,00	21,00	3 085,43	647,94	3 733,36
SO04 - Komunikace parc. č. 4807/4						115 975,26	24 354,80	140 330,06	
5 - Komunikace						115 975,26	24 354,80	140 330,06	
						Odbýt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	566201111R00	Úprava stávajícího krytu se zhutněním (bez dodávky kameniva)	m2	320	21,00	39,00	12 480,00	2 620,80	15 100,80
002	573411114R.	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	320	21,00	58,00	18 560,00	3 897,60	22 457,60
003	573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	320	21,00	72,00	23 040,00	4 838,40	27 878,40
004	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm	m2	320	21,00	144,00	46 080,00	9 676,80	55 756,80

005	917862111R00	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	23	21,00	452,00	10 396,00	2 183,16	12 579,16
006	59217010	Obručník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	KUS	23,46	21,00	231,00	5 419,26	1 138,04	6 557,30
SO05 - Komunikace podél Balinky 1							215 154,96	45 182,54	260 337,50
5.1 - Parkoviště - hluboká nerovnost							89 399,08	18 773,81	108 172,89
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	42	21,00	223,00	9 366,00	1 966,86	11 332,86
002	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	42	21,00	290,00	12 180,00	2 557,80	14 737,80
003	181101104R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněním	m2	42	21,00	35,00	1 470,00	308,70	1 778,70
004	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	42	21,00	664,00	27 888,00	5 856,48	33 744,48
005	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	42	21,00	16,00	672,00	141,12	813,12
006	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	42	21,00	722,00	30 324,00	6 368,04	36 692,04
007	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	18,48	21,00	79,00	1 459,92	306,58	1 766,50
008	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	55,44	21,00	7,00	388,08	81,50	469,58
009	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	18,48	21,00	21,00	388,08	81,50	469,58
010	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19	21,00	127,00	2 413,00	506,73	2 919,73
011	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	19	21,00	75,00	1 425,00	299,25	1 724,25
012	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	19	21,00	75,00	1 425,00	299,25	1 724,25
5.2 - Komunikace							125 755,88	26 408,73	152 164,61
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živич. pojivem	m2	315	21,00	62,00	19 530,00	4 101,30	23 631,30
002	573411114R.	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	315	21,00	58,00	18 270,00	3 836,70	22 106,70
003	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	315	21,00	72,00	22 680,00	4 762,80	27 442,80
004	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm	m2	315	21,00	144,00	45 360,00	9 525,60	54 885,60
005	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	70,875	21,00	79,00	5 599,13	1 175,82	6 774,94
006	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	212,625	21,00	6,00	1 275,75	267,91	1 543,66
007	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	70,875	21,00	163,00	11 552,63	2 426,05	13 978,68
008	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	70,875	21,00	21,00	1 488,38	312,56	1 800,93
SO06 - Komunikace pod Jordánkem							909 441,16	190 982,64	1 100 423,80
1 - Zemní práce							114 328,00	24 008,88	138 336,88
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113151319R00	Fréz.živич.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm	m2	922	21,00	124,00	114 328,00	24 008,88	138 336,88
5 - Komunikace							749 586,00	157 413,06	906 999,06
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

002 565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	922	21,00	370,00	341 140,00	71 639,40	412 779,40	
003 573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	922	21,00	16,00	14 752,00	3 097,92	17 849,92	
004 577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	922	21,00	427,00	393 694,00	82 675,74	476 369,74	
8 - Trubní vedení						20 375,00	4 278,75	24 653,75	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005 899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	6	21,00	3 121,00	18 726,00	3 932,46	22 658,46	
006 899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	1	21,00	1 649,00	1 649,00	346,29	1 995,29	
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot						25 152,16	5 281,95	30 434,11	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	202,84	21,00	79,00	16 024,36	3 365,12	19 389,48	
008 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	811,36	21,00	6,00	4 868,16	1 022,31	5 890,47	
009 979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	202,84	21,00	21,00	4 259,64	894,52	5 154,16	
SO07 - Komunikace Mírová, Čermáková						386 702,28	81 207,48	467 909,76	
1 - Zemní práce						63 288,00	13 290,48	76 578,48	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	439,5	21,00	144,00	63 288,00	13 290,48	76 578,48	
5 - Komunikace						284 356,50	59 714,87	344 071,37	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002 572753111R00	Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem	t	11,427	21,00	3 000,00	34 281,00	7 199,01	41 480,01	
003 573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	439,5	21,00	16,00	7 032,00	1 476,72	8 508,72	
004 577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	439,5	21,00	553,00	243 043,50	51 039,14	294 082,64	
8 - Trubní vedení						5 687,00	1 194,27	6 881,27	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005 899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	1	21,00	2 566,00	2 566,00	538,86	3 104,86	
006 899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1	21,00	3 121,00	3 121,00	655,41	3 776,41	
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot						33 370,78	7 007,86	40 378,64	
						Odbyt			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007 919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	58	21,00	75,00	4 350,00	913,50	5 263,50	
008 919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	58	21,00	75,00	4 350,00	913,50	5 263,50	
009 919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	58	21,00	199,00	11 542,00	2 423,82	13 965,82	

010	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	58	21,00	123,00	7 134,00	1 498,14	8 632,14
011	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	48,345	21,00	79,00	3 819,26	802,04	4 621,30
012	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	193,38	21,00	6,00	1 160,28	243,66	1 403,94
013	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	48,345	21,00	21,00	1 015,25	213,20	1 228,45
SO08 - Komunikace pod Světláčkem							388 986,00	81 687,06	470 673,06
1 - Zemní práce							44 096,00	9 260,16	53 356,16
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	78	21,00	294,00	22 932,00	4 815,72	27 747,72
002	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	78	21,00	144,00	11 232,00	2 358,72	13 590,72
003	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	78	21,00	54,00	4 212,00	884,52	5 096,52
004	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	260	21,00	22,00	5 720,00	1 201,20	6 921,20
5 - Komunikace							308 880,00	64 864,80	373 744,80
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	260	21,00	197,00	51 220,00	10 756,20	61 976,20
006	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	260	21,00	459,00	119 340,00	25 061,40	144 401,40
007	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	260	21,00	16,00	4 160,00	873,60	5 033,60
008	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	260	21,00	516,00	134 160,00	28 173,60	162 333,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot							36 010,00	7 562,10	43 572,10
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
009	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnicí závluku v živичném krytu	m	130	21,00	75,00	9 750,00	2 047,50	11 797,50
010	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	130	21,00	75,00	9 750,00	2 047,50	11 797,50
011	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	130	21,00	127,00	16 510,00	3 467,10	19 977,10
SO12 - Karlov - přilehlá komunikace u RD							682 218,84	143 265,96	825 484,80
1 - Zemní práce							77 252,00	16 222,92	93 474,92
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živич. pojivem	m2	1246	21,00	62,00	77 252,00	16 222,92	93 474,92
5 - Komunikace							529 550,00	111 205,50	640 755,50
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
002	566201111R00	Úprava stávajícího krytu se zhutněním (bez dodávky kameniva)	m2	1246	21,00	39,00	48 594,00	10 204,74	58 798,74
003	573411114R.	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1246	21,00	58,00	72 268,00	15 176,28	87 444,28
004	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	1246	21,00	72,00	89 712,00	18 839,52	108 551,52
005	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm	m2	1246	21,00	256,00	318 976,00	66 984,96	385 960,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot							75 416,84	15 837,54	91 254,38
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	280,36	21,00	79,00	22 148,44	4 651,17	26 799,61
007	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	280,36	21,00	6,00	1 682,16	353,25	2 035,41
008	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	280,36	21,00	163,00	45 698,68	9 596,72	55 295,40
009	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	280,36	21,00	21,00	5 887,56	1 236,39	7 123,95
SO14.1 - Komunikace směr Loupežník - zpev. krajnice							274 960,00	57 741,60	332 701,60
1 - Zemní práce							62 160,00	13 053,60	75 213,60
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	112	21,00	294,00	32 928,00	6 914,88	39 842,88
002	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	M3	112	21,00	97,00	10 864,00	2 281,44	13 145,44
003	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	112	21,00	54,00	6 048,00	1 270,08	7 318,08
004	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	560	21,00	22,00	12 320,00	2 587,20	14 907,20
5 - Komunikace							212 800,00	44 688,00	257 488,00
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
005	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	560	21,00	106,00	59 360,00	12 465,60	71 825,60
006	573411114R.	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	560	21,00	58,00	32 480,00	6 820,80	39 300,80
007	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	560	21,00	72,00	40 320,00	8 467,20	48 787,20
008	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm	m2	560	21,00	144,00	80 640,00	16 934,40	97 574,40
SO14.2 - Komunikace směr Loupežník							73 711,50	15 479,42	89 190,92
5 - Komunikace							73 711,50	15 479,42	89 190,92
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	566201111R00	Úprava stávajícího krytu se zhutněním (bez dodávky kameniva)	m2	235,5	21,00	39,00	9 184,50	1 928,75	11 113,25
002	573411114R.	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	235,5	21,00	58,00	13 659,00	2 868,39	16 527,39
003	573411115R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	235,5	21,00	72,00	16 956,00	3 560,76	20 516,76
004	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10cm	m2	235,5	21,00	144,00	33 912,00	7 121,52	41 033,52
SO15 - Komunikace podél Balinky 2							136 694,50	28 705,85	165 400,35
5 - Komunikace							136 694,50	28 705,85	165 400,35
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001	571905111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	732	21,00	19,00	13 908,00	2 920,68	16 828,68
002	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	5,5	21,00	5 023,00	27 626,50	5 801,57	33 428,07
003	573411114R.	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	732	21,00	58,00	42 456,00	8 915,76	51 371,76

004 573411115R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	732	21,00	72,00	52 704,00	11 067,84	63 771,84
------------------	---	----	-----	-------	-------	-----------	-----------	-----------
