

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Objednatel

**Název:** Město Žďar nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďar ad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Zastoupený:** [REDAKCE] vedoucí odboru komunálních služeb - na základě pověření de směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválené RM Žďar nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE] referent odboru komunálních služeb  
**Kontakt:** [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitel

**Název:** VHS Bohemia, a.s  
**Sídlo:** Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná  
**IČO:** 479 10 305  
**DIČ:** CZ47910305  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Zápis v obchodním rejstříku:** KSBrno, oddíl B 4937  
**Zastoupený:** Libor Havlík, člen představenstva  
**Kontaktní osoba:** [REDAKCE], vedoucí výroby  
**Telefonní spojení:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Oprava chodníku Brněnská** (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

## I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje opravu chodníku s položením nového dlážděného povrchu, odstranění nerovností a vad původních povrchů včetně instalace prvků pro imobilní osoby, zajištění zemních prací pro položení nového vedení veřejného osvětlení, zajištění koordinace prací s dalšími dodavateli staveních prací působících na místě, realizace překopů komunikací pro položení koordinovaných inž. sítí a další související stavební práce.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Předmětem Díla jsou práce definované v položkovém rozpočtu a nutné pro realizaci Díla „na klíč“, a to dle orientační situace, která je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Situace**“) a dále dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
5. Součástí Díla je zejména:
  - 5.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
  - 5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
  - 5.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
  - 5.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
  - 5.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálů nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
  - 5.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění požární ochrany;
  - 5.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
  - 5.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
  - 5.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
  - 5.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
  - 5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;

- 5.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
- 5.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro řádné uvedení do trvalého užívání, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s veškerými dokumenty uvedenými v odst. 4 této Smlouvy a dále v souladu právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se k předmětu plnění vztahují, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
8. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

### **III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS (technický dozor stavebníka) do 3 pracovních dnů.
10. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla.
11. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveništi jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen pracovat v souladu s platným standardem péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI. Dílo je možné realizovat pouze tak, aby nedošlo k poškození dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin, nebo bezprostředně či následně způsobilo jejich odumření.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník. Smluvní strany výslovně sjednávají, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
14. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zázpisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

15. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to před zakrytím prací. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí.
16. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
18. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS prováděných dle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem nebo TDS, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
19. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
20. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
21. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

#### IV. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

22. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
23. Místem provádění Díla je ul. Brněnská, Žďár nad Sázavou.
24. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

**Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15.09.2024;**

**Termín pro zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;**

**Termín pro dokončení a předání Díla: nejpozději do 31.10.2024.**

25. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 24 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

26. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 26.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
  - 26.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodloužení na straně Objednatele,
  - 26.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
  - 26.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo
  - 26.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

## V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

27. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 dny předem.
28. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné správy.
29. Objednatel Dílo:
- 29.1. převezme, a to zapředpokladu, že je Dílo dokončené, a odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků (dále jen „**Drobné vady**“),
  - 29.2. nepřevzme pro existenci vad a nedodělků, přičemž pro případ nepřevzetí Díla, které vykazují vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
30. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol (dále jen „**Předávací protokol**“).
31. V případě převzetí Díla Objednatel bude Předávací protokol obsahovat:
- 31.1. identifikační údaje Smluvních stran,
  - 31.2. identifikaci Díla,
  - 31.3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá,
  - 31.4. zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb,
  - 31.5. soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
  - 31.6. soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran.
32. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude Předávací protokol kromě výše uvedeného obsahovat také:
- 32.1. důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran,
  - 32.2. lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

33. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne předání Díla, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíše Smluvní strany protokol. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
34. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## VI. STAVENIŠTĚ

35. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 24 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
36. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
37. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa směřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
38. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
39. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
40. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
41. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
42. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. **Objednatel zajistil pro původní asf. povrch chodníku**

**analýzu PAU asfaltových směsí a penetračního makadamu dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., přičemž původní asfaltový povrch chodníku je zařazen v kvalitativní třídě ZAS-T1.**

43. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
44. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
45. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## VII. CENA DÍLA

46. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí 1299 477,67,- **Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
- M.** Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná svýjmkami stanovenými ve Smlouvě. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla.
48. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen:
  - 48.1. provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny Díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ (dále jen „**Změnový list**“),
  - 48.2. Předložit Změnový list Objednateli ke schválení,
  - 48.3. v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je rovněž Objednateli ke schválení.
49. Objednatel je povinen vyjádřit se ke Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Písemný návrh dodatku ke Smlouvě vyhotoví Zhotovitel.
50. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
  - 50.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
  - 50.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny v podrobnosti odpovídající některé z cenových soustav používaných v ČR např. RTS, ÚRS, a to v aktuální cenové úrovni (kterou na požádání Zhotovitel předloží Objednateli nebo TDS) a upravené na úroveň cen obdobných položek uvedených v Položkovém rozpočtu;
  - 50.3. pokud se bude jednat o položky, které nelze odvodit z aktuálních ceníků cenových soustav používaných v ČR, použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.



Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

51. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
52. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíší důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
53. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
54. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

55. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.
56. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH.
57. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“), a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Zhotovitel předloží Soupis rovněž v elektronické verzi ve formátu .xls nebo jiném, na kterém se zástupci stran dohodnou.
58. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.



59. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.
60. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
61. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
62. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
63. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 29 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

#### **IX. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

64. Dílo je vadné, neodpovídá-li Smlouvě.
65. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 66 Smlouvy.
66. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání záruční doby 36 měsíců od data převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s Drobnými vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s Drobnými vadami do odstranění posledních Drobných vad zjištěných při předání a převzetí Díla.
67. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede Objednatel u Zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.
68. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu zahavárií (dále jen „Havárie“), je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka Zhotovitele "[doplň účástník]" a následně potvrzeno písemnou formou.
69. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
70. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
71. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

72. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady nebo započítáním odstraňování Havárie, je Objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
73. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odst. 66 Smlouvy, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

## X. SANKCE

74. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 24 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
75. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady nebo započítáním odstraňování Havárie, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 72 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
76. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat zpět vyklizené staveniště Objednateli ve lhůtě dle odst. 45, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
77. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 77.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
  - 77.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
  - 77.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
  - 77.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
78. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
79. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
80. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo Závěrečnou fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

## XI. UKONČENÍ SMLOUVY

81. Smlouva zaniká řádným a včasným splněním Díla, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením některé ze Smluvních stran.
82. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
83. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
  - 83.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
  - 83.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
  - 83.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 88 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
  - 83.4. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 24 Smlouvy;
  - 83.5. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 24 Smlouvy;
  - 83.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům;
  - 83.7. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatelům odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
84. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatelům se rozumí zejména:
  - 84.1. prodlení s úhradou Faktury nebo Závěrečné faktury o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu; nebo
85. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 86 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
86. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednatelům, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednatelům veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 28 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
87. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

## **XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

88. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
89. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
90. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
91. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
92. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
93. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
94. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

## **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

95. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
96. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
97. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
98. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
99. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění

zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

### Doložka


Smlouva byla uzavřena v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou radou města Žďáru nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

### Přílohy

1. příloha č. 1: orientační Situace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne: *podle el. podpisu*

V Brně dne: *podle el. podpisu*



Datum: 2024.08.15 08:36:04 +02'00'

Objednatel

Libor  
Havlík

Digitálně podepsal  
Libor Havlík  
Datum: 2024.08.15  
07:30:51 +02'00'

Zhotovitel




# Příloha č. 1 Smlouvy

## Orientační Situace

21. 6. 2024

uživatel anonymní

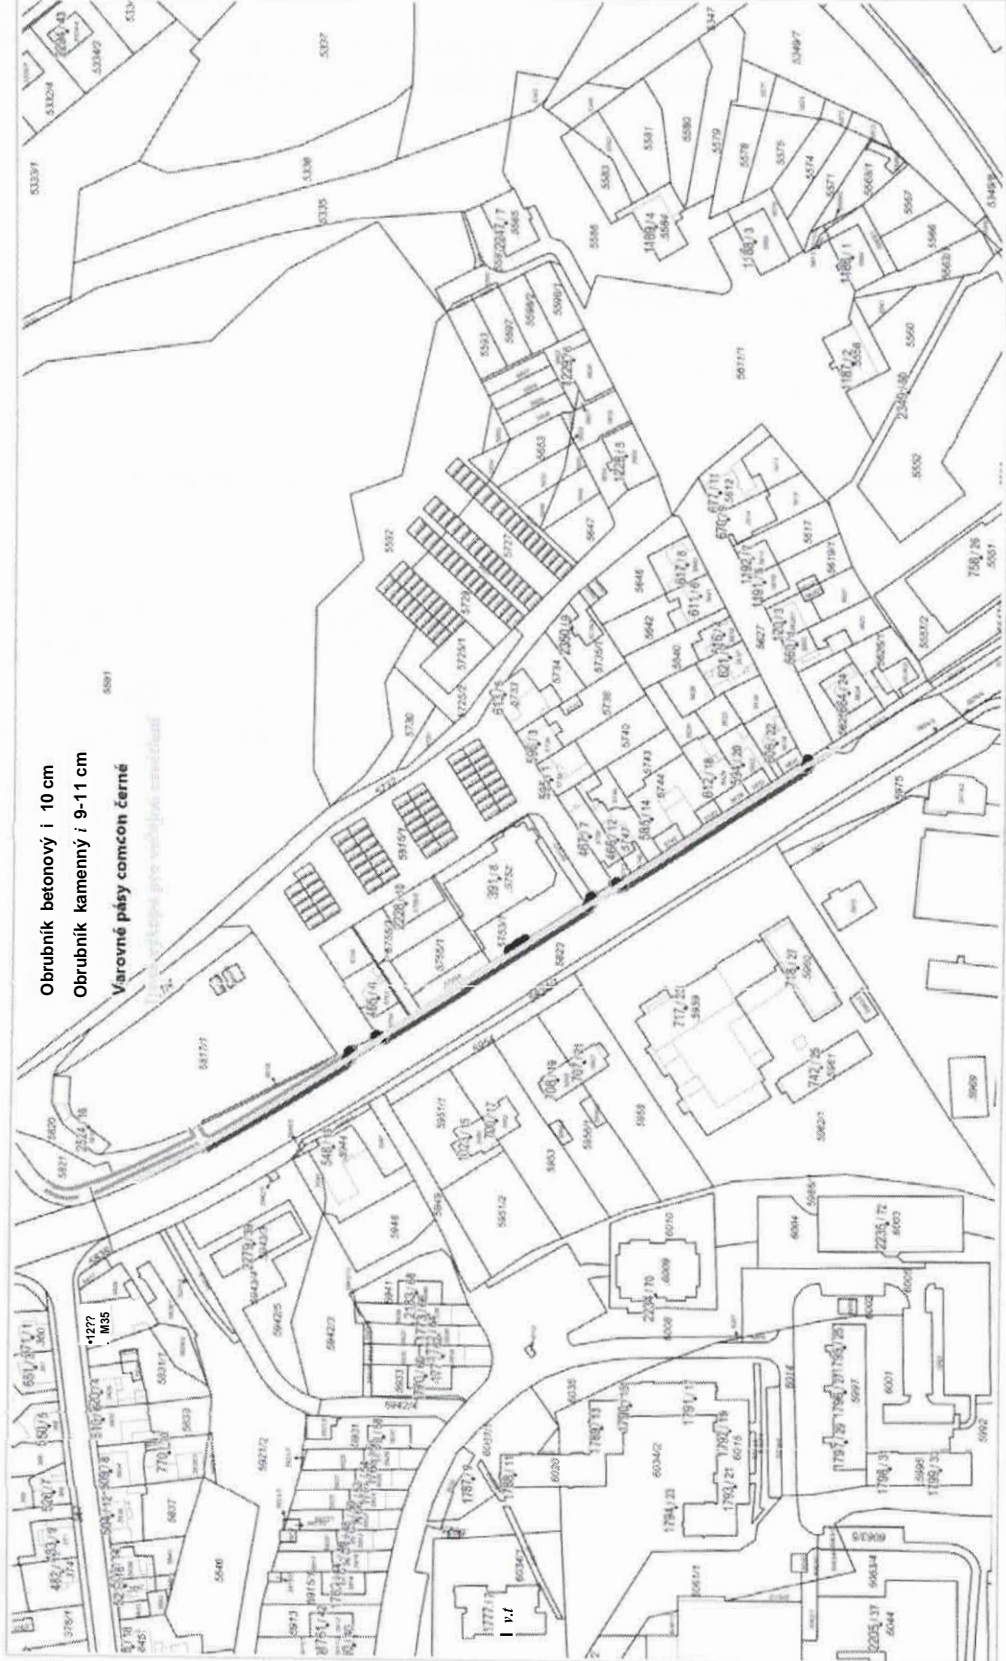

Obrubník betonový i 10 cm  
Obrubník kamenný i 9-11 cm  
Várovné pásy camcon černé

1 : 1 499

0 "Isn " Wcn

GntfX: © CAZK, Kaus © CAZK, RUBAN, © CAZK

**Příloha č. 2 Smlouvy**

**Položkový rozpočet**



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2024-2 Oprava chodníku Brněnská ZR

Objekt: 1 Oprava chodníku Brněnská ZR

Rozpočet: 01 Rozpočet

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**VHS Bohemia, a.s**

**Haškova 153/17**

**638 00**

**Brno - Lesná**

IČO: **47910305**

DIČ: **CZ47910305**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 140 637,17
PSV			0,00
<b>MON</b>			84 340,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			74 500,00
<b>Celkem</b>			<b>1 299 477,67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 299 477,67 CZK
Základní DPH	21 %		<b>272 890,31 CZK</b>

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

**1 572 367,98 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Popis stavby: 2024-2 - Oprava chodníku Brněnská ZR

Popis objektu: 1 - Oprava chodníku Brněnská ZR

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			113 535,94	8,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 341,00	0,6
5	Komunikace	HSV			627 084,44	48,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			319 323,60	24,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 933,52	2,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			84 340,50	6,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 418,67	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			74 500,00	5,7
Cena celkem					1 299 477,67	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024-2	Oprava chodníku Brněnská ZR
O:	1	Oprava chodníku Brněnská ZR
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cenas DPH	Cenik	Cen, soustava / platnost	
OH: 1							113 535,94	137 378,49			
1	113106231R00	Zemní práce Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	12,00000	66,30	795,60	21,00	962,68	822-1	RTS 24/ 1	
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm kolem obrubníku : 75 vjezdy: 15 chodníky : 775	m2	866,00000	54,20	46 937,20	21,00	56 794,01	822-1	RTS 24/ 1	
3	113113201 111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	150,00000	131,401	19 710,001	21,00	23 849,10	822-1	RTS 24/ 1	
4	113132021 111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	240,00000	107,30	25 752,00	21,00	31 159,92	822-1	RTS 24/ 1	
5	1174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách. 295*0,5*0,7-295*0,65*0,2	m3	64,90000	151,30	9 819,37	21,00	11 881,44	800-1	RTS 24/ 1	
6	199000002 R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	38,50000	143,60	5 528,60	21,00	6 689,61	800-1	RTS 24/ 1	
7	0,	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na skládku ve vzdálenosti dle možností dodavatele 295*0,5*0,7-64,9	m3	38,35000	130,20	4 993,17	21,00	6 041,74		Vlastní	
Díl: 2							8 341,00	10 092,61			
8	1215901101R00	Základy a zvláštní zakládání Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypekch relativní ulehlosti (d) do 0,8 z rostlé horniny IM - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypekch relativní ulehlosti (d) do 0,8 776+12 90	m2	878,00000	9,50	8 341,00	21,00	10 092,61	800-1	RTS 24/ 1	
Díl: 5							627 084,44	758 772,17			
9	564811111R00	Podklad ze štiřkocrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm částečná úprava po vybourání asfaltového povrchu : 776*0,1	m2	77,60000	69,80	5 416,48	21,00	6 553,94	822-1	RTS 24/ 1	
10	573231222R00	Postřik spojovací katonaktivní emulzi KAE , množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	90,00000	6,60	594,00	21,00	718,74	1822-1	RTS 24/ 1	
11	577141 112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	90,00000	474,00	42 660,00	21,00	51 618,60	822-1	RTS 24/ 1	
12	577141 122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 sjezdy : 15 okolo obrubníků : 75	m2	90,00000	497,90	44 811,00	21,00	54 221,31	822-1	RTS 24/ 1	
13	596215040R00	Klazení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením toze z kameniva arceno, s vypínemím spár, s dvojitým nutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	776,00000	290,00	225 040,00	21,00	272 298,40	822-1	RTS 24/ 1	
14	596811111R00	Klazení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm komunikaci pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0.25 m2, s provedením lože do tl, 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	12,00000	227,90	2 734,80	21,00	3 309,11	1822-1	RTS 24/ 1	
15	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm 776*1,1	m2	853,60000	282,00	240 715,20	21,00	291 265,39	SPCM	RTS 24/ 1	
16	592490022R	dlažba polymerbetonová s hmatovou úpravou pro osoby se zrakovým postižením; pro exteriér, na pojízdné plochy; 200 x 200 mm; tl. 60 mm, povrch reliéfní; černá 12*1,1	m2	13,20000	4 932,80	65 112,96	21,00	78 786,68	SPCM	RTS 24/ 1	
Díl: 91							319 323,60	386 381,56			
17	917461 111R00	Doplňující práce na komunikaci Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	240,00000	343,10	82 344,00	21,00	99 636,24	822-1	RTS 24/ 1	
18	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 0 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	150,00000	364,90	54 735,00	21,00	66 229,35	1822-1	RTS 24/ 1	
19	919735112R00	(Rezáni stávajících krytu nebo podkladu živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	240,00000	80,90	19 416,00	21,00	23 493,36	822-1	RTS 24/ 1	
20	58380211R	(krajník silničního malenálava skupina 1/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm 240*1,1	m	264,00000	565,90	149 397,60	21,00	180 771,10	SPCM	RTS 24/ 1	
21	59217421 R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 150*1,1	kus	165,00000	81,40	13 431,00	21,00	16 251,51	SPCM	RTS 24/ 1	
Díl: 99							32 933,52	39 849,56			
22	998223011R00	Staveništní přesun hmot (Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďeny jakékoliv délky objektu vodorovné do 200 m	.	118,93650	276,90	32 933,52	21,00	39 849,56	822-1	RTS 24/ 1	
Díl: M46							84 340,50	102 052,01			
23	460200253R00	Zemní práce při montážích Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 zelený pas : 27 překopy vjezdu : 29 v chodníku 239	m	295,00000	138,00	40 710,00	21,00	49 259,10		RTS 24/ 1	
24	460420022R13	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku, lože tloušťky 20 cm	m	295,00000	147,90	43 630,50	21,00	52 792,91		RTS 24/ 1	
Díl: D96							39 418,67	47 696,59			
25	1	Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz a likvidace vybouraných asfaltových vrstev, do vzdálenosti dle možnosti dodavatele, včetně všech poplatků	t	190,52000	143,60	27 358,67	21,00	33 103,99		Vlastní	
26	2	Odvoz a likvidace vybouraných betonových prvků, do vzdálenosti dle možnosti dodavatele, včetně všech poplatků 2,7+33+64,8	t	100,50000	120,00	12 060,00	21,00	14 592,60		Vlastní	
Díl: ON							74 500,00	90 145,00			
27	3	Ostatní náklady Koordnace prací s jiným dodavatelem VO (který provede pokládku nových chrámček, fólie, kabel...)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	
28	4	Koordnace s realizací rozvodu optické sítě SATT jiného dodavatele	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	
29	5	Kompletní zajištění DIO pro překopy I obrubníky podél státní silnice	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		Vlastní	
30	6	Vytýčení a ochrana stávajících sítí technické infrastruktury	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	
31	7	Zkouška hutnění na rýhách VO pod komunikací	soubor	5,00000	1 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní	

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2024-2	Oprava chodníku Brněnská ZR
O:	1	Oprava chodníku Brněnská ZR
R:	01	Rozpočet

№	p.e.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost
		3218	Kompletní zajištění informační reklamní tabule velikosti 1,8x3.5 m. dle grafického návrhu investora, po celou dobu stavby, vč. nosné konstrukce	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	21,00	8 470,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>1 299 477,67</b>										
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
