

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

č. smlouvy: SMLD-0887/00066001/2024

SMLOUVA

o vytvoření sloučené projektové dokumentace

(dále jen „Smlouva“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478

zastoupena:

Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupena

Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022;

(dále jen „Objednatel“)

a

M – Projekce s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415
Zapsán/a v OR: Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 37094
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové, č.ú: 274779891/0300

zastoupen/a:

Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany, zejména podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu s § 31 ve spojení s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, tuto smlouvu o vytvoření projektové dokumentace (dále jen „**Smlouva**“), na veřejnou zakázku malého rozsahu

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2. 1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k vytvoření a dodání sloučené projektové dokumentace pro zadání rekonstrukce mostu - stavby „**III/32827 Rožďalovice, most ev. 32827 - 4**“. Požadavky k jejímu provedení jsou detailně konkretizovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Služba**“).

2. 2. Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

2. 3. Projektová dokumentace bude vyhotovena podle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, dostupné na:

<http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf>.

2. 4. Objednatel požaduje v soupisu prací a expertním rozpočtu definovat nakládání s odpady následovně:

- a) Asfaltové směsi – vyfrézovaný materiál - část se znovu zapracuje v rámci stavby a zbytek bude předmětem povinného odkupu dle platné směrnice zadavatele v době odkupu. Položka Poplatek za skládku – nebude
- b) Komodity jako jsou dlažební kostky, kov, kámen - budou předmětem povinného odkupu dle platné směrnice zadavatele v době odkupu. Poplatek za skládku – nebude
- c) Ostatní komodity a nebezpečný odpad bude kalkulován standardním způsobem, přednostně bude uvažováno s uložením odpadu na skládku s oprávněním k opětovnému využití – s předpokládanou jednotkovou cenou za uložení 100,- Kč za tunu (bez DPH)

2. 5. Objednatel požaduje definovat zhotoviteli povinnost vedení elektronického stavebního deníku.

3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

3. 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Službu uvedenou v čl. 2 této Smlouvy podle podmínek, níže specifikovaných.

3. 2. Poskytovatel se zavazuje dodat projektovou dokumentaci v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby.

3. 3. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy o Objednateli dozvěděl, a které nejsou veřejně známé.

3. 4. Poskytovatel je povinen při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru. Poskytovatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní postup prací a jejich realizaci v souladu s relevantními právními předpisy.

3. 5. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně, včas, a v nejvyšší kvalitě.

3. 6. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytné podklady a součinnost pro poskytování Služby.

4. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

4. 1. Poskytovatel, jakožto původní autor, prohlašuje, že je výlučným autorem autorského díla dodávané projektové dokumentace, přičemž uděluje Objednateli v souladu s ustanovením autorského zákona oprávnění k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, a to jako licenci výhradní s právem podlicence, a za podmínek touto smlouvou výslovně stanovených.
4. 2. Poskytovatel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Poskytovatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla (projektové dokumentace) zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy projektové dokumentace (či jakékoli její části), včetně jejich rozmnožení, pro jakékoli účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoli řízení vedených ohledně výstavby projektu.
4. 3. Licence je poskytnuta ode dne předání projektové dokumentace Objednateli. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Poskytovatele.
4. 4. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení Poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové dokumentace.
4. 5. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Poskytovatel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.
4. 6. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla stavbou dle předané dokumentace.
4. 7. Podpisem předávacího protokolu, kterým byla dokumentace předána Objednateli, se Objednatel stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.
4. 8. Poskytovatel, jakožto původní autor, prohlašuje, že poskytuje Objednateli souhlas k bezplatnému užití veškerých částí odevzdané dokumentace a ke zhotovení dokumentace nové.
4. 9. Objednatel je oprávněn zhotovením nové dokumentace pověřit třetí osobu.
4. 10. Odměna za oprávnění k užití dokumentace a za získaná svolení je zahrnuta v odměně za vytvoření dokumentace, která již byla zaplacená.

5. DOBA PLNĚNÍ

5. 1. Stupněm projektové dokumentace se pro účely Smlouvy rozumí:
 - a) geodetické zaměření včetně zjištění inženýrských sítí,
 - b) dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“),
 - c) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).
5. 2. Poskytovatel se zavazuje předat koncept DSP/DUSP včetně MPM, geodetického zaměření a potřebných průzkumů do **3 měsíců od účinnosti smlouvy**, nejpozději však do předání čistopisu DSP Objednateli.
5. 3. Poskytovatel se zavazuje podat žádost o stavební povolení dle platné legislativy do **3 měsíců od předání čistopisu DSP**

5. 4. Poskytovatel se zavazuje projednat s Objednatelům obsah PDPS **do 1 měsíce od vydání pravomocného povolení stavby nebo písemné výzvy Objednatelě**, nejpozději však do vydání čistopisu PDPS. Objednatel je po projednání oprávněn Poskytovateli předložit připomínky k PDPS, přičemž Poskytovatel je povinen se těmito připomínkami řídit při případném přepracování PDPS. Objednatel poskytne Poskytovateli k přepracování PDPS přiměřenou lhůtu.

5. 5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby AD od doby zahájení VŘ na zhotovitele stavby až **do kolaudace stavby**.

5. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případech opakovaného a/nebo podstatného porušení této Smlouvy Poskytovatelem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zpoždění s dodáním kteréhokoli stupně projektové dokumentace o více než 15 dní je podstatným porušením Smlouvy.

5. 7. Výpovědní doba se sjednává v délce 10 dní a počíná běžet v den následující po doručení výpovědi smlouvy druhé smluvní straně.

6. CENA SLUŽBY

6. 1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služby částku ve výši:

497 500,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátšedmtisícšestset korun českých) bez DPH

601 975,- Kč (slovy: šestsetjednatisícdevětsedmdesátšest korun českých) vč. DPH

Částka bude uhrazena Poskytovateli na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem, se splatností 30 dní, od jeho doručení Objednateli. Poskytovatel je fakturu oprávněn vystavit po řádném předání projektové dokumentace.

6. 2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli k doplnění. Po obdržení opraveného či doplněného daňového dokladu Objednatelům počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7. SANKCE

7. 1. Pro případ prodlení s dodáním projektové dokumentace se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny Služby, a to za každý započatý den prodlení.

7. 2. Pro případ prodlení s úhradou ceny Služby se Objednatel zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

8. UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE REGISTRU SMLUV

8. 1. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost tuto Smlouvu zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), naplňují-li podmínky této Smlouvy definici povinně uveřejňovaných smluv.

8. 2. Případné splnění povinnosti uveřejnit Smlouvu dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

8. 3. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


9. 1. Jakékoliv změny nebo doplňky Smlouvy budou uzavírány formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.
9. 2. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné, popř. zdánlivé ustanovení smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl Smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 10 dnů od obdržení kteroukoli Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany.
9. 3. Otázky v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
9. 4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že je uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek.
9. 5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Krajská správa a údržba silnic střečeského kraje, p.o.

elektronický podpis




M – PROJEKCE s.r.o.

elektronický podpis



Ing. Petr Hájek



Mgr. Michal Kropáč

jednatel



III/32827 Rožďalovice, most ev. 32827 - 4 – PD

Stavební náklady cca 8 000,- tis. Kč včetně DPH

žlutě - vyplní uchazeč


popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Mimořádná prohlídka mostu, vč. místního šetření pro stanovení rozsahu opravy, za účasti zástupce investora	12 500,00
Diagnostický průzkum mostu - SS	neoceňuje se
Zhodnocení základových poměrů	neoceňuje se
Geodetické zaměření mostu	15 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000,00
Ověření inženýrských sítí	5 000,00
Záborový elaborát	10 000,00
Průzkumy celkem	52 500,00
DÚR+DSP	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	25 000,00
Stavební část	125 000,00
DIO	17 500,00
BOZP	12 500,00
DSP celkem	190 000,00
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	30 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	12 500,00
IC celkem	62 500,00
PDPS	
Technická zpráva	12 500,00
Výkresová část	100 000,00
ZTKP	12 500,00
Soupis prací a rozpočet	32 500,00
PDPS celkem	157 500,00
celkem bez DPH	462 500,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	500,00	70	35 000,00

celkem bez DPH	497 500,00
21 %DPH	104 475,00
celková cena včetně DPH	601 975,00

Technická specifikace

Název akce: III/32827 Rožd'álovice, most ev. 32827 - 4 – PD

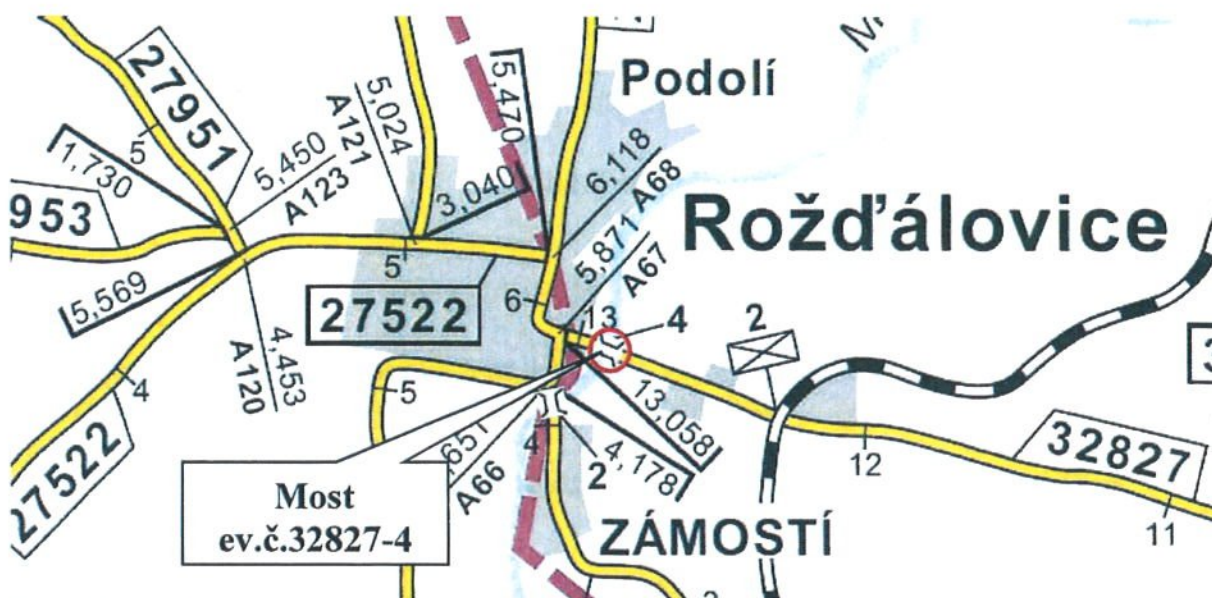

Staničení provozní v km : 12,891 , CMS: Městec Králové

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Stav mostu je nyní klasifikován jako V = špatný. Zatékání na prahu opěr. Opěra ve spodní části pravděpodobně protéká. Dochází zde k prasklinám zřejmě od korozního nabývání výztuže. Průsaky a výluhy. V opěrách trhliny. Dřívky pravděpodobně protékají. Na okrajích lokálně odpadá beton. Masivní koroze ložisek. Hloubková degradace betonu říms, trhliny. Povrch vozovky nerovný, trhliny. Vozovka je nerovná a převrstvená, její tíha odčerpává zatížitelnost NK pro silniční dopravu. Chodníky na mostě rozpadlé, degradace betonu. Zábradlí koroduje. Hydroizolace nefunkční. Záchytný systém na mostě nevyhovuje platným ČSN, TP.

Výčet požadovaných oprav:

Požadujeme provést podrobnou mimořádnou prohlídku mostu za účasti Objednatele pro upřesnění parametrů a rozsahu navrhované opravy. Hlavním cílem projektu bude provést celkovou výměnu mostního svršku včetně izolace. Provést případnou památkovou ochranu mostu. Kompletní sanace spodní stavby, opěr, křídel. Sanace úložných prahů, výměna ložisek, nové římsy. Spárování kamene na opěrách, očištění mostu apod. Kompletní provedení opravy a obnovy PKO zábradlí způsobem stanoveným dle projednání s DOSS a Objednatelem.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí včetně uzavření smluv o realizaci překládek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a uzavření majetkoprávních smluv pro získání povolení k zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu dle platné legislativy. Pokud to především technické a územní podmínky dovolí požadujeme vymístit přítomné inženýrské sítě z mostního tělesa. Součástí projektových prací je komplexní majetkoprávní příprava v rozsahu uvedeném v Metodickém pokynu pro majetkoprávní přípravu dopravních staveb, v platném znění.

Nedílnou součástí prací je vyhotovení návrhu opravy vozovky před a za mostem v rozsahu koordinovaném se související akcí rekonstrukce silnice III/32827 včetně chodníků a náměstí v obci Rožďalovice.

Součástí prací je provedení zkoušky asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem tj. žádáme, aby byl recyklát zatříděn a jeho likvidace zohledněna v soupisu prací (výkazu výměr pro výběr zhotovitele).

2. Náklady stavebních prací jsou dány odhadem:

Stavba: 8 000 000,- Kč vč DPH

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ v rozsahu:

- Společné DÚSP,
- IČ včetně majetkoprávní přípravy, uzavření majetkoprávních smluv nezbytných pro realizaci stavby, případné povinné správní poplatky budou přeučtovány objednateli.
- PDPS s oceněným a neoceněným soupisem prací
- Výkon AD

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- DIO
- Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti
- Most ev.č. 32827-4 včetně vozovky na mostě a úprav pod mostem

5. Územně-technické podmínky

- Rekonstrukce se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu v koordinaci s akcí opravy silnice III/32827.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK,
- Provoz a údržbu vodního díla pod mostem zajišťuje jeho vlastník (správce).

7. Termín realizace

PD: SP + PDPS 1Q 2025

Stavba (TDI): **předpoklad zahájení – hlavní stavební sezona roku 2025**

Kontakt :

Ing. Milan Jeřábek, vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku mosty KSÚS SK, mobil [REDACTED]

Milan Horák, provozní manažer úseku mosty - oblast Kutná Hora, mobil [REDACTED]
email: [REDACTED]

Zpracoval: Ing. Milan Jeřábek

Datum: 12.7.2024

In [REDACTED]

Přílohy :

1. Hlavní mostní prohlídka z 21.6.2023
2. Mostní list




Vozovka a mostní vybavení



Degradace říms a spodní stavby



Stav ložisek – plátková koroze

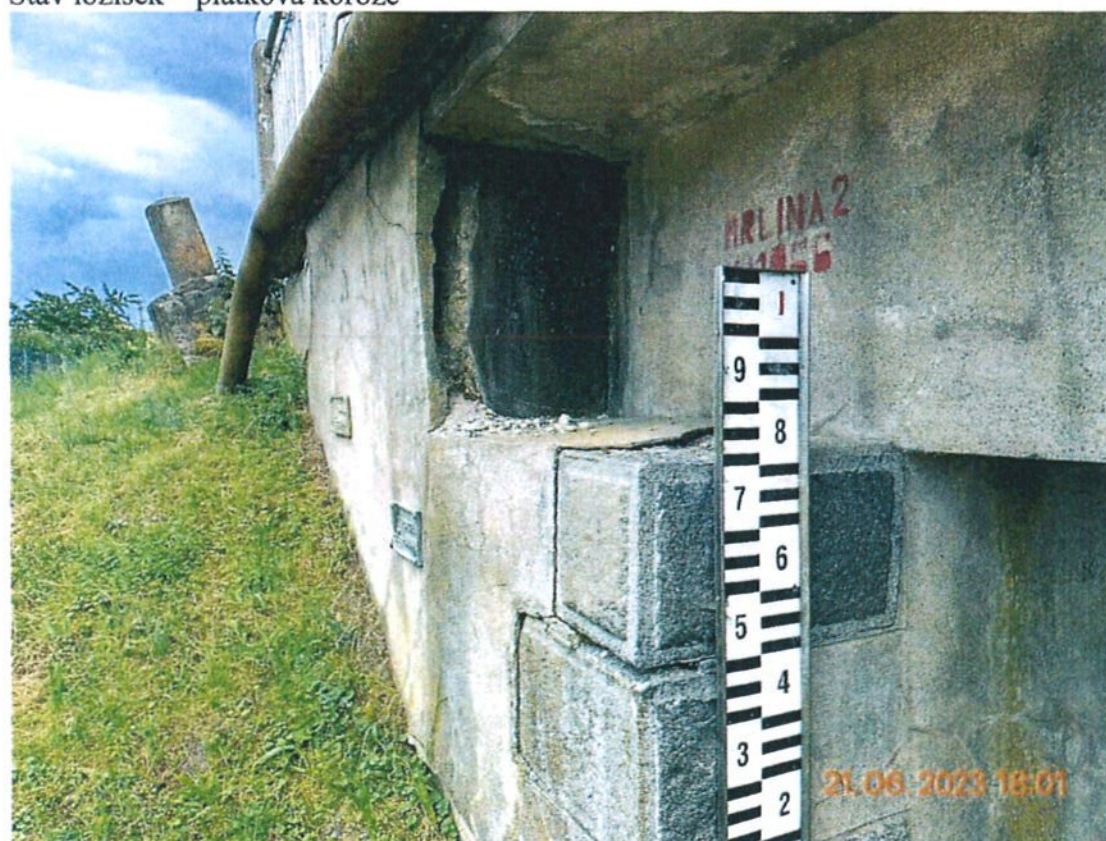

Cizí zařízení a poruch spodní stavby



Podemletá opěra a celkově dobrý stav NK



Nové mostní vybavení – pokud možno se zachováním původního nýťovaného zábradlí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Společnost M – PROJEKCE s.r.o. se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415, zapsána u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 37094 tímto čestně prohlašuje, že řádně poskytla níže uvedené služby.

Název zakázky:	I/17 Chrudim, most ev.č. 17-031, DUSP, IČ, VD-ZDS, AD
Identifikace objednatele:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Radek Soukup + 4 [REDACTED] z
Doba plnění od – do (měsíc – rok):	07/2018–04/2023
Popis předmětu plnění (včetně uvedení stupně PD):	Projekt kompletní rekonstrukce mostu na silnici I/17 přes řeku Chrudimku v intravilánu města Chrudim. Kompletní rekonstrukce mostu o 1 poli s délkou přemostění 18,5 m spočívající ve snesení stávající nosné konstrukce, částečné demolici spodní stavby v následné výstavbě nové spodní stavby a nové nosné konstrukce, včetně mostního příslušenství. Zpracování dokumentace ve stupních DSP a VD-ZDS (PDPS) a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP).
Cena služeb v Kč:	687.500,00 Kč bez DPH

Název zakázky:	Most ev.č. 3262-3 Skřivany
Identifikace objednatele:	Královéhradecký kraj Pivovarské nám.1245, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba objednatele:	Martin Dvořáček + 4 [REDACTED] z
Doba plnění od – do (měsíc – rok):	06/2017–06/2023
Popis předmětu plnění (včetně uvedení stupně PD):	Projekt celkové rekonstrukce jednopolevého mostu ev.č. 3262-3 přes Cidlinu v km 1,012 silnice III/3262 nedaleko obce Skřivany. Délka přemostění 21,00 m, délka mostu 30,00 m. Zpracování dokumentace ve stupních DUSP a PDPS a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP).
Cena služeb v Kč:	453.350,00 Kč bez DPH

**M - PROJEKCE**

Název zakázky:	I/32 - most ev.č. 32-001 přes Cidlinu, celková oprava
Identifikace objednatele:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba objednatele:	Radek Drahekoupil + [REDACTED]
Doba plnění od – do (měsíc – rok):	06/2020-09/2021
Popis předmětu plnění (včetně uvedení stupně PD):	Projekt celkové opravy (rekonstrukce) třípolového mostu ev.č. 32-001 přes řeku Cidlinu a cyklostezku v km 0,180 silnice I/32. Délka přemostění 63,2 m, délka mostu 77,5 m. Zpracování dokumentace ve stupních DSP a VD-ZDS (PDPS) a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP).
Cena služeb v Kč:	1.634.000,00 Kč bez DPH

Název zakázky:	Most ev.č. 3048-1 Ratibořice
Identifikace objednatele:	Královéhradecký kraj Pivovarské nám.1245, 500 03 Hradec Králové
Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Jiří Koutník + [REDACTED]
Doba plnění od – do (měsíc – rok):	10/2020-06/2022
Popis předmětu plnění (včetně uvedení stupně PD):	Projekt celkové rekonstrukce jednopolevého historického „Vilémova“ mostu ev.č. 3048-1 z roku 1906, přes Úpu, v km 3,212 silnice III/3048, v ochranném pásmu národní kulturní památky Babiččino údolí. Délka přemostění 23,0 m, délka mostu 26,6 m. Zpracování dokumentace ve stupních DUSP a PDPS a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení (SP).
Cena služeb v Kč:	605.000,00 Kč bez DPH

[REDACTED]
Ing. Petr Hájek
jednatel

[REDACTED]
Mgr. Michal Kropáč
jednatel



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Závazný seznam osob (členů realizačního týmu), které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky „III/32827 Rožďalovice, most ev. 32827 - 4“.

- **Ing. Jiří Ehrenberger** – autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. osvědčení 31403
- **David Senohrábek, DiS** – autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, osvědčení č. 38434
- **Ing. David Kněbort** – zodpovědný projektant mostu

„Autorizací“ se rozumí (není-li uvedeno jinak) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31403

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Ehrenberger

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

mosty a inženýrské konstrukce



V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0501067

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 2.12.2008



Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **38434**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

David Senohrábek, DiS.

jméno a příjmení

[REDACTED]

rodné číslo

je


autorizovaným technikem

v oboru


dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0501332

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **28.3.2017**



[REDACTED]
Ing. Pavel Kráček
předseda ČKAIT

**M - PROJEKCE****Odesílatel:**

M – PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/16
500 02, Hradec Králové
IČO: 050 61 415

Adresát:

Ing. Milan Jeřábek
Vedoucí manažer, zástupce vedoucího úseku
mosty
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Kleinarská 894, 280 02 Kolín
Tel. [REDACTED]

Vaše zn.: -

Naše zn.: **N-142/2024**Datum: **29.7. 2024**

Vyřizuje/tel: Ing. Ehrenberger/ 724 973 655

Věc: Cenová nabídka**Akce: „III/32827 Rožďalovice, most ev. 32827 - 4 – PD“**

Na základě Vaší poptávky Vám níže zasíláme naši cenovou nabídku.

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH	497 500,- Kč
DPH 21%	104 475,- Kč
Cena celkem vč. DPH	601 975,- Kč

Fakturace:

Po předání předmětu díla objednateli. Splatnost faktury je 30 dní.
Platnost nabídky je 2 měsíce.

S díky a pozdravem

[REDACTED]
Ing. [REDACTED]
M – PROJEKCE s.r.o.

Jednatel**Příloha: oceněný soupis prací****M - PROJEKCE s.r.o.**

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště
Pardubice - Husova 1697, 530 03 Pardubice
Praha - Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 37094

IČ: 050 61 415, DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové

telefon: + 420 495 842 111

e-mail: m-projekce@m-projekce.cz

web: www.m-projekce.cz
