

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Název/obchodní jméno: **Natur & Forest s.r.o.**
Adresa sídla: Tovačovská 300, 750 02 Přerov
IČ: 27785645
DIČ: CZ27785645
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jakub Stojan
Kontaktní osoba
zadavatele: Ing. Jakub Stojan
Tel. kontakt (mobil): 605 248 041
E-mail: Jakub.stojan@agras.cz
Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 211996901/0300
dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Název: **JAKEŠ WOOD s.r.o.**
Adresa sídla: Velké Karlovice 82, 756 06
IČ: 02314088
DIČ: CZ02314088
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná jednat: Ing. Ivo Jakeš
Kontaktní osoba: Martin Jakeš
Tel.: 604645014
E-mail: jakeswood@seznam.cz
Bankovní spojení: číslo účtu 212881321/0600
dále jen **zhotovitel**

(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:

II. Předmět Smlouvy

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Výstavba odpočinkových stanovišť a lesní studánky na LHC Královec“

v rozsahu podle:

- Zadávací dokumentace,
- a dle nabídky zhotovitele.

- II.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

III. Cena Díla a způsob úhrady

- III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zakázky jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH	585 000,-Kč
DPH 21%	122 850,-Kč
Celková cena díla vč. D	707 850,-Kč

DPH bude v případě změny sazby připočtena podle platných předpisů.

- III.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- III.3 Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami: nedohodnou-li se smluvní strany na jiných termínech fakturace.
Splatnost dílčích daňových faktur je **15 kalendářních dnů** od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- III.4 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečný daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečného daňového dokladu je **15 kalendářních dnů** od data doručení.
- III.5 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- III.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

IV. Změny díla

- IV.1 Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů vyplývajících z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s. v cenové úrovni platné v době provádění víceprací (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení. Zástupcem objednatele odsouhlasená změna nedává sama o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- IV.2 Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu dokončení díla.

V. Doba a místo plnění

V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště. K převzetí staveniště objednatel vyzve nejpozději 14 dní po podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace.
- dokončení stavebních prací: nejpozději **do 31.12.2024**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

V.2 Místo plnění předmětu smlouvy je: k.ú. Královec p.č.: 1288/1 a Bernartice p.č.:770/1

VI. Provádění díla

VI.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 166 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

VI.2 Zhotovitel v průběhu realizace celého díla zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

VI.3 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. V případě poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. energie, zhotovitel.

VI.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

VI.5 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Způsob nakládání s vytěženým a vybouraným materiálem, mimo stavební suť, určí objednatel. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VI.6 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VI.7 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

VI.8 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz oceněný soupis prací a dodávek a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

VII. Dodání díla a přejímka

VII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepší zástupci objednatele a zhotovitele.

VII.2 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

- VII.3 Při převzetí je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů, atesty materiálů a výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení, a případné další dokumenty k budoucímu řádnému užívání díla.
- VII.4 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se vyskytnou na díle vady a nedodělky, které brání užívání díla, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

VIII. Záruka na dílo

- VIII.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **12** měsíců
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- VIII.2 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, v dohodnutém termínu, na výzvy objednatele, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX. Smluvní pokuty

- IX.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,005 %** z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.
- IX.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodloužení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodloužení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodloužení, který nebude (nastane-li prodloužení) zvlášť účtován.
- IX.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 00,- Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- IX.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 00,- Kč** za každý den prodloužení a vadu.
- IX.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **2 00,- Kč** za každý den prodloužení.

X. Odstoupení od smlouvy

- X.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- X.2 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- X.3 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.

- X.4 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.
- X.5 Realizace zakázky je závislá na získání finanční podpory v rámci Strategického plánu SZP. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora v rámci Strategického plánu SZP, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu, informovat zhotovitele.

XI. Závěrečná ustanovení

- XI.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XI.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XI.3 Zhotovitel si je vědom, že je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne zhotoviteli k plnění zakázky určité věci či práva.
- XI.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XI.5 Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 1 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.
- XI.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – zadávací dokumentace

v Přerově dne 27.9.2024

ve Velkých Karlovicích dne 27.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Natur & Forest s.r.o.
Tovařovská 300
Přerov I - Město, 750 02 Přerov 2
IČ: 27765646 DIČ: CZ27765646

Ing. Jakub Stojan, jednatel



Ing. Ivo Jakeš

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel

Identifikační údaje o zadavateli:

Název/obchodní jméno: Natur & Forest s.r.o.
Adresa/Sídlo podnikání: Tovačovská 300, 750 02 Přerov
IČ zadavatele: 277856445
DIČ zadavatele: CZ277856445
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jakub Stojan, jednatel
Tel. Kontakt (mobil): 605 248 041

2. Název a druh zakázky

Název zakázky: Výstavba odpočinkových stanovišť a lesní studánky na LHC Královec

Druh zakázky: CENOVÝ MARKETING

3. Lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možné podat písemně prostřednictvím pošty, kurýrní služby či jiného přepravce nebo osobně na adresu: Želatovice 203, 751 16, Želatovice nebo e-mailové nabídky na info@naturforest.cz nejpozději do 20.9.2024 do 10:00 hodin.

4. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výstavba odpočinkových stanovišť a lesní studánky na LHC Královec. Zakázka není rozdělena na části.

• Odpočinkové stanoviště na Bukovém sedle

První odpočinkové stanoviště se nachází na p.č. 1288/1 v k.ú. Královec místní název Bukové sedlo. Na této parcele budou provedeny terénní úpravy – srovnání. Posléze dojde k vytyčení šesti opěrných sloupků, které budou ukotveny přes ocelové kotevní prvky. Na takto osazených ocelových kotvách budou osazeny kompletně zhotoven z modřínu, pouze podsedák a stolek bude z jedle. Součástí odpočívadla bude odpadkový koš zhotovený z jedle nebo modřínu – vydlabaný kmen cca 100 cm, ve

kterém bude umístěn vyjímatelný plechový koš. Celá konstrukce odpočívadla nebude povrchově ošetřena. Podlaha odpočívadla bude ze sypaného kamínku o frakci 0- 32 mm z místního kamenolomu. Dále bude na odpočívadle instalovaná informativní cedule.

- Odpočinkové stanoviště v Trojúhelníku

Druhé odpočinkové stanoviště se nachází na p.č. 770/1 v k.ú. Bernartice místní název Trojúhelník. Odpočinkové stanoviště bude umístěno na vyvýšeném místě – asi 1m nad okolním terénem, proto bude zapotřebí zhotovit schody a dřevěné zábradlí. Posléze dojde k vytyčení šesti opěrných sloupků, které budou ukotveny přes ocelové kotevní prvky. Příloha č.1: Technická dokumentace. Materiál pro výstavbu bude kompletně zhotoven z modřinu, pouze podsedák a stolek bude z jedle. Součástí odpočívadla bude odpadkový koš zhotovený z jedle nebo z modřinu – vydlabaný kmen cca 100 cm, ve kterém bude umístěn vyjímatelný plechový koš. Celá konstrukce odpočívadla nebude povrchově ošetřena. Podlaha odpočívadla bude ze sypaného kamínku o frakci 0 – 32 mm z místního kamenolomu. Spojovací materiál bude torx – šrouby do dřeva a hřebíky. Dále bude na odpočívadle instalovaná informativní cedule.

- Lesní studánka

Lesní studánka se nachází na p.č. 1288/1 v k.ú. Královec – místní název u Joskového kamene. V tomto místě po dobu posledních pěti let vyvěrá pramen – spodní vývěr, který dále nekontrolovatelně odtéká přes přilehlou komunikaci. Na tomto místě dojde k opatrnému osazení kameninové nebo betonové roury. Na tomto místě dojde k opatrnému osazení kameninové nebo betonové roury. Následně dojde k úpravě terénu, a dle možností osazení kamene z místního kamenolomu. Studánka bude obložena kamenem, střecha bude dřevěná, krytina bude taška nebo šindel. Přepad bude z nerezové či měděné trubky. Voda ze studánky bude odvedena do stávající odvodňovací trubky. Terén před studánkou bude vydlážděn plochými kameny.

Požadované technické parametry:

Požadované technické parametry jsou uvedeny v příloze č.1.

5. Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky činí:

Odpočinkové stanoviště na Bukovém sedle:	250.000,- bez DPH
Odpočinkové stanoviště v Trojúhelníku:	250.000,- bez DPH
Lesní studánka:	100.000,- bez DPH
CELKEM:	600.000,- Kč bez DPH

6. Doba a místo plnění zakázky

Termín dodání:

Zadavatel požaduje dodání předmětu plnění nejpozději do 31.12.2024.

Místa plnění zakázky:

1. Odpočinkové stanoviště na Bukovém sedle se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov, obec Královec, v k.ú. Královec, p.č. 1288/1.
2. Odpočinkové stanoviště u Trojúhelníku se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov, obec Bernartice, v k.ú. Bernartice na p.č. 770/1.
3. Lesní studánka se nachází v Královéhradeckém kraji, okres Trutnov, v obci Královec, v k.ú. Královec na p.č. 1288/1.

7. Hodnocení nabídek a posouzení splnění zadávacích podmínek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnížší nabídkové ceny bez DPH a splnění technických parametrů.

- Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

8. Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č.1 Technická dokumentace


V Želatovicích dne 15.9. 2024.


Zadavatel: Natur & Forest s.r.o.

Ing. Jakub Stojan


Natur & Forest s.r.o.
Tovačovská 300
Přerov - Město, 750 02 Přerov 2
IČ 27755645 Z.Č. CZ277353-5

Příloha č. 1: Technická dokumentace

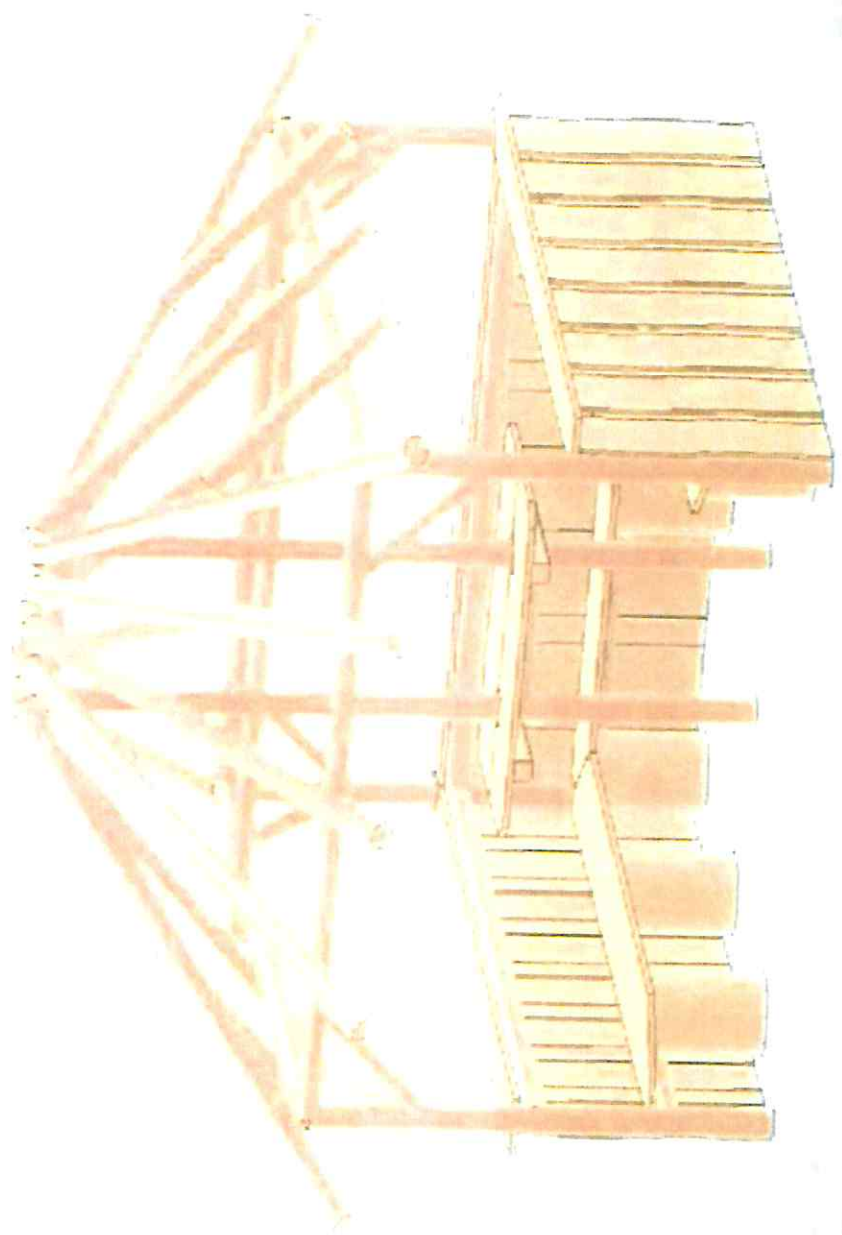

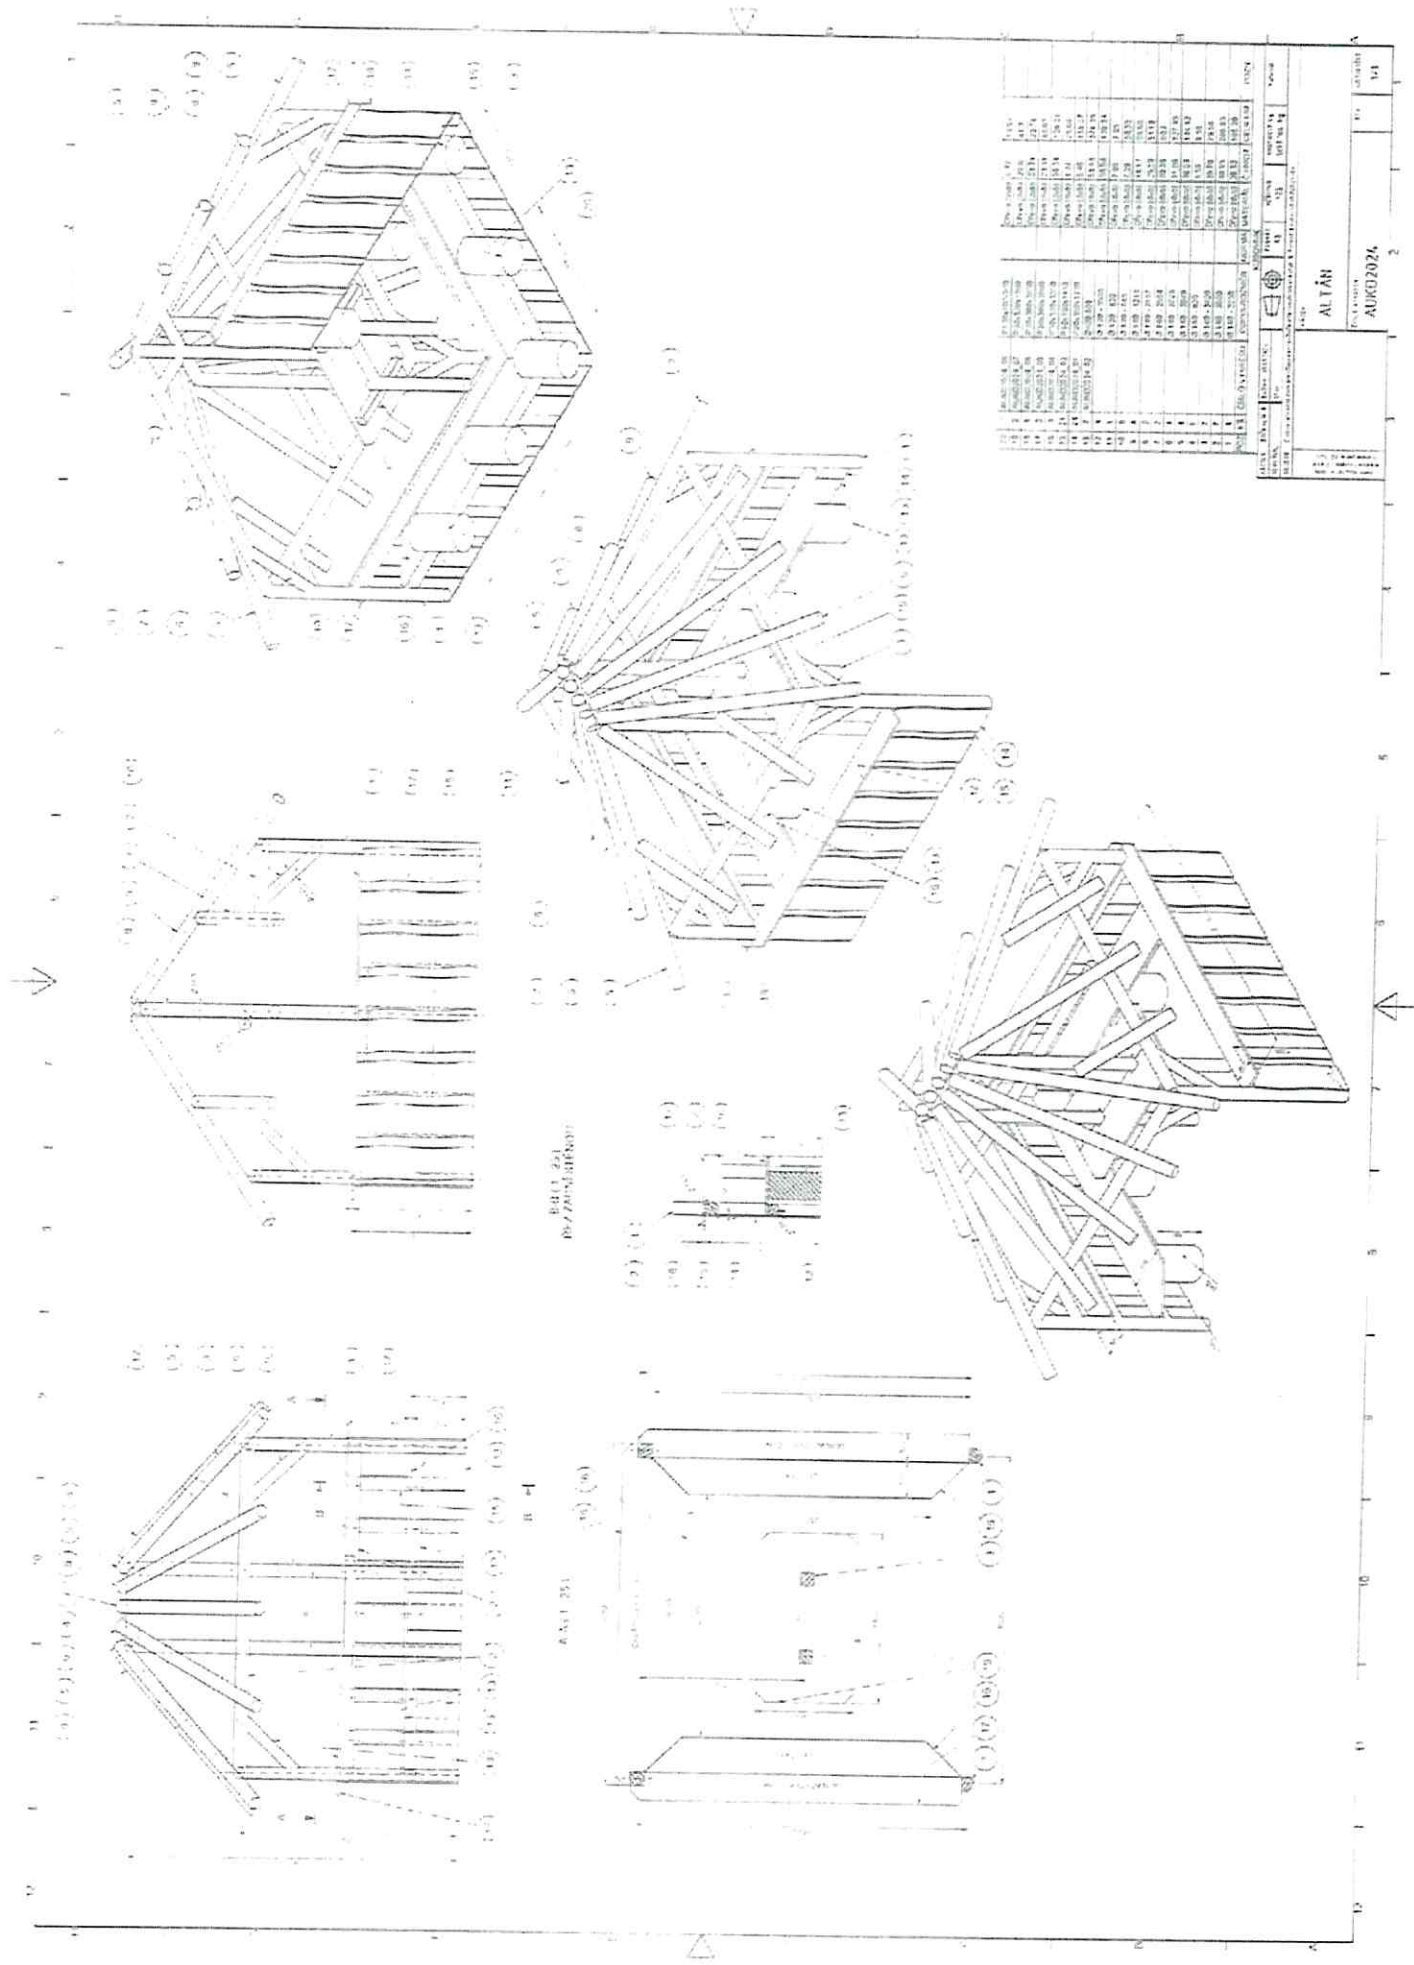

ST. TÊN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ	THÀNH TIỀN
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

AL TÂN
 AUD 2024
 13

Čestné prohlášení účastníka výběrového/zadávacího řízení či cenového marketingu

(Doporučený vzor)

Povinnost doložit v rámci příloh od vybraného dodavatele¹.

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti²;
2. poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti³;
3. odpovídá za to, že on sám ani žádný z jeho poddodavatelů **není** po celou dobu trvání zakázky osobou (i) uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, na který se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění;
4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo **nezpřístupní** fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací); a dále (ii) osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (i); (iii) na které se vztahují podmínky nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v platném znění.

v r. VELKÝM KARLOVICEM dne 27.9.24



¹ Doporučuje se vyžádat si v rámci nabídek od všech účastníků.

² Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu

³ Platí pouze pro účastníky zadávacího řízení (zadáváno dle ZZVZ) a veřejné zakázky malého rozsahu

Poznámka pro zadavatele zakázky:

Sankce EU proti Rusku a Bělorusku možno ověřit na:

<https://www.sanctionsmap.eu/>

<https://www.amlisolutions.cz/overovani-mezinarodnich-sankci>

<https://sankce.datlab.eu/>

§ 4b) zákona o střetu zájmů – seznam veřejných funkcionářů z § 2 (1c) ke stažení v .XLSX

<https://justice.cz/web/msp/seznam-vf>

U vybraného dodavatele je možnost ověřit neexistenci střetu zájmů v evidenci skutečných majitelů dostupné na:

<https://esm.justice.cz>
