



SMLOUVA O DÍLO Č. SOD/00926/2024/OSUM

OPRAVA CHODNÍKŮ V ŘÍČANECH

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00926/2024/OSUM

OBJEDNATEL:
sídlem: *Město Říčany*
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
bankovní spojení: *Ing. David Michalička, starostou města*
číslo účtu:
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických
Technický dozor investora (TDI): *[.....]*
tel.:
Email: *[.....]*
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:
sídlem: *Le – Kov s.r.o.*
zastoupený: *Na střelnici 522/6, 186 00 Praha 8 - Karlín*
bankovní spojení: *Michal Leibl*
číslo účtu: *MONETA Money Bank a.s.*
IČO: *[REDACTED]*
DIČ: *14330369*
Identifikátor datové schránky: *CZ14330369*
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických: *dnamsv2*
tel.: *Michal Leibl*
email: *[REDACTED]*
lekov.office@gmail.com
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je realizace opravy chodníku v souladu s projektovou dokumentací (příloha č.2 této Smlouvy), s nimiž byl zhotovitel seznámen, a které v potřebném počtu výtisků obdržel.

ULICE: U Kina

ÚSEK: dům č.p. 1331/1

ČÁST: okolí domu

PARC. Č.: dle PD

K.Ú.: Říčany

1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem (výkazem-výměrem), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, k projektové dokumentaci a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými z poptávkového řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. Je-li v poptávkové dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané nabídky.

1.5. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále:

- závazek komplexního provedení prací dle TKP - Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy
- závazek předložení kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací zástupci objednatele
- závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP
- závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve stavebním deníku
- zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) v rozsahu projektové dokumentace
- zpracování skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x na CD-R, či USB.
- zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek, apod.
- zajištění a předání kompletní dokumentace všech potřebných dokladů, revizí, atestů apod.
- z vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi. Případné zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

ČLÁNEK 2. TERMÍNY REALIZACE

2.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva k převzetí staveniště bude objednatelem odeslána nejpozději do 31.10. 2024.

2.2. Doba provádění stavebních prací na jednotlivé etapě nesmí přesáhnout 30 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli.

2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.

ČLÁNEK 3. CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21% DPH
Oprava chodníku v ul. U Kina	338 666,76	409 786,78
celkem	338 666,76	409 786,78

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla.

3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení prací, které nebyly obsaženy v původních poptávkových podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se odchyľují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce provedeny nebyly.

3.4. Případné práce nad rámec poptávkové dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku URS Praha považovány za maximální možné.

3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD.

3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. Tyto změnové listy budou přílohou dodatků této SOD.

3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle odstavce 4.1 tohoto článku.

ČLÁNEK 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Úhrada ceny díla bude uhrazena na základě řádného předání celého díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.2. Faktura bude doručena na podatelnu objednavatele, do datové schránky nebo zasláním na email: podatelna@ricany.cz. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.
- 4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
- 4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedenému plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.
- 4.5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení celého předmětu díla. Podpisem předávacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH.

ČLÁNEK 5. PROVÁDĚCÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku.
- 5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.
- 5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny.
- 5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na okolí.
- 5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním rozhodnutím.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném nebo obvyklém způsobu použití

příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s přihlédnutím zejména na hospodárny provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí.

- 5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDI) v nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku.
- 5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDI, kteří jsou uvedeni v úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDI přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.
- 5.9. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací (oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis.
- 5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.11. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla překážka na straně objednatele.
- 5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo.
- 5.13. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci poptávkového řízení na předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele.
- 5.14. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.
 - 5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné
 - 5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby.
 - 5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených nemovitostí.
 - 5.14.4. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající bezproblémový přístup do všech provozoven a dotčených nemovitostí po celou dobu trvání stavby.
- 5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednateli ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli.
- 5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
- 6.2. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo.
- 6.3. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez sjednání podmínek užívání. Dohoda o předčasném užívání musí být vyhotovena jako dodatek k této smlouvě o dílo.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace.
- 6.6. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla předává.
- 6.7. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
- 6.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 7. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční va-

dy, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Článek 8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –
 - 8.1.1. s termínem dokončení díla 0,1 % z ceny díla bez DPH,
 - 8.1.2. s odstraněním staveniště 0,1 % z ceny díla bez DPH,
 - 8.1.3. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla 0,1 % z ceny díla bez DPH,
 - 8.1.4. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,1 % z ceny díla bez DPH.
- 8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné porušení:
 - 8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 5 000,00 Kč,
 - 8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 5 000,00 Kč.
- 8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH
- 8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit.

Článek 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno:
 - 9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému harmonogramu vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu,
 - 9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném termínu nebude zjednána náprava
 - 9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo samostatným dopisem
 - 9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.

- 9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a minimalizoval ztráty.
- 9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané škody.
- 9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 9.1 tohoto článku odstoupí, je oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele.

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v poptávkových podmínkách předmětné veřejné zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.
- 10.2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu autora.
- 10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením.
- 10.4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního předání díla objednateli.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vyhotovena v digitální podobě a podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva zveřejněním v registru smluv.
- 10.7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.
- 10.8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit dohodou.
- 10.9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří

předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

10.12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 26.09.2024 pod číslem usnesení 24-40-002.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č.2 – Výkresová/projektová dokumentace

V Říčanech

V _____ dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. David Michalíčka
Město Říčany
a

Město Říčany
Leibl

.....
Ing. David Michalíčka

.....
Michal Leibl

starosta města

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **chodníček ul. U Kina**
 Objekt: **Zhotovení dlážděného okapového chodníku kolem domu čp. 1331/1, 251 01 Říčany**
 Rozpočet: **zpevněné plochy dlážděné**

Objednatel: **Město Říčany** IČ: _____
Masarykovo náměstí 53/40 DIČ: _____
251 01 Říčany

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			285 766,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 900,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			338 666,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	338 666,76 CZK
Základní DPH	21 %	71 120,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **338 666,76** CZK

Cena celkem s DPH **409 786,78** CZK

v _____ dne **27.9.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			63 303,95
46	Zpevněné plochy	HSV			222 462,81
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			26 900,00
Cena celkem					338 666,76

Položkový rozpočet

S:	chodníček ul. U Kina
O:	
R:	Zhotovení dlážděného okapového chodníku kolem domu čp. 1331/1, 251 01 Říčany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				63 303,95
1	113106121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (v kamenivu) <i>1,50*(9,90+10,10+2,60+19,10)+1,0*10,60</i>	m2	73,150	72,60	5 310,69
				<i>73,150</i>		
2	979082111.R00	Vnitrostaveništní přesun demont. dlaždic do 10 m	t	10,095	391,49	3 952,09
3	979082121.R00	Příplatek k vnitrost. přesunu demont. bet. dlaždic, za dalších 5 m <i>2*10,0950</i>	t	20,190	162,00	3 270,78
				<i>20,190</i>		
4	979087212.R00	Nakládání demont. dlaždic na dopravní prostředky	t	10,095	147,99	1 493,96
5	979084216.R00	Odvoz na skládku, na vzdálenost do 5 km	t	10,095	433,00	4 371,14
6	979084219.R00	Příplatek k odvozu na skládku za dalších 5 km	t	10,095	433,00	4 371,14
7	979990102.R00	Poplatek za skládku - beton	t	10,095	2 725,00	27 508,88
8	122201101.R00	Odkopávky nezapažené v hor.tř. 3 do 100 m3 <i>0,30*1,60*(10,00+10,10+10,60)+0,30*2,00*(5,80+5,80)+0,30*1,60*(10,50+10,60)</i>	m3	31,824	227,49	7 239,64
				<i>31,824</i>		
9	122201109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor.tř. 3	m3	31,824	44,90	1 428,90
10	181101102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor.tř. 1-4 <i>1,60*(10,00+10,10+10,60)+2,0*(5,80+5,80)+1,60*(10,50+10,60)</i>	m2	106,080	8,29	879,40
				<i>106,080</i>		
11	174101101.R00	Zásyp/násyp zeminou se zhutněním <i>za obrubníkem: 0,20*0,30*(9,90+10,10+14,10+22)</i> <i>za palisádou: 0,60*0,40*14,10</i>	m3	6,750	147,00	992,25
				<i>3,366</i>		
				<i>3,384</i>		
12	181301102.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm <i>0,60*(9,90+10,10+14,10+22)+0,60*14,10</i>	m2	42,120	59,00	2 485,08
				<i>42,120</i>		
Díl:	46	Zpevněné plochy				222 462,81
13	215901101.RT5	Zhutnění podloží, vibrační deskou <i>1,60*(10,00+10,10+10,60)+2,0*(5,80+5,80)+1,60*(10,50+10,60)</i>	m2	106,08	9,21	977,00
				<i>106,08</i>		
14	564861111.RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm; s rozprostřením a zhutněním - vč. dopravy kameniva na stavbu <i>1,50*(9,90+10,10+10,60+10,50+10,60)+2,00*(5,80+5,80)</i>	m2	100,75	242,50	24 431,88
				<i>100,75</i>		
15	564201111.R00	Lože pod dlažbu ze šterkopísku, tl. 4 cm, po zhutnění tloušťky 4 cm; s rozprostřením a zhutněním - vč. dopravy kameniva na stavbu <i>1,50*(9,90+10,10+10,60+10,50+10,60)+2,00*(5,80+5,80)</i>	m2	100,75	51,10	5 148,33
				<i>100,75</i>		
16	711823121.RT5	Montáž nopové fólie svisle, na sucho, včetně dodávky fólie DEKDREN N8 <i>0,30*(8,50+8,60+10,60+19,10+10,60)</i>	m2	17,22	76,39	1 315,44
				<i>17,22</i>		
17	596215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě <i>s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu.</i> <i>1,50*(9,90+10,10+10,60+10,50+10,60)+2,00*(5,80+5,80)</i>	m2	100,75	295,50	29 771,63
				<i>100,75</i>		
18	596291111.R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm, - dořezy k obrubníkům	m	32,00	270,51	8 656,32
19	59245308R	Dlažba betonová přírodní 20x10x6 cm, povrch standard	m2	106,00	365,50	38 743,00
20	917862111.R00	Osazení stojat. chodníkového obrubníku betonového, do lože z CP	m	56,10	370,00	20 757,00

		9,90+10,10+14,10+22,0		56,10		
21	918101111.R00	Lože pod obrubníky z CP 20	m3	2,244	4 190,00	9 402,36
		0,20*0,20*(9,90+10,10+14,10+22,00)		2,244		
22	59217510R	Obrubník betonový přírodní 100x8x25 cm	kus	56,00	142,00	7 952,00
23	59217509R	Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm	kus	2,00	91,70	183,40
24	338920011.R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	14,19	1 132,99	16 077,13
25	59228408R	Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm	kus	129,00	208,00	26 832,00
26	918101111.R00	Lože pod palisády z CP 20	m3	1,2771	4 190,00	5 351,05
		0,09*14,19		1,2771		
27	998223011.R00	Přesun hmot, pro zpevněné plochy, kryt dlážděný	t	99,8709	268,99	26 864,27
Díl:	ON	Ostatní náklady				26 000,00
28	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. - doprava materiálu, přesun strojů a stavebních kapacit	Soubor	1,00	26 000,00	26 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				26 900,00
29	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	3 400,00	3 400,00
30	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
31	005 21-1020.R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00	7 200,00	7 200,00
32	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
33	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00	6 800,00	6 800,00



chodníček ul. U Kina

celkem Kč bez DPH

338 666,76

chodníček ul. U Kina

Zhotovení dlážděného okapového chodníku kolem domu čp. 1331/1, 251 01 Říčany, ul. U Kina.
z betonové zámkové dlažby, vč. podkladních vrstev a betonového obrubníku, betonové palisády.

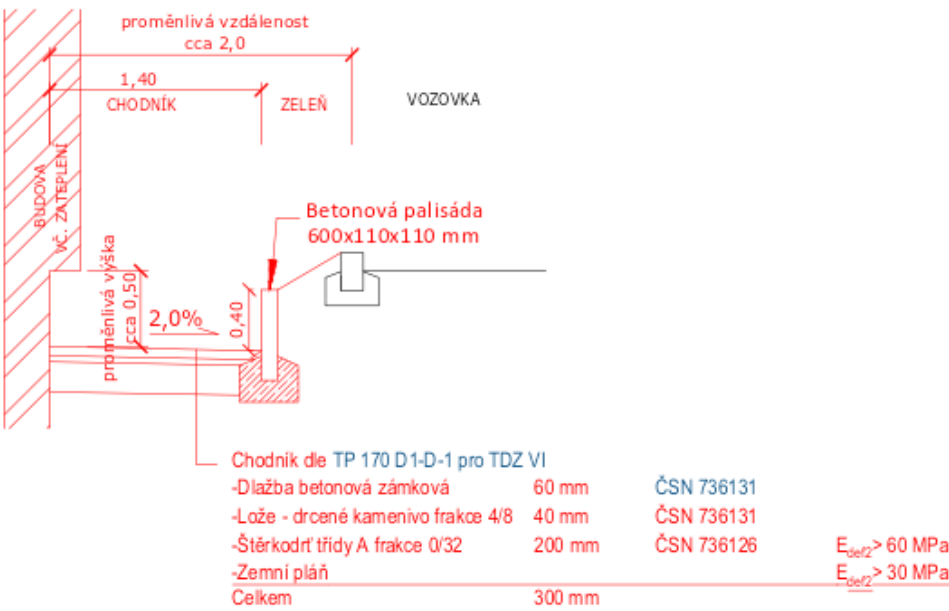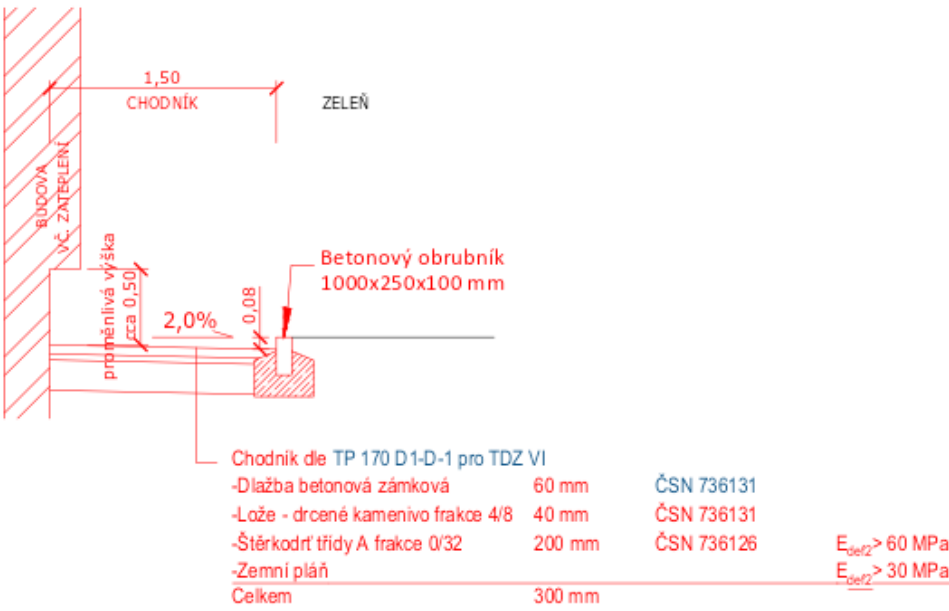

±0,000=358,00 m.n.m.

Hlavní projektant :		Projektant části :		Autorizace :	
					
Vedoucí projektu : To		91 17 Košice, IČO: 06111459			
tel. [redacted]		[redacted]@gmail.com			
Zodpovědný projektant : Ing. R		ěslav			
tel.: 60 [redacted]					
Vypracoval : Monika Kozinski, tel.: 774 313 522, email: m.kozinski@daspro.cz					
Investor : Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany					
KÚ : Říčany u Prahy [745456]		Parcelní číslo : 1710		Číslo zak. :	Paré :
Akce :		Datum :		červen 2024	
Chodníkeček ul. U Kina		Ozn. části :		C	
Obsah :		Měřítko :		Č. výkresu :	
Řez příčný vzorový		1:50		C.2	
