

Smlouva o dílo č. SMLD24000144
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2024-137a

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel	Město Jilemnice
IČO	00275808
DIČ	CZ00275808
se sídlem	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
zástupce	Bc. David Hlaváč, starosta

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	M – SILNICE a.s.
-------------------	-------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

se sídlem	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO	42196868
DIČ	CZ421 96 868
zástupce	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem

bankovní spojení
číslo účtu



Plátce DPH (ano/ne)	ANO
---------------------	-----

dále jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

1. Článek
Úvodní ustanovení

- 1..1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“) na stavební práce, jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Název veřejné zakázky:	Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších
Datum zahájení řízení:	7.8.2024

- 1..2 Pod pojmem „zadávací řízení“ se v této smlouvě rozumí zadávací řízení k veřejné zakázce uvedené v předchozím odstavci.

- 1..3 Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako „projekt“):

Dotační program:	IROP, 35. výzva – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR)
Projekt	
Název projektu:	Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část
Registrační číslo projektu:	CZ.06.06.01/00/22_035/0003143

- 1..4 Podmínky čerpání dotace upravují zejména Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném regionálním operačním programu pro všechny specifické cíle a výzvy v aktuálním znění dostupná na https://irop.gov.cz/getmedia/caed70a1-d8e4-4b42-832d-04e0ffd930dd/Obecna-pravidla-2021-2027_verze-3.pdf.aspx?ext=.pdf (dále jen „Dotační pravidla“). Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku porušení této smlouvy zhotovitelem, vč. prodlení s termínem provedení díla, může objednateli vzniknout škoda spočívající mj. v odnětí až 100 % přiznané dotace a dále v uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Za takovou škodu zhotovitel objednateli plně odpovídá.

2. Článek Zmocněné osoby

- 2..1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce objednatele ve věcech smluvních:	Bc. David Hlaváč 
B	Zástupce objednatele ve věcech technických:	
C	Zástupce objednatele na stavbě vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“):	
D	Zástupce objednatele vykonávající činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud taková činnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů (dále také jako „koordinátor BOZP“):	
E	Zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“ nebo také jako „AD“):	
F	Případně další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.	

Změna zde uvedených zástupců či zmocněnců objednatele může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatелеm.

2..2 Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

2..3 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

A	Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem 
B	Zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí z nabídky):	
C	Případně další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.	

2..4 Změna zástupců či zmocněnců zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku může být provedena jednostranným písemným oznámením zhotovitele objednateli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku, není-li stanoveno touto smlouvou jinak; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným zhotovitelem.

2..5 Změna zástupce zhotovitele na stavbě dle odst. 3 písm. B tohoto článku (stavbyvedoucí z nabídky) je možná pouze při splnění následujících podmínek. Zhotovitel oznámí objednateli písemně změnu v osobě stavbyvedoucího z nabídky a současně s tím doloží doklady, prokazující kvalifikaci nahrazující osoby minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval zhotovitel prostřednictvím nahrazované osoby stavbyvedoucího v zadávacím řízení. V případě, že u nahrazující osoby zhotovitel neprokáže kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval prostřednictvím nahrazované osoby stavbyvedoucího v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen nahradit tuto novou osobu za jinou, která bude splňovat podmínky dle tohoto ustanovení. O tom, že tato nahrazující osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu dle věty druhé tohoto ustanovení, objednatel informuje písemně (postačí prostřednictvím e-mailu) zhotovitele bez zbytečného odkladu po doručení dokladů dle věty druhé tohoto ustanovení.

2..6 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele uvedených v odst. 3 tohoto článku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí) je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

3. Článek

Podklady pro uzavření smlouvy

3..1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 09.09.2024 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

3..2 Předmět díla je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy

- a) Zadávací podmínky veřejné zakázky
- b) Projektová dokumentace zpracovaná společností [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: [REDAKCE] vyhotovená 05/2023.
- c) ROZHODNUTÍ/STAVEBNÍ POVOLENÍ vydané Městským úřadem Jilemnice, odborem dopravy, č. j.: PDMUJI-7760/2024/OD ze dne 18.3.2024, nabytí právní moci dne 10.4.2024.
- d) Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny z prosince 2019.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 3 Plán přípravy (Předcházení vzniku odpadů – zásada DNSH)

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- c) prověřil místní podmínky na staveništi;
- d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

3.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy jednal s odbornou péčí a přiměřeně překontroloval a ověřil správnost projektové a smluvní dokumentace a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení, a to formou žádosti o vysvětlení či změnou zadávací dokumentace (zejména ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku), případně na zjevné vady a nedostatky podkladů upozornil objednatele před podpisem smlouvy a to formou soupisu zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

3.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.6 Priorita jednotlivých dokumentů je v případě jejich vzájemných rozporů stanovena od nejvyšší síly takto: stavební povolení, smlouva o dílo, stavební povolení, projektová dokumentace, položkový rozpočet s výkazem výměr, ostatní dokumenty, není-li stanoveno jinak.

4. Článek

Předmět smlouvy

- 4..1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované.
- 4..2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně za provedené dílo, zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

5. Článek

Předmět díla a povinnosti zhotovitele

- 5.1 **Předmětem díla** je realizace stavebních prací, a to vybudování cyklostezky Jilemnice - Martinice v Krkonoších.

Vzhledem k financování je stavba rozdělena na dvě akce, Akce A a Akce B. Pro obě akce je zpracována jedna projektová dokumentace s oddělenými rozpočty.

Touto smlouvou se realizuje Akce A, jejíž předmětem je vybudování cyklostezky Jilemnice – Martinice v Krkonoších, části 1, v úseku staničení 0,0 km – 0,947.

Soupis prací s výkazem výměr obsahuje tyto objety:

SO 01 – cyklostezka

- a) **Pozemní komunikace:** cyklostezka s integrovaným provozem pěších. Obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3,0 m a návrhovou rychlostí 30 km/hod.
- b) **Mostní objekty a zdi:** Ve staničení 0,735 km se jedná o dřevěnou věšadlovou lávku pro překonání vodního toku Jilemka, rozpětí podélníků 7,1 m, průjezdný profil 3,5 x 2,6 m.
- c) **Odvodnění pozemní komunikace:** je řešeno příčným, resp. výsledným sklonem asfaltového krytu. Povrchová voda je na začátku úseku odváděna ke zvýšené obrubě, kde je prostřednictvím čtyř uličních vpustí zaústěna do kanalizace. Ve zbylém úseku je voda odváděna do podélného příkopu, kde dojde k jejímu vsakování.
- d) **Obslužná zařízení:** V blízkosti mimoúrovňového křížení bude zřízena zpevněná plocha s kolostavy a mobiliářem pro odpočinek
- e) **Vybavení pozemní komunikace:**
 - záchytná bezpečnostní zařízení – mostní zábradlí na dřevěné věšadlové lávce, nad přespaným objektem bude osazeno zábradelní svodidlo
 - dopravní značení – osazení dopravními značkami C9a a C9b a dalších dopravních značek

SO 02 – veřejné osvětlení

- f) Bude provedeno zcela nově a bude uloženo do tělesa cyklostezky a do nezápevněné krajnice silnice II/293, osvětlována bude pouze část spadající do intravilánu města Jilemnice.

SO 03 – doprovodná zeleň

- g) Návrh vychází ze záměru oddělit cyklostezku od silnice II/293 souvislým stromořadím. Proběhne výsadba dubu letního a třešně ptačí.

Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a dalších dokumentech uvedených v čl. 3 odst. 2 této smlouvy.

Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné (dále také souhrnně jako „dílo“).

- 5..2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy při provádění stavebních prací zjistí na staveništi výskyt obecně chráněných druhů ptáků (nález obsazeného ptačího hnízda s vajíčky nebo mláďaty), bude stavební práce provádět plně v souladu s § 5a odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- 5..3 Povinností zhotovitele dle této smlouvy je mimo jiné:
- a) vybudování zařízení staveniště;
 - b) zabezpečení staveniště;
 - c) vytyčení inženýrských sítí vč. zajištění splnění podmínek jejich vlastníků (správců);
 - d) zajištění přechodného dopravního značení;
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (díla);
 - f) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) k užívání stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, zejména poté odstranění kolaudačních vad;
 - g) provedení všech předepsaných a zkoušek a revizí, včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
 - h) provedení všech geodetických prací potřebných k řádnému provedení stavby (díla);
 - i) geodetické zaměření stavby (díla);
 - j) dokončení stavby (díla) pro uvedení do trvalého provozu;
- 5..4 Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 266/2021 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011, Sb., a dále § 153 zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 5..5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 5..6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, stavebním povolením, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 5..7 Všechny povrchy, konstrukce, vnitřní vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, resp. do stavu dle projektové dokumentace; v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

- 5..8 Zhotovitel bere na vědomí, že oznámení o užívání díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy k užívání díla se zavazuje podat a získat objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomu objednateli veškerou nezbytnou součinnost, a to bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany objednatele vyzván.

6. Článek

Doba a místo plnění

- 6..1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění díla:	Srpen až září 2024.
Termín předání/převzetí staveniště:	nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště.
Termín pro dokončení díla a jeho milníky:	<u>Dokončení stavebních prací: nejpozději do 610 dnů od převzetí staveniště.</u> <u>Závazné milníky v průběhu plnění:</u> 1. milník – Kácení: nejpozději do 180 dnů od převzetí staveniště. 2. milník – Stavba betonového přesýpaného objektu (dvojitý tubus tlamovitého profilu): nejpozději do 365 dnů, ale ne dříve než 150 dnů po převzetí staveniště.

Plnění dle smlouvy o dílo bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastního díla do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

- 6..2 Termíny dokončení díla a/nebo závazných milníků dle této smlouvy se posouvají o počet dnů, o který celková doba případného provádění záchranného archeologického či jiného průzkumu dle článku 10, odstavce 5, bodu 10 této smlouvy na stavbě, prokazatelně bránícího zhotoviteli v provádění díla, překročí 10 kalendářních dnů.
- 6..3 Termíny dokončení díla a/nebo závazných milníků se prodlužují o počet dnů trvání nepříznivých klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým - v období a místě provádění Díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ (<http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty>) a které zároveň zhotoviteli prokazatelně brání v provádění díla v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě.
- 6..4 **Místem plnění** díla je pozemek parc. č. 1453/10, 2194/1, 2194/2, 2195, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198, 2221, 2239/1 v k. ú. Jilemnice, 1759/5, 1759/22, 1760/15, 1990, 2139/3, 2139/13, 2139/27 v k. ú. Roztoky u Jilemnice, do staničení cca 0,947 km pozemky 1755/1, 1991/1 v k. ú. Roztoky u Jilemnice.

Podrobnosti jsou určeny projektovou dokumentací.

7. Článek

Cena díla

- 7..1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, oplocení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 7..2 Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Celková cena díla, akce A, v Kč bez DPH:	21 300 543,71
Sazba DPH v %	21 %
DPH v Kč samostatně:	4 473 114,18
Celková cena díla, akce A, v Kč včetně DPH	25 773 657,89

- 7..3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 7..4 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou předmětem díla vyjma postupu dle článku 18.

8. Článek

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 8..1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka (je-li ustanoven) a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací.
- 8..2 Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. TDS a zástupce objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací, potvrzený TDS, předá TDS či zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami včetně případného zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy.
- 8..3 Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc zhotovitelem, zpravidla poslední den příslušného kalendářního měsíce, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci a potvrzené ve smyslu předchozího odstavce.

- 8..4 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla případně den podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy v případě, že bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bylo dílo objednatelem převzato s drobnými vadami či nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu, teprve po odstranění poslední z vad či nedodělků. Celkové zdanitelné plnění se tedy považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla bez vad a nedodělků ve smyslu čl. 11 odst. 2 smlouvy objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“).
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
- 8..6 Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavateli vyžádat.
- 8..7 Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavatel přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatel přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky v Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatel nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 8..8 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 8..9 **Splatnost oprávněně vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury – daňového dokladu do sídla objednatele.
- 8..10 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS, objednatele a zástupcem objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla v případě konečné faktury včetně případného zápisu odstranění vad a nedodělků dle čl. 11 odst. 2 bodu 8 smlouvy.
- q) na faktuře bude rovněž uveden tento text:
*„Předmět smlouvy je spolufinancován z dotačního programu IROP, 35. výzva – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR).
Název projektu: Cyklostezka Jilemnice – Martinice v Krkonoších – 1. část“
Reg. číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003143*

- 8..11 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, které nemají náležitosti požadované touto smlouvou.
- 8..12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 8..13 Oproti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je objednatel oprávněn započíst veškeré své nároky vůči zhotoviteli, a to i nároky dosud nesplacené, zejména nárok na smluvní pokutu či nárok na náhradu škody.
- 8..14 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit jakoukoliv pohledávku zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Článek Pojištění a zajištění závazků

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 9..1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **s pojistnou částkou ve výši 30 mil Kč na jednu pojistnou událost.** Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Zhotovitel před podpisem této smlouvy předává objednateli potvrzení o pojištění sjednaného v rozsahu dle tohoto odstavce.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli trvání pojištění i v průběhu provádění díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od vyzvání zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

- 9..2 Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na celou cenu díla v Kč včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 10 %.

Zajištění závazků za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek

- 9..3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek ve sjednaném termínu formou zádržného. Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši maximálně 10 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH. Zadržanou částku vyplatí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem. Částka ve výši 5 % ze sjednané ceny díla v Kč včetně DPH bude zhotoviteli objednatelem vyplacena bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po oboustranném potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu. Zbývající částka 5 %, případně částka ponížená, uplatní-li (započte-li) objednatel vůči této své případné pohledávky bude vyplacena zhotoviteli objednatelem na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného zaslané po uplynutí záruční doby.
- 9..4 Zádržné dle odst. 3 tohoto článku je možné kdykoliv nahradit bankovní zárukou ve stejné výši stanovené v odst. 3 tohoto článku. V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele za dodržení závazku řádného dokončení díla a/nebo povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a řádné plnění záručních podmínek, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem. Bankovní záruka musí být platná do doby trvání předmětné povinnosti. Bankovní záruka musí obsahovat min. tyto údaje:

- název a sídlo banky;
- název a sídlo zhotovitele;
- výši bankovní záruky;
- účel bankovní záruky
- označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele;
- dobu platnosti bankovní záruky.

Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání a musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- a. zhotovitel neplní své povinnosti ve vztahu k řádnému dokončení díla, nebo
- b. zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost, nebo
- c. zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž dle smlouvy bude povinen, nebo
- d. byl zjištěn úpadek zhotovitele.

Body a-b) budou v bankovní záruce obsaženy v závislosti na tom, v jaké fázi realizace smlouvy o dílo bude bankovní záruka nahrazovat zádržné.

Po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků případně po jejich odstranění dle odst. 3 tohoto článku, dojde k ponížení výše bankovní záruky na 5 % obdobně postupu dle odst. 3 tohoto článku.

10. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

10..1 Kontroly průběhu výstavby

- 10..1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla.
- 10..1.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS.
- 10..1.3 Kontrolní dny budou svolávány minimálně 1x měsíčně, případně dle výzvy TDS.
- 10..1.4 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto mimořádné kontrolní dny jsou pro zhotovitele povinné.
- 10..1.5 Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 10..1.6 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 10..1.7 V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10..1.8 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 10..1.9 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 10..1.10 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 10..1.11 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s veškerými ustanoveními ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, vztahující se k předmětu díla.
- 10..1.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

- 10..1.13 Zhotovitel je oprávněn poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci pouze za účelem realizace díla.

10..2 **Kontroly zakrývaných prací a konstrukcí**

- 10..2.1 Objednatel, TDS nebo AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to e-mailem a zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel nebo TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli nebo TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 10..2.2 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 10..2.3 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 10..2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle předchozího odstavce tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 10..2.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

10..3 **Zkoušky**

- 10..3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 10..3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 10..3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatelům požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
- 10..3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné

jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

- 10..3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 10..3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

10.4 Stavební deník

- 10..4.1 Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště v souladu s relevantními právními předpisy.
- 10..4.2 Jméno osoby, oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 10..4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli bezodkladně po vyhotovení. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 10..4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

10.5 Staveniště a jeho zařízení

- 10..5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací v termínu dle článku č. 6 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol.
- 10..5.2 Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy
- 10..5.3 Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 10..5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 10..5.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
- 10..5.6 Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 10..5.7 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Postup dle věty druhé tohoto ustanovení se neuplatní pro třetí osoby, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla nebo třetích osob, které jsou k přístupu oprávněny na základě jiného smluvního vztahu s objednatelem.

Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

- 10..5.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10..5.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 10..5.10 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody či jakémukoli jinému příslušnému orgánu veřejné moci, a to dle charakteru nálezu, a zároveň na vlastní náklady učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž při určení dalšího postupu musí být respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem veřejné moci. Zhotovitel se zavazuje pokyn objednatele k dalšímu postupu dodržet.

10..6 Použití poddodavatelů

- 10..6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (v této smlouvě také jen jako „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 10..6.2 Změnu či doplnění poddodavatele provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem objednatele zápisem do stavebního deníku. Objednatel není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
- 10..6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci pouze za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí vždy předem odsouhlasit objednatel. Objednatel je oprávněn si vyžádat před udělením souhlasu dokumenty prokazující kvalifikaci osoby v rozsahu dle zadávací dokumentace tak, jako by zhotovitel prokazoval kvalifikaci touto osobou.
- 10..6.4 V případě zjištění výše popsaných skutečností dle odstavce 6 bodu 3 a 4 tohoto článku je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění.

10..7 Harmonogram

- 10..7.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět dle závazného harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z jeho nabídky podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou v souladu se smlouvou a jsou reálně splnitelné.
- 10..7.2 Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli včetně poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
- 10..7.3 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné části díla v souladu se smlouvou a harmonogramem. Dílčí termíny harmonogramu mohou být po vzájemné dohodě

smluvních stran v průběhu realizace díla měněny. Změny v harmonogramu nezakládají nutnost dodatku ke smlouvě v případě, že nedojde k posunu termínu splnění díla. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.

10..8 Další podmínky realizace díla

- 10..8.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS, autorského dozoru projektanta a činnosti koordinátora BOZP.
- 10..8.2 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a objektu k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.
- 10..8.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat pracovní klid, tj. neprovádět na staveništi žádné činnosti v době od 22.00 hod. do 06.00 hod., a dále zcela o nedělích a ve dnech státních svátků, pokud objednatel neurčí jinak.
- 10..8.4 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje zejména podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o odpadech“) a dle právních předpisů souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 10..8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu smlouvy zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny odpadem.
- Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží a bude objednateli na základě této skutečnosti zkrácena dotace.
- 10..8.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody a klimatu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této zásady zpracuje zprávy/reports dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti ČR. Zhotovitel dále odpovídá za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
- 10..8.7 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví „Zprávu o plnění podmínek DNSH“ a po ukončení realizace doloží:
- a) porovnání plánu přípravy se skutečností, případné odchylky je nutné odůvodnit;
 - b) kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - c) dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Pokud by došlo k odchylkám oproti plánu přípravy, zhotovitel tuto skutečnost zdůrazní, popíše a odůvodní v samostatné zprávě. Zhotovitel za tímto účelem vyplní po ukončení realizace přílohu – Přejímání na oběhové hospodářství.

Pokud ve výsledku nebylo připraveno k opětovnému použití minimálně stanovené množství, lze takovou odchylku odůvodnit jen dříve neodhalenými okolnostmi nezávislými zadavatelem.

11. Článek

Předávání a přejímání prací

11..1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným dokončením a předáním díla, včetně poskytnutí nezbytné součinnosti při vydání souhlasu s užíváním stavby či kolaudačního souhlasu. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přebírá.

11..2 Předání a převzetí díla – stavby

11..2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Organizaci předávacího řízení včetně pořízení zápisu o předání a převzetí zajistí objednatel. Objednatel k předání a převzetí díla (stavby) přizve TDS, případně autorský dozor projektanta. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

11..2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram přejímek, postupuje zhotovitel podle první věty předchozího odstavce. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení řádně sjednaného předávání, nedostává se zhotovitel do prodlení s předáním díla (stavby). Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

11..2.3 Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla (stavby) nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.

11..2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla. Při předání díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

11..2.5 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (stavby) v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči (USB flash disk apod.) v počtu 2 ks, není-li stanoveno touto smlouvou jinak. Pokud nebude při převzetí díla (stavby) nebo jeho části doložena tato dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

11..2.6 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:

- zhodnocení jakosti díla (stavby) nebo event. jeho části,
- identifikační údaje o díle (stavbě) či event. jeho části,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis příloh (vč. provedených změn od dokumentace ověřené ve stavebním řízení).

11..2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla (stavby), je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto

důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění spolu s uvedením termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- 11..2.8 Pokud dílo (stavba) nebo jeho část vykazuje při převjímacím řízení drobné vady a nedodělků, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla (stavby), mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol dle odst. 11.2.6. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Na základě takového protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. O odstranění vad a nedodělků dle protokolu bude stranami vyhotoven zápis. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělků, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 11..2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převjíká a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 11..2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

12. Článek

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k dílu

- 12..1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí dokončeného díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle,
 - b) na věcech, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- 12..2 Zhotovitel nese též do doby dokončení a předání díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 12..3 Odpovědnost zhotovitele je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li, že porušení povinností, v důsledku něhož objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 12..4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

- 12..5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 12..6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. **Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).** Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

13. Článek

Odpovědnost za vady díla

- 13..1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré jeho součásti) bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích případných změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a že nedojde ke zhoršení těchto vlastností ani **po záruční dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o řádném předání a převzetí kompletního díla**, vyjma obvyklého působení nepříznivých vlivů.
- 13..2 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně (postačí i e-mailem, v takovém případě bude e-mail zaslán na adresu [redacted] přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný nárok z vadného plnění, resp. záruky za jakost. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle článku 11.
- 13..3 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- a) Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Neprodleně, nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě (nejdéle do 3 kalendářních dnů od nahlášení havárie) s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - b) Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- c) Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „havárie“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13..4 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady ve lhůtách uvedených výše a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

13..5 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

13..6 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 13..3, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající nákladům na odstranění vad (viz níže), a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

13..7 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

13..8 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti z vadného plnění a záruky za jakost vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k dílu či jeho částem. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

13..9 V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

14. Článek

Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

- 14..1 Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením oprávněně vyfakturované ceny za dílo zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 14..2 Smluvní pokuty pro případ porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo v termínech uvedených v článku 6 odst. 6..1 této smlouvy se sjednávají v následujících výších:
- a) pro termín dokončení díla činí smluvní pokuta 0,2 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data dokončení a předání díla,
 - b) pro termíny dokončení závazných milníků činí smluvní pokuta 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data dokončení daného milníku, a
 - c) pro termín nejdřívejšího zahájení milníku č. 2 činí smluvní pokuta 0,1 % ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den, o němž bylo provádění milníku č. 2 zahájeno dříve.
- 14..3 Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den za každou oznámenou vadu nebo nedodělek, u níž je v prodlení s jejím odstraněním, a to až do doby jejího odstranění.
- 14..4 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14..5 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP činí 5.000 Kč.
- 14..6 Smluvní pokuta za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště, pokud není odstraněno do konce pracovní doby činí 5.000 Kč.
- 14..7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 14..8 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech činí 2.000 Kč za každý případ neomluvené neúčasti.
- 14..9 Smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny, a to za každý i započatý den nesplnění povinnosti.
- 14..10 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 14..11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den nevyklizení staveniště.
- 14..12 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14..13 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

- 14..14 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 14..15 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

15. Článek

Odstoupení od smlouvy

- 15..1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že insolvenční soud rozhodl o tom, že je zhotovitel v úpadku.
- 15..2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) zastavení či přerušení prací na více jak než 5 dní na stavbě v rozporu s harmonogramem prací;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle 10.1.6. ve spojení s 10.1.7 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, přičemž zhotovitel byl objednatelem vyzván ke zjednání nápravy, je-li náprava možná a byla mu k tomu objednatelem stanovená přiměřená lhůta a zhotovitel ani v této lhůtě nápravu nezjednal;
 - f) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce v zadávacím řízení vědomě nepravdivé údaje;
 - g) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
- 15..3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 15..4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 15..5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupeného materiálu dodaného na místo plnění, který se má stát vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností objednatele. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr snížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 15..6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o

smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

- 15..7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky ve smyslu odst. 5 tohoto článku do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, případně dle dohody smluvních stran. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

16. Článek

Další ujednání

- 16..1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 16..2 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatel. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 16..3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16..4 Zhotovitel při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také své poddodavatele.
- 16..5 Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

- 16..6 Zhotovitel na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

17. Článek

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 17..1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 17, odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 17, odst. 4 této smlouvy.
- 17..2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní ode dne, kdy měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 17 odst. 4 a 5 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 17..3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- d) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
 - e) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
 - f) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
- 17..4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:
- a) - přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
 - b) - válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
 - c) - povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
 - d) - nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.
- 17..5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 17..6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 17..7 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 90 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

18. Článek Změny díla

- 18..1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
- 18..2 Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:
- a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce. Nárok na úhradu za tyto práce bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy);
 - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín dokončení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 18.3. této smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že v důsledku změn nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla, dohodnou se strany ve změnovém listu též na prodloužení termínu v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn. Nárok na úhradu za tyto práce a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst. 18.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy).
- 18..3 Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy použité pro sestavení rozpočtu nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.
- 18..4 Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dotačními podmínkami.
- 18..5 O změnách této smlouvy je oprávněna za objednatele rozhodovat rada města, a v případě změn dle odst. 18.2. též TDS.

19. Článek Závěrečná ustanovení

- 19..1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně závaznými předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat

(nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

- 19..2 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, e-mailem na kontaktní osobu ve věcech smluvních, případně prostřednictvím datové schránky a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou, při doručení prostřednictvím e-mailu a prostřednictvím datové schránky dnem doručení datové zprávy či e-mailu nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 19..3 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v elektronické či listinné podobě.
- 19..4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dnem podpisu druhé ze smluvních stran) a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
- 19..5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 19..6 Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF a bude podepsaná uznávaným elektronickým podpisem smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 19..7 Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 19..8 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce, smluvní strany jsou tak povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv či pachtu závodu apod. byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 19..9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 19..10 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele v Jilemnici

Za zhotovitele v Hradci Králové

.....
Bc. David Hlaváč
starosta

.....
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0924
Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.09.2024

Zadavatel: IČ:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE DIČ:
Uchazeč: IČ: 421 96 868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 300 543,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 300 543,71	4 473 114,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 773 657,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0924

Stavba:

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Místo:

Datum:

06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:



Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 300 543,71	25 773 657,89
01	úsek v k.ú. Jilemnice	7 751 901,45	9 379 800,75
01CJ	Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice	6 647 211,67	8 043 126,12
02CJ	Přímé výdaje na doprovodnou část - Jilemnice	986 593,78	1 193 778,47
03CJ	Nepřímé náklady - Jilemnice	118 096,00	142 896,16
02	úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek	9 358 731,58	11 324 065,21
01TP	Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek	1 136 166,24	1 374 761,15
02TP	Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek	3 817 446,24	4 619 109,95
03TP	Nepřímé náklady - Tlamový propustek	3 932 806,24	4 758 695,55
04TP	Nezpůsobilé výdaje - Tlamový propustek	472 312,86	571 498,56
03	úsek v k.ú. Jilemnice - VRN	507 600,00	614 196,00
01VR	Přímé výdaje na hlavní část - VRN	190 500,00	230 505,00
02VR	Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN	25 000,00	30 250,00
03VR	Neřímé náklady - VRN	292 100,00	353 441,00
04	úsek v k.ú. Martinice	3 466 110,68	4 193 993,92
01CM	Přímé výdaje na hlavní část - Martinice	3 402 363,17	4 116 859,44
02CM	Přímé výdaje na doprovodnu část - Martinice	7 387,21	8 938,52
03CM	Nepřímé náklady - Martinice	56 360,30	68 195,96
05	úsek v k.ú. Martinice - VRN	216 200,00	261 602,00
01VR	Přímé výdaje na hlavní část - VRN	80 000,00	96 800,00
02VR	Přímé výdaje na doprovodnouí část - VRN	19 500,00	23 595,00
03VR	Nepřímé náklady - VRN	116 700,00	141 207,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
01 - úsek v k.ú. Jilemnice
Soupis:
01CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 647 211,67	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 647 211,67	21,00%	1 395 914,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 043 126,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 01 - úsek v k.ú. Jilemnice

Soupis: 01CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 647 211,67
--------------------------	--------------

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt:

01 - úsek v k.ú. Jilemnice

Soupis:

01CJ - Přímé výdaje na hlavní část - Jilemnice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:



Uchazeč:

M - SILNICE a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 647 211,67

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	630,000		
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	140,000		
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	140,000		
4	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	145,000		
5	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	145,000		
6	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,000		
7	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000		
VV			panely				
VV			20		20,000		
8	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	29,000		
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000		
VV			2*6		12,000		
10	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	75,000		
VV			15+60		75,000		
11	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	6,000		
12	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	56,000		
13	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	24,000		
VV			4*6		24,000		
14	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	40,000		
VV			sjezdy				
VV			40		40,000		
15	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	40,000		
16	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000		
17	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000		
18	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 226,000		
19	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	104,500		
VV			plyn				
VV			1,5*6*2		18,000		
VV			ostatní				
VV			173*1*0,5		86,500		
VV			Součet		104,500		
20	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	853,000		




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	161,830		
	VV		drena cyklo				
	VV		165*0,4*0,6		39,600		
	VV		drena cylko				
	VV		20*0,4*0,6		4,800		
	VV		propustek 400				
	VV		25*0,8*0,8		16,000		
	VV		propustek 600				
	VV		95*0,9*0,9		76,950		
	VV		propustek 800				
	VV		9*1,2*1,2		12,960		
	VV		základy				
	VV		0,6*0,8*1,2*20		11,520		
	VV		Součet		161,830		
22	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 119,330		
	VV		104,5+853+161,83		1 119,330		
23	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 255,330		
	VV		výkopek				
	VV		1119,33-179		940,330		
	VV		odvoz přebytečné ornice				
	VV		2100*0,15		315,000		
	VV		Součet		1 255,330		
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 613,330		
	VV		výkopek				
	VV		1119,33		1 119,330		
	VV		179		179,000		
	VV		odvoz přebytečné ornice				
	VV		2100*0,15		315,000		
	VV		Součet		1 613,330		
25	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	179,000		
26	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	18,000		
	VV		za úhlovou zeď				
	VV		18		18,000		
27	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	36,000		
	VV		18*2 'Přepočtené koeficientem množství		36,000		
28	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	964,000		
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	964,000		
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	19,280		
	VV		964*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,280		
31	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně - 45MPa	m2	2 282,000		
D 2 Zakládání							
32	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	277,500		
	VV		185*1,5		277,500		
33	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	328,699		
	VV		277,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		328,699		
34	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	165,000		
	VV		cyklo				
	VV		165		165,000		
35	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	20,000		
36	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 249,000		
37	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	2 663,941		
	VV		2249*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		2 663,941		
38	K	27431381XF4	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XF4 vč. lože ze štěrkopísku	m3	11,520		
	VV		základy k propustkům				
	VV		0,6*0,8*1,2*20		11,520		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	327122113	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1000 mm	m	22,000		
40	K	327122213	Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 1000 mm	kus	2,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							
41	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	39,140		
	VV		drena cylko		13,200		
	VV		165*0,4*0,2				
	VV		drena cylko		1,600		
	VV		20*0,4*0,2				
	VV		propustek 400		4,000		
	VV		25*0,8*0,2				
	VV		propustek 600		17,100		
	VV		95*0,9*0,2				
	VV		propustek 800		3,240		
	VV		9*1,2*0,3		39,140		
	VV		Součet				
42	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	25,940		
	VV		drena cylko		1,600		
	VV		20*0,4*0,2				
	VV		propustek 400		4,000		
	VV		25*0,8*0,2				
	VV		propustek 600		17,100		
	VV		95*0,9*0,2				
	VV		propustek 800		3,240		
	VV		9*1,2*0,3		25,940		
	VV		Součet				
D 5 Komunikace pozemní							
43	K	56421101R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku f 0-32 plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	44,000		
	VV		signální, varovné				
	VV		14		14,000		
	VV		odpočívadlo				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		44,000		
44	K	56425111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrti f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 837,000		
	VV		celé				
	VV		2015		2 015,000		
	VV		odpočet sjezdů				
	VV		-178		-178,000		
	VV		Součet		1 837,000		
45	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	44,000		
	VV		signální, varovné				
	VV		14		14,000		
	VV		odpočívadlo				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		44,000		
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 071,000		
	VV		celé				
	VV		2249		2 249,000		
	VV		odpočet sjezdů				
	VV		-178		-178,000		
	VV		Součet		2 071,000		
47	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	1 874,000		
	VV		1898		1 898,000		
	VV		zámkovka na plyn				
	VV		-24		-24,000		
	VV		Součet		1 874,000		
48	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	292,000		
49	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 757,000		
	VV		1781		1 781,000		
	VV		zámkovka na plyn				
	VV		-24		-24,000		
	VV		Součet		1 757,000		
50	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 757,000		
	VV		1781		1 781,000		
	VV		zámkovka na plyn				
	VV		-24		-24,000		
	VV		Součet		1 757,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	59451111R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu tl. 100mm, štěrkopísek tl. 100mm	m2	59,000		
	VV		vyspávané cem. maltou MC 25, XF4, štěrkopískové lože tl. 100				
	VV		59		59,000		
52	M	5838108	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm)	t	29,500		
	VV		59*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		29,500		
53	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	68,000		
	VV		signální, varovné				
	VV		14		14,000		
	VV		odpočívadlo				
	VV		30		30,000		
	VV		zámkovka na plyn				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		68,000		
54	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	55,620		
	VV		odpočívadlo				
	VV		30		30,000		
	VV		zámkovka na plyn				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		54,000		
	VV		54*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		55,620		
55	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	14,420		
	VV		signální, varovné				
	VV		14		14,000		
	VV		14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,420		
D 8			Trubní vedení				
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	15,000		
	VV		dešťovka				
	VV		15		15,000		
57	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	25,000		
	VV		propustky				
	VV		8+7+10		25,000		
58	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	25,375		
	VV		25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		25,375		
59	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	95,000		
	VV		95		95,000		
60	M	28617272	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12	m	96,425		
	VV		95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		96,425		
61	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	9,000		
	VV		propustek				
	VV		9		9,000		
62	M	28617273	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN12	m	9,135		
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
63	K	911000001	Přemístění svislých dopravních značek	kus	2,000		
64	K	911000002	D + M Sklopné zátarasy (vč. patky, kotvení) dle přílohy	kus	1,000		
65	K	911000003	D + M Svislých dopravních značek (základ, sloup, uchycení, značka)	kus	5,000		
66	K	911000004	Tůňka pro obojživelníky (hloubka min. 600mm, plocha 9m2 se stojatou vodou) dle přílohy	kus	1,000		
67	K	911000005	Uliční vpusti (dno, skruže, koš, litina. mříž, napojení na potrubí)	soubor	4,000		
68	K	911000006	D + M kolostavů, laviček, stolu, nástěnka dle přílohy	soubor	1,000		
69	K	911000008	Výsadba stromů třešeň ptačí vč. dvouleté péče, zálivky, kůlu 3ks a ochrany proti okusu, nátěr kmenů proti tepelnému poškození kůry (Prunus avium, výsadbová velikost 12/14 cm obvod kmínku)	soubor	16,000		
70	K	911000009	Výsadba stromů dub letní vč. dvouleté péče, zálivky, kůlu 3ks a ochrany proti okusu, nátěr kmenů proti tepelnému poškození kůry (Quercus robur, výsadbová velikost 12/14 cm obvod kmínku)	soubor	8,000		
71	K	911000010	Revizní šachta DN 1000 hl. 2m, plný betonový poklop nepojezdový	soubor	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	22,000		
73	M	5534203	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 3 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm, v. 1,3	m	22,000		
74	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	18,000		
	VV		V4 krajnice cyklo u obrubníku				
	VV		18		18,000		
75	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	58,000		
	VV		souběh samotný a s BUS zastávkou				
	VV		29*2		58,000		
76	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	9,860		
	VV		58*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		9,860		
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,000		
	VV		HRANA SOUBEHU SE SILNICÍ + SJEZDY A PŘEJEZDOVÝ OBRUBNÍK				
	VV		69		69,000		
	VV		snížený				
	VV		69		69,000		
	VV		náběhový				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		148,000		
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	70,380		
	VV		HRANA SOUBEHU SE SILNICÍ + SJEZDY A PŘEJEZDOVÝ OBRUBNÍK				
	VV		69		69,000		
	VV		69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,380		
79	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	70,380		
	VV		snížený				
	VV		69		69,000		
	VV		69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,380		
80	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,200		
	VV		náběhový				
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200		
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000		
	VV		KOLEM CYKLO A VODÍCÍ LINIE DO KM 0,180 poslední lampa u tunelu				
	VV		175		175,000		
	VV		odpočívadlo				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		200,000		
82	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	204,000		
	VV		200*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		204,000		
83	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	58,000		
	VV		souběh a ZÚ				
	VV		58		58,000		
84	K	919413121	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	1,000		
85	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	58,000		
	VV		souběh a ZÚ				
	VV		58		58,000		
86	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	12,000		
	VV		12		12,000		
87	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	9,000		
D 997 Přesun sutě							
88	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	144,125		
89	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 594,250		
	VV		144,125*18 'Přepočtené koeficientem množství		2 594,250		
90	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	144,125		
D 998 Přesun hmot							
91	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčním	t	2 638,657		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
92	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	2 638,657			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
93	K	741000001	Stožár K6 - 133/89/60 pozink ocel 6m bez výložníku S1.1, S1.2, svítidlo T25 DN10/730 (2991 lm, 23W)	soubor	2,000			
94	K	7410000011	Stožár U8 - 159/133/114 8m pozink ocel výložník J1 2m S2.1, S2.2, svítidlo T25 /730 (9412 lm, 70W)	soubor	2,000			
95	K	7410000012	Stožár U8 - 159/133/114 8m pozink ocel výložník J1 2m S3, svítidlo T25 DM31 BL1/730 (7736 lm, 77,5W)	soubor	1,000			
96	K	7410000013	Stožár U8 - 159/133/114 8m pozink ocel výložník J1 1,5m S4.1, S4.2 svítidlo T25 DN11 /730 (4707 lm, 34W)	soubor	2,000			
97	K	741000002	Svítidla S5.1 + S5.2 na stropě tubusu 1400 lm, 15W, 3000K, IK10	soubor	2,000			
98	K	741000003	Základ pro sloup, roura, beton, výkop jamy	soubor	7,000			
99	K	741000004	Kabel - CYKY - J 4x10 mm2 V KORUG CHRÁNIČCE 50/41 (vč. chráničky)	mb	370,000			
100	K	741000005	Kabel - CYKY - J 3,5x10 mm2 V KORUG CHRÁNIČCE 50/41 SVĚTLA DO TUBUSU (vč. chráničky)	mb	28,000			
101	K	741000006	Výkop volný terén	mb	398,000			
102	K	741000007	Uzemnění stožárů páska FeZn 30 x 4mm	mb	370,000			
103	K	741000008	Rozvaděč	soubor	1,000			
104	K	741000009	Revize elektro, dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
01 - úsek v k.ú. Jilemnice
Soupis:
02CJ - Přímé výdaje na doprovodnou část - Jilemnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			986 593,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	986 593,78	21,00%	207 184,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 193 778,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 01 - úsek v k.ú. Jilemnice

Soupis: 02CJ - Přímé výdaje na doprovodnou část - Jilemnice

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	986 593,78
HSV - Práce a dodávky HSV	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 01 - úsek v k.ú. Jilemnice

Soupis: 02CJ - Přímé výdaje na doprovodnou část - Jilemnice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

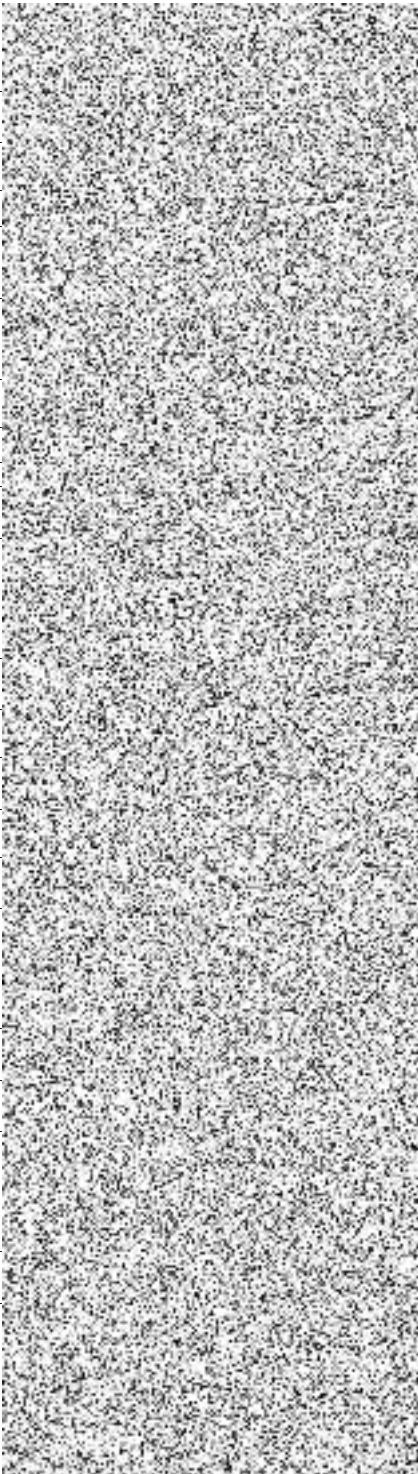
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

986 593,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		2	Zakládání				
1	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	10,000		
	VV		ochrana VTL plynu				
	VV		10		10,000		
2	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	5,000		
	VV		20*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,000		
D		5	Komunikace pozemní				
3	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 142,000		
	VV		chem úprava aktivní zóny				
	VV		2142		2 142,000		
4	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy vápna	t	107,100		
	VV		2142*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		107,100		
5	K	56421101R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku f 0-32 plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	35,000		
	VV		bus nástupiště				
	VV		28		28,000		
	VV		pás š.500 mm u BUS obrubníku				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		35,000		
6	K	56425111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrti f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	178,000		
	VV		sjezdy				
	VV		178		178,000		
7	K	56427111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	18,000		
	VV		zesílené sjezdy				
	VV		18		18,000		
8	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	35,000		
	VV		bus nástupiště				
	VV		28		28,000		
	VV		pás š.500 mm u BUS obrubníku				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		35,000		
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	178,000		
10	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	178,000		
	VV		asfaltové sjezdy k domům a sjezdy na trase				
	VV		158		158,000		
	VV		přejezdy v lese				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		178,000		
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	137,000		
	VV		bus nástupiště				
	VV		28		28,000		
	VV		pás š.500 mm u BUS obrubníku				
	VV		7		7,000		
	VV		sjezdy				
	VV		102		102,000		
	VV		Součet		137,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	133,900		
	VV		bus nástupiště				
	VV		28		28,000		
	VV		sjezdy				
	VV		102		102,000		
	VV		Součet		130,000		
	VV		130*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		133,900		
13	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	7,210		
	VV		pás š.500 mm u BUS obrubníku				
	VV		7		7,000		
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	911000007	Posun číchačky (zemní práce, úprava potrubí, obsyp, záyp, hutnění)	soubor	1,000		
15	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	42,000		
	VV		bus zastávka				
	VV		3*14		42,000		
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000		
	VV		opravované 3 ks sjezdů				
	VV		23		23,000		
	VV		2 sjezdy do lesa				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		35,000		
17	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,700		
	VV		opravované 3 ks sjezdů				
	VV		23		23,000		
	VV		2 sjezdy do lesa				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		35,000		
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000		
	VV		sjezdy				
	VV		9+14+12		35,000		
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	35,700		
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
20	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	14,000		
21	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,040		
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
22	M	CSB.0019978.URS	Obrubník HK přímý (290/1006/400)	kus	14,280		
	VV		14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280		
D		998	Přesun hmot				
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	406,683		
24	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	406,683		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
01 - úsek v k.ú. Jilemnice
Soupis:
03CJ - Nepřímé náklady - Jilemnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 096,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 096,00	21,00%	24 800,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	142 896,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt: 01 - úsek v k.ú. Jilemnice
Soupis: **03CJ - Nepřímé náklady - Jilemnice**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		118 096,00
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
997 - Přesun sutě		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 01 - úsek v k.ú. Jilemnice

Soupis: 03CJ - Nepřímé náklady - Jilemnice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 096,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 037,328		
VV			(1119,33-179-292)*1,6		1 037,328		
D		997	Přesun sutě				
2	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	135,860		
3	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,335		
4	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,930		
VV			144,125		144,125		
VV			-135,86		-135,860		
VV			-3,335		-3,335		
VV			Součet		4,930		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek
Soupis:
01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 136 166,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 136 166,24	21,00%	238 594,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 374 761,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: **01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 136 166,24
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: 01TP - Přímé výdaje hlavní část - Tlamový propustek

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

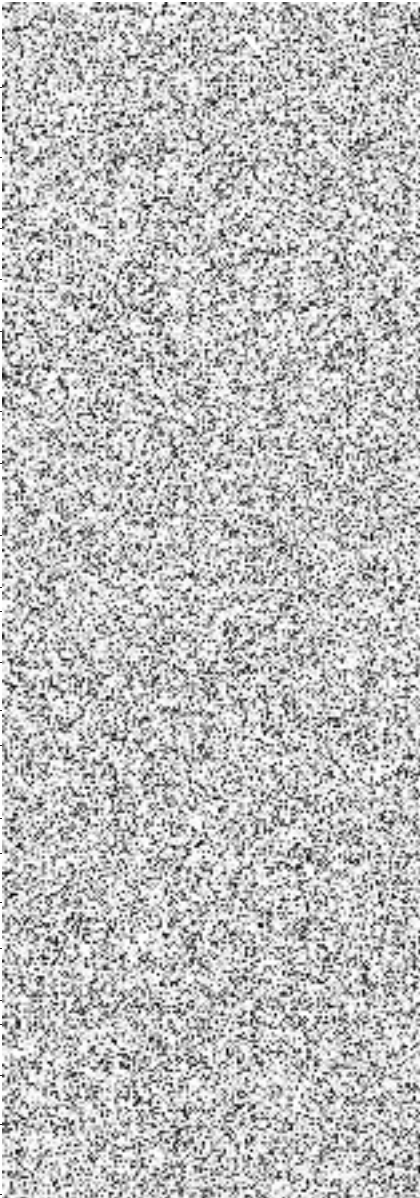
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 136 166,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	184,000		
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	175,000		
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	166,000		
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	168,000		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 120,000		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 519,000		
VV			1120		1 120,000		
VV			399		399,000		
VV			Součet		1 519,000		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	399,000		
VV			69+330		399,000		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,000		
VV			OCHRANNÝ NÁSYP Z PROPUSTNÉHO MATERIÁLU				
VV			(1,9+0,6+1,9)*22,5		99,000		
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	198,000		
VV			99*2 'Přepočtené koeficientem množství		198,000		
D		2	Zakládání				
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	37,000		
D		997	Přesun sutě				
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	280,945		
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 057,010		
VV			280,945*18 'Přepočtené koeficientem množství		5 057,010		
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	280,945		
D		998	Přesun hmot				
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	283,158		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek
Soupis:
02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 817 446,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 817 446,24	21,00%	801 663,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 619 109,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: 02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací		3 817 446,24
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
4 - Vodorovné konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt:

02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis:

02TP - Přímé výdaje doprovodná část - Tlamový propustek

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 817 446,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	560,000		
	VV		tunel + výkopy základů				
	VV		70*16/2		560,000		
D		2	Zakládání				
2	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	37,500		
	VV		tunel				
	VV		25*3/2		37,500		
3	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	7,800		
	VV		Vyrovňovací ŽB deska tl. do 0,3 m - u vrcholu tlamy				
	VV		0,75*8		6,000		
	VV		Ochranná ŽB deska tl. 60 mm - pod kce silnice				
	VV		1,2*8		9,600		
	VV		Součet		15,600		
	VV		15,6/2		7,800		
4	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	21,696		
	VV		2x deska mezi PREFA tlamový profil				
	VV		(3,2*22,6*0,3)*2/2		21,696		
5	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	1,170		
	VV		Vyrovňovací ŽB deska tl. do 0,3 m - u vrcholu tlamy				
	VV		0,75*8*0,15		0,900		
	VV		Ochranná ŽB deska tl. 60 mm - pod kce silnice				
	VV		1,2*8*0,15		1,440		
	VV		Součet		2,340		
	VV		2,34/2		1,170		
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,075		
	VV		pod drenáže				
	VV		(0,25*0,8*22,5)*2		9,000		
	VV		Betonový práh š. 0,5 m před a za tlamou ukončení dlažby z lom kamene				
	VV		(3,5*0,5*0,9)*2		3,150		
	VV		Součet		12,150		
	VV		12,15/2		6,075		
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	18,000		
	VV		pod drenáže				
	VV		(0,8*22,5)*2/2		18,000		
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	18,000		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
9	K	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,290		
	VV		0,33*26/2		4,290		
10	K	348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	m2	15,600		
	VV		1,2*26/2		15,600		
11	K	348351311	Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění	m2	15,600		
12	K	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	t	0,644		
	VV		8,58*0,15/2		0,644		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	m	26,000		
	VV		13*4/2		26,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
14	K	45831111X	Výplňové klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutněného po vrstvách vč. bednění	m3	41,400		
	VV		Přechodový klín z mezerovitého betonu		69,000		
	VV		2*(1,5*23)				
	VV		břeh v tunelu pod dlažbu z lomového kamene		13,800		
	VV		0,6*23		82,800		
	VV		Součet		41,400		
	VV		82,8/2				
15	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	3,500		
	VV		tunel uvnitř, opatření pro přechod obojživelníků fr. 63-125/250		3,500		
	VV		35*0,2/2				
	D	5	Komunikace pozemní				
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	92,000		
	VV		184/2		92,000		
17	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	87,500		
	VV		175/2		87,500		
18	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	83,000		
	VV		166/2		83,000		
19	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	84,000		
	VV		168/2		84,000		
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	83,000		
	VV		166/2		83,000		
21	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	84,000		
	VV		168/2		84,000		
22	K	59451111R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu tl. 100mm, štěrkopísku tl. 100mm	m2	52,000		
	VV		vyspávané cem. maltou MC 25, XF4, štěrkopískové lože tl. 100		52,000		
	VV		čela				
	VV		104/2				
23	M	5838108	kámen lomový upravený štípaný (63/125)	t	26,000		
	VV		52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
24	K	628612101	Nátěr žlabu mostních římς epoxipolyamidový základní a vrchní	m2	39,000		
	VV		39*2/2		39,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	K	911000001	D + M tubusů tunelu (naložení, doprava, osazení) - tlamový propustek dle řezu mimoúrovňového křížení D.1.2.3.1	soubor	1,000		
26	K	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římς bez výplně	m	6,600		
	VV		13,2/2		6,600		
27	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,500		
	VV		bourání stávajících vrstev pro tunel		22,500		
	VV		7,5*6/2				
28	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	65,000		
	VV		13*5*2/2		65,000		
29	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 900,000		
	VV		65*60 'Přepočtené koeficientem množství		3 900,000		
30	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	65,000		
31	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	8,000		
	VV		16/2		8,000		
32	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	65,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 300,000		
	VV		65*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 300,000		
34	K	OST001	Slepení zaizolování dílů tlamy systémem SIPLAST	m2	7,000		
	VV		14/2		7,000		
	D	997	Přesun sutě				
35	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	54,688		
	VV		109,375/2		54,688		
36	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	28,865		
	VV		57,730/2		28,865		
37	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,920		
	VV		280,945		280,945		
	VV		-109,375		-109,375		
	VV		-57,73		-57,730		
	VV		Součet		113,840		
	VV		113,84/2		56,920		
	D	998	Přesun hmot				
38	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	243,000		
	VV		243		243,000		
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	87,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
40	K	711612101	Provedení hydroizolace podchodů za studena penetračním lakem	m2	190,000		
	VV		380/2		190,000		
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,068		
	VV		190*0,00036 'Přepočtené koeficientem množství		0,068		
42	K	711642567	Provedení hydroizolace podchodů přitavením pásu NAIP	m2	190,000		
	VV		380/2		190,000		
43	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	231,990		
	VV		190*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		231,990		
44	K	711691272	Provedení hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie	m2	190,000		
	VV		380/2		190,000		
45	M	69311179	geotextilie PP s ÚV stabilizací 700g/m2	m2	221,445		
	VV		190*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		221,445		
46	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,539		
47	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,539		

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

1Č:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

1Č:

421 96 868

DÍČ:

CZ42196868

Projektant:

lč:

DIČ:

Zpracovatel:

lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 932 806,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 932 806,24	21,00%	825 889,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 758 695,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: **03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 932 806,24
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: 03TP - Nepřímé náklady - Tlamový propustek

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 932 806,24

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	560,000	
VV			tunel + výkopy základů			
VV			70*16/2		560,000	
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 153,600	
VV			1120		1 120,000	
VV			-399		-399,000	
VV			Mezisoučet		721,000	
VV			721*1,6		1 153,600	
D		2	Zakládání			
3	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	37,500	
VV			tunel			
VV			25*3/2		37,500	
4	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	7,800	
VV			Vyrovnávací ŽB deska tl. do 0,3 m - u vrcholu tlamy			
VV			0,75*8		6,000	
VV			Ochranná ŽB deska tl. 60 mm - pod kce silnice			
VV			1,2*8		9,600	
VV			Součet		15,600	
VV			15,6/2		7,800	
5	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	21,696	
VV			2x deska mezi PREFA tlamový profil			
VV			(3,2*22,6*0,3)*2/2		21,696	
6	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	1,170	
VV			Vyrovnávací ŽB deska tl. do 0,3 m - u vrcholu tlamy			
VV			0,75*8*0,15		0,900	
VV			Ochranná ŽB deska tl. 60 mm - pod kce silnice			
VV			1,2*8*0,15		1,440	
VV			Součet		2,340	
VV			2,34/2		1,170	
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,075	
VV			pod drenáže			
VV			(0,25*0,8*22,5)*2		9,000	
VV			Betonový práh š. 0,5 m před a za tlamou ukončení dlažby z lom kamene			
VV			(3,5*0,5*0,9)*2		3,150	
VV			Součet		12,150	
VV			12,15/2		6,075	
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	18,000	
VV			pod drenáže			
VV			(0,8*22,5)*2/2		18,000	
9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	18,000	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			
10	K	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	m3	4,290	
VV			0,33*26/2		4,290	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	m2	15,600		
	VV		1,2*26/2		15,600		
12	K	348351311	Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění	m2	15,600		
13	K	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505	t	0,644		
	VV		8,58*0,15/2		0,644		
14	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	26,000		
	VV		13*4/2		26,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				
15	K	45831111X	Výplňové klíny za opěrou z betonu stabilizačního SC II hutněného po vrstvách vč. bednění	m3	41,400		
	VV		Přechodový klín z mezerovitého betonu				
	VV		2*(1,5*23)		69,000		
	VV		běh v tunelu pod dlažbu z lomového kamene				
	VV		0,6*23		13,800		
	VV		Součet		82,800		
	VV		82,8/2		41,400		
16	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	3,500		
	VV		tunel uvnitř, opatření pro přechod obojíživelníků fr. 63-125/250				
	VV		35*0,2/2		3,500		
D 5			Komunikace pozemní				
17	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	92,000		
	VV		184/2		92,000		
18	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm	m2	87,500		
	VV		175/2		87,500		
19	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	83,000		
	VV		166/2		83,000		
20	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	84,000		
	VV		168/2		84,000		
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	83,000		
	VV		166/2		83,000		
22	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	84,000		
	VV		168/2		84,000		
23	K	59451111R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu tl. 100mm, štěrkopísku tl. 100mm	m2	52,000		
	VV		vyspávané cem. maltou MC 25, XF4, štěrkopískové lože tl. 100				
	VV		čela				
	VV		104/2		52,000		
24	M	5838108	kámen lomový upravený štípaný (63/125)	t	26,000		
	VV		52*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		26,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
25	K	628612101	Nátěr žlabu mostních říms epoxipolyamidový základní a vrchní	m2	39,000		
	VV		39*2/2		39,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	911000001	D + M tubusů tunelu (naložení, doprava, osazení) - tlamový propustek dle řezu mimoúrovňového křížení D.1.2.3.1	soubor	1,000		
27	K	911334111	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně	m	6,600		
	VV		13,2/2		6,600		
28	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,500		
	VV		bourání stávajících vrstev pro tunel				
	VV		7,5*6/2		22,500		
29	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatíženými do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m	m2	65,000		
	VV		13*5*2/2		65,000		
30	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 900,000		
	VV		65*60 'Přepočtené koeficientem množství		3 900,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížením do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	65,000		
32	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	8,000		
VV		16/2			8,000		
33	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	65,000		
34	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 300,000		
VV		65*20 'Přepočtené koeficientem množství			1 300,000		
35	K	OST001	Slepení zaizolování dílů tlamy systémem SIPLAST	m2	7,000		
VV		14/2			7,000		
D		997	Přesun sutě				
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	54,688		
VV		109,375/2			54,688		
37	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	28,865		
VV		57,73/2			28,865		
38	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,920		
VV		280,945			280,945		
VV		-109,375			-109,375		
VV		-57,73			-57,730		
VV		Součet			113,840		
VV		113,84/2			56,920		
D		998	Přesun hmot				
39	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	t	243,000		
VV		243			243,000		
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	87,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
41	K	711612101	Provedení hydroizolace podchodů za studena penetračním lakem	m2	190,000		
VV		380/2			190,000		
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,068		
VV		190*0,00036 'Přepočtené koeficientem množství			0,068		
43	K	711642567	Provedení hydroizolace podchodů přitavením pásu NAIP	m2	190,000		
VV		380/2			190,000		
44	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	231,990		
VV		190*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			231,990		
45	K	711691272	Provedení hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie	m2	190,000		
VV		380/2			190,000		
46	M	69311179	geotextilie PP s ÚV stabilizací 700g/m2	m2	221,445		
VV		190*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			221,445		
47	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	1,539		
48	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	1,539		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek
Soupis:
04TP - Nezpůsobilé výdaje - Tlamový propustek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			472 312,86
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	472 312,86	21,00%	99 185,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	571 498,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: **04TP - Nezpůsobilé výdaje - Tlamový propustek**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	472 312.86
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 02 - úsek v k.ú. Jilemnice - Tlamový propustek

Soupis: 04TP - Nezpůsobilé výdaje - Tlamový propustek

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

472 312,86

D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 5			Komunikace pozemní			
1	K	59451111R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu tl. 100mm, štěrkopísku tl. 100mm	m2	155,300	
VV			vyspávané cem. maltou MC 25, XF4, štěrkopískové lože tl. 100			
VV			tunel (venku, uvnitř)			
VV			4,5*27	121,500		
VV			dlažba z lomového kamene skladba stejná			
VV			2,6*13	33,800		
VV			Součet	155,300		
2	M	5838108	kámen lomový upravený štípaný (63/125)	t	77,650	
VV			155,3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	77,650		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
3	K	OST002	Berma š. 0,6m (zemní práce, hutnění)	m2	13,800	
VV			okraj tunelu cesta pro zvířata bez dlažby hlína			
VV			0,6*23	13,800		
D 998			Přesun hmot			
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,641	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN
Soupis:
01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:





Cena bez DPH			190 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 500,00	21,00%	40 005,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			230 505,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN

Soupis: **01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	190 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN

Soupis: 01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

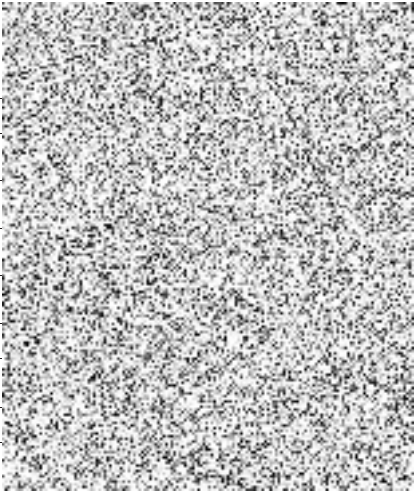
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

190 500,00

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí, kopané sondy	soubor	1,000	
2	K	012002000	Geodetické práce, vytyčená stavby, práce při stavbě	soubor	1,000	
D VRN3			Zařízení staveniště			
3	K	035103002	Pronájem ploch, komunikace II třídy překop pro tunel	soubor	1,000	
D VRN6			Územní vlivy			
4	K	060001000	Územní vlivy, provizorní cesta	soubor	1,000	
D VRN7			Provozní vlivy			
5	K	090001000	Ostatní náklady - DIO	soubor	1,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN
Soupis:
02VR - Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 000,00	21,00%	5 250,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			30 250,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN
Soupis: 02VR - Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN

Soupis: 02VR - Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN7			Provozní vlivy					
1	K	070001000	Provozní vlivy (přístup IZS a pod.)	soubor	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN
Soupis:
03VR - Neřímé náklady - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO JILEMNICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			292 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	292 100,00	21,00%	61 341,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	353 441,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN

Soupis: **03VR - Neřímé náklady - VRN**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	292 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 03 - úsek v k.ú. Jilemnice - VRN

Soupis: 03VR - Neřímé náklady - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:


Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 100,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
4	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000		
5	K	034303000	Dopravní značení dočasné, objízdná trasa	soubor	1,000		
6	K	034403000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000		
7	K	035103002	Pronájem ploch, komunikace II třídy překop pro tunel	soubor	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000		
9	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		
D		VRN6	Územní vlivy				
10	K	060001000	Územní vlivy, provizorní cesta	soubor	1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				
11	K	090001000	Ostatní náklady - DIO	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
04 - úsek v k.ú. Martinice
Soupis:
01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 402 363,17	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 402 363,17	21,00%	714 496,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 116 859,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 04 - úsek v k.ú. Martinice

Soupis: 01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 402 363,17
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
4 - Vodorovné konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
8 - Trubní vedení		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
762 - Konstrukce tesařské		
783 - Dokončovací práce - nátěry		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt:

04 - úsek v k.ú. Martinice

Soupis:

01CM - Přímé výdaje na hlavní část - Martinice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Ing. Jan KORDA,
č.p. 103, ČISTÁ U
HOREK, 512 35

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

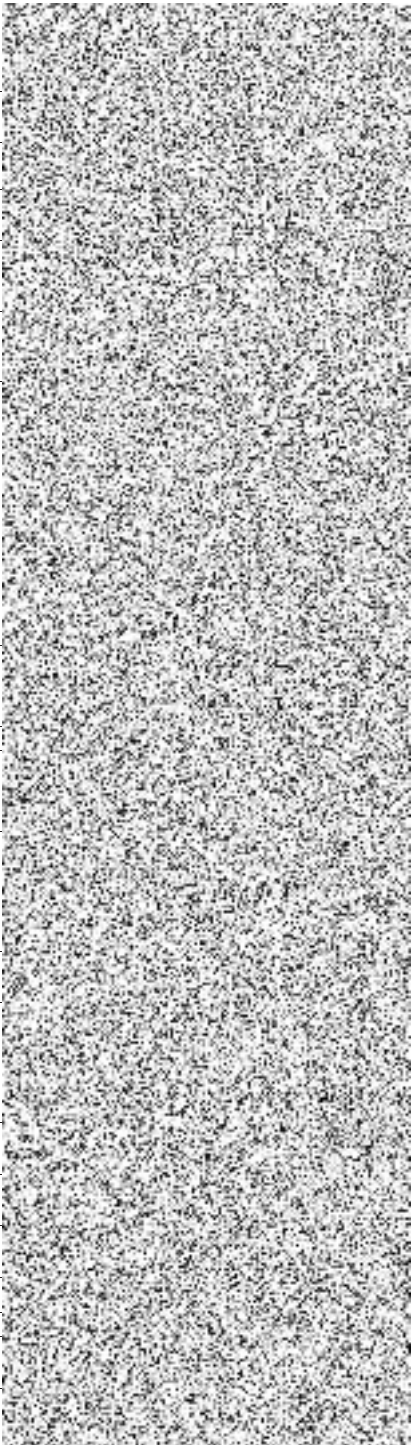
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 402 363,17

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	33,000		
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	33,000		
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 455,000		
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	546,000		
5	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	89,252		
	VV		propustek			9,000	
	VV		10*0,9*1				
	VV		trativod 200			10,800	
	VV		30*0,6*0,6				
	VV		trativod 150			50,100	
	VV		167*0,5*0,6				
	VV		lávka			18,200	
	VV		1,4*1*6,5*2				
	VV		základy			1,152	
	VV		0,6*0,8*1,2*2				
	VV		Součet			89,252	
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	635,252		
	VV		546+89,252			635,252	
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	682,202		
	VV		546+89,252			635,252	
	VV		-102			-102,000	
	VV		přebytečná ornice			148,950	
	VV		993*0,15				
	VV		Součet			682,202	
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	682,202		
	VV		546+89,252			635,252	
	VV		-102			-102,000	
	VV		přebytečná ornice			148,950	
	VV		993*0,15				
	VV		Součet			682,202	
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	102,000		
10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	462,000		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	462,000		
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,240		
	VV		462*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			9,240	
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně - 45MPa	m2	1 631,000		

D		2	Zakládání				
---	--	---	-----------	--	--	--	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	14,000		
	VV		za opěrku lávky				
	VV		5*2*0,7*2		14,000		
15	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	295,500		
	VV		1,5*(167+30)		295,500		
16	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	350,020		
	VV		295,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		350,020		
17	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	187,000		
	VV		cyklo				
	VV		167		167,000		
	VV		lávka				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		187,000		
18	K	212752403	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	30,000		
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 439,000		
20	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	1 704,496		
	VV		1439*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		1 704,496		
21	K	2743111274	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30, XF4	m3	22,600		
	VV		lávka - XF2				
	VV		1,4*5*1*2		14,000		
	VV		0,5*1*2*2		2,000		
	VV		práh				
	VV		0,6*1*5,5*2		6,600		
	VV		Součet		22,600		
22	K	2743111284	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37, XF4	m3	23,010		
	VV		lávka - XF2				
	VV		1,8*0,9*6,5*2		21,060		
	VV		0,3*0,5*6,5*2		1,950		
	VV		Součet		23,010		
23	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	45,610		
	VV		22,6+23,01		45,610		
24	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,152		
	VV		základy				
	VV		0,6*0,8*1,2*2		1,152		
25	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	46,800		
	VV		1,8*6,5*2*2		46,800		
26	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	46,800		
27	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	9,000		
	VV		lávka				
	VV		3*1,5*2		9,000		
28	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	2,000		
	VV		8*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
D 4		Vodorovné konstrukce					
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24,100		
	VV		propustek				
	VV		10*0,9*0,2		1,800		
	VV		trativod 200				
	VV		30*0,6*0,2		3,600		
	VV		trativod 150				
	VV		187*0,5*0,2		18,700		
	VV		Součet		24,100		
30	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,800		
	VV		propustek				
	VV		10*0,9*0,2		1,800		
31	K	463215111	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	3,000		
	VV		pod lávkou, opatření pro přechod obojživelníků fr. 63-125/250				
	VV		15*0,2		3,000		
D 5		Komunikace pozemní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	1 631,000		
	VV		chem úprava aktivní zóny				
	VV		1631		1 631,000		
33	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy vápna	t	81,550		
	VV		1631*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,550		
34	K	56425111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkdrti f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 294,000		
35	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 439,000		
36	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	1 221,000		
37	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	181,000		
38	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 149,000		
39	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 149,000		
40	K	59451111R	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m2	8,000		
	VV		vypárované cem. maltou MC 25, XF4, štěrkopískové lože tl. 100				
	VV		8		8,000		
41	M	5838108	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm)	t	4,000		
	VV		8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,000		
	D	8	Trubní vedení				
42	K	871390420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	10,000		
43	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	10,150		
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
44	K	911000001	Odklonění vodoteče pro betonáž základů lávky a dna	soubor	1,000		
45	K	911000002	D + M Sklopné zátarasy (vč. patky, kotvení) dle přílohy	kus	2,000		
46	K	911000003	D + M Svislých dopravních značek (základ, sloup, uchycení, značka)	kus	1,000		
47	K	911000005	D + M polykarbonátové výplně tl. 8mm na kovových úchytech do sloupků u lávky	m2	23,400		
	VV		1,3*9*2		23,400		
48	K	911000010	Výsadba stromů třešeň ptačí vč. dvouleté péče, zálivky, kůlu 3ks a ochrany proti okusu, nátěr kmenů proti tepelnému poškození kůry (Prunus avium, výsadbová velikost 12/14 cm obvod kmínku)	soubor	8,000		
49	K	911000011	Výsadba stromů dub letní vč. dvouleté péče, zálivky, kůlu 3ks a ochrany proti okusu, nátěr kmenů proti tepelnému poškození kůry (Quercus robur, výsadbová velikost 12/14 cm obvod kmínku)	soubor	10,000		
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000		
	VV		snížený				
	VV		12		12,000		
	VV		náběhový				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		16,000		
51	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,240		
	VV		snížený				
	VV		12		12,000		
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
52	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080		
	VV		náběhový				
	VV		4		4,000		
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080		
	D	998	Přesun hmot				
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 872,690		
54	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	1 872,690		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	42,000		
	VV		lávka				
	VV		3*7*2		42,000		
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014		
	VV		42*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,014		
57	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	42,000		
58	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	51,282		
	VV		42*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		51,282		
59	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,303		
60	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,303		
D		762	Konstrukce tesařské				
61	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	19,000		
	VV		5+5+9		19,000		
62	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	36,000		
	VV		19+17		36,000		
63	K	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkých hranolů dle D5 - dřevěná lávka - řezy	m3	6,078		
	VV		1. podélník 180/200				
	VV		8*4*0,18*0,2		1,152		
	VV		2. věšadlo 180/200				
	VV		5*4*0,18*0,2		0,720		
	VV		3. věšák 180/200				
	VV		4*2*0,18*0,2		0,288		
	VV		4. podvlak 200/200				
	VV		5*2*0,2*0,2		0,400		
	VV		5. podpora 180/180				
	VV		4*4*0,18*0,18		0,518		
	VV		6. mostina 140/100				
	VV		30*0,1		3,000		
	VV		Součet		6,078		
64	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	6,078		
65	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	3,934		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
66	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	93,920		
	VV		lávka				
	VV		1. podélník 180/200				
	VV		8*4*(0,18+0,2+0,18+0,2)		24,320		
	VV		2. věšadlo 180/200				
	VV		5*4*(0,18+0,2+0,18+0,2)		15,200		
	VV		3. věšák 180/200				
	VV		4*2*(0,18+0,2+0,18+0,2)		6,080		
	VV		4. podvlak 200/200				
	VV		5*2*(0,2+0,2+0,2+0,2)		8,000		
	VV		5. podpora 180/180				
	VV		4*4*(0,18+0,18+0,18+0,18)		11,520		
	VV		6. mostina 140/100				
	VV		30*(0,1+0,1+0,14+0,14)		14,400		
	VV		zábradlí				
	VV		36*0,4		14,400		
	VV		Součet		93,920		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
04 - úsek v k.ú. Martinice
Soupis:
02CM - Přímé výdaje na doprovodnu část - Martinice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH			7 387,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 387,21	21,00%	1 551,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 938,52
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt: 04 - úsek v k.ú. Martinice
Soupis: **02CM - Přímé výdaje na doprovodnu část - Martinice**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 387,21
HSV - Práce a dodávky HSV	
5 - Komunikace pozemní	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 04 - úsek v k.ú. Martinice

Soupis: 02CM - Přímé výdaje na doprovodnu část - Martinice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 387,21

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		5	Komunikace pozemní			
1	K	56427111R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku f 0-32 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	27,000	
VV			sjezdy			
VV			15+12		27,000	
D		998	Přesun hmot			
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,525	
3	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	15,525	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
04 - úsek v k.ú. Martinice
Soupis:
03CM - Nepřímé náklady - Martinice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:




Cena bez DPH			56 360,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 360,30	21,00%	11 835,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			68 195,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 04 - úsek v k.ú. Martinice

Soupis: **03CM - Nepřímé náklady - Martinice**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		56 360,30
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km



Objekt:

04 - úsek v k.ú. Martinice

Soupis:

03CM - Nepřímé náklady - Martinice

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:



Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

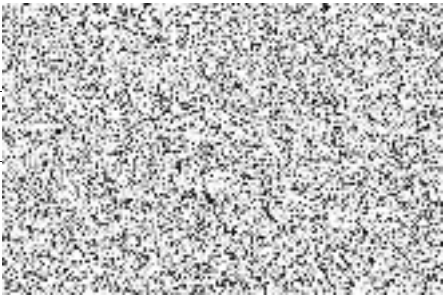
Náklady soupisu celkem

56 360,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	563,603
VV			546+89,252		635,252
VV			-102		-102,000
VV			-181		-181,000
VV			Mezisoučet		352,252
VV			352,252*1,6		563,603



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN
Soupis:
01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,00	21,00%	16 800,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			96 800,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN

Soupis: **01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	80 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN6 - Územní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN

Soupis: 01VR - Přímé výdaje na hlavní část - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000			
D		VRN6	Územní vlivy					
2	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000			

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.09.2024

Zadavatel:

MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

1Č:

421 96 868

D|Č:

CZ42196868

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 500,00	21,00%	4 095,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 595,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN
Soupis: 02VR - Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	19 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN

Soupis: 02VR - Přímé výdaje na doprovodnou část - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN7	Provozní vlivy				
1	K	070001000	Provozní vlivy (přístup IZS a pod.)	soubor	1,000		
2	K	090001000	Ostatní náklady - DIO	soubor	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km
Objekt:
05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN
Soupis:
03VR - Nepřímé náklady - VRN

KSO:
Místo:
Zadavatel:
MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE
Uchazeč:
M - SILNICE a.s.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			116 700,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 700,00	21,00%	24 507,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 207,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN

Soupis: **03VR - Nepřímé náklady - VRN**

Místo:		Datum:	06.09.2024
Zadavatel:	MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE	Projektant:	
Uchazeč:	M - SILNICE a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	116 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA JILEMNICE – MARTINICE V KRKONOŠÍCH - 1. úsek 0 - 0,947km

Objekt: 05 - úsek v k.ú. Martinice - VRN

Soupis: 03VR - Nepřímé náklady - VRN

Místo:

Datum: 06.09.2024

Zadavatel: MĚSTO JILEMICE, Masarykovo nám.82,514 01 JILEMNICE

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

116 700,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení sítí, kopané sondy	soubor	1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
4	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000		
5	K	034303000	Dopravní značení dočasné	soubor	1,000		
6	K	034403000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor	1,000		
8	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000		



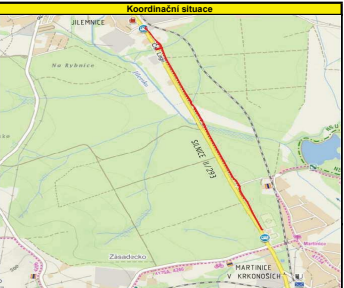
Akce:	Cyklostezka Jilemnice- Martinice v Krkonoších		
Identifikační údaje			
Zadavatel č. 1:	Město Jilemnice,Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice	IC :	00275808
Zadavatel č. 2:	Obec Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších	IC :	00580805
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	IC :	42196868



HARMONOGRAM PRACÍ

Číslo činnosti	Objekt	Zhotovitel Podzhotovitelé	Činnost
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
			výtyčení staveniště, vytyčení inženýrských sítí
			Odstranění stromů listnatých a křovin
			Odstranění polezů
			Sejmuti omítky a lesní hrabanky
TLAMOVÝ PROPUSTEK V KM 0,173 40			
			Frézování asf. vrstev
			odkopávky
			bourání původního propustku
			základy
			osazení tubusu
			izolace tubusu
			základy a obrysy
			vyrovnávací beton
			římky
			konstrukční vrstvy, asfaltové vrstvy
			zábradlí, svodidla
			dražby, kamenná sypanina
			DIO, úplná uzavírka
CYKLOSTEZKA			
			odkopávky
			úprava podlaží
			římky
			propustky
			konstrukční vrstvy
			obrubníky, dražby
			veřejné osvětlení
			asfaltové vrstvy
			lávka
			mobilita a dokončovací práce
			DIO částečné omezení

Koordinátní situace



razítko

organizace:

razítko

organizace:

razítko

organizace:

razítko

organizace:

razítko

organizace:

Datum výzvy k zahájení prací:

Datum předání staveniště:

Datum zahájení stavebních prací :

Termín pro dokončení kácení:

Začátek prací na tlamovém propustku :

Konec prací na tlamovém propustku

Doba realizace stavebních prací dle SOD :

Datum pro dokončení stavby:

180 dní od předání staveniště

150 dní od předání staveniště

365 dní od předání staveniště

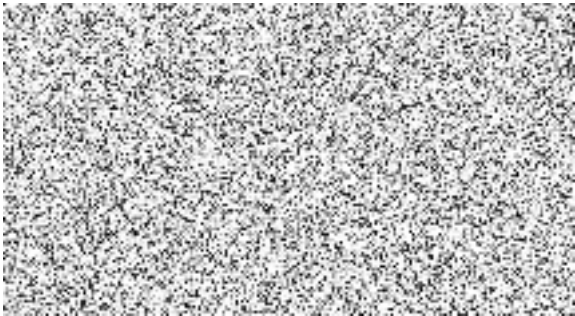
610 dní

150dní

180 dní

365 dní

610 dní



PLÁN PŘÍPRAVY**Zadavatel č. 1 (část zakázky A): Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 012 Jilemnice**

Jako vybraný dodavatel zakázky „Cyklostezka Jilemnice-Martinice v Krkonoších“ předkládáme odhadované množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě a připravovaného k opětovnému použití.

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s realizací projektu, resp. přímo na staveništi použitý materiál, který se tak formálně nestal odpadem dle české legislativy (<i>podrobněji viz poznámka</i>)	celkové množství (v tunách)	množství předaného subjektu s právem nakládat s daným druhem a kategorií odpadu, resp. využití přímo na staveništi (v tunách)	%
17 01 01 beton	245,236	245,236	100,00 %
17 03 02 asfaltové směsi bez dehtu	61,065	61,065	100,00 %
17 05 04 zemina a kamení	2 873,301	1 448,70	50,04 %
CELKEM	3 179,602	1 755,000	60,00 %
Využití pro část zakázky B, zadavatel č. 2 obec Martinice v Krkonoších		1 108,000	
CELKEM využito z části zakázky A		2 863,000	90,04%

Naše společnost vlastní třídičku zeminy a kamení a dokáže zajistit od partnerů drtičku sutě. V místě plnění, ve spolupráci se smluvními partnery, jsme schopni vzniklý odpad ze stavby recyklovat a použít v režimu vedlejšího produktu.

Předpokládané využití recyklovaného materiálu na zakázce „Cyklostezka Jilemnice-Martinice v Krkonoších“ pro zadavatele č. 1 město Jilemnice:

- | | | |
|----------------------------|----------|-------|
| - Násypové těleso, | množství | 505 t |
| - Zásyp jam, šachet a rýh, | množství | 400 t |
| - Zřízení zemních krajnic, | množství | 850 t |

Celkem 1 755 t

Využití recyklovaného materiálu pro část zakázky B, zadavatel č. 2 obec Martinice v Krkonoších:

- | | | |
|---------------------------|----------|-------|
| - Násypové těleso, | množství | 720 t |
| - Zřízení zemních krajnic | množství | 388 t |

Celkem 1 108 t

M-SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod SEVER: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Jičín: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Hradec Králové: Bři Štefanů 492, 500 03 Hr.Král.

provoz Liberec: Na Výběžku 839, 460 15 Liberec

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci
Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

telefon:
e-mail:
web:

Na stavbě nevyužitý odpad bude dle klasifikace odvezen pro další zpracování nebo uložen na řízenou skládku.



M - SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht
ředitel OZ SEVER

Vypracoval:



Schválil:



M - SILNICE a.s.

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

oblastní závod SEVER: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Jičín: Hradecká 415, 506 01 Jičín

provoz Hradec Králové: Bři Štefanů 492, 500 03 Hr.Král.

provoz Liberec: Na Výběžku 839, 460 15 Liberec

Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci
Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DIC:** CZ42196868



telefon:

e-mail:

web:



POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem Kropáčem**, předsedou představenstva
a paní **Mgr. Irenou Bubeníkovou**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka Babku**,  9
Hradec Králové, místopředsedu představenstva společnosti M – SILNICE a.s., k provádění
níže uvedených úkonů jménem společnosti

- uzavírat obchodní smlouvy **do výše 50 000 000 Kč** (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové



Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Mgr. Irena Bubeníková
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Pověření přijímám



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.
