

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 16PT-000494/16

č. dodavatele/zhotovitele: 37016

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

SDRUŽENÍ SILNICE.CZ + AKTOR ATE

SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 267 92 711

DIČ: CZ26792711

Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2543

zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku, Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 05391059

DIČ: CZ683947381

Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77536

zastoupeným [REDACTED], zástupci vedoucího odštěpného závodu

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo I/57 Krnov – SV obchvat, ISPROFOND 327 111 7001 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 948 991 370,38 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/57 Krnov – SV obchvat	948 991 370,38	199 288 187,79	1 148 279 558,17

kteřážno cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/57 Krnov - SV obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)¹
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)²
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 3. 11. 2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

¹Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvypředložit na elektronickém datovém nosiči.

²Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14-07-2017


Datum: SILNICE, s.r.o.

PODEPSÁN _____

Jméno: [redacted] a
Funkce: ředitel Správy Ostrava
(na základě delegace pravomocí)

PODEPSÁN IČO: 26 32711 _____

Jméno: I [redacted]
Funkce: jednatel SILNICE.CZ s.r.o.



Jméno: [redacted]
Funkce: zástupce vedoucího odštěpného závodu

Jméno: [redacted]
Funkce: zástupce vedoucího odštěpného závodu

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
SDRUŽENÍ SILNICE.CZ+AKTOR ATE

AKTOR
AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice
Rytiřská 534/13, 110 00 Praha 1
IČO: 05391059, DIČ: CZ683947381

A 77536 vedená u Městského soudu v Praze

86

23. 05. 2017



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Ostravě dne: 22. 05. 2017

Číslo zakázky: 16PT-000494/1/151 ✓

Vyřizuje: [REDACTED]

„SDRUŽENÍ SILNICE.CZ + AKTORE ATE“
SILNICE.CZ
Červený Dvůr 918/7
Pod Cvilínem
794 00 KRNOV

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„ I/57 Krnov - SV obchvat“

zadávací řízení zahájeno dne 16. srpna 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 633516, ISPROFIN: 327 111 7001 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů

„SDRUŽENÍ SILNICE.CZ + AKTOR ATE“

Společník 1:

SILNICE.CZ s.r.o. , sídlo: Červený Dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, právní forma: společnost s ručením mezeným, IČO: 26792711

Společník 2:

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku, se sídlem Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1, právní forma: odštěpný závod zahraniční právnické osoby, IČO: 05391059

Celková nabídková cena uchazeče: 948 991 370,38 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, která v hodnocení dosáhla 96,82 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost Krnov STRABAG – SILNICE“

Správce:

STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle, 198/21, PSČ 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost, IČO: 60838744

Společník:

SILNICE MORAVA s.r.o., se sídlem: Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 25357352

Celková nabídková cena uchazeče: 983 734 852,10 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla 91,38 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost SWIETELSKY + METROSTAV, I/57 Krnov – SV obchvat“

Správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 48035599

Společník:

Metrostav, a.s., se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, právní forma: akciová společnost, IČO: 00014915

Celková nabídková cena uchazeče: 1 049 490 521,40 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla 88,92 bodů, podaná sdružením uchazečů

Společnost Krnov obchvat

Vedoucí společník:

SILNICE GROUP a.s., se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, právní forma: akciová společnost, IČO: 62242105

Společník 2:

VÁHOSTAV – SK, a.s., se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, právní forma: akciová společnost, IČO: 31356648

Společník 3:

D.I.S. spol. s r. o., se sídlem: Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno, právní forma: společnost s ručením mezeným, IČO: 46975616

Celková nabídková cena uchazeče: 1 082 169 137,12 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla 75,54 bodů, podaná uchazečem

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno,
právní forma: akciová společnost, IČO: 25317628

Celková nabídková cena uchazeče: 1 130 605 854,03 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem „SDRUŽENÍ SILNICE.CZ + AKTOR ATE“ jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější.


Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
ředitel Správy Ostrava
na základě delegačních pravomocí



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/57 Krnov - SV obchvat
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny(a)	(c) = (a) + (b)
I/57 Krnov – SV obchvat	948 991 370,38	199 288 187,79	1 148 279 558,17

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	90%	948 991 370,38 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10%	84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)

- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvyv případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: _____
funkce _____ jednatel společnosti

Podpis: _____
SILNICE.CZ+AKTOR ATE

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení Sdružení SILNICE.CZ+AKTOR ATE

Adresa Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Datum 30. 11. 2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/57 Krnov - SV obchvat

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Sdružení SILNICE.CZ + AKTOR ATE Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	██████████ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	48měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	42 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	I/57 Krnov – SV obchvat
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 3.000.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 600.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 100.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 6.000.000,-Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 600.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 1.200.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 100.000,-Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: Finanční plnění minimálně 33 % z Přijaté smluvní částky za práce provedené dle platného harmonogramu do 24 měsíců od zahájení prací
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla C461, C462, C463, C464, C465, SO C465, C466, C467, C468, C469, C470, C481, C482, C483, SO C483, C484, C485, C486, C487, C488 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	15 % Přijaté smluvní částky
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i>

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 30. 11. 2016

 jednatel společnosti

Soupis objektů s DPH

Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C000 - 0	Všeobecné konstrukce a práce			
C000 - A3	Projekt základní vytyčovací sítě			
C000 - A5	Zásady organizace výstavby			
C001.1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ ZÚ - KM 3,600			
C001.2	Příprava území km 3,6-KÚ			
C002.1	DEMOLICE ZÚ-KM 3,600			
C002.2	Demolice km 3,6-KÚ			
C005.1	REKULTIVACE PLOCH ZÚ - KM 3,600			
C005.2	Rekultivace ploch km 3,6-KÚ			
C101.1 - 01	SILNIČNÍ ČÁST			
C101.1 - 02	SKLUZY			
C101.1 - 03	PROPUSTEK V KM 0,09000			
C101.1 - 04	PROPUSTEK V KM 0,17045			
C101.1 - 05	PROPUSTEK V KM 0,39300			
C101.1 - 06	PROPUSTEK V KM 0,70310			
C101.1 - 07	PROPUSTEK V KM 0,89150			
C101.1 - 08	PROPUSTEK V KM 1,06500			
C101.1 - 09	PROPUSTEK V KM 1,89000			
C101.1 - 10	PROPUSTEK V KM 2,05000			
C101.1 - 11	PROPUSTEK V KM 2,36000			
C101.1 - 12	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,15000			
C101.2 - 01	Přeložka silnice I/57			
C101.2 - 02	Rámový propustek v km 4,194			
C101.2 - 03	Trubní propustek v km 4,390			
C101.2 - 04	Rámový propustek v km 7,415			
C101.2 - 05	Trubní propustek v km 7,507			
C101.3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
C102 - 01	SILNIČNÍ ČÁST			
C102 - 02	PROPUSTEK V KM 0,347			
C102 - 03	SKLUZ			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C103 - 01	Napojení stáv. sil. I/57 v km 7,462.48			
C103 - 02	Rámový propustek v km 0,466.40			
C104 - 01	SILNIČNÍ ČÁST			
C104 - 02	PROPUSTEK V KM 0,071			
C105	PŘELOŽKA ULICE CHOMÝŽSKÉ			
C106	Napojení ulice Hlubčické			
C107	Napojení podnikatelské zóny			
C108	Přeložka ulice Bližčické			
C109	PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE STATKU			
C111	ÚPRAVA ULICE OKRUŽNÍ			
C112	Přeložka MK Vysoký břeh v km 5,550			
C121	CYKLISTICKÁ STEZKA S CHODNÍKEM V KM 3,400			
C122	Chodník do podchodu v km 4,289			
C123	Chodník do podchodu v km 5,320			
C124	Přeložka chodníku v km 5,550			
C125.1	PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU K ZAHRÁDKÁM			
C125	CHODNÍK K ZAHRÁDKÁM V KM 3,400 VPRAVO			
C126 - 01	Chodník podél ulice Opavské			
C126 - 02	Trubní propustek v km 0,079.46			
C151 - 01	SILNIČNÍ ČÁST			
C151 - 02	PROPUSTEK V KM 0,03305			
C151 - 03	PROPUSTEK V KM 0,04950			
C151 - 04	PROPUSTEK V KM 0,23580			
C152 - 01	SILNIČNÍ ČÁST			
C152 - 02	PROPUSTEK V KM 0,003			
C153	PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K JEŽNICKÉMU POTOKU			
C154	PŘELOŽKA PŘÍJEZDU K VODÁRNĚ			
C155	Polní cesta km 5,700 vpravo			
C156	Polní cesta km 5,700 - 7,180 vlevo			
C157	Příjezd k trafostanici			

Soupis objektů s DPH**Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6****Varianta: IV - Importovaná varianta**Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C158	Příjezd k čerpací stanici	██████████	██████████	██████████
C159	Komunikace areálu ČEPRO a.s.	██████████	██████████	██████████
C201	PODCHOD PRO DOBYTEK V km 1,165	██████████	██████████	██████████
C202	ESTAKÁDA PŘES ALBRECHTICKOU, MK A ČD	██████████	██████████	██████████
C203	MOST PŘES JEŽNICKÝ POTOK	██████████	██████████	██████████
C204	ESTAKÁDA PŘES CS, OPAVICI A MK	██████████	██████████	██████████
C205	PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 4,289	██████████	██████████	██████████
C206	MOST PŘES MOHLU	██████████	██████████	██████████
C207	PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 5,320	██████████	██████████	██████████
C208	ESTAKÁDA PŘES CS A ŘEKU OPAVU V KM 5,527-5.812	██████████	██████████	██████████
C209	INUDAČNÍ MOST V KM 6,951	██████████	██████████	██████████
C210	ESTAKÁDA PŘES MK, ŽELEZNIČNÍ TRÁŤ A OPAVSKOU	██████████	██████████	██████████
C241	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,370 - 0,390 VPRAVO	██████████	██████████	██████████
C242	OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,814-6,891 VLEVO	██████████	██████████	██████████
C261.1	NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ ROD.DOMKŮ U SIL.I/57	██████████	██████████	██████████
C261	PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.1 V KM 1,400-2,300	██████████	██████████	██████████
C262	PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.2 V KM 1,540-4,100	██████████	██████████	██████████
C263	PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.3 V KM 5,390 - 5,750	██████████	██████████	██████████
C265	PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.5 V KM 2,530-2,650	██████████	██████████	██████████
C301.02	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 2,700-3,400	██████████	██████████	██████████
C301.02a	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK V KM 3,500	██████████	██████████	██████████
C301.03	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 3,600-4,400	██████████	██████████	██████████
C301.04	ČERPACÍ STANICE KM 4,290	██████████	██████████	██████████
C301.05	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,120	██████████	██████████	██████████
C301.06	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,320	██████████	██████████	██████████
C301.07	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,550	██████████	██████████	██████████
C301.10	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 7,630 - KÚ	██████████	██████████	██████████
C301.11	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 1,750	██████████	██████████	██████████
C301.12	SILNIČNÍ KANALIZACE KM 0,185 - 0,250	██████████	██████████	██████████

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6
Varianta: IV - Importovaná varianta**

Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C301.13	PŘELOŽKA KANALIZACE ÚPRAVNÝ VOD KVAK	████████	████████	████████
C302	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 5,290	████████	████████	████████
C303	PŘELOŽKA KANALIZACE DN 2000 V KM 7,200	████████	████████	████████
C304	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SHYBKÝ	████████	████████	████████
C331	ÚPRAVA JEŽNICKÉHO POTOKA	████████	████████	████████
C351	PŘELOŽKA VODOVODU DE 50 V KM 0,134	████████	████████	████████
C352	PŘELOŽKA VODOVODU DN 80 V KM 2,627	████████	████████	████████
C353	PŘELOŽKA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ 2 X DN 350 V KM 3,100	████████	████████	████████
C354	PŘELOŽKA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ 2 X DN 350 V KM 3,300 - 3,445	████████	████████	████████
C355.1	PŘELOŽKA KABELU NN V KM 3,550	████████	████████	████████
C355	PŘELOŽKA VODOJEMU PRO ZAHRÁDKY V KM 3,540	████████	████████	████████
C356	ÚPRAVA VODOVODU DN 100 V KM 4,250	████████	████████	████████
C357	PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 5,290	████████	████████	████████
C358	PŘELOŽKA VODOVODU DN 80 V KM 7,210	████████	████████	████████
C361 - 01	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - OSTATNÍ NÁKLADY	████████	████████	████████
C361 - 02	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - ZŘÍZENÍ VRTŮ	████████	████████	████████
C361 - 03	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - STAVEBNÍ ČÁST	████████	████████	████████
C361 - 04	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	████████	████████	████████
C361 - 05	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - SROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST	████████	████████	████████
C361 - 06	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - OPLOCENÍ	████████	████████	████████
C361 - 07	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - ČERPACÍ ZKOUŠKY	████████	████████	████████
C361 - 08	NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ - GEOLOGICKÉ PRÁCE	████████	████████	████████
C401	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN - KM 0,600-1,720	████████	████████	████████
C402	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 3,100-3,520	████████	████████	████████
C403	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 5,240	████████	████████	████████

Soupis objektů s DPH

Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C404	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 6,750-6,950			
C411	PŘELOŽKA TRAFKA V KM 7,420			
C431	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 0,200			
C432	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 1,790			
C433	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 2,640			
C434	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 3,850 A 3,920			
C435	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ NN - KM 4,240-4,400			
C437	PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 7,200			
C438	PŘÍPOJKA NN PRO ČS PODCHODU V KM 4,280			
C451	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 0,200			
C452	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 2,640			
C453	VO KŘIŽOVATKY SIL. I/57 SE SIL. I/45			
C454	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 4,640			
C455	VO KŘIŽOVATKY SIL. I/57 S UL HLUBČICKOU			
C456	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 5,500			
C457	PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 7,200			
C458	VO OKŘUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SIL. I/57			
C459	PŘELOŽKA VO ČEPRO A.S.			
C460	VO OBJEKTU C 201			
C461	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 0,150			
C462	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 0,730			
C463	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN POD RAMPOU KE STATKU			
C464	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 1,550			
C465	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 1,640			
C466	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 2,630			
C467	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 3,525			
C468	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 4,250-PETROVICKÁ UL.			
C469	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 5,290 - HLUBČICKÁ UL.			
C470	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN NA ULICI OPAVSKÉ			

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6**

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč] 948 991 370,38
OC + DPH [Kč] 1 148 279 558,17

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		OC + DPH
		OC	DPH	
C471	OCHRANA DK ČD V KM 1,680	██████	██████	██████
C472	OCHRANA DK ČD V KM 7,200 - OPAVSKÁ UL.	██████	██████	██████
C481	PŘELOŽKA DOKU CETIN V KM 0,730	██████	██████	██████
C482	PŘELOŽKA DOKU CETIN POD RAMPOU KE STATKU	██████	██████	██████
C483	PŘELOŽKA DOKU CETIN V KM 1,550	██████	██████	██████
C484	OCHRANA TRUBKY HDPE CETIN V KM 1,640	██████	██████	██████
C485	PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 2,630	██████	██████	██████
C486	PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 4,250-PETROVICKÁ UL.	██████	██████	██████
C487	PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 5,290-HLUBČICKÁ UL.	██████	██████	██████
C488	PŘELOŽKA DOKU CETIN NA ULICI OPAVSKÉ	██████	██████	██████
C501	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 0,650-1,800	██████	██████	██████
C502	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 2,100	██████	██████	██████
C503.1	KŘÍŽENÍ POLNÍ CESTY S VTL PLYNOVODEM V KM 6,134	██████	██████	██████
C503a	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 7,050	██████	██████	██████
C503b	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 7,050	██████	██████	██████
C511	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 NA UL. BLIŽČICKÉ	██████	██████	██████
C512	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 V KM 7,155	██████	██████	██████
C513	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 POD OBJ. C 103	██████	██████	██████
C521	PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU D225 V KM 5,300	██████	██████	██████
C701.1	PŘELOŽKY OPLOCENÍ ZÚ - KM 3,600	██████	██████	██████
C701.2	Přeložky oplocení km 3,6-KÚ	██████	██████	██████
C702.1	PŘELOŽKA VEDENÍ NN A ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ	██████	██████	██████
C702.3	Přeložka kontrolních vrtů	██████	██████	██████
C801.1	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	██████	██████	██████
C801.2	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	██████	██████	██████
C801.3	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	██████	██████	██████
CSO101 - 01	Přeložka silnice I/45 v km 1,85 - 2,26	██████	██████	██████
CSO101 - 02	Trubní propustek v km 1,984.70	██████	██████	██████

Soupis objektů s DPH

**Stavba: 150129 - I/57 KRNOV - SV OBCHVAT - ČISTOPIS (VD-ZDS), SOUPIS PRACÍ,
11/2016 v.6**

Varianta: IV - Importovaná varianta

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		948 991 370,38
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
CSO101 - 03	Trubní propustek v km 2,060.30	████████	████████	████████
CSO101 - 04	Rámový propustek v km 2,132.30	████████	████████	████████
CSO113	Připojení ul. Petrovické	████████	████████	████████
CSO304	DEŠŤOVÁ KANALIZACE KM 2,050 - 2,260	████████	████████	████████
CSO332	ZÁCHYTNÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ Č. 2 KM 2,230	████████	████████	████████
CSO353	PŘELOŽKA VODOVODU V KM 2,190-2,240	████████	████████	████████
CSO443	VO NOVÉ SIL. I/45, KM 1,650-2,250	████████	████████	████████
CSO444	PŘELOŽKA VO NA STÁVAJÍCÍ SIL. I/45	████████	████████	████████
CSO465	PŘELOŽKA TELEFONNÍCH KABELŮ V KM 2,245 SILNICE I/45	████████	████████	████████
CSO483	PŘELOŽKA TRUBEK HDPE V KM 2,245 SILNICE I/45	████████	████████	████████

(Handwritten signature and stamp)

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: SILNICE.CZ s. r. o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 267 92 711

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/57 Krnov - SV obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corruptpractice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulentpractice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel**(Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibitedpractice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Krnově dne 16. 11. 2016

████████████████████
jednatel společnosti

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: **AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku**

se sídlem: Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: [REDAKCE], zástupce vedoucího odštěpného závodu

zastoupená: [REDAKCE], zástupce vedoucího odštěpného závodu

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77536

IČ: 05391059

DIČ: CZ683947381,

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/57 Krnov - SV obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516(dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců

nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:


- **Úplatkářství** (Corruptpractice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulentpractice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel**(Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibitedpractice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 2011



AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice
Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1
IČO: 05391059, DIČ: CZ683947381

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku
[redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu



AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice
Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1
IČO: 05391059, DIČ: CZ683947381

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku
[redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.5 ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **I/57 Krnov - SV obchvat**

Společnost SILNICE.CZ s. r. o., ,
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČ: 267 92 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/57 Krnov - SV obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	██████	██████
Dlažební kostky	████	██████
Betonové obrubníky silniční (nepoškozené)	██████	██████
Betonové obrubníky záhonové (nepoškozené)	██████	██████
Betonová dlažba zámková (nepoškozená)	████	██████
Ocelové konstrukce určené do šrotu	██████	██████
Vytěžená dřevní hmota	██████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Štěpkovaný materiál	██████	██████

** Dřevo využitelné k dalšímu zpracování ve výši ceny obvyklé dle znaleckého posudku. Při prodeji musí být uvedeno druhové složení materiálu v souladu se zákonem 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.*


Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/57 Krnov - SV obchvat
Stavební práce v otevřeném řízení

zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Krnově dne 16. 11. 2016


Jednatel společnosti

DÍL I, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost SILNICE.CZ s. r. o.,
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČ: 267 92 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/57 Krnov - SV obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516(dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:
 - Stavba bude prováděna současně v celé délce trasy, která bude rozdělena na 7 úseků dělených především mostními objekty a křižovatkami takto :
 1. Úsek ZÚ – most C 202 km 1,640
 2. Úsek most C 202 km 1,640 – most C 204 km 3,500
 3. Úsek most C 204 km 3,500 – křižovatka se silnicí I/45 km 4,220
 4. Úsek křižovatka se silnicí I/45 km 4,220 – most C 206 km 4,400
 5. Úsek most C 206 km 4,400 – most C 208 km 5,670
 6. Úsek most C 208 km 5,670 – most C 210 km 7,230
 7. Úsek most C 210 km 7,230 – okružní křižovatka - KÚ
 - Před zahájením vlastních stavebních prací bude provedena příprava území C 001.1 a C 001.2 , demolice objektů C 002.1 a C 002.2 a přeložky oplocení C 701.1 a C 701.2. V jednotlivých úsecích budou pro uvolnění stavenišť hlavních silničních a mostních objektů provedeny nejprve podmiňující přeložky inženýrských sítí. Před zahájením prací v ochranném pásmu vodních zdrojů bude proveden objekt náhradních vrtů C 361. Přeložené inženýrské sítě budou ihned uváděny do provozu.
 - Po uvolnění stavenišť budou průběžně zahájeny práce na zemních tělesech hlavních silničních objektů a spodních stavbách mostů. Současně s realizací dalších prací na těchto objektech budou prováděny doprovodné objekty (přeložky a úpravy místních komunikací, chodníků, příjezdů, VO apod.).

- V průběhu výstavby bude průběžně zajišťováno usměrňování provozu provizorním dopravním značením.
 - Pro provedení objektu C 102 a objektu C 104 bude nutné uvedení hlavní trasy v úseku od začátku úpravy do křižovatky se silnicí I/45 do předčasného provozu. D předčasného provozu budou uvedeny i přeložené ulice Hlubčická C106 a Bližčická C 108. Pro dokončení objektu C 108 bude zajištěno zásobování závodu Kofola obchvatovou komunikací od křižovatky se silnicí I/45 do křižovatky s napojením podnikatelské zóny.
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

Pokládka hutněných asfaltových vrstev vozovky hlavní trasy.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:


Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Zpracování RDS	SHB, akciová společnost	Max 1%	
Výstupní kontrola RDS	PK OSSENDORF s.r.o.	Max 1%	
Zeměměřické práce	GEOS SILESIA s.r.o.	Max 1%	
CELKEM %		3	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/57 Krnov - SV obchvat
Stavební práce v otevřeném řízení

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.


V Krnově dne 16. 11. 2016



jednatel společnosti

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

1948 FEBRUARY - 1948 MARCH

1948 FEBRUARY - 1948 MARCH

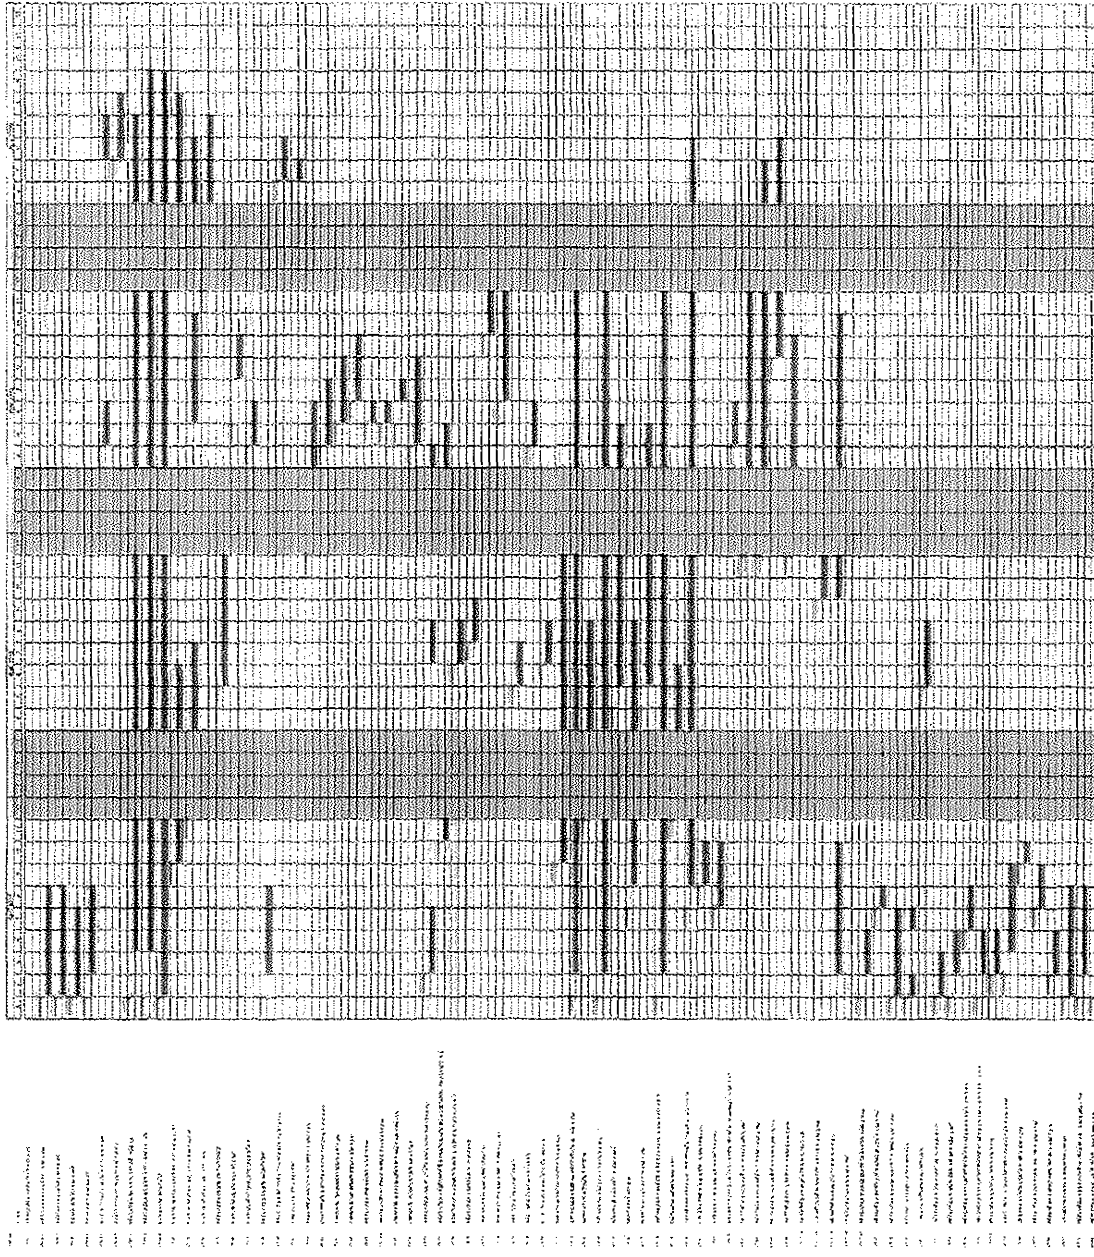

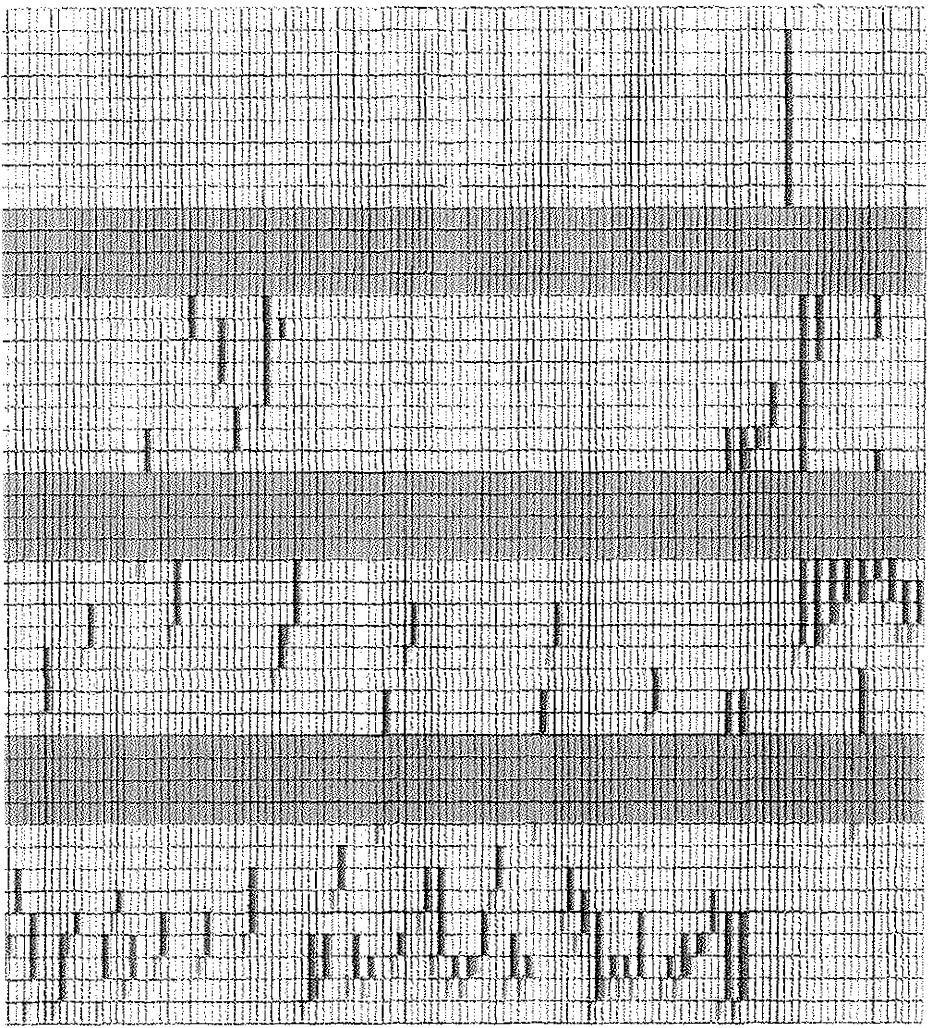

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. This is particularly crucial for businesses and organizations that operate in highly regulated industries.

2. The second part of the document provides a detailed overview of the various methods and techniques used to collect and analyze data. This includes both traditional and modern approaches, such as surveys, interviews, and data mining.

3. The third part of the document focuses on the challenges and limitations of data collection and analysis. It highlights the need for careful planning and execution to ensure the reliability and validity of the results.

4. The fourth part of the document discusses the ethical considerations surrounding data collection and analysis. It emphasizes the importance of protecting individual privacy and ensuring that data is used responsibly.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study. It highlights the main insights gained from the data and offers recommendations for future research and practice.

6. The sixth part of the document contains a list of references and sources used in the study. This includes both academic journals and industry reports.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and supplementary materials. These include additional data, charts, and tables that support the main findings of the study.

8. The eighth part of the document contains a list of footnotes and endnotes. These provide further details and clarifications on specific points mentioned in the text.

9. The ninth part of the document provides a list of acknowledgments and thanks. These recognize the contributions of individuals and organizations that assisted in the research and publication of the document.

10. The tenth part of the document contains a list of contact information and other relevant details. This includes the author's name, affiliation, and contact information.

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost SILNICE.CZ s. r. o., ,
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČ: 267 92 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/57 Krnov - SV obchvat, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:**

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
PK OSSENDORF s.r.o.]	255 64 901	Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Krnově dne 16. 1. 2016.

[Signature]
jednatel společnosti

System výstupní kontroly realizační dokumentace stavby

Dodavatel zajistí účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) z hlediska její kompletnosti, věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně ZTKP), prostřednictvím kvalifikované subdodavatelské firmy.

Výstupní technická kontrola realizační dokumentace stavby (RDS) bude prováděna kvalifikovaným projektantem, který v žádném časovém okamžiku pro zadavatele nezpracovával ani nebude zpracovávat projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k této stavbě.

Kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) bude provádět subdodavatel nebo dodavatel, resp. právnická či fyzická osoba s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb (dle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu).

Identifikační údaje kvalifikované firmy a personální obsazení kontroly RDS:

Název společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.
Sídlo: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
Vedoucí kontrolního týmu: [REDACTED]

Členové kontrolního týmu:

Silniční část:

[REDACTED]
Autorizace v oboru Dopravní stavby, ČKAIT 17503

Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb:

[REDACTED]
Autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 29838

Statika a dynamika staveb:

[REDACTED]
Autorizace v oboru Statika a dynamika staveb, ČKAIT 15621

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství:

[REDACTED]
Autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 28653

Výstupní kontrolou RDS se rozumí prověření věcné správnosti, souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a zejména technickými podmínkami investora.

Kontrola bude prováděna prostřednictvím autorizovaných osob dle odbornosti jednotlivých stavebních objektů.

Kontrola realizační dokumentace stavby (RDS) bude probíhat následovně:

- účasti na jednáních v průběhu projekčních prací,
- kontrola KONCEPTU realizační dokumentace,
- kontrola ČISTOPISU realizační dokumentace,
- kontrola dokumentace změn během výstavby (v rozsahu RDS).

Požadovaný rozsah KONCEPTU realizační dokumentace stavby (RDS):

- základní výkresy a texty
- seznam souvisejících SO a PS
- seznam použitých předpisů s uvedením počátku jejich platnosti
- budoucího vlastníka a pověřeného správce
- specifikace výrobků
- požadavků na funkci technologických zařízení a jeho vazby na ostatní SO a PS
- zásad postupu výstavby a požadavků na koordinaci prací s ostatními SO a PS
- požadavků na zkoušení
- dočasných konstrukcí a úprav
- vytyčení
- seznamu dotčených ochranných pásem inženýrských sítí původních i nově navržených
- zákresu do KN
- zdůvodnění změn a odchylek od PDPS
- rozdílového soupisu prací

ČISTOPIS realizační dokumentace stavby (RDS) bude oproti KONCEPTU realizační dokumentace stavby (RDS) navíc obsahovat:

- text o způsobu zpracování všech připomínek k RDS, popřípadě odůvodnění jejich nezpracování
- doklady o projednání, tj. připomínky a vyjádření ke konceptu RDS, relevantní záznamy z jednání

Kontrola KONCEPTU i ČISTOPISU RDS bude zahrnovat:

- plnění požadavků zadávací dokumentace zakázky a smlouvy o dílo,
- ověření technické a věcné správnosti návrhů a výpočtů,
- ověření koordinace jednotlivých částí a objektů stavby,
- soulad obsahu a rozsahu dokumentace s požadavky technických norem a resortních předpisů.

Výstupem kontroly bude:

- připomínky a doporučení jako součást zápisů z výrobních výborů,
- protokol o připomínkách ke konceptu PD,
- protokol o kontrole zpracování připomínek čistopisu PD,
- protokol o připomínkách k dokumentaci změn během výstavby.

Rozsah řešených objektů:

- C001.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ ZÚ - KM 3,600
- C001.2 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 3,6-KÚ
- C002.1 DEMOLICE ZÚ-KM 3,600
- C002.2 DEMOLICE KM 3,6-KÚ
- C005.1 REKULTIVACE PLOCH ZÚ - KM 3,600
- C005.2 REKULTIVACE PLOCH KM 3,6-KÚ
- C101.1 PŘELOŽKA SILNICE I/57 ZÚ - KM 3,6
- C101.2 PŘELOŽKA SILNICE I/57
- C101.3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- C102 NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ SIL. I/57 V KM 1,232
- C103 NAPOJENÍ STÁV. SIL. I/57 V KM 7,462.48
- C104 NAPOJENÍ STÁV. SIL. I/57 - MK
- C105 PŘELOŽKA ULICE CHOMÝŽSKÉ
- C106 NAPOJENÍ ULICE HLUBČICKÉ
- C107 NAPOJENÍ PODNIKATELSKÉ ZÓNY
- C108 PŘELOŽKA ULICE BLIŽČICKÉ
- C109 PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KE STATKU
- C111 ÚPRAVA ULICE OKRUŽNÍ
- C112 PŘELOŽKA MK VYSOKÝ BŘEH V KM 5,550
- C121 CYKLISTICKÁ STEZKA S CHODNÍKEM V KM 3,400
- C122 CHODNÍK DO PODCHODU V KM 4,289
- C123 CHODNÍK DO PODCHODU V KM 5,320
- C124 PŘELOŽKA CHODNÍKU V KM 5,550
- C125.1 PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU K ZAHRÁDKÁM
- C125 CHODNÍK K ZAHRÁDKÁM V KM 3,400 VPRAVO
- C126 CHODNÍK PODÉL ULICE OPAVSKÉ
- C151 PŘELOŽKA POLNÍ CESTY KM 0,145-0,560 VPRAVO
- C152 PŘELOŽKA PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE DO PODCHODU PRO DOBYTEK
- C153 PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K JEŽNICKÉMU POTOKU
- C154 PŘELOŽKA PŘÍJEZDU K VODÁRNĚ
- C155 POLNÍ CESTA KM 5,700 VPRAVO
- C156 POLNÍ CESTA KM 5,700 - 7,180 VLEVO
- C157 PŘÍJEZD K TRAFOSTANICI
- C158 PŘÍJEZD K ČERPACÍ STANICI
- C159 KOMUNIKACE AREÁLU ČEPRO A.S.
- C201 PODCHOD PRO DOBYTEK V km 1,165
- C202 ESTAKÁDA PŘES ALBRECHTICKOU, MK A ČD
- C203 MOST PŘES JEŽNICKÝ POTOK
- C204 ESTAKÁDA PŘES CS, OPAVICI A MK
- C205 PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 4,289
- C206 MOST PŘES MOHLU
- C207 PODCHOD PRO PĚŠÍ V KM 5,320
- C208 ESTAKÁDA PŘES CS A ŘEKU OPAVU V KM 5,527-5.812
- C209 INUDAČNÍ MOST V KM 6,951
- C210 ESTAKÁDA PŘES MK, ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A OPAVSKOU
- C241 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,370 - 0,390 VPRAVO
- C242 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,814-6,891 VLEVO
- C261.1 NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ ROD.DOMKŮ U SIL.I/57
- C261 PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.1 V KM 1,400-2,300
- C262 PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.2 V KM 1,540-4,100

C263 PROTIHLUKOVÁ ZEĎ Č.3 V KM 5,390 - 5,750
 C265 PROTIHLUKOVÁ ZEĎ č.5 V KM 2,530-2,650
 C301.02 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 2,700-3,400
 C301.02a ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK V KM 3,500
 C301.03 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 3,600-4,400
 C301.04 ČERPACÍ STANICE KM 4,290
 C301.05 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,120
 C301.06 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,320
 C301.07 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 5,550
 C301.10 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 7,630 - KÚ
 C301.11 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 1,750
 C301.12 SILNIČNÍ KANALIZACE KM 0,185 - 0,250
 C301.13 PŘELOŽKA KANALIZACE ÚPRAVNY VOD KVAK
 C302 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 5,290
 C303 PŘELOŽKA KANALIZACE DN 2000 V KM 7,200
 C304 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA SHYBKY
 C331 ÚPRAVA JEŽNICKÉHO POTOKA
 C351 PŘELOŽKA VODOVODU DE 50 V KM 0,134
 C352 PŘELOŽKA VODOVODU DN 80 V KM 2,627
 C353 PŘELOŽKA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ 2 X DN 350 V KM 3,100
 C354 PŘELOŽKA VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ 2 X DN 350 V KM 3,300 - 3,445
 C355.1 PŘELOŽKA KABELU NN V KM 3,550
 C355 PŘELOŽKA VODOJEMU PRO ZAHŘÁDKY V KM 3,540
 C356 ÚPRAVA VODOVODU DN 100 V KM 4,250
 C357 PŘELOŽKA VODOVODU DN 100 V KM 5,290
 C358 PŘELOŽKA VODOVODU DN 80 V KM 7,210
 C361 NÁHRADNÍ VRTY V JÍMACÍM ÚZEMÍ
 C401 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VN - KM 0,600-1,720
 C402 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 3,100-3,520
 C403 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 5,240
 C404 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ VN - KM 6,750-6,950
 C411 PŘELOŽKA TRAFY V KM 7,420
 C431 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 0,200
 C432 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 1,790
 C433 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 2,640
 C434 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 3,850 A 3,920
 C435 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ NN - KM 4,240-4,400
 C437 PŘELOŽKA VENK. VEDENÍ NN - KM 7,200
 C438 PŘÍPOJKA NN PRO ČS PODCHODU V KM 4,280
 C451 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 0,200
 C452 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 2,640
 C453 VO KŘÍŽOVATKY SIL. I/57 SE SIL. I/45
 C454 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 4,640
 C455 VO KŘÍŽOVATKY SIL. I/57 S UL HLUBČICKOU
 C456 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 5,500
 C457 PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO - KM 7,200
 C458 VO OKŘUŽNÍ KŘÍŽOVATKY NA SIL. I/57
 C459 PŘELOŽKA VO ČEPRO A.S.
 C460 VO OBJEKTU C 201
 C461 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 0,150
 C462 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 0,730
 C463 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN POD RAMPOU KE STATKU
 C464 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 1,550

- C465 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 1,640
- C466 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 2,630
- C467 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 3,525
- C468 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 4,250-PETROVICKÁ UL.
- C469 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN V KM 5,290 - HLUBČICKÁ UL.
- C470 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN NA ULICI OPAVSKÉ
- C471 OCHRANA DK ČD V KM 1,680
- C472 OCHRANA DK ČD V KM 7,200 - OPAVSKÁ UL.
- C481 PŘELOŽKA DOKU CETIN V KM 0,730
- C482 PŘELOŽKA DOKU CETIN POD RAMPOU KE STATKU
- C483 PŘELOŽKA DOKU CETIN V KM 1,550
- C484 OCHRANA TRUBKY HDPE CETIN V KM 1,640
- C485 PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 2,630
- C486 PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 4,250-PETROVICKÁ UL.
- C487 PŘELOŽKA TRUBKY HDPE CETIN V KM 5,290-HLUBČICKÁ UL.
- C488 PŘELOŽKA DOKU CETIN NA ULICI OPAVSKÉ
- C501 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 0,650-1,800
- C502 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 2,100
- C503.1 KRÍŽENÍ POLNÍ CESTY S VTL PLYNOVODEM V KM 6,134
- C503a PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 7,050
- C503b PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN200 V KM 7,050
- C511 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 NA UL. BLIŽČICKÉ
- C512 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 V KM 7,155
- C513 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU D63 POD OBJ. C 103
- C521 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU D225 V KM 5,300
- C701.1 PŘELOŽKY OPLOCENÍ ZÚ - KM 3,600
- C701.2 PŘELOŽKY OPLOCENÍ KM 3,6-KÚ
- C702.1 PŘELOŽKA VEDENÍ NN A ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
- C702.3 PŘELOŽKA KONTROLNÍCH VRTŮ
- C801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- C811 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE
- CSO101 PŘELOŽKA SILNICE I/45 V KM 1,85 - 2,26
- CSO113 PŘIPOJENÍ UL. PETROVICKÉ
- CSO304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KM 2,050 - 2,260
- CSO332 ZÁCHYTNÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ Č. 2 KM 2,230
- CSO353 PŘELOŽKA VODOVODU V KM 2,190-2,240
- CSO443 VO NOVÉ SIL. I/45, KM 1,650-2,250
- CSO444 PŘELOŽKA VO NA STÁVAJÍCÍ SIL. I/45
- CSO465 PŘELOŽKA TELEFONNÍCH KABELŮ V KM 2,245 SILNICE I/45
- CSO483 PŘELOŽKA TRUBEK HDPE V KM 2,245 SILNICE I/45

V Brně dne

.....
 [redacted]
 jednatel společnosti

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: SILNICE.CZ s. r. o.

Sídlo vedoucího účastníka: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ 267 92 711 DIČ CZ26792711

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Telefon / Fax XXXXXXXXXX

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: netýká se

Telefon / Fax – netýká se

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku
Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „Sdružení
SILNICE.CZ + AKTOR ATE“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“).

- i) Datum uzavření: 16. 11. 2016
- ii) Místo: Krnov
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

i) SILNICE.CZ s.r.o. - 50% - práce na výstavbě komunikací a přilehlých objektů, práce na výstavbě mostních objektů, protihlukových stěn, kanalizaci

ii) AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku - 50% - práce na výstavbě komunikací a přilehlých objektů, práce na výstavbě mostních objektů, protihlukových stěn, kanalizaci

V Krnově dne 16. 11. 2016

██████████
jednatel společnosti

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

SILNICE.CZ s. r. o.,
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČ: 267 92 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/57 Krnov - SV obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	-----			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	-----			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Krnově dne 16. 11. 2016

jednatel společnosti

**DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku

se sídlem: Rytířská 534/13, Staré Město, 110 00 Praha 1
 zastoupená: [redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu
 zastoupená: [redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77536
 IČ: 05391059
 DIČ: CZ683947381,
 Bankovní spojení: [redacted]
 Číslo účtu: [redacted]

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/57 Krnov - SV obchvat“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 633516(dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních ráďů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.				
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,

resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.				
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne



AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice
Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1
IČO: 05391059, DIČ: CZ683947381

A 77536 vedená u Městského soudu v Praze

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku
[redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu



AKTOR ATE, odštěpný závod v České republice
Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1
IČO: 05391059, DIČ: CZ683947381

A 77536 vedená u Městského soudu v Praze

AKTOR ATE, odštěpný závod pro Českou republiku
[redacted], zástupce vedoucího odštěpného závodu

DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.12 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

SILNICE.CZ s. r. o.,
se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov,
IČ: 267 92 711,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/57 Krnov - SV obchvat, ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek 633516(dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny
veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B


Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
-----------------------------------	-------------------------------

bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.


V Krnově dne 16. 11. 2016


jednatel společnosti

bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno
bude doplněno	bude doplněno

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Krnově dne 16. 11. 2016


jednatel společnosti
