

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Č. VPI/MJ/2024/00142**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Brno

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená [REDACTED] manažerem VFS, na základě pověření ev.č. PŘ/4801/2024

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupená JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna, k podpisu této smlouvy

pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

datová schránka: a7kbrnn

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Bystrc; Žebětín - spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN a znamená také stavbu spočívající (i) ve zrušení části Kabelovodu, (ii) vybudování Nového Kabelovodu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním; Překládka bude rozdělena do tří etap označených v CTN jako 1. Etapa Překládky, 2. Etapa Překládky a 3. Etapa Překládky;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

Harmonogram znamená harmonogram, který koordinuje, zejména z časového hlediska jednotlivé úkony Stavby s jednotlivými úkony Překládky;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Kabelovod znamená věc nemovitou, ve vlastnictví společnosti CETIN, specifikovanou v CTN a v Projektu;

Nový Kabelovod znamená věc nemovitou, ve vlastnictví CETIN, která bude vybudována v rámci Stavby, specifikovanou v CTN a v Projektu;

Stavba je stavba Stavebníka pod označením „**Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy**“, která Překládku vyvolala;

Stávající kabelové komory jsou kabelové komory společnosti CETIN, které budou Stavbou dotčeny, zaniknou a budou nahrazeny v rámci Stavby Novými kabelovými komorami;

Nové kabelové komory jsou kabelové komory společnosti CETIN, které budou vybudovány v rámci Stavby;

Náklad Překládky znamená jakýkoliv a každý náklad vzniklý společnosti CETIN, který by společnosti CETIN nevznikl, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal, a to zejména, nikoliv však výlučně (i) náklad určený v CTN a v Projektu, (ii) náklad skutečně provedených prací a skutečně provedených činností na Překládce, (iii) náklad na každou Etapu překládky, (iv) jakýkoliv další náklad, vzniklý společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 13.12.2022 vydané pod čj. 859137/22 a „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 25.5.2023 vydané pod č.j. 143499/23 jejichž nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Bystř-Kamechy - Prodloužení TT**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky včetně pravomocného povolení pro stavbu Kabelovodu;
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva; včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro umístění a provozování Nového kabelovodu;
 - (c) schválení Harmonogramu společností CETIN.
- (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje
- (a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
- (b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) Předat společnosti CETIN pravomocné územní, resp. stavební povolení překládky nebo jiný doklad, opravňující k přeložení SEK a stavbě Nového kabelovodu z hlediska správních orgánů vč. dokumentace, která byla předmětem tohoto stavebního řízení;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však osm (8) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci První ETAPY Překládky (Kabelovod) do osmi (8) měsíců, Druhé ETAPY Překládky (Vejrostova) do pěti (5) měsíců a Třetí ETAPY Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a zálohovou platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnost dle odst. 4.2 bodu (i) a (iii) Smlouvy;
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky včetně povolení ke stavbě kabelovodu.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Předběžná výše Nákladu Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **10.803.151,- Kč** (slovy: deset milionů osm set tři tisíc jedno sto padesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
 Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
 Registr smluv: ANO

- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady Překládky ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně:

- (a) úhradou nákladů na Přípravu Překládky ve výši **451.576,- Kč** (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc pět set sedmdesát šest korun českých) na základě faktury; fakturu vystaví společnost CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) zálohovými platbami (každá jednotlivá zálohová platba za každou následující jednotlivou Etapu Překládky dále jen „**Záloha**“) v následující výši: Zálohou za První Etapu Překládky ve výši **4.300.000,- Kč** (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) a Zálohou za Druhou Etapu Překládky ve výši **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých), (Třetí Etapa Překládky bude bez Zálohy); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena v obou případech do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva (k realizaci První Etapy Překládky, resp. k realizaci Druhé Etapy Překládky);
- (c) úhradou doplateků, vždy na základě faktury na výši nákladů za každou jednotlivou Etapu Překládky; fakturu za každou jednotlivou Etapu Překládky vystaví společnost

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) tohoto odstavce 6.1 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.4 Jakoukoliv platbu dle faktury či dle výzvy k úhradě Zálohy v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na faktuře či ve výzvě k úhradě Zálohy.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka není nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: specialista koordinace výstavby sítě
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec, MBA
funkce: vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
funkce: investiční manažer dopravní staveb, Odbor investiční Magistrátu města Brna
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
 Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
 Registr smluv: ANO

ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00142
Číslo smlouvy Stavebníka: 5624176009

SAP S/4 Hana: 8030005453
Registr smluv: ANO

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a z povolení ke stavbě Kabelovodu – vzor

Doložka


Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/106 dne 13. listopadu 2024.

CETIN:

Stavebník:


V Praze

V Brně



CETIN a.s.

manažer, Výstavba fixní sítě
na základě pověření



Statutární město Brno

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrát města Brna

VPIC Bystř-Kamechy - Prodloužení TT

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 77495/24/0008 na zpracování CTN: VPIC Bystř-Kamechy - Prodloužení TT

2.2 Navrhované řešení:

Zpracování CTN pro realizaci překládky SEK vyvolané realizací výstavby prodloužené tramvajové tratě (nového tramvajového tělesa), souvisejících komunikací, chodníků a ostatních stavebních objektů v ul. Vejrostova, Kuršova a Teyschlova v Brně.

Přeložky jsou rozděleny na 3 části:

1. Kabelovod.
2. Metalická trasa Vejrostova
3. DSLAM BOBY 2403

Část 1 kabelovod

V Bystřci vede kabelovod 5x4 otvorů podél ulice Vejrostova a dále k ul. Ečerova v rozsahu 5x4 otvory.

Popis stávajícího stavu:

MET:

1. E200XN0,6 Pozor DN.
2. E100XN0,6 – směr KK122
3. E200XN0,6 – směr KK122
4. E200XN0,6 – směr KK122
5. E200XN0,6 – směr KK122
6. E200XN0,6 – směr KK122
7. E100XN0,6 – směr KK122
8. E200XN0,6 – kabel do koncovky do KK120 – zůstane beze změny, bude pouze manipulace v KK120A na nosníky.
9. E200XN0,6 – směr komora KK120 a přes děličku napojen výstup směr Vejrostova DSLAM BOBY89 a nazpět výstup směr BOBYxxx Kuršova.

HDPE:

Severní část příchod do objektu

1. HDPE40 C/BB (K604 ALB 03)
2. HDPE40 O/CV (O/CVCV) (T676 DLB 05/10)
3. HDPE32 O/BB prázdná
4. HDPE40 C/CVCV prázdná

TS: 676 DLB 10) 3x10+4x7

Část 10 v 10/8 CV – MOK (676 DLB 05 OFS 48f 8x6 RB D),

v 7/5,5Z – (MOK 604 ALB 71 OFS 24f 4x6 RB XT)

OK:

1. 604 ALB 003 – SAM48f LT CU
2. 676 DLB 05 OFS 48f 8x6 RB D
3. 604 ALB 71 OFS 24f 4x6 RB XT.

Návrh technického řešení:

Z důvodu kolize kabelovodu s výstavbou tramvajové tratě bude vystavěn nový kabelovod:

Mezi KK119 a KK120 na stávajícím kabelovodu bude postavena nová komora KK120A a dále nový kabelovod v délce cca 59m (3x7) +32m(4*5) přes nové komory KK121A a KK121B, která bude umístěna na stávajícím kabelovodu mezi KK121 a KK122.

KK121 a část kolem ní bude zrušena stavbou. Některé komory budou vyčištěny. (KK122 a KK118.)

MET:

1. E200XN0,6 Pozor DN. – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkami XAGA 500 100/25-460.
2. E100XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE100XN0,4 a spojkami XAGA 500 75/15-400.
3. E200XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkami XAGA 500 100/25-460.
4. E200XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkami XAGA 500 100/25-460.
5. E200XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkami XAGA 500 100/25-460.

6. E200XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkami XAGA 500 100/25-460.
 7. E100XN0,6 – V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE100XN0,4 a spojkami XAGA 500 75/15-400.
 8. E200XN0,6 – Kabel zůstane beze změny do KK121
 - 9.A E200XN0,6 - V novém kabelovodu bude kabel řešen vložkou PFLE200XN0,4 a spojkou XAGA do KK121.
 - 9.B V kabelu z KK120 do KK122 jsou v kabelu č.9 vedeny Dslamové linky. Nové trasy kabelovodu a metalických kabelů má za následek navýšení délky tras metalických kabelů a snížení rychlosti internetu.
- Z Tohoto důvodu nebude kabel překládán a z KK122 bude napojeno na stávající kabel 150XN0,6 do DSLAM BOBY 2403. (řešeno v samostatné části DSLAM BOBY2403).

HDPE:

1. HDPE40 C/BB (K604 ALB 03) – V novém kabelovodu bude instalována nová HDPE40 C/BB.
2. HDPE40 O/CV (O/CVCV) (T676 DLB 05/10)– V novém kabelovodu bude instalována nová HDPE40 O/CVCV.
3. HDPE32 O/BB prázdná – V novém kabelovodu bude instalována nová HDPE32 O/BB.
4. HDPE32 C/CVCV prázdná– V novém kabelovodu bude instalována nová HDPE32 C/CVCV.

U HDPE bude provedena kalibrace a HDPE spojky osazeny spojkami.

Stávající HDPE mezi KK120A a KK120 budou mimo HDPE40 OCV osazeny koncovkami. U HDPE bude provedena kalibrace.

TS:

1. Mezi KK 120A a KK121B bude instalován nový TS 3x10+4x7. V KK120A bude instalován nový T-Matrix, v KK121B T Matrix.
2. Odbočka z KK120A do KK120- V KK120A bude instalována vložka 3m od nové T Matrix k I matrix a v HDPE přeznačeno na část 73 z 05. V KK120 bude demontován T matrix , nahrazen I Matrix a MT, které byly propojeny směr KK121 budou propojeny směr ven z KK.

OK:

1. 604 ALB 003 – SAM48f LT CU – OK bude vyfouknut z KK126 cca 450m do KK120A a skrz novou trasu zafouknut zpět.
2. 676 DLB 05 OFS 48f 8x6 RB D – kabel bude vyfouknut z EUR:BS:610 EUR-BMECE – přes rezervu v Romoldu a zafouknuto zpět. Drobné navýšení trasy bude kompenzováno z rezervy 40m.
3. 604 ALB 71 OFS 24f 4x6 RB XT – Kabel není dostatečně dlouhý pro překládku – V KK121B bude instalována nová spojka DTC a k DSLAM bude zafouknut nový kabel Brezze 24f místo původního.

Provaření vláken:

Vlákna budou provařena dle původního. Minimálně 42 dní dopředu je nutné požádat o PEW.

Část.2 . Metalická trasa Vejrostova

Stávající stav:

1. OPV 100XN0,8
2. DSQ 7RP 1,3 +46DM0,9
3. odbočka QY 5XN 0,8 směr BOBY 708
4. QYPY 5XN 0,8

Návrh technického řešení:

Budou provedeny výkopy dle PD stavebníka v délce cca 300m.

1. OPV 100XN0,8 kabel bude nahrazen v celé délce novým kabelem PPFL 100XN0,8 a spojkami XAGA s děličkou na kabel č.3.
2. DSQ 7RP 1,3 +46DM0,9 kabel bude nahrazen v celé délce novým kabelem PPFL 50XN0,8 a spojkami XAGA
3. odbočka QY 5XN 0,8 – od děličky viz kabel 1 bude veden nový kabel PPFL 5XN0,8 a napojeno přes spojku XAGA na původní.
4. QYPY 5XN 0,8 - kabel bude nahrazen v celé délce novým kabelem PPFL 5XN0,8 a spojkou XAGA + koncovkou SKH.

V místě napojení bude nutné provést páření stávajících chráničků v zeleni.

Část 3. DSLAM BOBY 2403

Vzhledem k navýšení délky metalických tras přes nový kabelovod bude stávající vedení ul. Ečerova mít větší útlum:

BOBY1810-1820. Vedení bude přepojeno na rezervní kabel 150XN0,6 směr DSLAM a ten bude přes spojku vyveden do DSLAM. Skříň DSLAM bude vyměněna za větší – SIS1350D. Elektroměrový rozvaděč zprava bude bez dotčení.

Kabel 150XN v koncovce BOBY 2422 bude nadstaven PPFL 200XN0,6 přes spojku XAGA a ukončen v novém DSLAM.

V KK122 bude kabel stříhnut a instalována koncovka BOBY 2422. NA pokračující kabel bude napojen původní kabel 200XN0,6, který se bude odstraňovat od KK121.

Počet služeb BOBY 89 -9ks , BOBY 2403 – 14ks.

Dslam bude nutné dovybavit jednou kartou.

CTN neobsahuje demolicí stávající části kabelovodu mimo nově postavené komory.

Na stavební část bude vypracována samostatná stavební dokumentace. Ze strany stavebníka bude zajištěn podklad stavební průzkum.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN. Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků, a další, které nebyly předány ke zpracování CTN nebyly zohledněny.

CTN neobsahuje kontrolu vpustí a EZA- evidence zásahů do chodníku.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

XAGA, HDPE, MIDIA Bzeze 24f, DTC,
Metalické kabely TCEPKPFLE 0,6

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)
TPP 2003-2 - Výstavba přístupových sítí Kabelovody
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ:

CZ44992785, zast. JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna;

podpisem smlouvy pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna;

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED] investiční manažer dopravních staveb, e-mail:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

2.7 Ostatní:

PD:ano

ÚR: ne zajišťuje investor

GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom

VBŘ: ANO C1+2

GP: ANO C1+C2

SoUZ: Ne

PEW: Ano

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 42 dnů

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a pracovníka provozní složky spol. CETIN.

Kabelové spojky budou umístěny v nepojízdných plochách a budou opatřeny detekčními markery miniBall.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.


Měření:

metalické kabely = před provedením překládek bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.


optické kabely = po dokončení překládek bude provedeno měření přímou metodou + oboustranné OTDR.




Celková situace

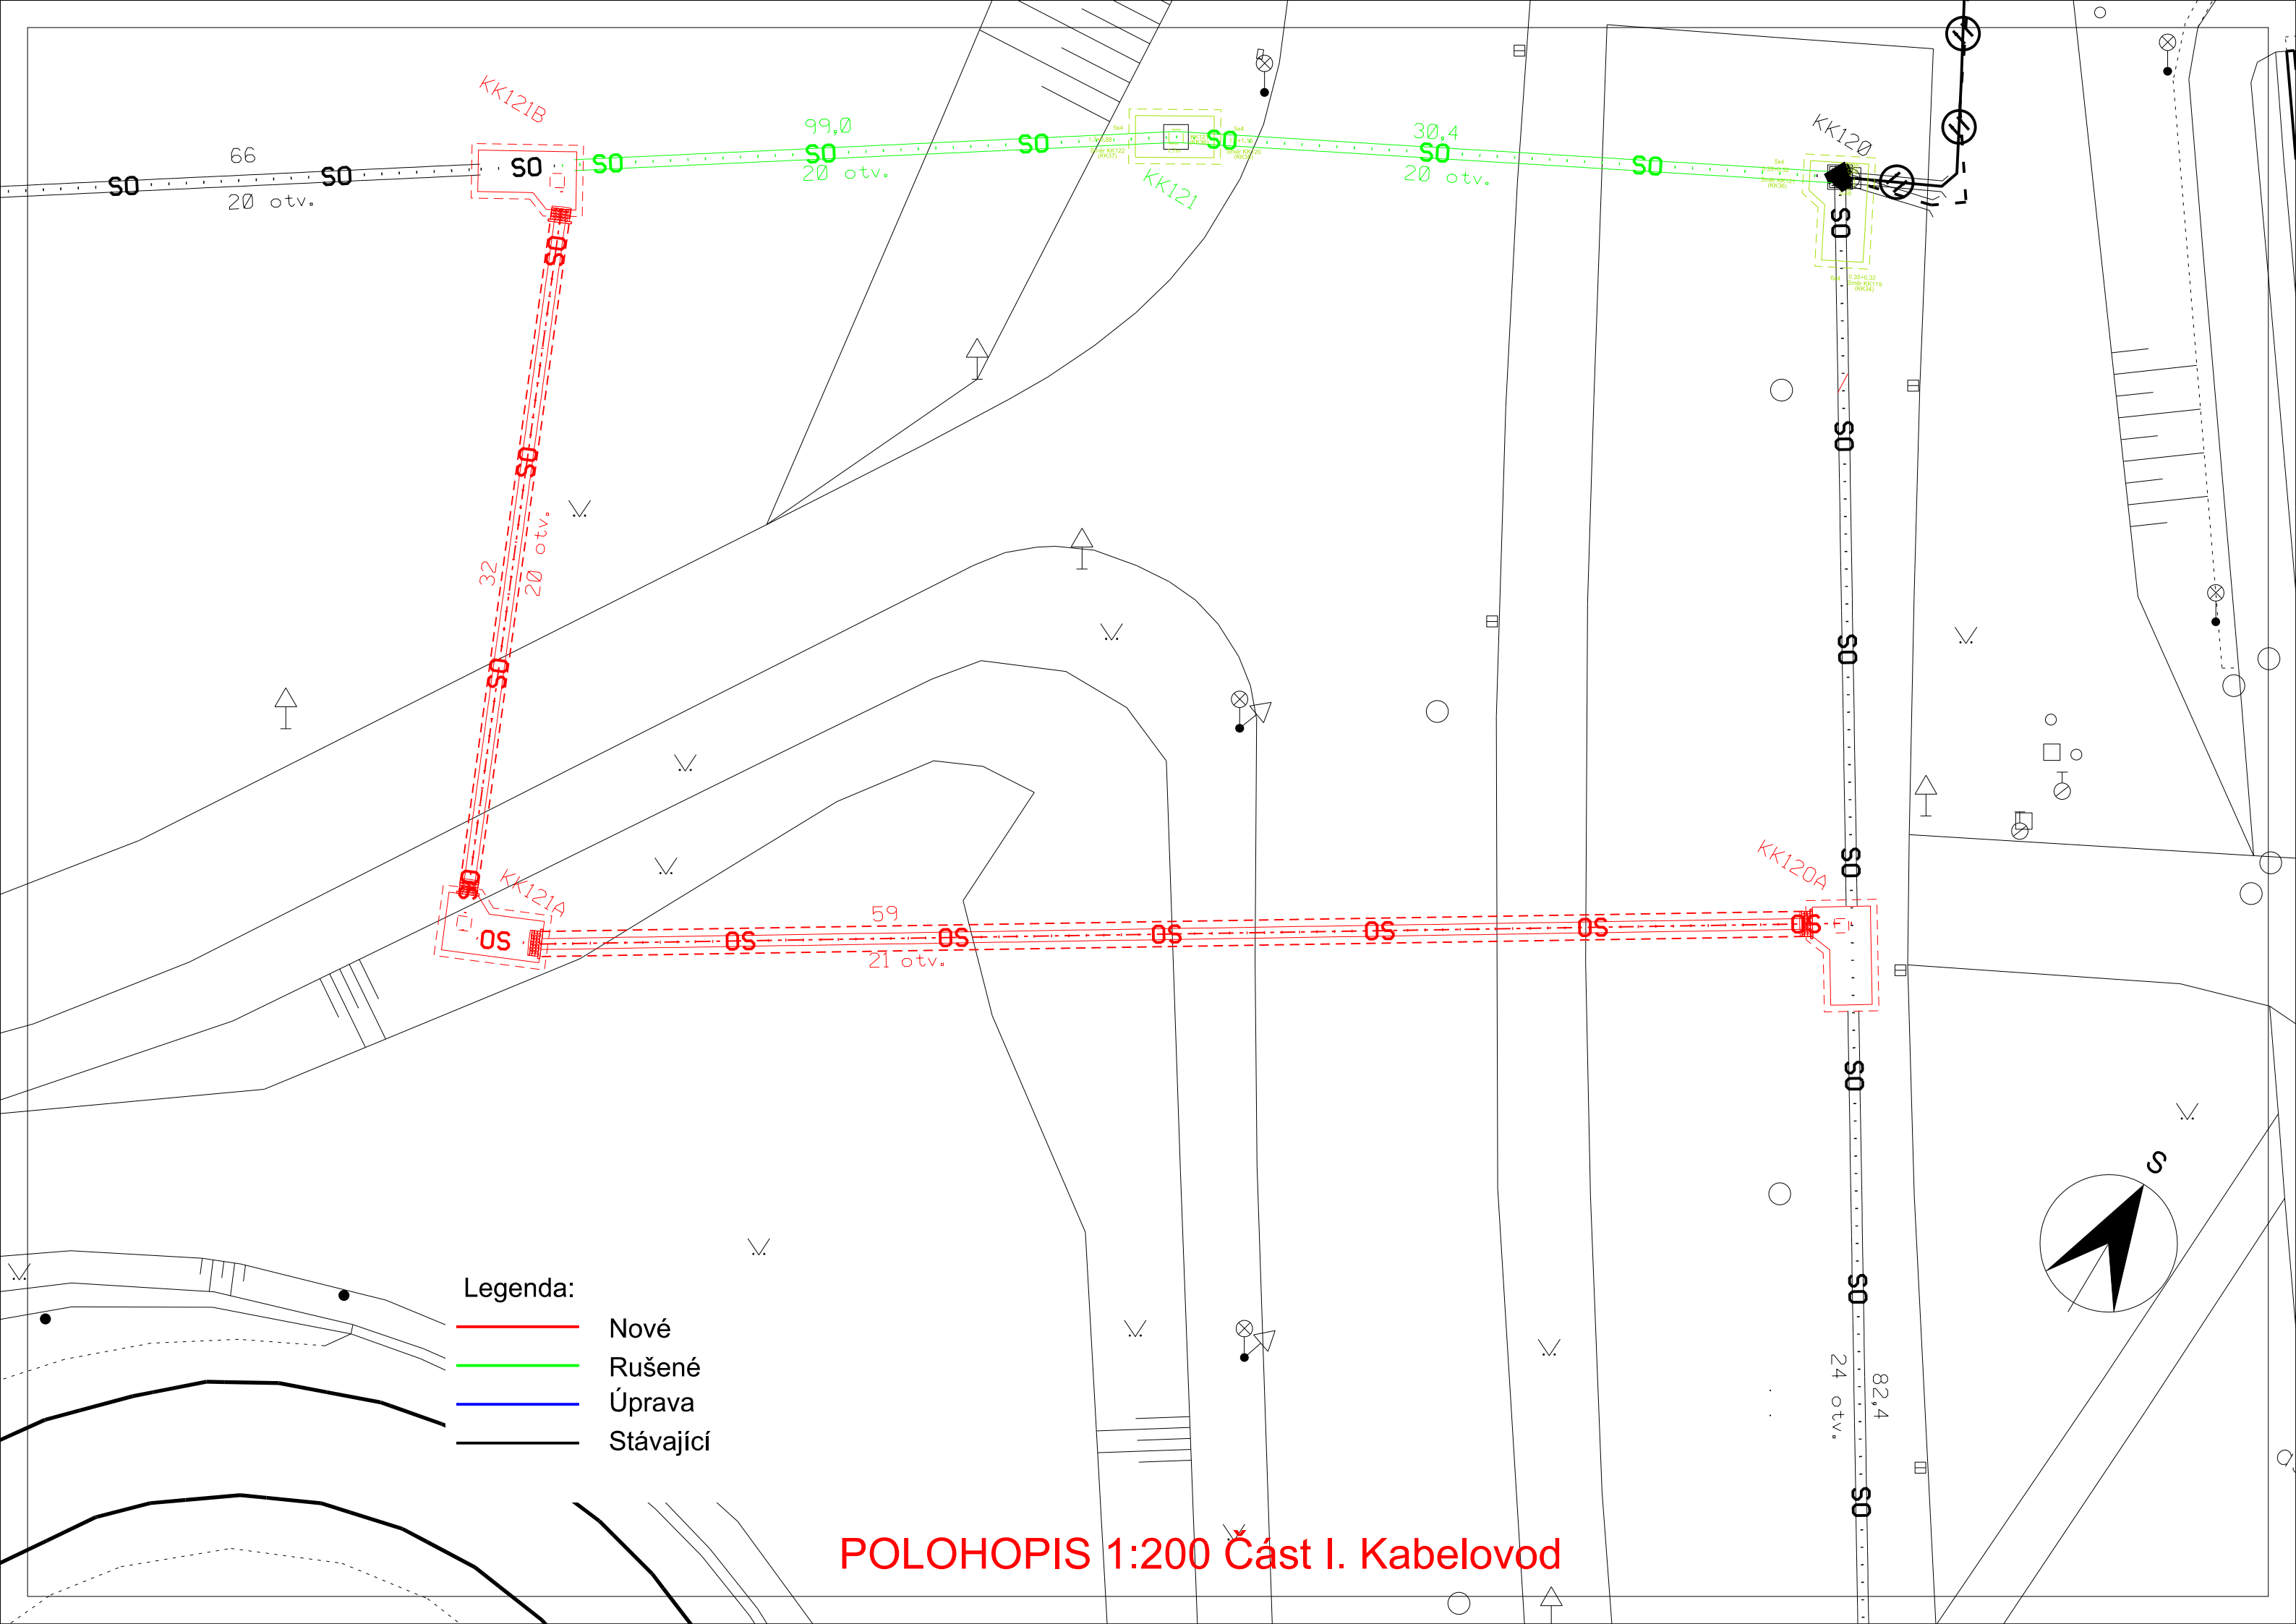

Rušený kabelovod Cetin a kabelová komora KK121

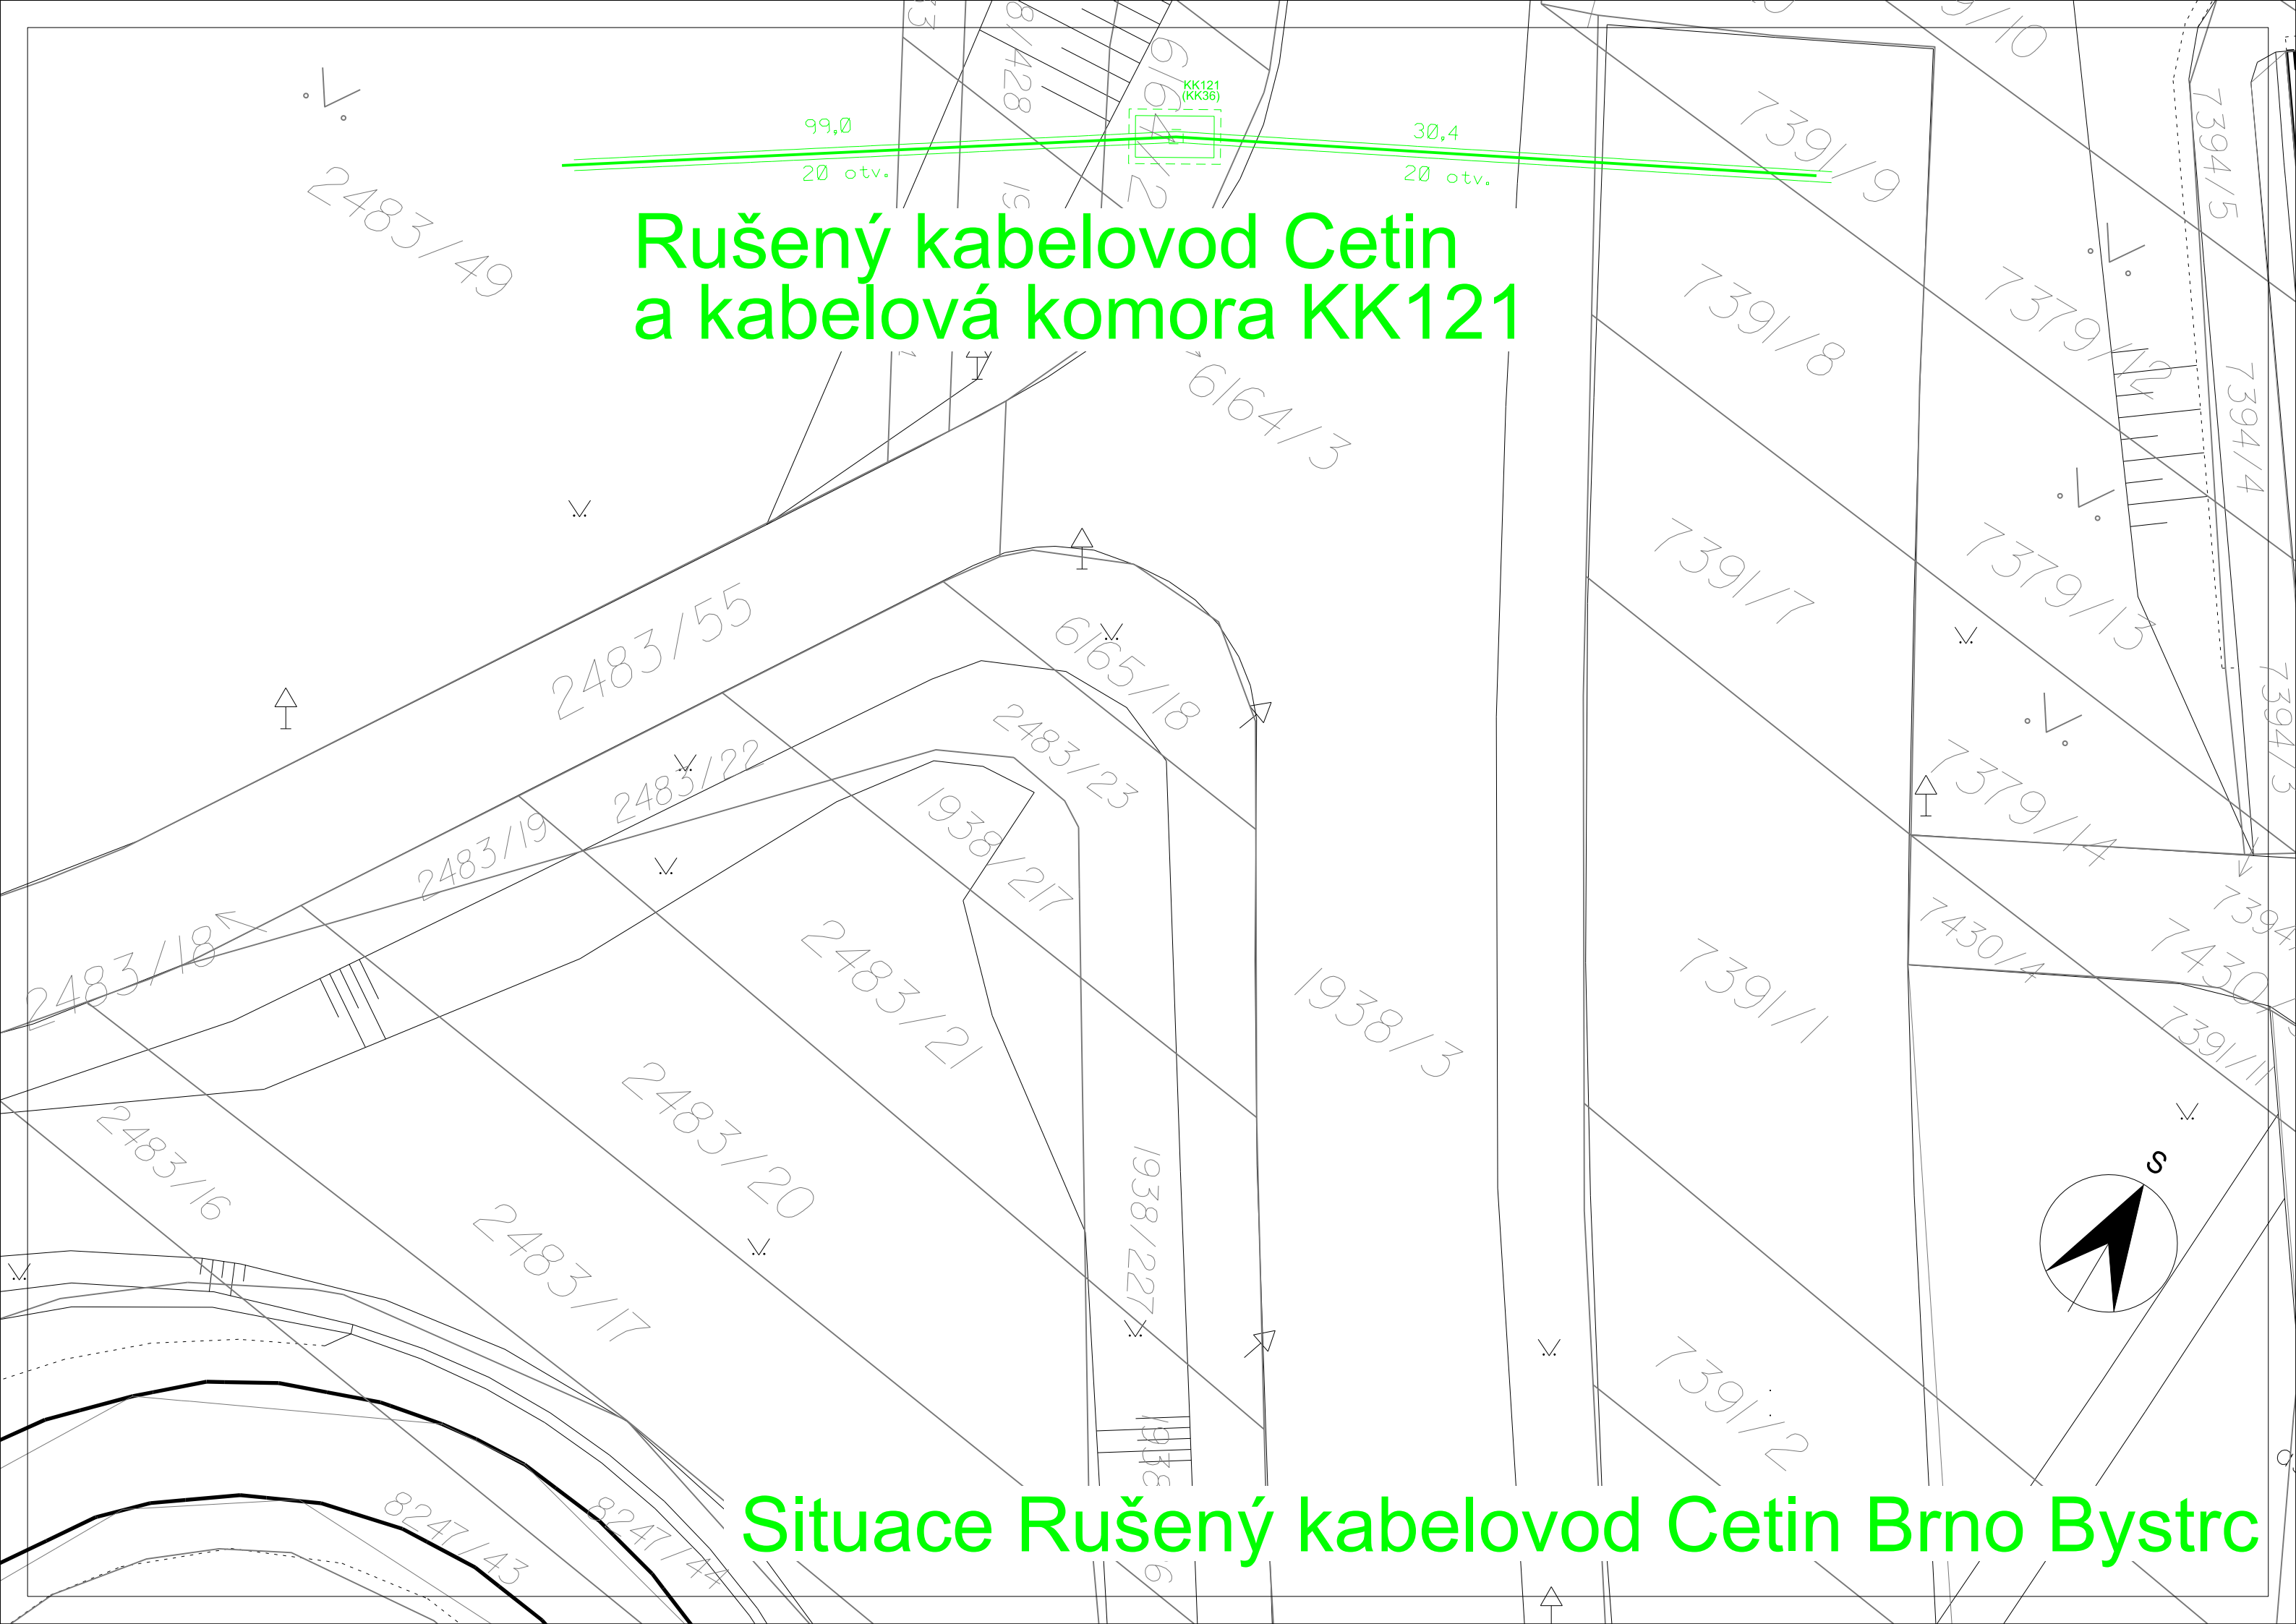


Situace Rušený kabelovod Cetin Brno Bystrc

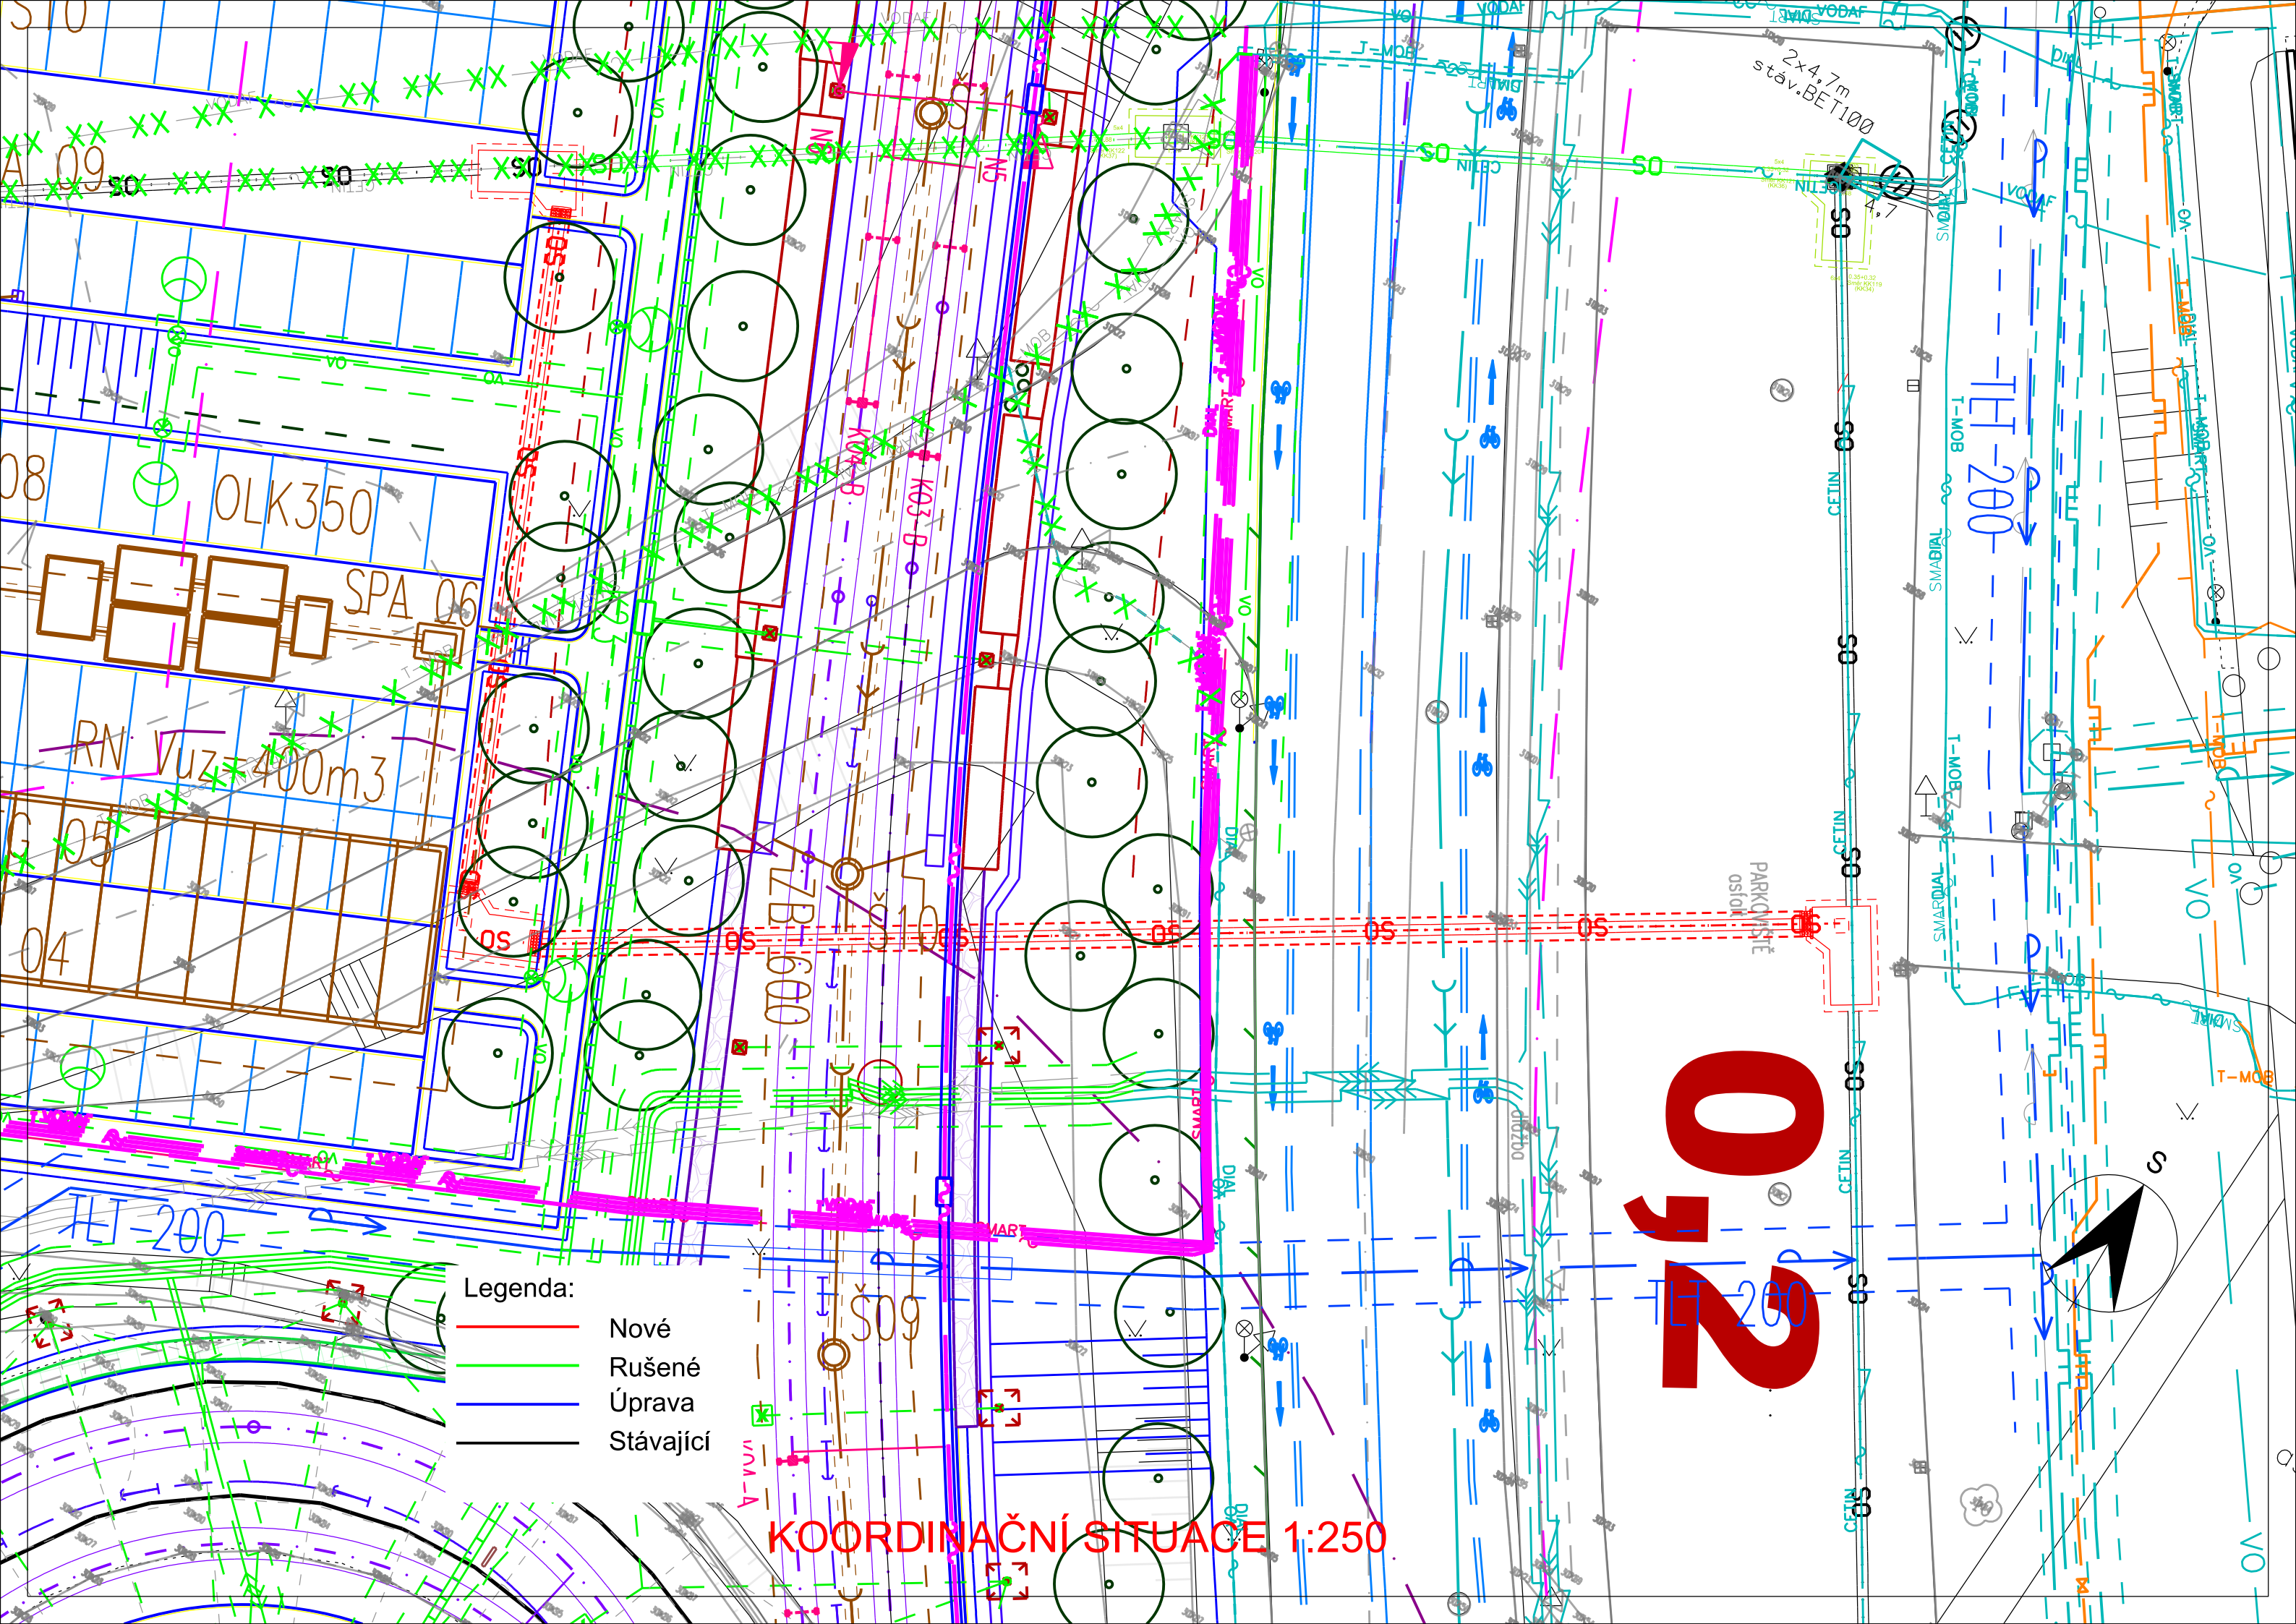

Legenda:

- Nové
- Rušené
- Úprava
- Stávající

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250

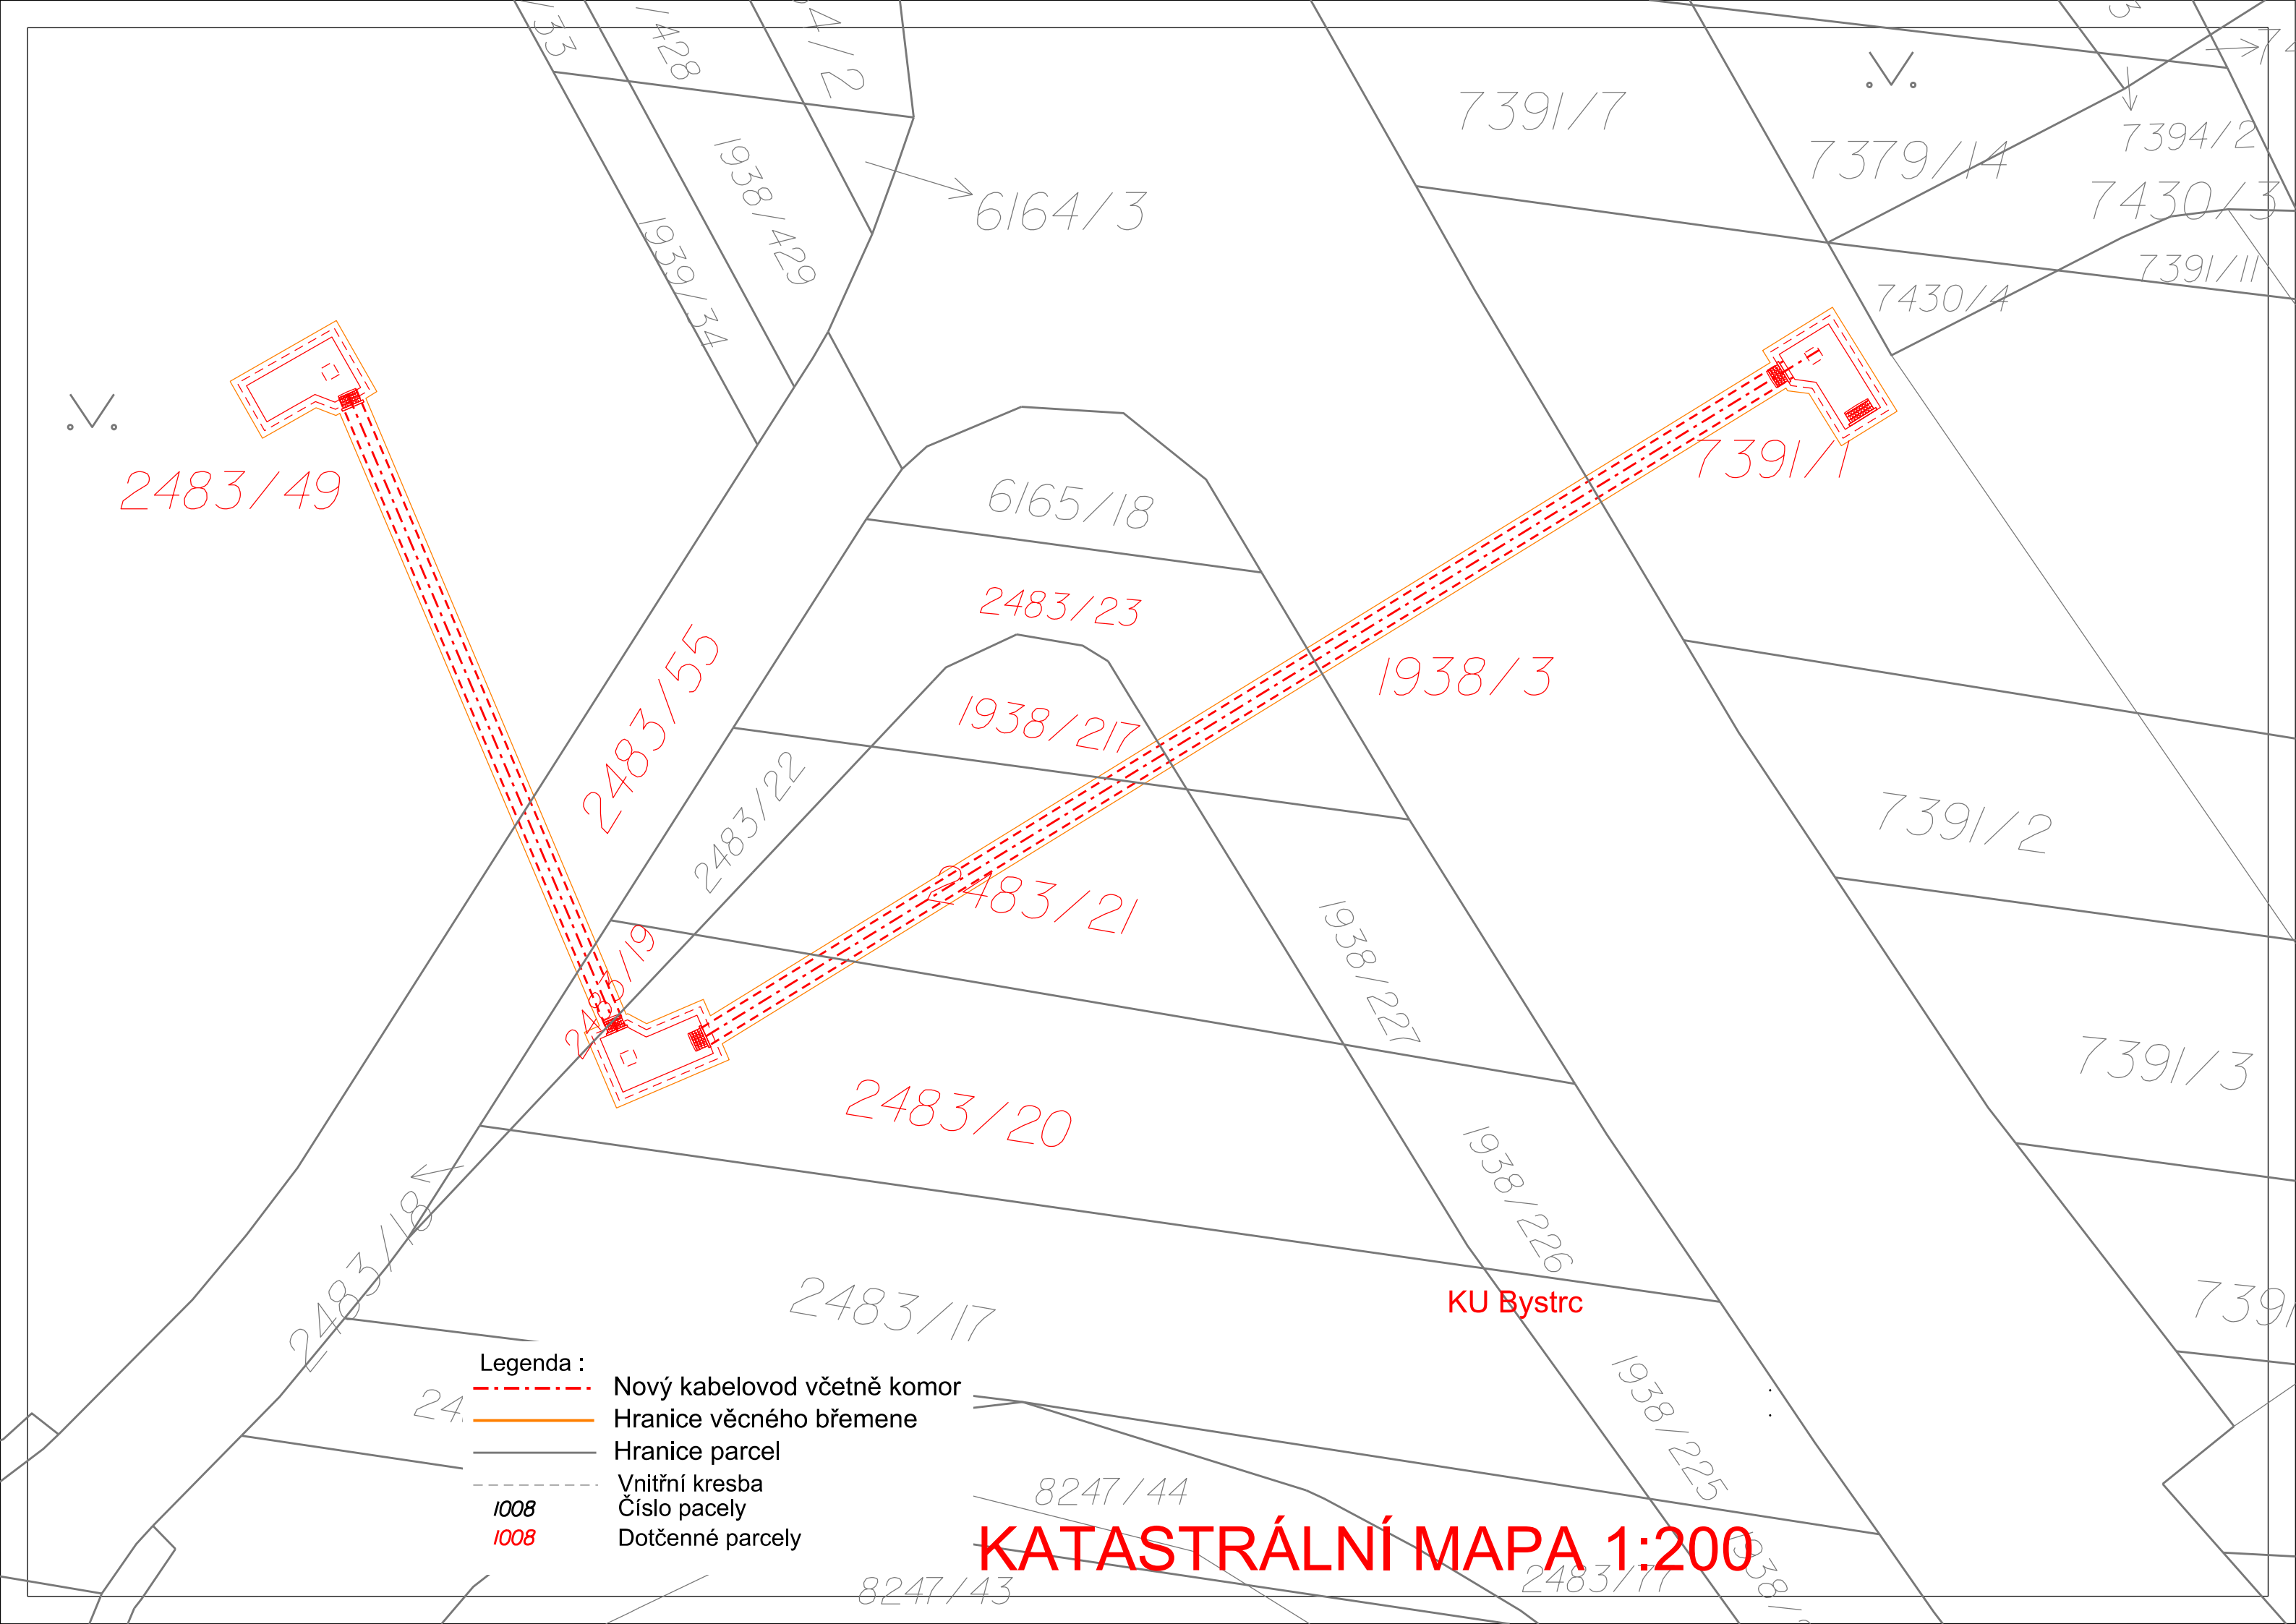

Legenda :

Nový kabelovod včetně komor

Hranice věcného břemene

Hranice parcel

Vnitřní kresba

Číslo parcely


Dotčenné parcely


1008


1008

KATASTRÁLNÍ MAPA 1:200

KU Bystřice

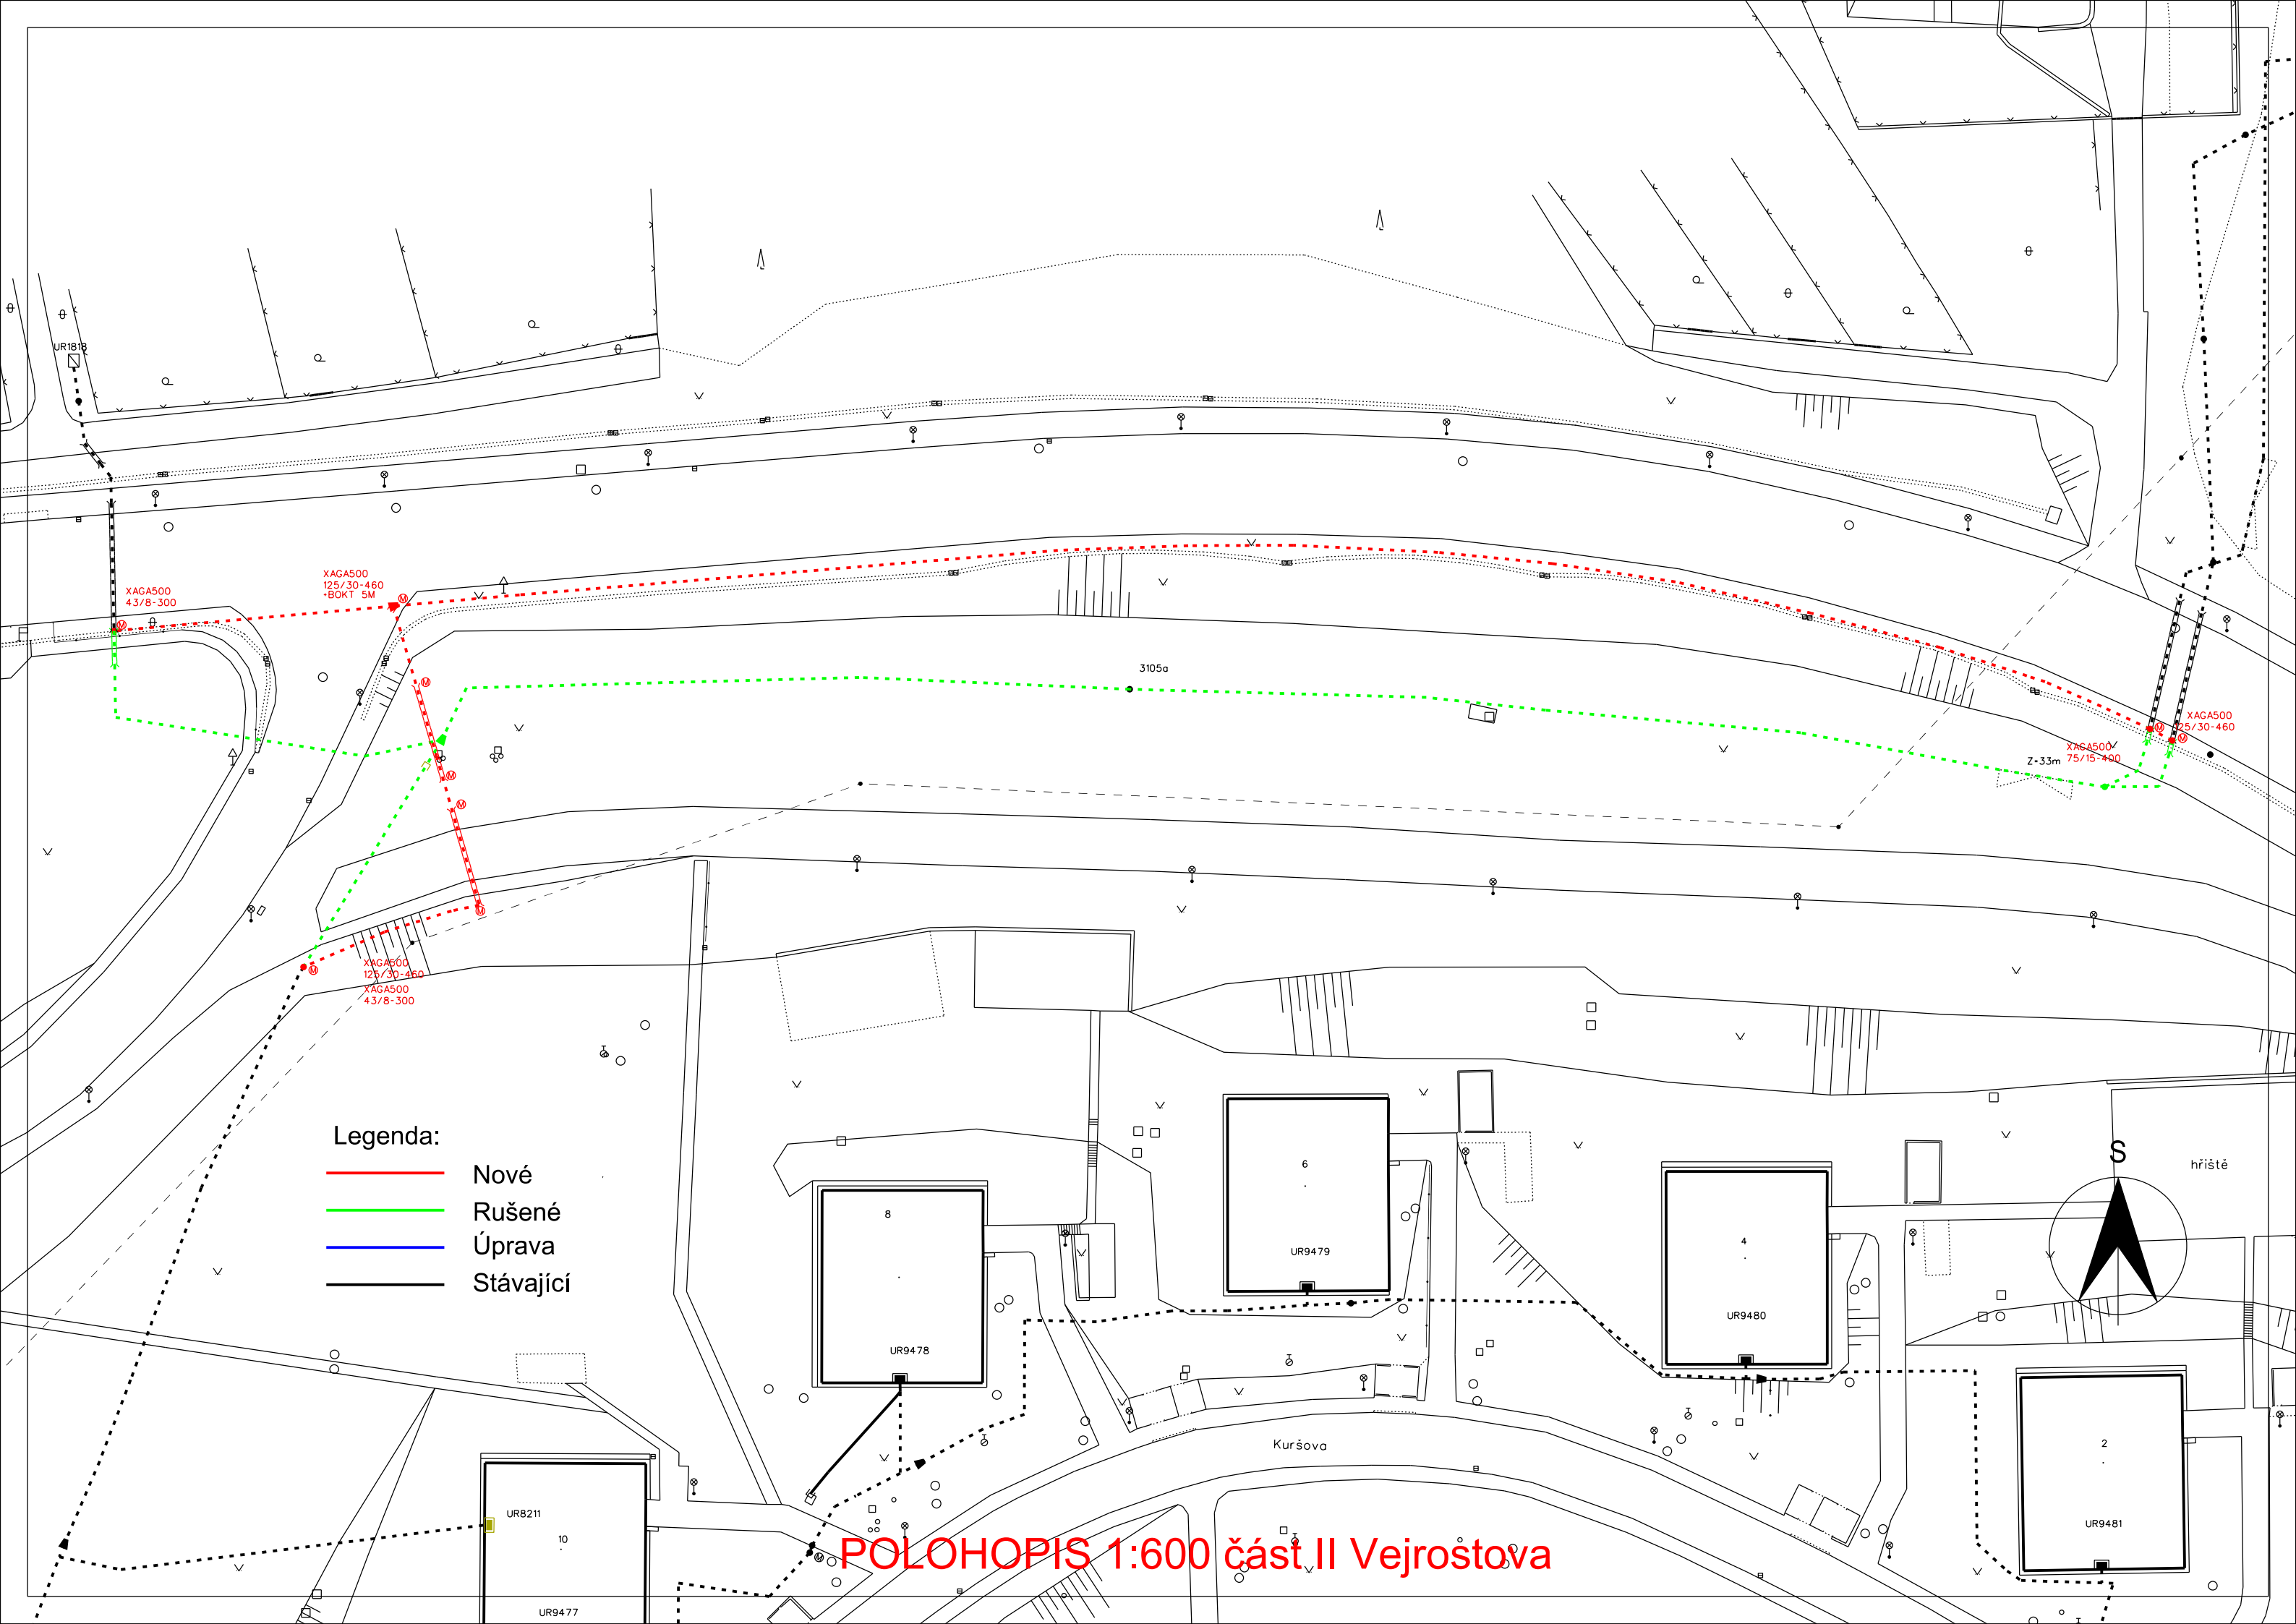

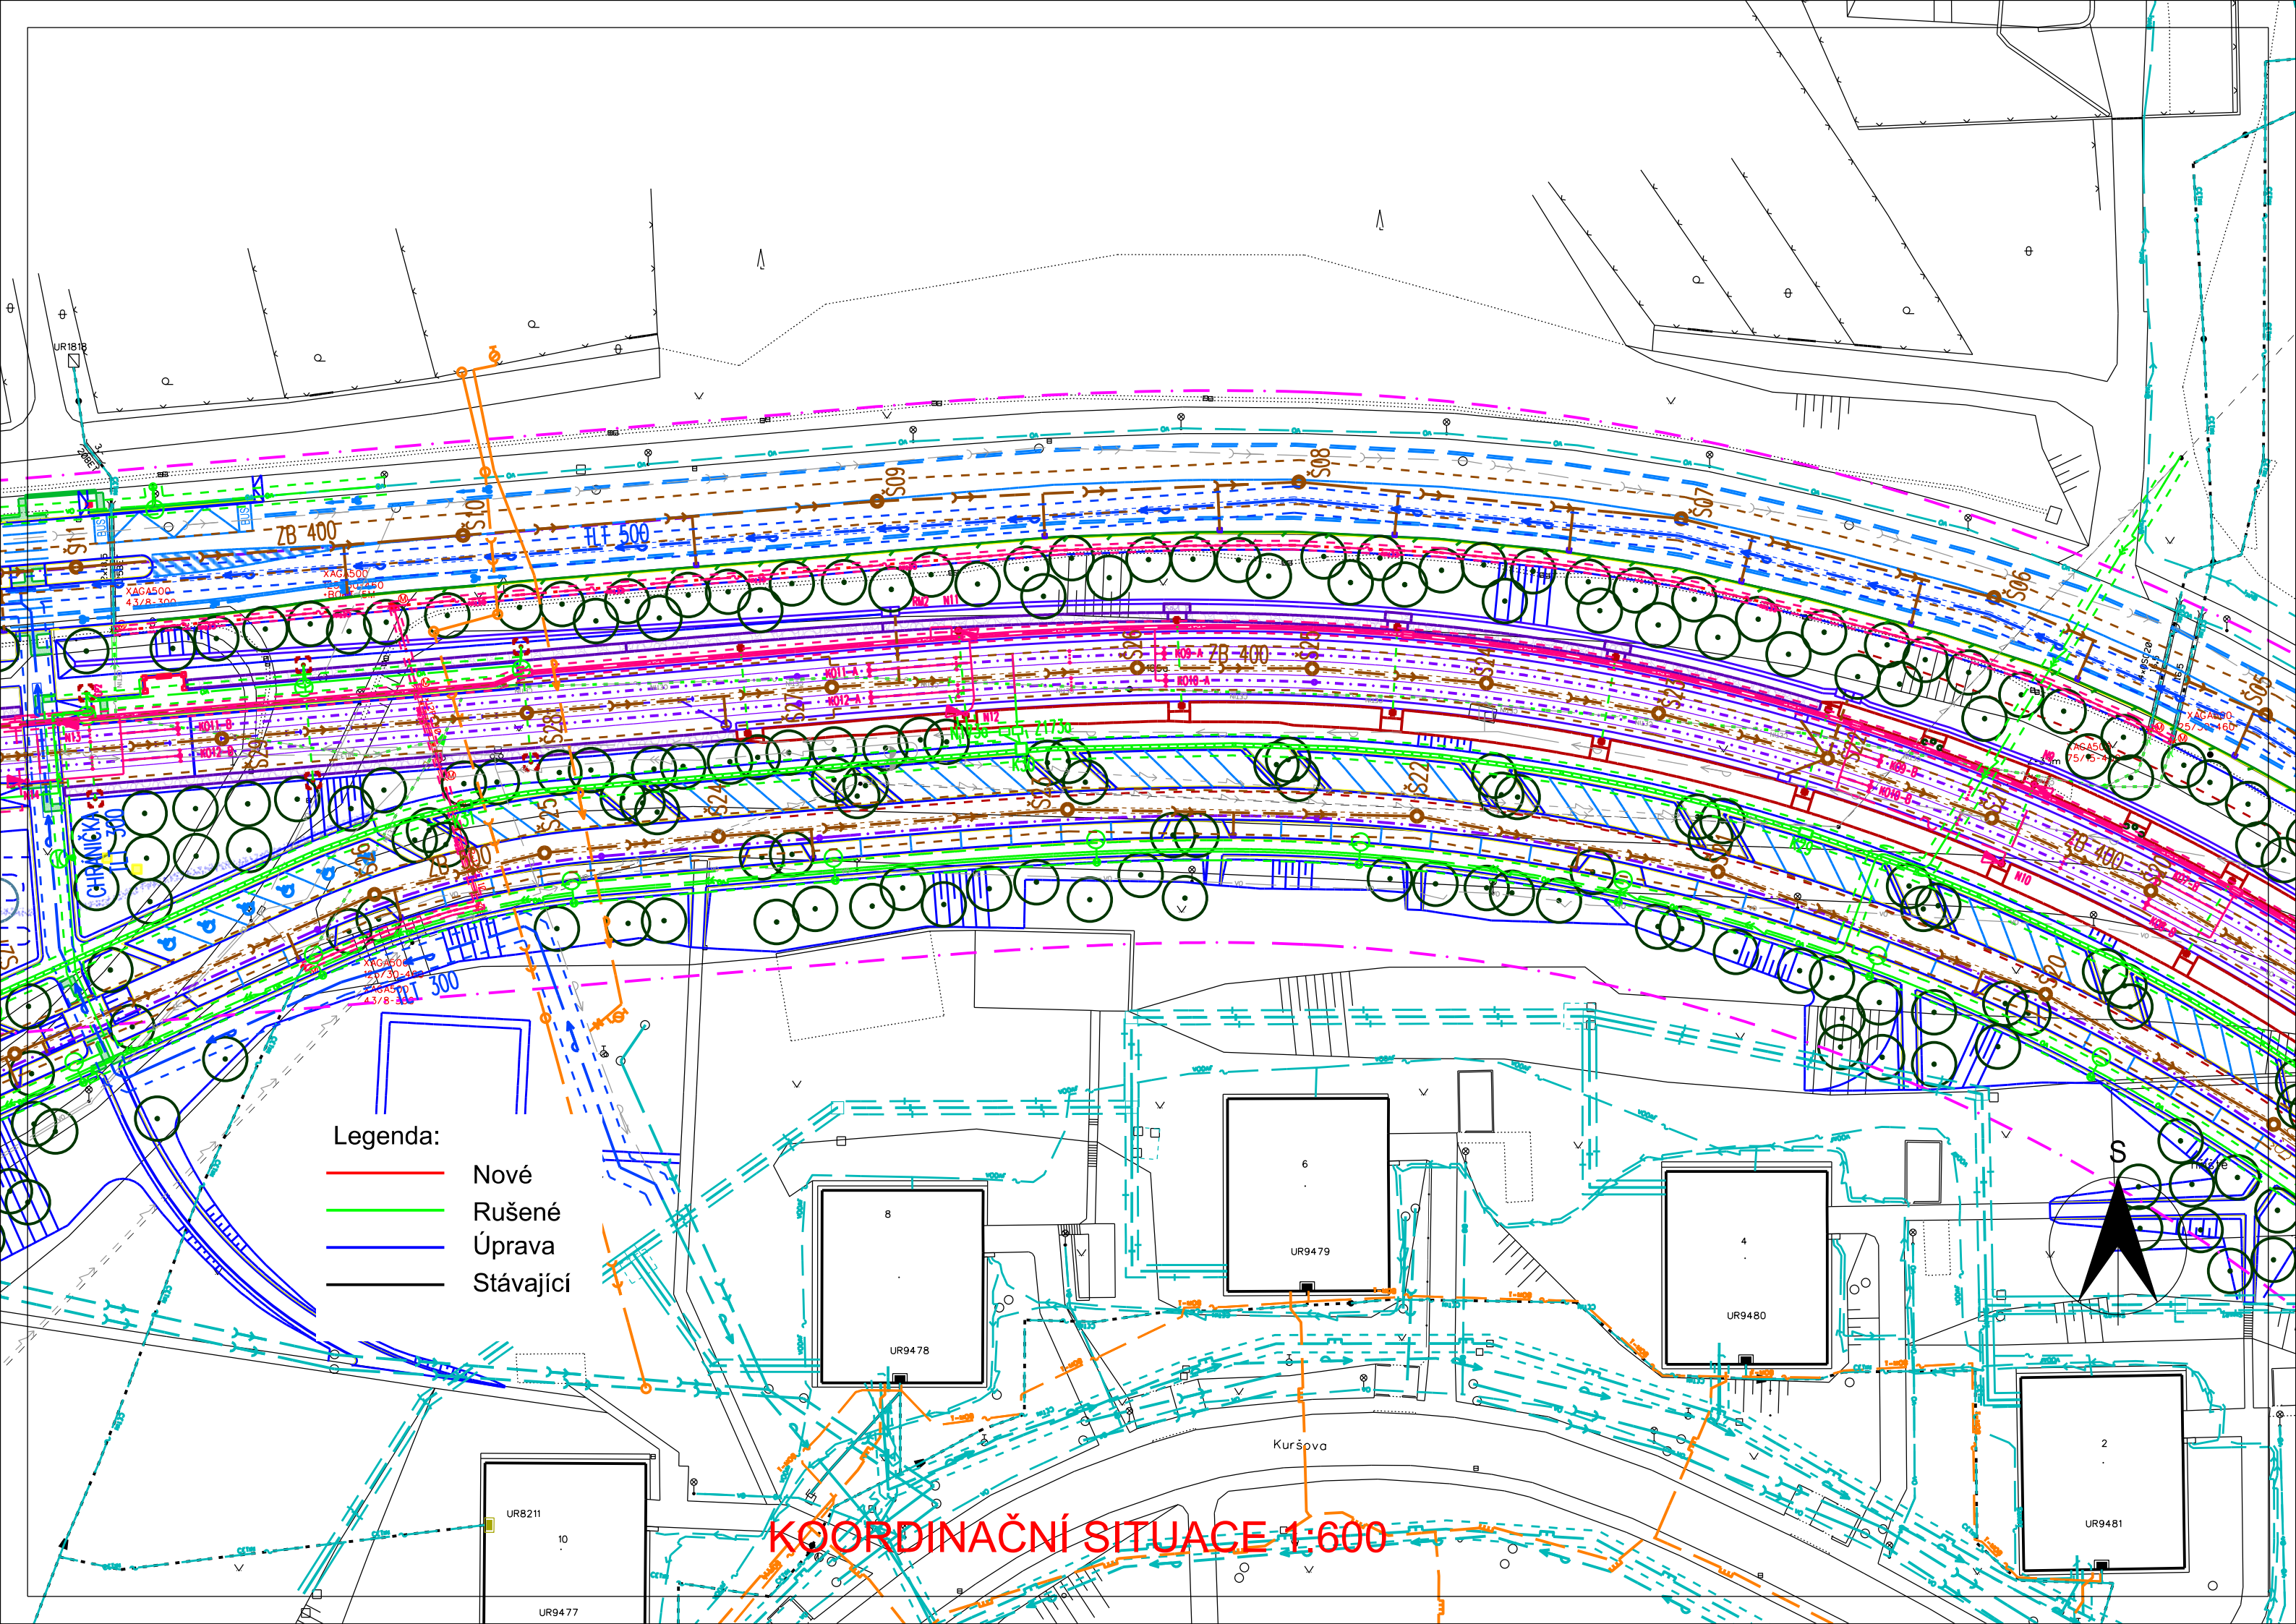

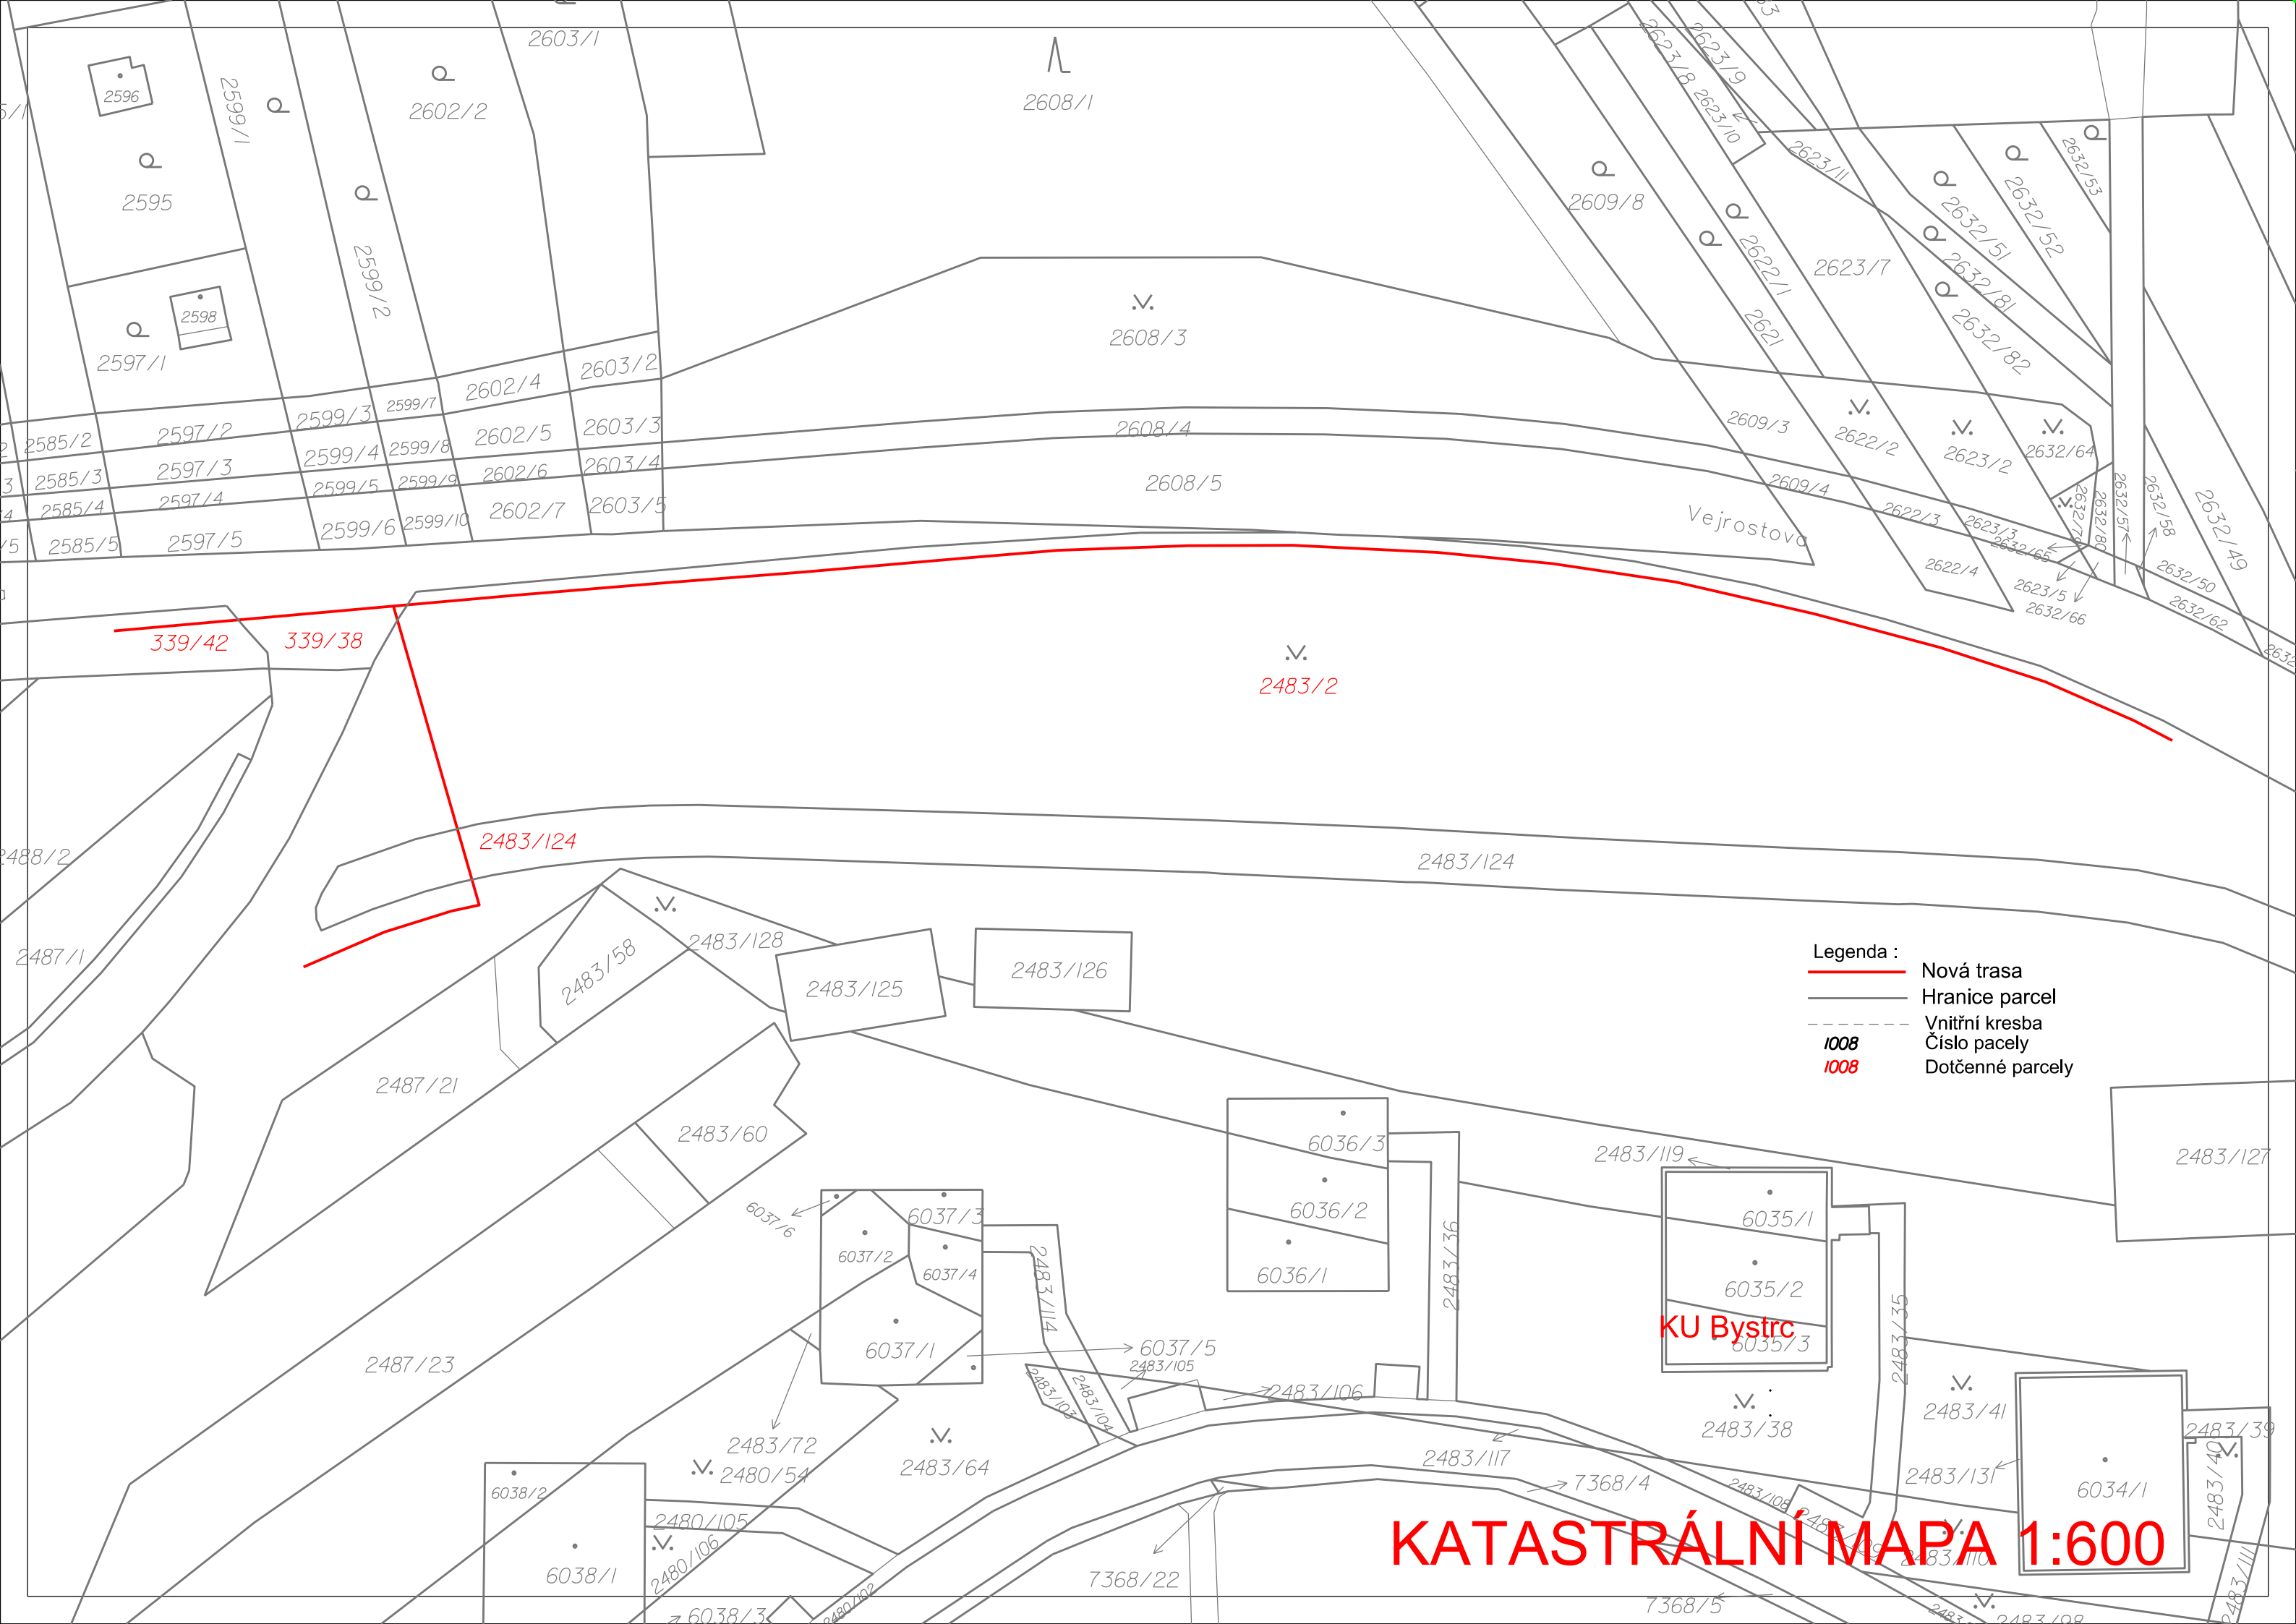

- Legenda :
- Nová trasa
 - Hranice parcel
 - Vnitřní kresba
 - Číslo parcely
 - Dotčenné parcely

KATASTRÁLNÍ MAPA 1:600

Legenda:

- Nové
- Nové v akci G3
- Měnírna Ečerova
- Rušené
- Úprava
- Stávající

BO:BS:1303

RVDSL BOBY2403

BOBY2403

BOX(podstavec)

OS02B

TS 0-vrap


TS 0/BB-vrap

2xXAGA500

100/25-460

XAGA500
100/25-460


POLOHOPIS 1:200 část III DSLAM A

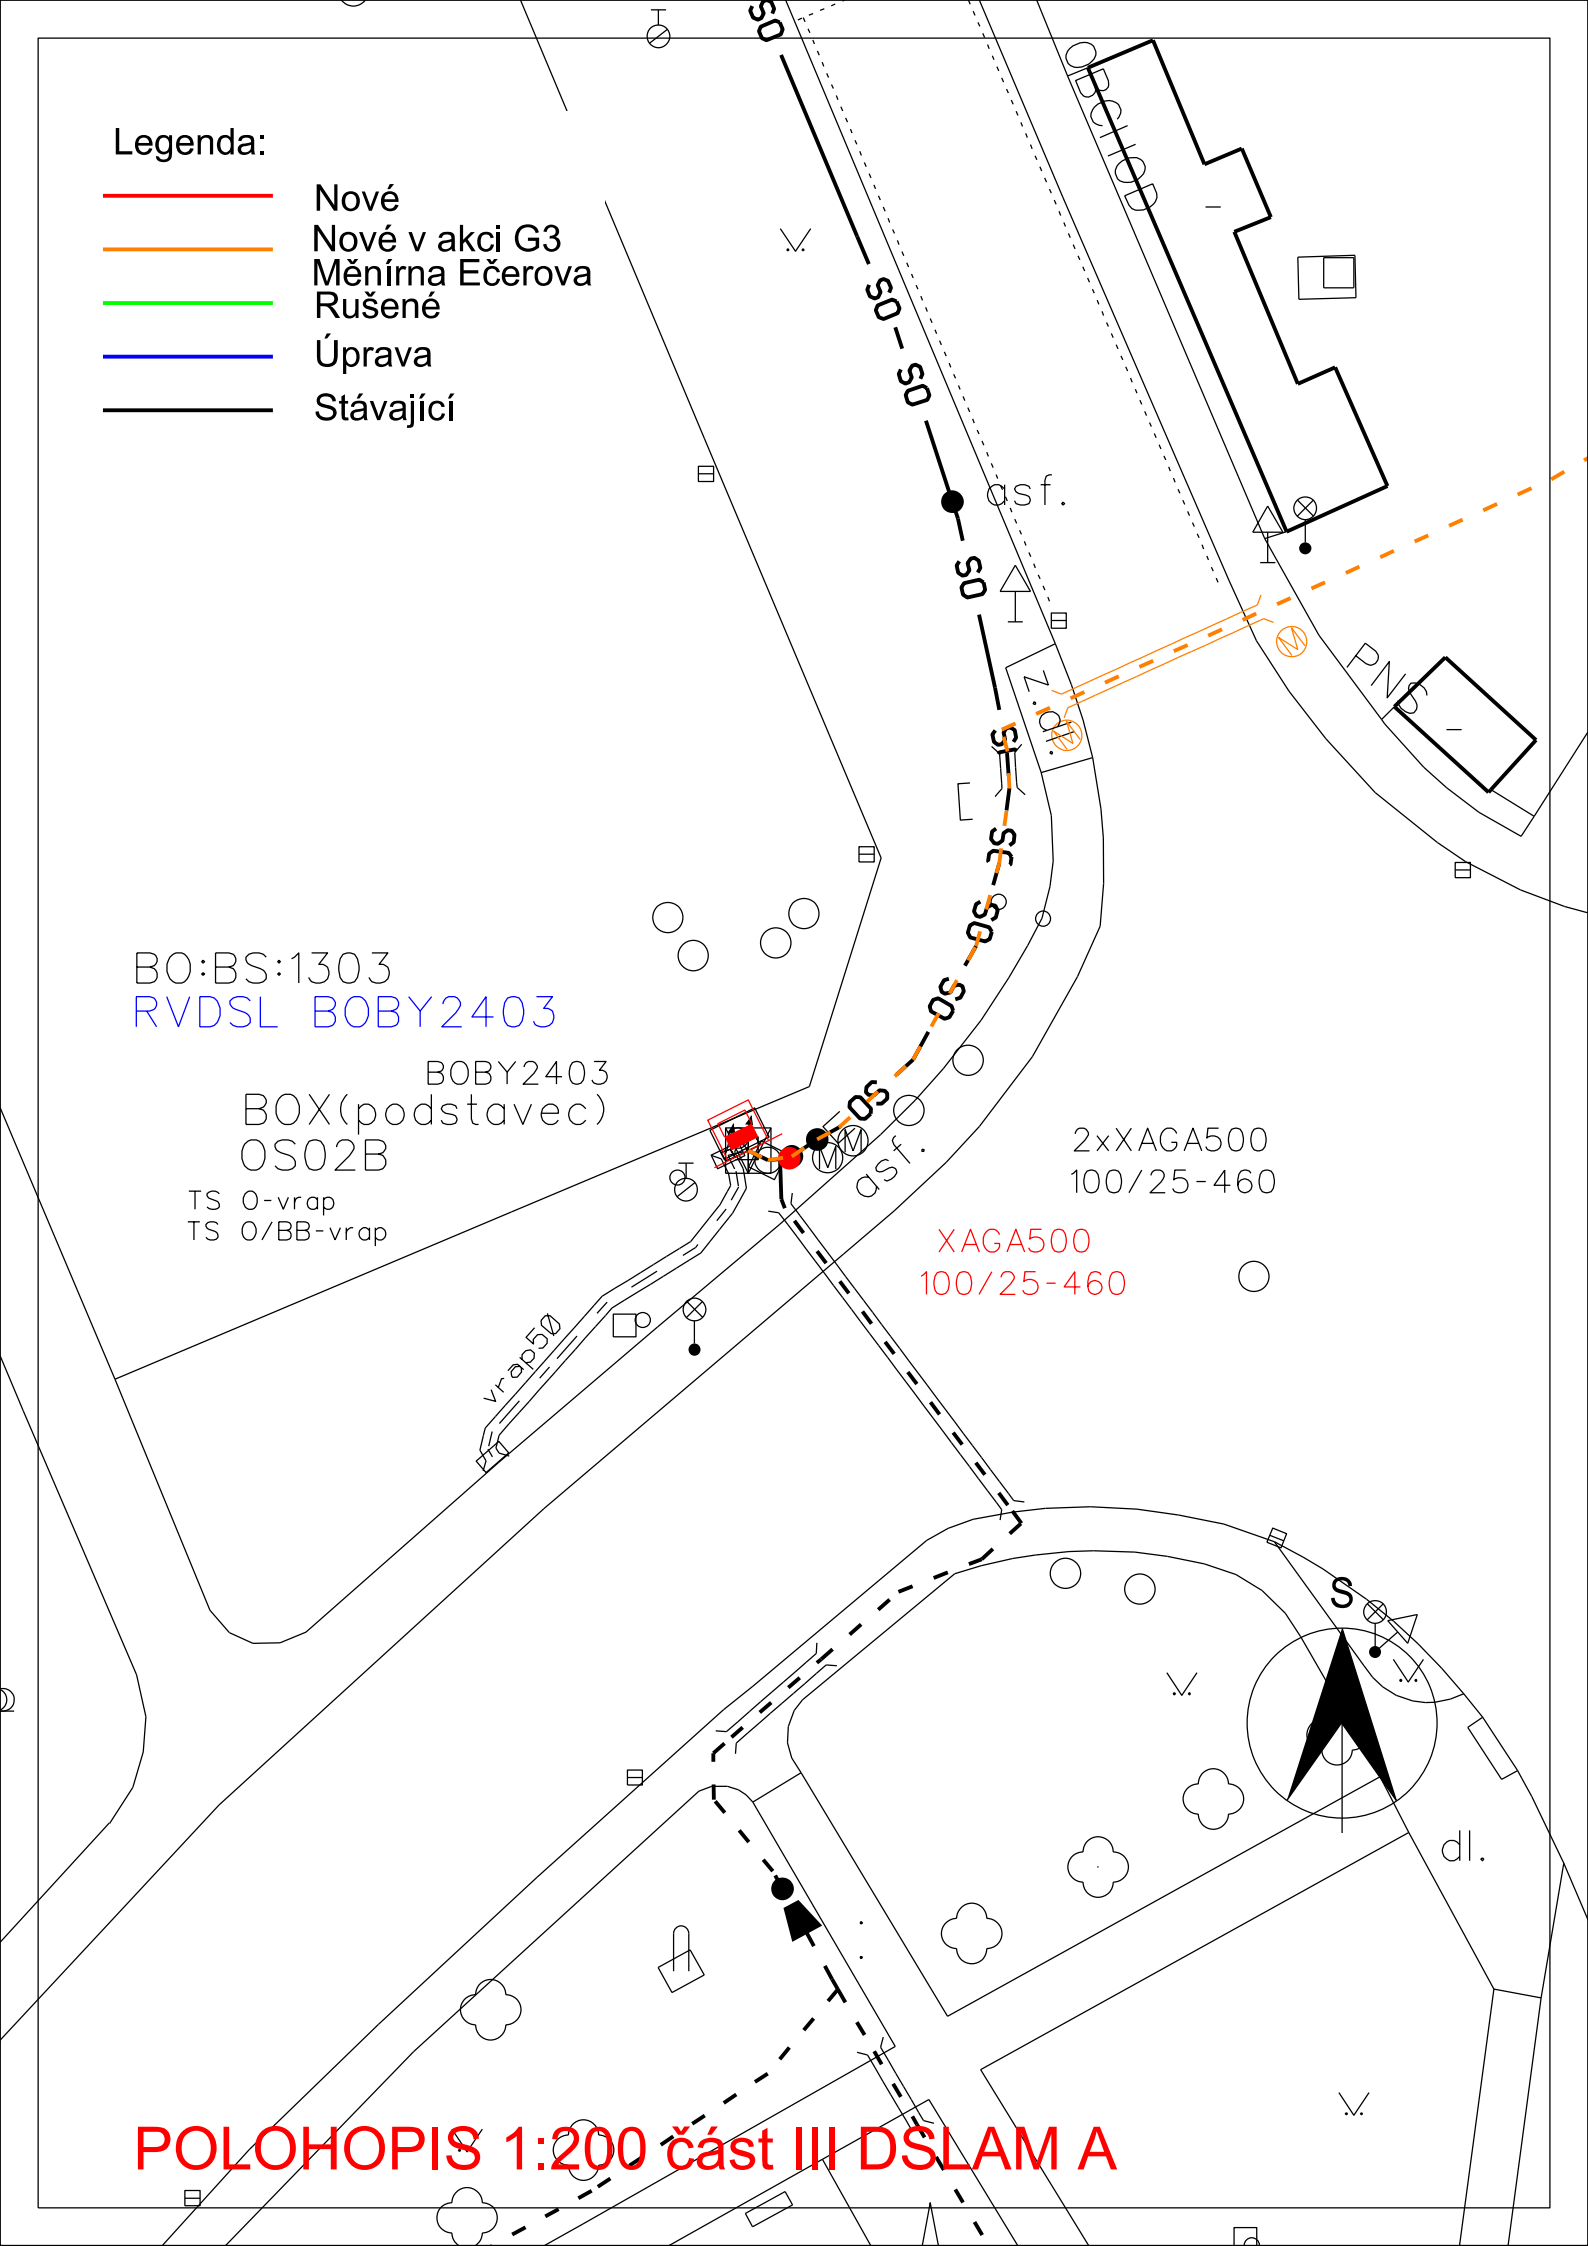

94

Legenda:

- Nové
- Nové v akci G3
- Měřírna Ečerova
- Rušené
- Úprava
- Stávající

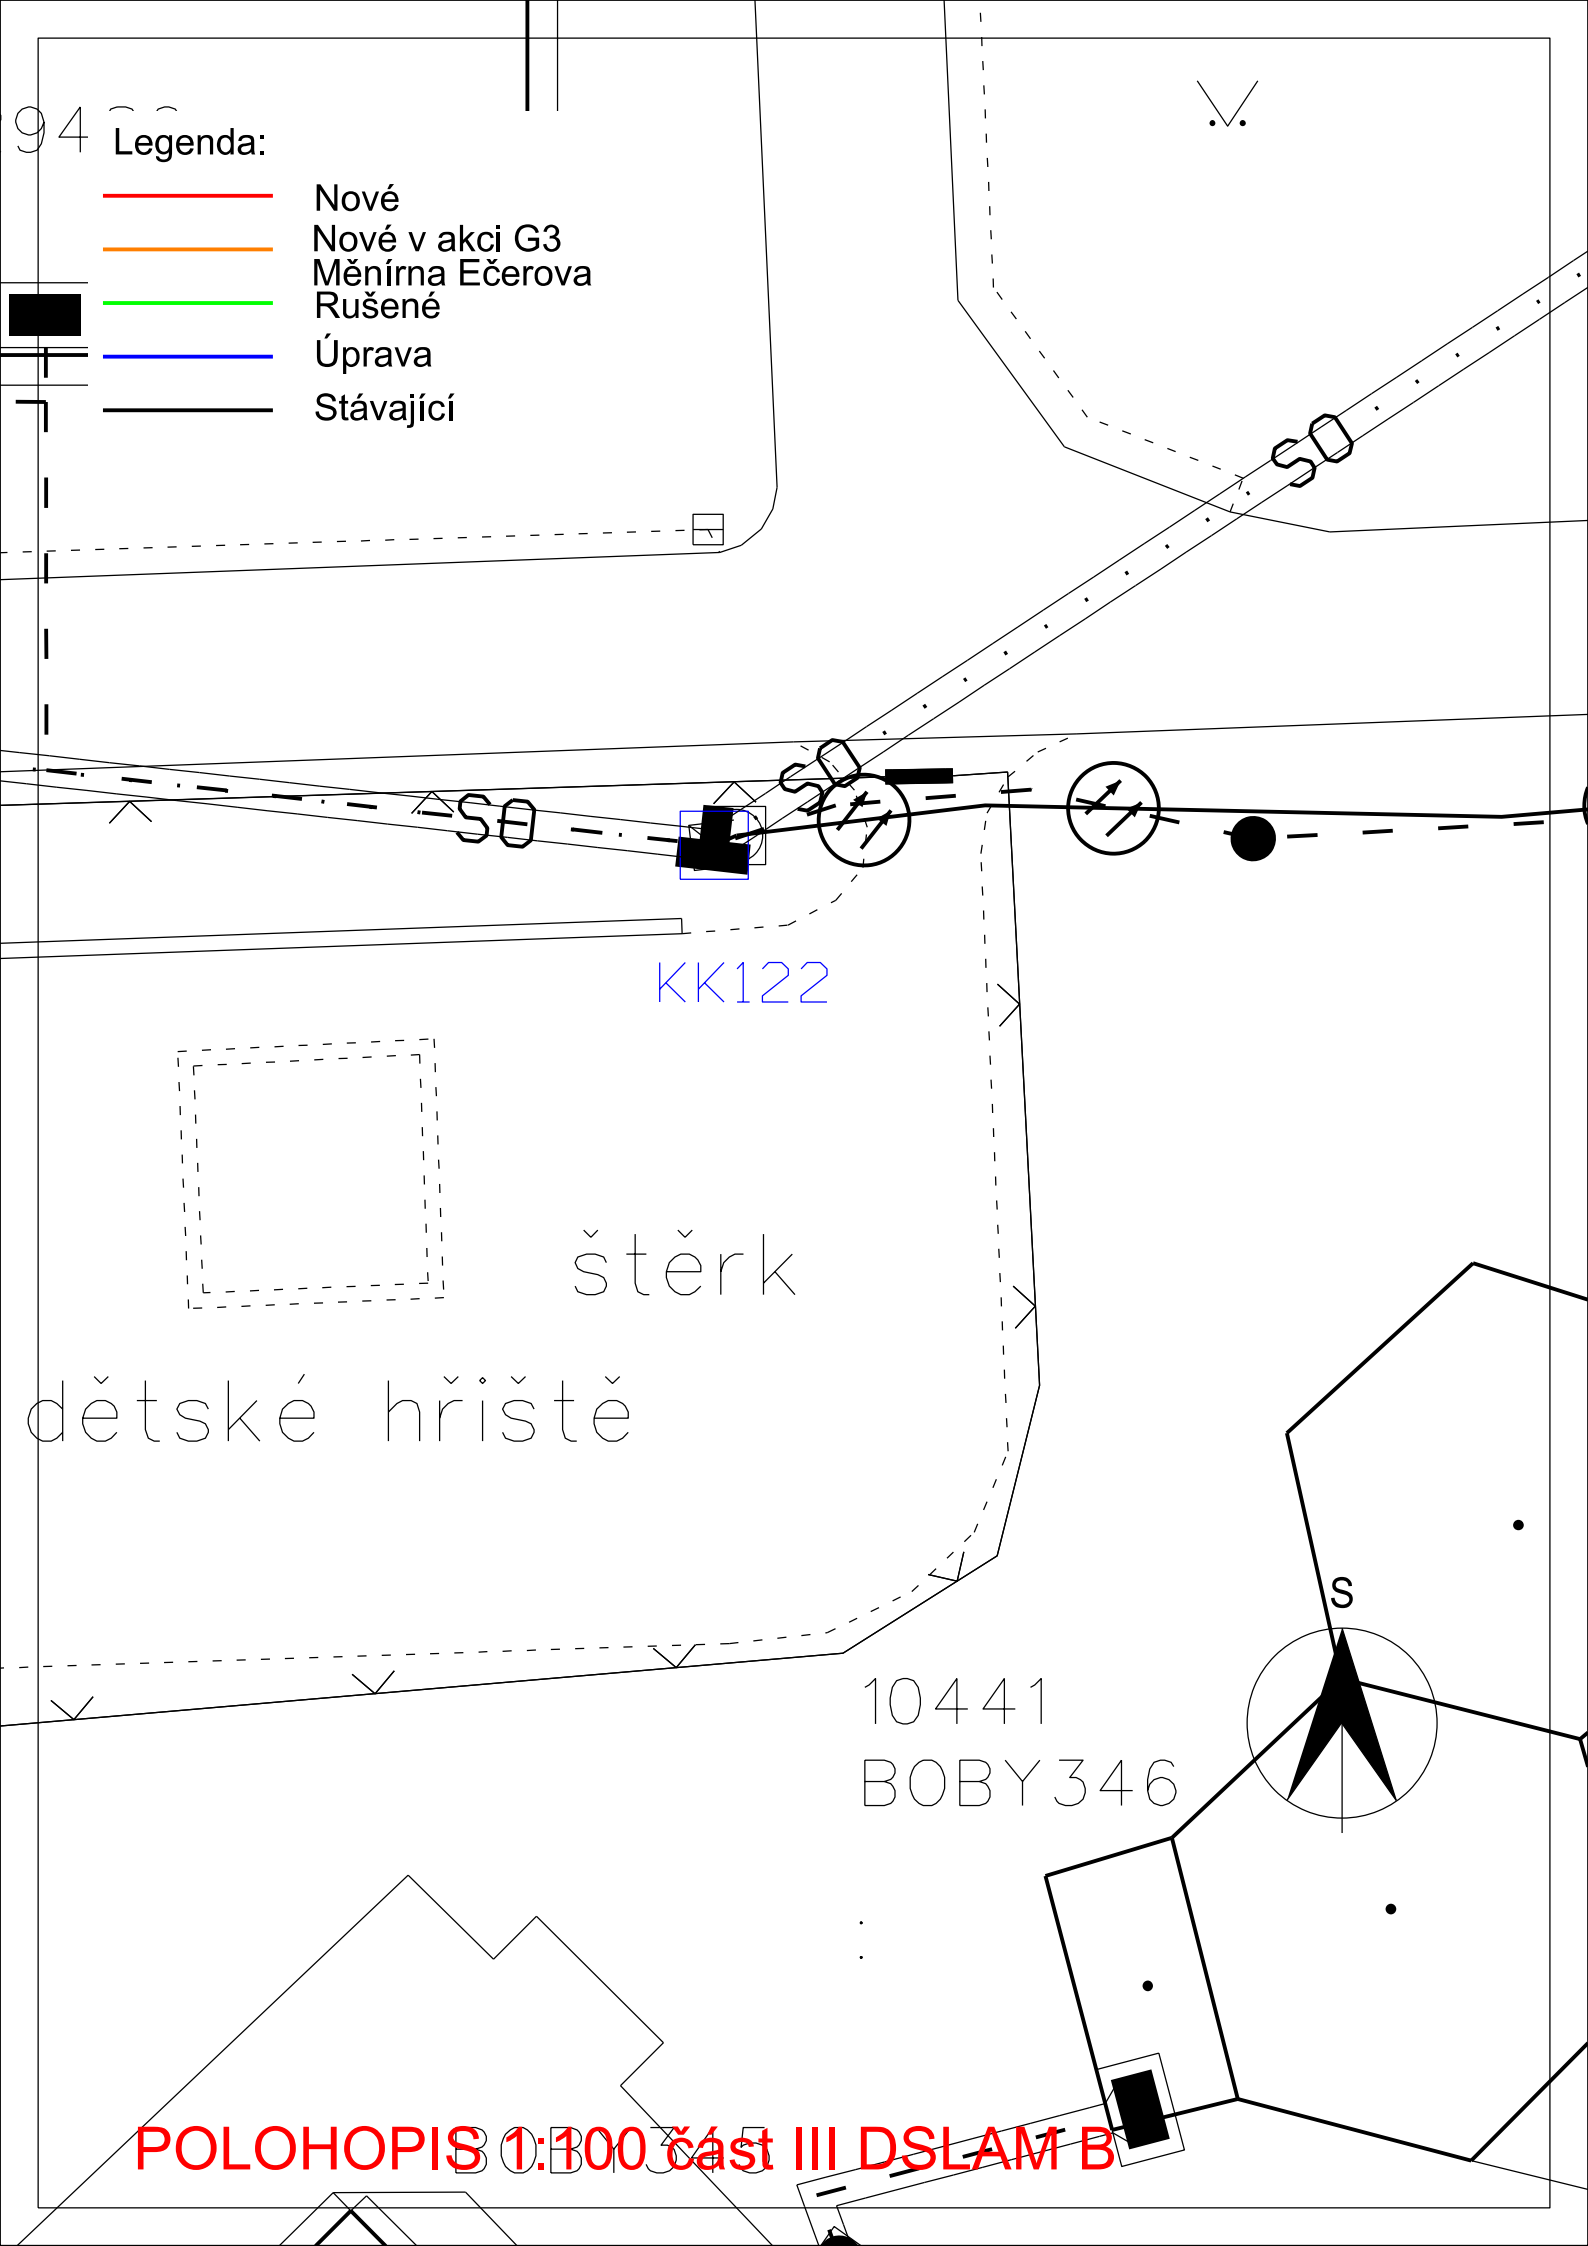

KK122

šterk

dětské hřiště

10441

BOBY 346

POLOHOPIS 1:100 část III DSLAM B

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - příprava

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▫ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▫ 2024.08
 Položková databáze: 2024.08
 Název stavby: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT
 Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný
 KPO: JMO
 HOST: Brno - Bystrc
 VUJ: Bystrc

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	447 421,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	451 575,52 Kč
-------------------------	----------------------

STAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	451 575,52 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
955835	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě	344400.00 JV	344 400,00 Kč
955833	Projekt tlk liniové sítě speciální	24600.00 JV	24 600,00 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	36328.05 JV	36 328,05 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	25941.93 JV	25 941,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 1 - Kabelovod

PPD - Propočet projektové dokumentace	
Ceník:	▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2024.08
Položková databáze:	2024.08
Název stavby:	VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT
Zhotovitel PD:	

Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	89,97 Kč
MONTÁŽ	7 853 138,22 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	9 317,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	19 308,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	896 092,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 8 777 946,55 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	8 768 485,28 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	9 461,27 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	3.00 m	89,97 Kč
MONTÁŽ			
955033	Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab.	850.00 m	64 982,50 Kč
955092	Demontáž rozvaděče optického	1.00 ks	790,25 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	440.00 m	2 274,80 Kč
958308	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	100.00 ks	22 122,00 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	100.00 ks	60 222,00 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	100.00 ks	10 767,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	18.00 ks	4 070,52 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	1641.00 ks	85 725,84 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	1492.00 ks	51 906,68 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	8.00 ks	974,40 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 809,12 Kč
954994	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	862.00 m	74 907,80 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	1400.00 ks	48 706,00 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	1400.00 ks	60 914,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	298,68 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické rozpočtová rezerva	1463700.00 JV	1 463 700,00 Kč
955260	Montáž rozvaděče optického	1.00 ks	898,40 Kč
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 431,79 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	16.00 ks	38 934,72 Kč
955945	Montáž spojky T (Y) (I)	3.00 ks	615,75 Kč
955946	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	3.00 ks	111,00 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	662,50 Kč
955948	Montáž těsnění svazku trubiček	1.00 ks	341,67 Kč
952603	Montáž trubky závlačné-4 ks	110.00 m	8 544,80 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	73 609,74 Kč

955257	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	330,61 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	22 952,81 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou <i>stavební část - kabelovod, kabelové komory</i>	5596500.00 JV	5 596 500,00 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	53.00 ks	28 595,62 Kč
958333	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti	8.00 ks	6 469,52 Kč
955306	Úprava spojky	2.00 ks	4 402,28 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	7127.85 JV	7 127,85 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	5.00 ks	7 755,00 Kč
955942	Zafukování svazku trubiček	118.00 m	4 640,94 Kč
955952	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	800.00 m	24 976,00 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	1520.00 m	51 011,20 Kč
958558	Zkouška trhací	3.00 ks	10 810,29 Kč
958728	Zpracování dok. skut. provedení nad 1 km (ks=100m)	1.00 ks	1 077,84 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	50.00 m	1 702,50 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	9 846,76 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2000.00 JV	2 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 230,22 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
323035	Kabel opt.MiDia Breeze LT,24vl. AW Flex	320.00 m	5 884,80 Kč
300122	Kabel plastový TCEPKPFL 100x4x0,6	232.00 m	129 040,72 Kč
300123	Kabel plastový TCEPKPFL 200x4x0,6	630.00 m	710 526,60 Kč
400299	Kapesník čistící S 4557 - Z201 A 267	60.00 ks	259,20 Kč
302780	Koncovka trubky 32 mm Plasson	4.00 ks	416,40 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	229,82 Kč
312417	Modul konektor. 4000-25P	224.00 ks	12 871,04 Kč
310387	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	8.00 ks	313,68 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	53.00 ks	286,73 Kč
322264	Průchodka spojky DTC průměr 6,4-9,4mm	2.00 ks	236,32 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	107,25 Kč
315066	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks	297,50 Kč
318806	Spojka I trubky rozšíř.40SRV-M 40 vodot	1.00 ks	1 483,03 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	3 321,24 Kč
319647	Spojka opt.COYOTE DROP TERM.CLOS. (DTC)	1.00 ks	1 232,66 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	11.00 ks	10 067,20 Kč
320295	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	1.00 ks	1 374,73 Kč
323827	Spojka trubičky HDPE Gas-bl 7mm s pojist	3.00 ks	148,02 Kč
302985	Spojka trubky HDPE 32mm Plasson	4.00 ks	497,52 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	794,88 Kč
314663	Spojka trubky HDPE T 40-40-40mm Matrix	2.00 ks	2 498,32 Kč
311727	Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE	1.00 ks	83,15 Kč
300633	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	118.00 m	457,84 Kč
300634	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	118.00 m	457,84 Kč
300635	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	118.00 m	457,84 Kč
300623	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	118.00 m	298,54 Kč
300624	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	178.00 m	450,34 Kč
300625	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	118.00 m	298,54 Kč
300626	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	118.00 m	298,54 Kč
300021	Trubka HDPE 32/27 černá -2x červené pr.	110.00 m	2 343,00 Kč
300019	Trubka HDPE 32/27 oranž. -2x černé pruhy	110.00 m	2 343,00 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	110.00 m	3 286,80 Kč

300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	110.00 m	3 286,80 Kč
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	3.00 m	55,17 Kč
310189	Ucpávka do těsnění trub.HDPE 7mm-bal10ks	1.00 ks	87,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	20.00 ks	0,00 Kč
301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	20.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 2 - Vejrostova

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2024.08

Položková databáze: 2024.08

Název stavby: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT

Zhotovitel PD: XXXXXXXXXX

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	324 263,78 Kč
MONTÁŽ	276 978,13 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 804,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 462,06 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	441 083,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady:	1 076 592,24 Kč
-------------------------	------------------------

STAVEBNÍ ČINNOST 1 076 592,24 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	48.00 m	1 439,52 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	273.00 m	209 027,91 Kč
958755	Rýha v chodníku 50/130	15.00 m	26 417,40 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	54.00 m	11 945,88 Kč
955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	26.00 m	68 541,46 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	314.00 m	5 287,76 Kč
954972	Znovuosazení obrubníků chodníkových	5.00 m	1 603,85 Kč
MONTÁŽ			
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	1 356,84 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	167.00 ks	8 724,08 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	152.00 ks	5 288,08 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	365,40 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	3.00 ks	678,42 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	150.00 ks	5 218,50 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	260.00 ks	11 312,60 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	69,57 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	180810.00 JV	180 810,00 Kč
<i>rozpočtová rezerva</i>			

955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	5.00 ks	12 167,10 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	3 303,56 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	101.00 m	3 004,75 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	276.00 m	14 418,24 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	268.00 m	9 816,84 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	6150.00 JV	6 150,00 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	7127.85 JV	7 127,85 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	7380.00 JV	7 380,00 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	200.00 m	6 810,00 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	7 614,89 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	12 462,06 Kč
--------	---	---------	--------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303910	Deska krycí plast. 300x500 mm	582.00 ks	11 250,06 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	67.00 m	280,73 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	306.00 m	1 465,74 Kč
300131	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	276.00 m	272 442,36 Kč
300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	268.00 m	131 799,72 Kč
300126	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	101.00 m	7 233,62 Kč
316534	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	72,27 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	9.00 ks	2 396,97 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	82.00 ks	2 212,36 Kč
315066	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks	297,50 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 191,28 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 660,62 Kč
303501	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	178,44 Kč
320295	Spojka smršťovací XAGA 500-125/30-460	3.00 ks	4 124,19 Kč
302655	Trubka PE 110/3,5/6000mm	8.00 ks	4 477,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	10.00 ks	0,00 Kč
301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	10.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 3 - Dslam

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▫ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▫ 2024.08

Položková databáze: 2024.08

Název stavby: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT

Zhotovitel PD: XXXXXXXXXX

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	4 634,58 Kč
MONTÁŽ	402 977,53 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 983,97 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	65 810,50 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 015,09 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 497 036,56 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 497 036,56 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	6.00 m	4 594,02 Kč
955052	Vytyčení trasy ve volném terénu	6.00 m	40,56 Kč
MONTÁŽ			
955094	Demontáž objektu samost.SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 086,85 Kč
958308	Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba	2.00 ks	442,44 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	2.00 ks	1 204,44 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	2.00 ks	215,34 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	1 356,84 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	600.00 ks	31 344,00 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	600.00 ks	20 874,00 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	6.00 ks	730,80 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	6.00 ks	1 356,84 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	150.00 ks	5 218,50 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	150.00 ks	6 526,50 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	69,57 Kč
955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 367,06 Kč
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické	83640.00 JV	83 640,00 Kč
<i>rozpočtová rezerva</i>			
955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	4 866,84 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	6.00 m	313,44 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 585,42 Kč

958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	36 804,87 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	22 952,81 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	128812.98 JV	128 812,98 Kč
<i>úprava RVDSL1726</i>			
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	2.00 ks	1 079,08 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	600.00 ks	20 874,00 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	3 023,40 Kč
955306	Úprava spojky	1.00 ks	2 201,14 Kč
958558	Zkouška trhací	1.00 ks	3 603,43 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	450.00 ks	11 007,00 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	1 253,64 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 614,89 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	239,66 Kč
955205	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	24.00 ks	1 035,36 Kč
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	260,55 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	24.00 ks	1 448,40 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN			
323100	Skříň SIS 1350 D HD 180	1.00 ks	61 930,54 Kč
323101	Základna nástavby 1350. 1800, 2250 D	1.00 ks	3 879,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
310684	Adaptér simplexní SC/APC	6.00 ks	26,46 Kč
303910	Deska krycí plast. 300x500 mm	12.00 ks	231,96 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	6.00 m	28,74 Kč
300123	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	6.00 m	6 766,92 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	2.00 ks	8,64 Kč
316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	173,29 Kč
312417	Modul konektor. 4000-25P	24.00 ks	1 379,04 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	2.00 ks	10,82 Kč
321497	Pigtail SANWA SM6f 6xSC/APC(2mm 0,3m)15m	1.00 ks	1 542,51 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 830,40 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	6.00 ks	577,56 Kč
315502	Vodič sděl. nf U 2x0,5	125.00 m	438,75 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - REKAPITULACE

Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - příprava	451 575,52 Kč
Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 1 - Kabelovod	8 777 946,55 Kč
Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 2 - Vejrostova	1 076 592,24 Kč
Specifikace nákladů dle CTN: VPIC Brno Bystrc-Kamechy - Prodloužení TT - Etapa č. 3 - Dslam	497 036,56 Kč

celkem:	10 803 150,87 Kč
----------------	-------------------------

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

VYPRAVENO DNE
7.11.2023

Č. j.: JMK 162994/2023

Sp. zn.: S - JMK 100211/2023 OÚPSŘ

Brno 07.11.2023

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 8.12.2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje

dne 13.12.2023 podpis: [redacted]



KUJMXOPZGLE7

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu
Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 7.11.2023

Sejmuto dne: 23.11.2023

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 7.11.2023

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“), jako příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení podle § 84 až § 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy“, kterou dne 28.06.2023 podalo Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno, prostřednictvím zplnomocněného zástupce, obchodní společnosti PK OSSENDORF s.r.o., IČ 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“).

KrÚ na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí o umístění stavby

Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy

(dále jen „záměr“ nebo též jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 339/27 (ostatní plocha), parc.č. 339/32 (ostatní plocha), parc.č. 339/33 (ostatní plocha), parc.č. 339/38 (ostatní plocha), parc.č. 339/39 (ostatní plocha), parc.č. 339/40 (ostatní plocha), parc.č. 339/42 (ostatní plocha), parc.č. 339/49 (ostatní plocha), parc.č. 339/53 (ostatní plocha), parc.č. 339/69 (ostatní plocha), parc.č. 1938/3 (ostatní plocha), parc.č. 1938/7 (ostatní plocha), parc.č. 1938/42 (ostatní plocha), parc.č. 1938/179 (ostatní plocha), parc.č. 1938/189 (ostatní plocha), parc.č. 1938/190 (ostatní plocha), parc.č. 1938/191 (ostatní plocha), parc.č. 1938/192 (ostatní plocha),

[illegible]

[illegible]

(ostatní plocha), parc.č. 8249/5 (ostatní plocha), parc.č. 8250/1 (ostatní plocha), parc.č. 8250/2 (ostatní plocha), parc.č. 8250/3 (ostatní plocha), parc.č. 8250/6 (ostatní plocha), parc.č. 8250/7 (ostatní plocha), parc.č. 8250/8 (ostatní plocha), parc.č. 8250/9 (ostatní plocha), parc.č. 8250/10 (ostatní plocha), parc.č. 8250/11 (ostatní plocha), parc.č. 8250/12 (ostatní plocha), parc.č. 8250/13 (ostatní plocha), parc.č. 8250/14 (ostatní plocha), parc.č. 8251/1 (ostatní plocha), parc.č. 8251/8 (ostatní plocha), parc.č. 8260/1 (ostatní plocha), parc.č. 8260/2 (ostatní plocha), parc.č. 8266 (ostatní plocha), parc.č. 8267/1 (ostatní plocha), parc.č. 8267/2 (ostatní plocha), parc.č. 8267/3 (ostatní plocha), parc.č. 8268/1 (ostatní plocha), parc.č. 8269 (ostatní plocha), parc.č. 8270 (ostatní plocha), parc.č. 8280 (ostatní plocha), parc.č. 8281 (ostatní plocha), parc.č. 8282 (ostatní plocha), parc.č. 8283 (ostatní plocha), parc.č. 8286/2 (ostatní plocha), parc.č. 8287 (ostatní plocha), parc.č. 8290 (ostatní plocha), parc.č. 8326/1 (ostatní plocha), parc.č. 8326/2 (ostatní plocha), parc.č. 8329 (ostatní plocha), parc.č. 8331 (ostatní plocha) v k.ú. Bystřec;

parc.č. 1847/5 (ostatní plocha), parc.č. 1847/11 (ostatní plocha), parc.č. 1847/12 (ostatní plocha), parc.č. 1847/17 (ostatní plocha), parc.č. 1847/18 (ostatní plocha), parc.č. 1847/21 (ostatní plocha), parc.č. 1847/22 (ostatní plocha), parc.č. 1847/25 (ostatní plocha), parc.č. 1847/27 (ostatní plocha), parc.č. 1847/33 (ostatní plocha), parc.č. 1855/1 (ostatní plocha), parc.č. 1861 (ostatní plocha), parc.č. 1862 (ostatní plocha), parc.č. 1863 (ostatní plocha), parc.č. 1864 (ostatní plocha), parc.č. 1877/11 (ostatní plocha), parc.č. 1886/1 (ostatní plocha), parc.č. 1886/2 (ostatní plocha), parc.č. 1888/8 (ostatní plocha), parc.č. 1888/11 (ostatní plocha), parc.č. 1889 (ostatní plocha), parc.č. 1892 (ostatní plocha), parc.č. 1894 (ostatní plocha), parc.č. 1896/13 (ostatní plocha), parc.č. 1897 (ostatní plocha), parc.č. 1901/6 (ostatní plocha), parc.č. 1904 (ostatní plocha), parc.č. 1907 (ostatní plocha), parc.č. 1912/2 (ostatní plocha), parc.č. 1920/38 (ostatní plocha), parc.č. 1920/41 (ostatní plocha), parc.č. 1923/1 (ostatní plocha), parc.č. 1934/1 (ostatní plocha), parc.č. 1934/2 (ostatní plocha), parc.č. 1998/2 (ostatní plocha), parc.č. 2000/6 (ostatní plocha), parc.č. 2001/1 (ostatní plocha), parc.č. 2001/11 (ostatní plocha), parc.č. 2001/17 (ostatní plocha), parc.č. 2001/20 (ostatní plocha), parc.č. 2001/24 (ostatní plocha), parc.č. 2001/25 (ostatní plocha), parc.č. 2001/26 (ostatní plocha), parc.č. 2001/27 (ostatní plocha), parc.č. 2001/28 (ostatní plocha), parc.č. 2001/29 (ostatní plocha), parc.č. 2001/30 (ostatní plocha), parc.č. 2001/31 (ostatní plocha), parc.č. 2001/32 (ostatní plocha), parc.č. 2003/19 (ostatní plocha), parc.č. 2005/5 (ostatní plocha), parc.č. 2006 (ostatní plocha), parc.č. 2007 (ostatní plocha), parc.č. 2008 (ostatní plocha), parc.č. 2012/4 (ostatní plocha), parc.č. 2028/3 (ostatní plocha), parc.č. 2029 (ostatní plocha), parc.č. 2030 (ostatní plocha), parc.č. 2062 (ostatní plocha), parc.č. 2064 (ostatní plocha), parc.č. 2080/2 (ostatní plocha), parc.č. 2080/3 (ostatní plocha), parc.č. 2082/1 (ostatní plocha), parc.č. 2082/7 (ostatní plocha), parc.č. 2082/11 (ostatní plocha), parc.č. 2082/12 (ostatní plocha), parc.č. 2082/25 (ostatní plocha), parc.č. 2083/1 (ostatní plocha), parc.č. 2083/4 (ostatní plocha), parc.č. 2083/5 (ostatní plocha), parc.č. 2083/6 (ostatní plocha), parc.č. 2083/7 (ostatní plocha), parc.č. 2083/8 (ostatní plocha), parc.č. 2083/11 (ostatní plocha), parc.č. 2083/12 (ostatní plocha), parc.č. 2083/13 (ostatní plocha), parc.č. 2083/19 (ostatní plocha), parc.č. 2084/1 (ostatní plocha), parc.č. 2084/2 (ostatní plocha), parc.č. 2084/3 (ostatní plocha), parc.č. 2084/4 (ostatní plocha), parc.č. 2085/2 (ostatní plocha), parc.č. 2086/2 (ostatní plocha), parc.č. 2086/4 (ostatní plocha), parc.č. 2086/5 (ostatní plocha), parc.č. 2087/1 (ostatní plocha), parc.č. 2087/5 (ostatní plocha), parc.č. 2087/6 (ostatní plocha), parc.č. 2087/8 (ostatní plocha), parc.č. 2087/9 (ostatní plocha), parc.č. 2087/11 (ostatní plocha), parc.č. 2953/21 (ostatní plocha) v k.ú. Žebětín.

Druh a účel umísťované stavby – základní popis záměru:

Předmětem žádosti je umístění stavby dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající převážně v prodloužení tramvajové trati Bystřec–Kamechy na území města Brna. Jedná se o novostavbu tramvajové trati ve smyslu prodloužení stávající tramvaje ze smyčky Ečerova v Bystřci do nové smyčky při ulici Hostislavova v sídlišti Kamechy. Délka

prodloužení v nové trase činí 1,4 km. Mimo vlastní stavbu tramvajového tělesa, včetně jeho tunelové trasy, jsou součástí úpravy dotčené pozemní komunikace, mosty, přeložky inženýrských sítí a další stavbou vyvolané investice. Stavba je navržena jako dvoukolejná tramvajová trať v prodloužení stávající trati doposud končící ve smyčce Ečerova, která se bude nacházet na samostatném tělese mimo pozemní komunikace. V souvislosti s prodloužením dojde oproti současnosti ke změně směru pojíždění stávající konečné smyčky (nově ve směru hodinových ručiček). Touto úpravou dojde ke sjednocení nástupní hrany pro vozidla odjíždějící ze smyčky Ečerova s vozidly přijíždějícími po prodloužené trati od Kamech. Smyčka Ečerova zůstane dvoukolejná, stejně jako je tomu v současnosti. V rámci jejího rozsahu dojde k úpravě nástupišť a zpevněných ploch. Ve vzdálenosti cca 520 m od smyčky Ečerova bude na úrovni odbočení ulice Ruda zřízena nová tramvajová zastávka s pracovním názvem „Ruda“. Jedná se o dvě v podélném směru odsazená nástupiště mezi jejichž čely bude umístěn přechod přes koleje. V jeho blízkosti bude zřízeno nakolejovací místo pro možnost nájezdu dvoucestných vozidel údržby. Ve vzdálenosti 160 m za zastávkou Ruda vjede tramvajová trať do tunelu, kterým překoná vrcholovou část terénního hřebene mezi Bystrčí a Žebětínem. Tunelovým úsekem tramvaj rovněž podjede ulici Říčanskou a novou trasu ulice Teyschlova. Celková délka tunelu bude 320 m. Před vjezdem do tunelu u bystrckého portálu vpravo bude umístěn provoznětechnologický objekt tunelu, u něž bude možnost vjezdu silničních vozidel záchranného systému nebo údržby do tunelu. Bezprostředně za tunelem je navržena zastávka s pracovním názvem „Říčanská“. Jedná se o dvě vstřícně situovaná nástupiště. Zastávka je oproti okolnímu terénu umístěna v hluboké rokli, přičemž přístup k ní bude možný rampovými chodníky v horní úrovni propojenými mostem. Úrovňový přechod kolejí nebude na zastávce umožněn. Ve vzdálenosti 200 m za zastávkou „Říčanská“ bude následovat vjezd do smyčky Kamechy, v které je tramvajová trať ukončena. Bude se jednat o tříkolejnou smyčku obsahující dvě výstupní hrany a jednu nástupní. Geometrické uspořádání trati, mimo úseku smyček, vyhovuje pro traťovou rychlost 60 km/h. V rozsahu tunelové trasy a v úseku od tunelu směrem ke smyčce Ečerova bude s ohledem na omezené rozhledové poměry (tunel, hluboký zářez) tramvajový provoz řízen zabezpečovacím zařízením. V souvislosti se stavbou tramvajové trati dojde k ovlivnění sítě pozemních komunikací v oblasti. Bude vybudována nová komunikace s přemostěním tramvajové trati v prodloužení východní větve ulice Fleischnerova. Současný výjezd od Horního náměstí na Vejrostovu ulici bude posunut do výškově výhodnější polohy (podjezdná výška nad tratí) o cca 100 m ve směru od smyčky Ečerova. V souběhu s ním se vybuduje nová lávka sloužící pro pěší a převedení potrubního vedení teplovodu a plynovodu. Komunikace procházející podélně mezi Kuršovou a Vejrostovou ulicí, využívaná v současnosti především k parkování, bude přesunuta mimo tramvajovou trať. Stávající napojení Teyschlovy ulice na Vejrostovu bude zrušeno a přesměrováno tak, aby její křížení s tramvajovou tratí proběhlo v místě tunelu. V souvislosti se zásahem do komunikací dojde k výstavbě nových parkovacích ploch, které nahradí parkovací místa stavbou zrušená. Při křižovatce ulic Kamechy a Hostislavova bude vybudováno autobusové obratiště a autobusové zastávky, které umožní přestup cestujících z autobusů od Žebětína na tramvaj. Autobusové obratiště umožní otáčení autobusů náhradní dopravy při výluce tramvajového provozu.

Hlavní stavbou v rámci souboru staveb je stavba dráhy – tramvajová trať, která je v platném územním plánu města Brna vymezena jako veřejně prospěšná stavba pod označením VPS17/05-II/5 a VPS17/05-II/4. Z tohoto důvodu je ve smyslu § 2e odst. 1 liniového zákona příslušným stavebním úřadem Krajský úřad Jihomoravského kraje, který je v souladu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřený výkonem obecného stavebního úřadu.

Záměr je členěn na tyto stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS):

Podrobný popis jednotlivých SO a PS viz **příloha č. 1** tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.

SO 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

SO 001 Příprava staveniště

SO 002 Odstranění prodejních stánků při smyčce Ečerova

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 Úpravy Vejrostovy ulice

SO 102 Úprava napojení Fleischnerovy ulice

SO 103 Úprava a prodloužení Šemberovy ulice

SO 104 Úprava komunikace k zahrádkám

SO 105 Komunikace Kuršova - Vejrostova

SO 106 Propojovací komunikace Kuršova - Teyschlova

SO 107 Napojení Teyschlova - Vejrostova

SO 108 Úpravy komunikací Hostislavova a Kamechy, bus. smyčka

SO 109 Chodníky zastávky Říčanská

SO 111 Parkoviště při ulici Kuršova

SO 112 Parkoviště při ulici Teyschlova

SO 113 Obnova parkoviště Kocanovská

SO 114 Úprava Říčanské ulice

SO 121 Chodníky MČ Bystrc

SO 122 Nezpevněné plochy MČ Bystrc

SO 123 Nezpevněné plochy MČ Žebětín

SO 131 Příjezd k PTO tunelu

SO 132 Komunikace k měnící Ečerova

SO 133 Komunikace k měnící Říčanská

SO 134 Příjezd k retenční nádrži Kamechy

SO 135 Dočasné dopravní konstrukce (provizorní zastávky)

SO 151 Přechodné dopravní značení

SO 152 Trvalé dopravní značení

SO 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 201 Most přes TT, Šemberova - Vejrostova

SO 202 Most přes TT, Kuršova - Vejrostova

SO 203 Lávka pro pěší přes TT, Kuršova - Vejrostova

SO 204 Lávka přes TT, Listnatá - Přírodní

SO 205 Vyhlídková lávka při ul. Říčanská

SO 211 Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,480 vpravo

SO 212 Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,610 vlevo

SO 213 Zárubní zeď podél TT km 0,774 - 0,864 vlevo

SO 214 Pilotová stěna u PTO

SO 215 Opěrné zdi smyčky Kamechy

SO 216 Zárubní zeď smyčka Kamechy

SO 217 Gabionové zdi km 0,185 - 0,210

SO 218 Gabionové zdi - zastávka Ruda

SO 219 Gabionová zeď podél TT km 0,690 - 0,838 vpravo

SO 220 Gabionové zdi - portál Žebětín

SO 221 Vany eskalátorů, schodiště

SO 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301 Přeložka splaškové kanalizace Šemberova - BVK

SO 302 Přeložka dešťové kanalizace - Kamechy - BVK

SO 303 Přeložka splaškové kanalizace - Kamechy - BVK

SO 304 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Říčanská - BVK

SO 305 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Říčanská - BVK
 SO 306 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Přírodní - BVK
 SO 307 Rekonstrukce splaškové kanalizace -Přírodní - BVK
 SO 308 Přeložka dešťové kanalizace -Kocanovská - BVK
 SO 309 Přeložka splaškové kanalizace -Kocanovská - BVK
 SO 310 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Teyschlova - BVK
 SO 311 Rekonstrukce splaškové kanalizace -Teyschlova - BVK
 SO 312 Úprava zhlaví šachet - BVK
 SO 320 Dešťová kanalizace - Šemberova - BKOM
 SO 321 Dešťová kanalizace - Kuršova-Teyschlova - BKOM
 SO 321.1 Přípojka kanalizace - Kuršova-Teyschlova
 SO 322 Retenční nádrž - Vejrostova -BKOM
 SO 323 Dešťová kanalizace - Teyschlova -BKOM
 SO 324 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Kocanovská
 SO 324.1 Přípojka kanalizace Kocanovská
 SO 325 Zrušení dešťové kanalizace -Teyschlova - BKOM
 SO 326 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Vejrostova - BKOM
 SO 327 Úprava zhlaví šachet - BKOM
 SO 340 Odvodnění TT - Vejrostova - DPMB
 SO 340.1 Přípojka kanalizace TT - Vejrostova
 SO 341 Retenční nádrž - Vejrostova - DPMB
 SO 342 Odvodnění TT - Kamechy - DPMB
 SO 342.1 Přípojka kanalizace TT - Kamechy
 SO 343 Retenční nádrž - Kamechy - DPMB
 SO 344 Přípojky kanalizace - měnárna Ečerova - DPMB
 SO 345 Přípojky kanalizace - měnárna Říčanská - DPMB
 SO 346 Přípojky kanalizace - PTO - BKOM
 SO 347 Úprava zhlaví šachet - DPMB
 SO 348 Přeložka kanalizace budovy DPMB Ečerova
 SO 348.1 Přípojka kanalizace budovy DPMB Ečerova
 SO 349 Odvodnění ploch zastávky Říčanská
 SO 350 Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka kanalizace
 SO 350.1 Soc.zař. Kamechy TRAM – areálová kanalizace
 SO 351 Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka kanalizace
 SO 361 Vodovod DN 200 - přeložka - Kuršova - Ečerova
 SO 362 Vodovod DN 200 - zrušení - Kuršova - Ečerova
 SO 363 Vodovod DN 500 - přeložka - Vejrostova
 SO 364 Vodovod DN 500 - zrušení - Vejrostova
 SO 365 Vodovod DN 250 - přeložka - vodojem Kuršova
 SO 366 Vodovod DN 300 - přeložka - Vejrostova - Kuršova
 SO 367 Vodovod DN 300 - zrušení - Vejrostova - Kuršova
 SO 368 Vodovod DN 150 - přeložka - Teyschlova
 SO 369 Vodovod DN 150 - zrušení - Teyschlova
 SO 370 Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Říčanská
 SO 371 Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Přírodní
 SO 372 Vodovod DN 300,600 - přeložka Hostislavova
 SO 373 Vodovod DN 300,600 - zrušení Hostislavova

SO 374 Vodovod DN 250 - přeložka Kamechy
 SO 375 Přípojka vodovodu - měnírna Ečerova - DPMB
 SO 376 Přípojka vodovodu - měnírna Říčanská - DPMB
 SO 377 Přípojka vodovodu - PTO - BKOM
 SO 378 Vodovod DN100 - odbočení Vejrostova
 SO 379 Přeložka vodovodu budovy DPMB Ečerova
 SO 380 Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka vodovodu
 SO 380.1 Soc.zař. Kamechy TRAM – areálový vodovod
 SO 381 Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka vodovodu
SO 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
 SO 401 Přívod VN měnírna Ečerova
 SO 402 Přívod VN měnírna Říčanská
 SO 403 Přeložky VN a NN
 SO 404 Úprava kabelu lokálního distributora
 SO 405 Přívod NN Kamechy
 SO 411 Veřejné osvětlení – nové
 SO 412 Veřejné osvětlení - přeložka
 SO 413 Venkovní osvětlení příjezdu k PTO
 SO 421 Přípojky NN DPMB
 SO 422 Přípojka NN - PTO
 SO 423 Elektropřípojka eskalátorů
 SO 451 Přeložky sdělovacích kabelů Cetin
 SO 452 Přeložky sdělovacích kabelů T-Mobile
 SO 453 Přeložky sdělovacích kabelů Quantcom
 SO 454 Přeložky sdělovacích kabelů Vodafone
 SO 455 Přeložky sdělovacích kabelů Smart Comp
 SO 456 Přípojka optického kabelu
 SO 457 Přeložka optického kabelu BKOM
 SO 461 Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnou Ečerova
 SO 462 Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnou Říčanská
 SO 463 Přípojka sdělovacího vedení pro PTO
 SO 491 Kabelovod pro sdělovací sítě
SO 500 – OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
 SO 501 Přeložka teplovodu km 0,340
 SO 502 Přeložka teplovodu km 1,360
 SO 503 Přeložka teplovodu km 1,140 – poklesová kotlina
 SO 521 Přeložka STL plynovodu km 0,337
SO 600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB
 SO 601 Stavební jáma Bystrc
 SO 602 Přesypaný tunel a portál Bystrc
 SO 603 Ražený tunel – ražba, primární ostění
 SO 604 Ražený tunel – definitivní ostění
 SO 605 Přesypaný tunel a portál Žebětín
 SO 606 Stavební jáma Žebětín
 SO 607 Chodníky a stavební úpravy v tunelu
 SO 608 Odvodnění tunelu
 SO 609 Požární vodovod v tunelu

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063

zastoupená na základě pověření [REDACTED] senior specialistou výstavby sítě –
smlouvy

datová schránka: qa7425t

(„**CETIN**“)

a

[•]

se sídlem [•]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•]

IČO: [•]

zastoupená [•]

datová schránka: [•]

(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**ČI. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**ČI. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek

- určených Správním rozhodnutím,
- b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převládá text Dohody.
7. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; (i) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný

dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(ii) Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Brně

V _____

za **CETIN a.s.**

senior specialista výstavby sítě - smlouvy

za [•]

[•]

[•]
