



č.j. zhotovitele: 1631/2024

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

uzavíraná mezi

objednatel:

Název: **VW WACHAL a.s.**, se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, zapsaná do OR u KS v Brně, oddíl B., vložka 2976, IČ 25567225, zastupuje [REDACTED], předseda představenstva;

Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice, zapsaná do OD u KS v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 21435, IČ 27263827, zastupuje [REDACTED], jednatel

a

YUCON CZ, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno - Slatina, zapsaná do OR u KS v Brně, oddíl C., vložka 63922, IČ 29184771, zastupuje [REDACTED], jednatel

Adresa: VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí projektu, tel. [REDACTED]

[REDACTED], vedoucí projektu, tel. [REDACTED]

IČ: 25567225 DIČ: CZ25567225

Bankovní spojení: 131-2799210277/0100

a

zhotovitelem:

Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**

Adresa: **Jana Žižky 835, 434 01 Most**, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317

Statutární orgán: [REDACTED] ředitel, [REDACTED]@uappmost.cz

Zástupce pro věci technické:

IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB Most, č. ú. 38532491/0100

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**občanský zákoník**“ nebo „**NOZ**“), a na základě § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**zákon o státní památkové péči**“ nebo „**ZoSPP**“), mezi obchodními společnostmi VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. jako společníky sdružení, stavebními podnikateli a generálními dodavateli stavby „Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby“ pověřenými k tomu stavebníkem Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, IČ 00025429 (dále také jako „**objednatel**“) na straně jedné a **Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále také jako „**zhotovitel**“) na straně druhé.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona o státní památkové péči v ploše stavby: „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“ v rozsahu naleziště ze starší doby kamenné o rozloze 1000 m² vymezeném přiloženým výkresem, příloha č. 1 (dále také jako „**lokalita**“).
2. Předmětem této smlouvy je dále provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem v období od 06.11.2024 do 22.11.2024, kterým byl stanoven rozsah lokality a provedení záchranného archeologického výzkumu. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu v rozsahu a cenách uvedených v příloze č. 4 a



touto smlouvou tuto domluvu potvrzují a nahrazují případné dohody a smluvní dokumenty dříve vydané (např. objednávka). Na vykázání a vyúčtování těchto provedených činností se obdobně použijí ujednání o platebních podmínkách uvedená v této smlouvě.

3. Předmět díla nezahrnuje provedení záchranného archeologického výzkumu mimo půdorys hlavní stavby, kde lze předpokládat archeologický terén dotčený dalšími stavebními objekty a výstavbou inženýrských sítí. Bude-li však zjištěna nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu i v dalších částech staveniště, bude takový dodatečný rozsah, včetně dopadu do nákladů na provedení záchranného archeologického výzkumu a doby pro jeho provedení upraven dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje tyto dopady řádně doložit a poskytnout objednateli součinnost při jejich prokazování stavebníkovi.
4. Záchraný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, případně geofyzikální výzkum a další varianty nedestruktivního průzkumu, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele a nálezové zprávy, případně další činnosti tak, aby byl naplněn smysl zákona o státní památkové péči a požadavky dané platnými právními předpisy (dále také jako „**záchranný archeologický výzkum**“ nebo „**ZAV**“).
5. Záchraný archeologický výzkum bude proveden na základě **technologického postupu**:
 - **terénní odkryv** archeologických horizontů bude provedený v pravidelné síti sond, dělených na sektory 1x1m a pod sektory 0,5 x 0,5m;
 - odkryv archeologických horizontů bude proveden od povrchu prvních nálezů již pouze ručně škrabkou, špachtlí. Při preparaci archeozoologických nálezů bude užito výhradně dřevěných modelářských špachtlí, tak aby nedošlo k poškození povrchu kosti a případnému zničení přítomných původních pracovních a užitkových stop. Všechny nálezy budou citlivě vypreparovány a ponechány ve své původní poloze;
 - **odběr vzorků** průběžně budou z archeologických horizontů odebírány vzorky na proplavení za účelem získání mikroartefaktů a ekofaktů. Průběžně budou odebrány další speciální vzorky z archeologických horizontů (vzorky na mikromorfologii, palynologické vzorky, OSL a C14 datování, apod.);
 - **dokumentace a evidence nálezů** a nálezových situací. Každému nálezu bude přiděleno vlastní identifikační číslo (ID) a jeho poloha bude zaznamenána do kontextového formuláře (sonda, sektor, pod sektor). Každý nález bude geodeticky zaměřen a zaznamená jeho absolutní výška. Každý nález bude zakreslen do plánu v měřítku 1:20. Po preparaci všech nálezů v sondě bude provedeno kolmé snímkování z výšky a každý nález bude fotograficky dokumentován;
 - **vyjmutí nálezů** bude provedeno s ohledem na jejich stav dochování, u nedobře dochovaných nálezů kostí bude snaha o celistvé vyjmutí jejich zbytků na pevné desce v bloku;
 - **základní laboratorní ošetření** nálezů bude provedeno proškoleným personálem, konzervace nálezů odborníky ze specializovaných pracovišť;
 - **odborné zpracování nálezů** bude provedeno výhradně odbornými pracovníky se specializací na paleolit a paleozoologii ze specializovaných pracovišť.

Zhotovitel prohlašuje, že rozsah záchranného archeologického výzkumu (rozsah lokality a nezbytných činností ZAV) stanovil na základě podrobného prověření lokality, zejména zjišťovacím záchranným archeologickým výzkumem dle odst. 2 tohoto článku tak, aby byl naplněn účel ZAV. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení ZAV dle platných právních předpisů a za případné škody na nálezech, ke kterým dojde při jeho činnosti nebo v důsledku pokynů a doporučení, které udělil objednateli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu provádění ZAV musí objednatel přerušit stavební práce prováděné v dotčené lokalitě a řádné a včasné provedení ZAV je nezbytnou podmínkou pro obnovení prací a plnění závazků objednatele vůči stavebníkovi. Zhotovitel se tedy zavazuje vyvíjet maximální úsilí i nad rámec výslovných ujednání obsažených v této smlouvě k tomu, aby byl ZAV dokončen řádně a včas a poskytovat objednateli veškerou nezbytnou součinnost při uplatňování práv a plnění povinností objednatele vůči stavebníkovi.



II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá: [redacted] tel.: +420 [redacted], email: [redacted] uappmost.cz (dále také jako „**oprávněná osoba zhotovitele**“).
2. Zhotovitel předpokládá, že bude provádět práce s maximálním nasazením personálu v 9 hodinových směnách (6:30 -16:00) v pracovní dny, mimořádně i v den pracovního volna. Do 9 hodinové směny je zahrnuta doba potřebná na dopravu personálu na naleziště a čas na přípravu pracovních nástrojů. Ani dodržení uvedeného nasazení personálu však zhotovitele nezavazuje povinnosti dokončit ZAV v termínu sjednaném v této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely ZAV nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury. Objednatel jako technické podmínky pro provedení ZAV zajistí na své náklady:
 - pro potřeby prací v klimaticky nepříznivých podmínkách plošné zakrytí části plochy stanem o rozměru 15 x 40 m, se zajištěným pracovním osvětlením a temperováním;
 - pro potřeby prací personálu 4 standardní pracovní buňky a 1 skladovací kontejner;
 - drobnou mechanizaci a v rozsahu 40 h/měsíc pro potřeby odvozu výkopku, případně plošného skrytí části terénu na povrch archeologických nálezů (pásový bagr a nákladní vůz, s obsluhou) a případně další pomocné práce dle předchozí výzvy zhotovitele;
 - ochranu naleziště mimo pracovní dobu archeologického výzkumu, kterou se rozumí oplocení staveniště a jeho ostraha (objednatel však nenese odpovědnost za případné škody, ke kterým dojde v případě, že by byla zajištěná ochrana překonána třetí osobou, nebo v případě, že by ke škodě došlo i jinak).

Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené podmínky zajišťované objednatelem jsou dostačující pro to, aby mohl být ZAV proveden ve sjednaném termínu i s přihlédnutím k podmínkám dotčeného ročního období, a že tyto byly ze strany objednatele zajištěny. Případné další požadavky na úpravu uvedených podmínek (např. úprava umístění stanů, osvětlení) zhotovitel dle potřeby projedná se zástupci objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen užívat zařízení poskytnutá mu objednatelem pro účely této smlouvy jen pro potřeby ZAV, v souladu s pokyny objednatele pro jejich užívání a s péčí řádného hospodáře, předcházet jejich poškození a po ukončení terénní části ZAV je objednateli vrátit ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení; případné škody na poskytnutém zařízení uhradí zhotovitel objednateli na jeho výzvu.

4. V případě, že by při provádění ZAV byly zjištěny neočekávané podmínky nebo by zhotovitel požadoval další součinnost od objednatele nad rámec výše uvedeného, je povinen bezodkladně kontaktovat zástupce objednatele ve věcech technických a dohodnout se na dalším postupu.

III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Náklady na provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu byly dohodnuty ve výši [redacted] **Kč bez DPH** (příloha č. 4). Tato částka je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně



- obsaženy veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho úplným dokončením. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
2. Náklady na provedení ZAV nepřesáhnou částku **Kč bez DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele (příloha č. 3) a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných. K uvedené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.
 3. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany uvádějí, že výše nákladů na provedení ZAV je částkou nepřekročitelnou, a to i v případě, že si provedení ZAV dle rozsahu této smlouvy vyžádá jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, a současně zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené výkony a prokázané náklady; bude-li ZAV proveden zhotovitelem s nižšími náklady, budou zhotoviteli objednatelem uhrazeny pouze tyto snížené náklady, ale zhotoviteli nebudou uhrazeny případné zvýšené náklady nad částku uvedenou v předchozím odstavci.
 4. V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury, které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
 - jednacím číslo smlouvy,
 - název stavby,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a včetně DPH,
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
 5. Přílohou každé faktury bude výkaz činnosti, ve kterém zhotovitel uvede přehled činností vykonaných na ZAV v průběhu fakturovaného období.
 6. Objednatel se zhotovitelem se dohodl na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do 90 dnů u první faktury, 60 dnů u druhé faktury, 45 dnů u třetí faktury a 30 dnů ostatních faktur od data obdržení faktury. Faktury (průběžné i konečné) je možné objednateli zasílat v listinné podobě na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na fakturační adresu fakturace@wachal.cz (objednatel upřednostňuje elektronickou fakturaci). V případě elektronické fakturace bude faktura a každá její (naskenovaná) příloha uvedena v samostatném dokumentu (souboru, *.pdf). Nebude-li mít faktura požadované náležitosti nebo přílohy nevznikne zhotoviteli právo na její zaplacení a objednateli nevznikne povinnost ji uhradit a nebude tak v prodlení s její úhradou. Výše uvedené adresy pro zasílání faktur jsou jediné, na které je možné fakturu řádně doručit; k faktuře zaslané na jinou adresu, i když by to byla adresa zaměstnance objednatele, nemusí objednatel přihlížet, zejména od takového doručení nezačne běžet lhůta splatnosti.
 7. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů. I za činnosti provádění prostřednictvím dalších subjektů odpovídá vůči objednateli zhotovitel, jako by tyto činnosti prováděl sám.
 8. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má od stavebníka přislíbeno řádné finanční krytí nákladů na ZAV. V případě, že by ze strany stavebníka nebyly náklady na provedení ZAV objednateli řádně a včas hrazeny, zejména pak v případě, že by se stavebník dostal do prodlení delšího jak 10 dní s proplacením zhotovitelem účtovaných nákladů ZAV, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy s tím, že pokračování ZAV a podmínky jeho provedení si zhotovitel dojedná přímo se stavebníkem.



IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem dokončeny do 30. 06. 2025. V tomto termínu také zhotovitel předá objednateli zprávu/potvrzení o ukončení terénní části ZAV s tím, že archeologické nálezy v dané lokalitě byly řádně zpracovány (zaevidovány, vyzvednuty, odvezeny atp.) a že je možné pokračovat v provádění stavebních prací, a dále souhlas s následnou kolaudací stavby.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytýčení. V případě poškození vytýčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytýčeny nebyly je věcí objednatele.
 - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
3. Zhotovitel nenese rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli (vyšší moc). Smluvní strany se dohodly, že klimatické podmínky, které jsou pro dobu, ve které má být ZAV proveden, běžné, očekávatelné nebo předvídatelné (např. nízké resp. vysoké teploty, dešťové nebo sněhové srážky), nejsou s ohledem na zajištění technických podmínky pro provedení ZAV objednatel (zejm. stany, temperování, osvětlení, buňky a sklad) důvodem pro přerušení prací a prodloužení termínu pro dokončení terénní části ZAV.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním nálezové zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do tří let od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
 - datu (dni) prováděného zápisu,
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Zpráva o ukončení terénní části ZAV a závěrečná zpráva (nálezová zpráva o záchranném výzkumu) bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti, i přes písemné upozornění objednatele zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn pozastavit



práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu po níž budou práce pozastaveny.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, si může zhotovitel účtovat smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením terénní části ZAV, s předáním zprávy o ukončení terénní části ZAV, s předáním nálezové zprávy nebo s předáním souhlasu s kolaudací stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení a za každý případ zvlášť. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání terénní části ZAV být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám, a to s pojistným limitem alespoň 30.000.000,- Kč. Potvrzení o pojištění zhotovitel předloží na výzvu objednateli kdykoli během trvání této smlouvy.

VI. Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží 4 autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o státní památkové péči.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou, není-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě dohody smluvních stran ve formě písemných dodatků.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Výkres plochy naleziště
 2. Hodinový sazebník zhotovitele - sazebník archeologických prací ÚAPPSZČ Most
 3. Náklady záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště, Justiční palác, Ústí nad Labem
 4. Náklady na zjišťovací záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště, Justiční palác, Ústí nad Labem 6. 11. - 22. 11. 2024.
5. ÚAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) §2 bod e) povinným subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle ÚAPPSZČ, v. v. i.



6. Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován o zveřejnění této smlouvy včetně jejích případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění, datu podpisu smlouvy a textový obraz smlouvy.

VIII. Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech. K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

Datum: 2024

Datum: 2024

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.06 10:10:10 +01'00'

.....
předseda představenstva VW WACHAL a.s.

ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

Datum: 2024.12.18 13:50:45
+01'00'

jednatel Gardenline s.r.o.

YCN


Datum: 2024.12.18
15:12:59 +01'00'

jednatel YUCON CZ, s.r.o.

rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel (ÚAPPSZČ, v.v.i.)



Příloha 1. Výkres plochy naleziště:

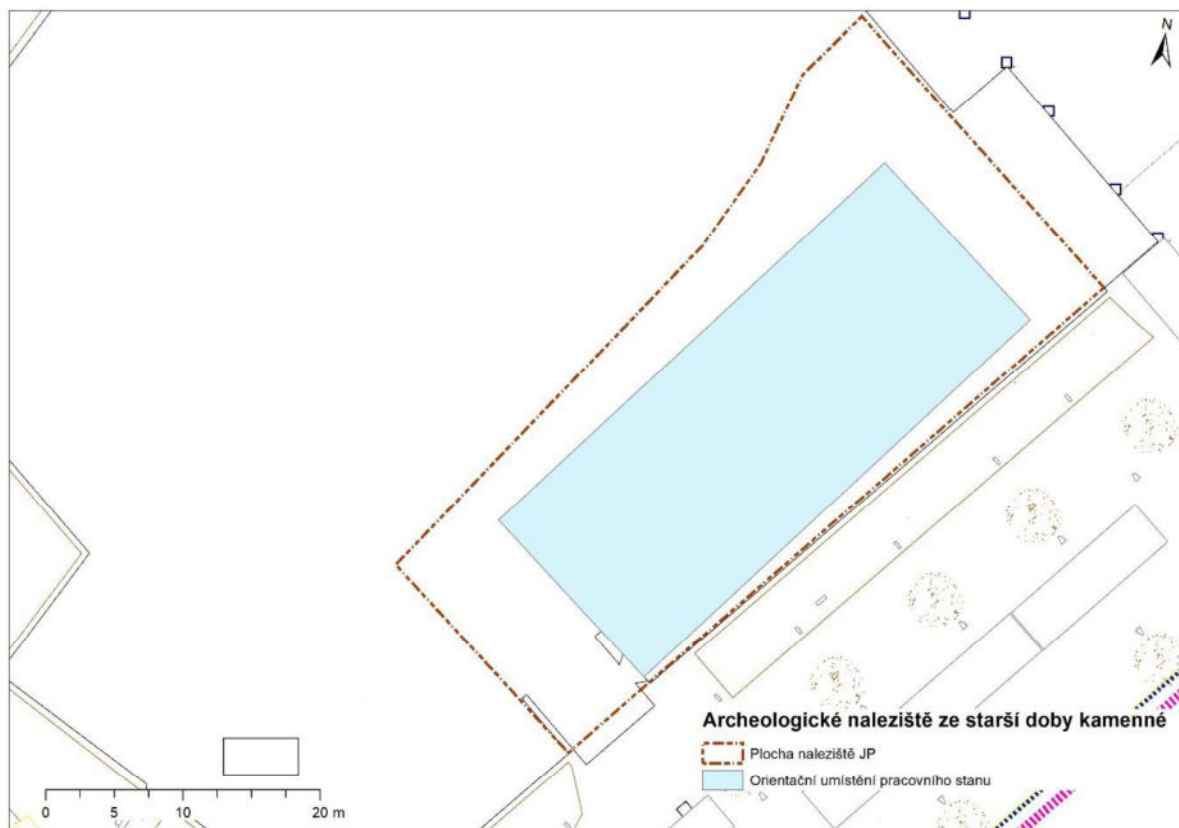



Příloha č. 2



Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
veřejná výzkumná instituce

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Jana Žižky 835/9, 434 01 Most

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 11. 2024

Archeolog (vedoucí výzkumu)

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník/preparátor

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady: Cestovné

Náklady na dopravu: Velké užitkové automobily

Osobní automobily

Další přímé náklady: Materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, apod.

Náklady na postexkavační práce obvykle tvoří 30 - 40% celkových nákladů na terénní část a zahrnují veškeré náklady spojené s výzkumem, které se provádí mimo naleziště. Jedná se o náklady na administrativu spojenou s výzkumem, odbornou práci geodetů, terénních techniků a dokumentátorů na převedení terénní dokumentace do podoby trvalého záznamu. Dále náklady na proces laboratorního zpracování, ošetření a evidence nálezů, včetně nákladů na obalový materiál, speciální ošetření nálezů a jejich konzervaci a vyhotovení obalového materiálu pro jejich trvalé uložení v depozitáři. Zahrnují odbornou práci archeologů, antropologů a dalších specialistů, odborné analýzy, posudky a vyhotovení nálezové zprávy.

V Mostě dne 1. 11. 2024

IČ: 473 25 011
tel.: 476 704 465

DIČ: CZ47325011
e-mail: office@uappmost.cz ID DS: b2cjua1

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v. v. i.
Jana Žižky 835, 434 01 Most
IČ: 473 25 011
DIČ: CZ47325011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp





Příloha č. 3

Náklady záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště, Justiční palác, Ústí nad Labem

A. Terénní (exkavační) část

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem
Archeolog vedoucí výzkumu			
Archeolog			
Antropolog			
Geodet			
Technik			
Dokumentátor			
Dělník/preparátor			
Dělník			
Terén			

B. Postexkavační část - 40% nákladů terénní části

Postexkavační část zahrnuje veškeré náklady spojené s výzkumem, které se provádí mimo naleziště. Zahrnuje tedy náklady na administrativu spojenou s výzkumem, práci archeologů, geodetů, terénních techniků a dokumentátorů na převedení terénní dokumentace do podoby trvalého záznamu.

Náklady na proces laboratorního zpracování, ošetření a evidence nálezů včetně nákladů na obalový materiál. Dále speciální ošetření nálezů a jejich konzervaci a vyhotovení obalového materiálu pro jejich trvalé uložení v depozitáři.

Zahrnuje odbornou práci archeologů, antropologů, paleozoologů a dalších specialistů, náklady na odborné analýzy, posudky a vyhotovení nálezové zprávy.

C. Přímé náklady

Doprava	Počet jízd	Km/Ks	Sazba	Celkem
Osobní automobil				
Velký užitkový automobil				
Cestovné/stravné				
Bedny na nálezy				
Ubytování zaměstnanců				
Materiál, drobná vydání				
Přímé náklady				



Celkem za výzkum:



bez DPH

V Mostě dne 25. 11. 2024

Zpracoval:





Příloha č. 4

Náklady na zjišťovací záchranný archeologický výzkum paleolitického naleziště, Justiční palác, Ústí nad Labem 6. 11. - 22. 11. 2024.**A. Terénní (exkavační) část**

Zařazení	Hodin	Sazba	Celkem
Archeolog vedoucí výzkumu			
Archeolog			
Antropolog			
Geodet			
Technik			
Dokumentátor			
Dělník/preparátor			
Dělník			
Terén subtotal			

B. Postexkavační část - 40% nákladů terénní části

Postexkavační část zahrnuje veškeré náklady spojené s výzkumem, které se provádí mimo naleziště. Zahrnuje tedy náklady na administrativu spojenou s výzkumem, práci archeologů, geodetů, terénních techniků a dokumentátorů na převedení terénní dokumentace do podoby trvalého záznamu.

Náklady na proces laboratorního zpracování, ošetření a evidence nálezů včetně nákladů na obalový materiál. Dále speciální ošetření nálezů a jejich konzervaci a vyhotovení obalového materiálu pro jejich trvalé uložení v depozitáři.

Zahrnuje odbornou práci archeologů, antropologů, paleozoologů a dalších specialistů, náklady na odborné analýzy, posudky a vyhotovení nálezové zprávy.

C. Přímé náklady

celkem	
---------------	--

Celkem za výzkum:**bez DPH**

V Mostě dne 17.11.2024



Zpracoval:



Předmětem zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu je: a/ zjištění rozsahu naleziště, orientační hustoty nálezů a mocnosti archeologických horizontů, ve kterých jsou nálezy uloženy. b/ provedení kompletního výzkumu na referenční části naleziště (včetně postexkavační části), v místech, které potřebuje uvolnit stavba prioritně. c/ stanovení odborného odhadu časové náročnosti na provedení kompletního záchranného archeologického výzkumu a jeho nákladů. O výsledcích bude objednatel informován průběžně, souhrnně závěrečnou zprávou, vyhotovenou, nejpozději do tří pracovních dnů po skončení terénní části zjišťovacího výzkumu. O výsledcích bude objednatel informován průběžně, souhrnně závěrečnou zprávou, vyhotovenou, nejpozději do tří pracovních dnů po skončení terénní části zjišťovacího výzkumu, nebo souhrnným stanoviskem předneseným na kontrolním dnu stavby.
