
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2024_0100**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Lubošem Minářem, supervizorem, VFS Čechy východ

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.

Pr 162

zastoupená [REDACTED]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Hluboká u Skutče spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 6. 12. 2024 vydané pod čj. 347616/24, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Hluboká u Sk. rek.silnice SO402**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu;
- (ii) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení Městského úřadu Chrudim – rozhodnutí o schválení stavebního záměru na stavbu „Oprava silnice III/305 32 Brdo-Hluboká“ č.j. CR 038836/2024 STO/Št ze dne 22. 5. 2024, které nabylo právní moci dne 25. 6. 2024 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **192 549,- Kč** (slovy: jedno sto devadesát dva tisíc pět set čtyřicet devět korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanou na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury

připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: specialista pro výstavbu sítě

[REDACTED]

ve věcech [REDACTED]

[REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
funkce: ředitel

[REDACTED]

[REDACTED] technických: [REDACTED]
funkce: technický dozor

[REDACTED]

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní

[REDACTED]

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na též dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

- Příloha č. 1 - Projekt
- Příloha č. 2 - Společné povolení

CETIN

Stavebník

V Praze dne

V Pardubicích dne

**Luboš
Minář**

Digitálně podepsal Luboš Minář
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-04084063, o=CETIN
a.s., ou=70490, cn=Luboš Minář,
sn=Minář, givenName=Luboš,
serialNumber=P783117
Datum: 2024.12.18 14:49:22 +01'00'

za CETIN a.s.

supervizor, VFS Čechy východ
na základě pověření
(podepsáno elektronicky)


**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.01.06
13:33:05 +01'00'

za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje


ředitel

(podepsáno elektronicky)

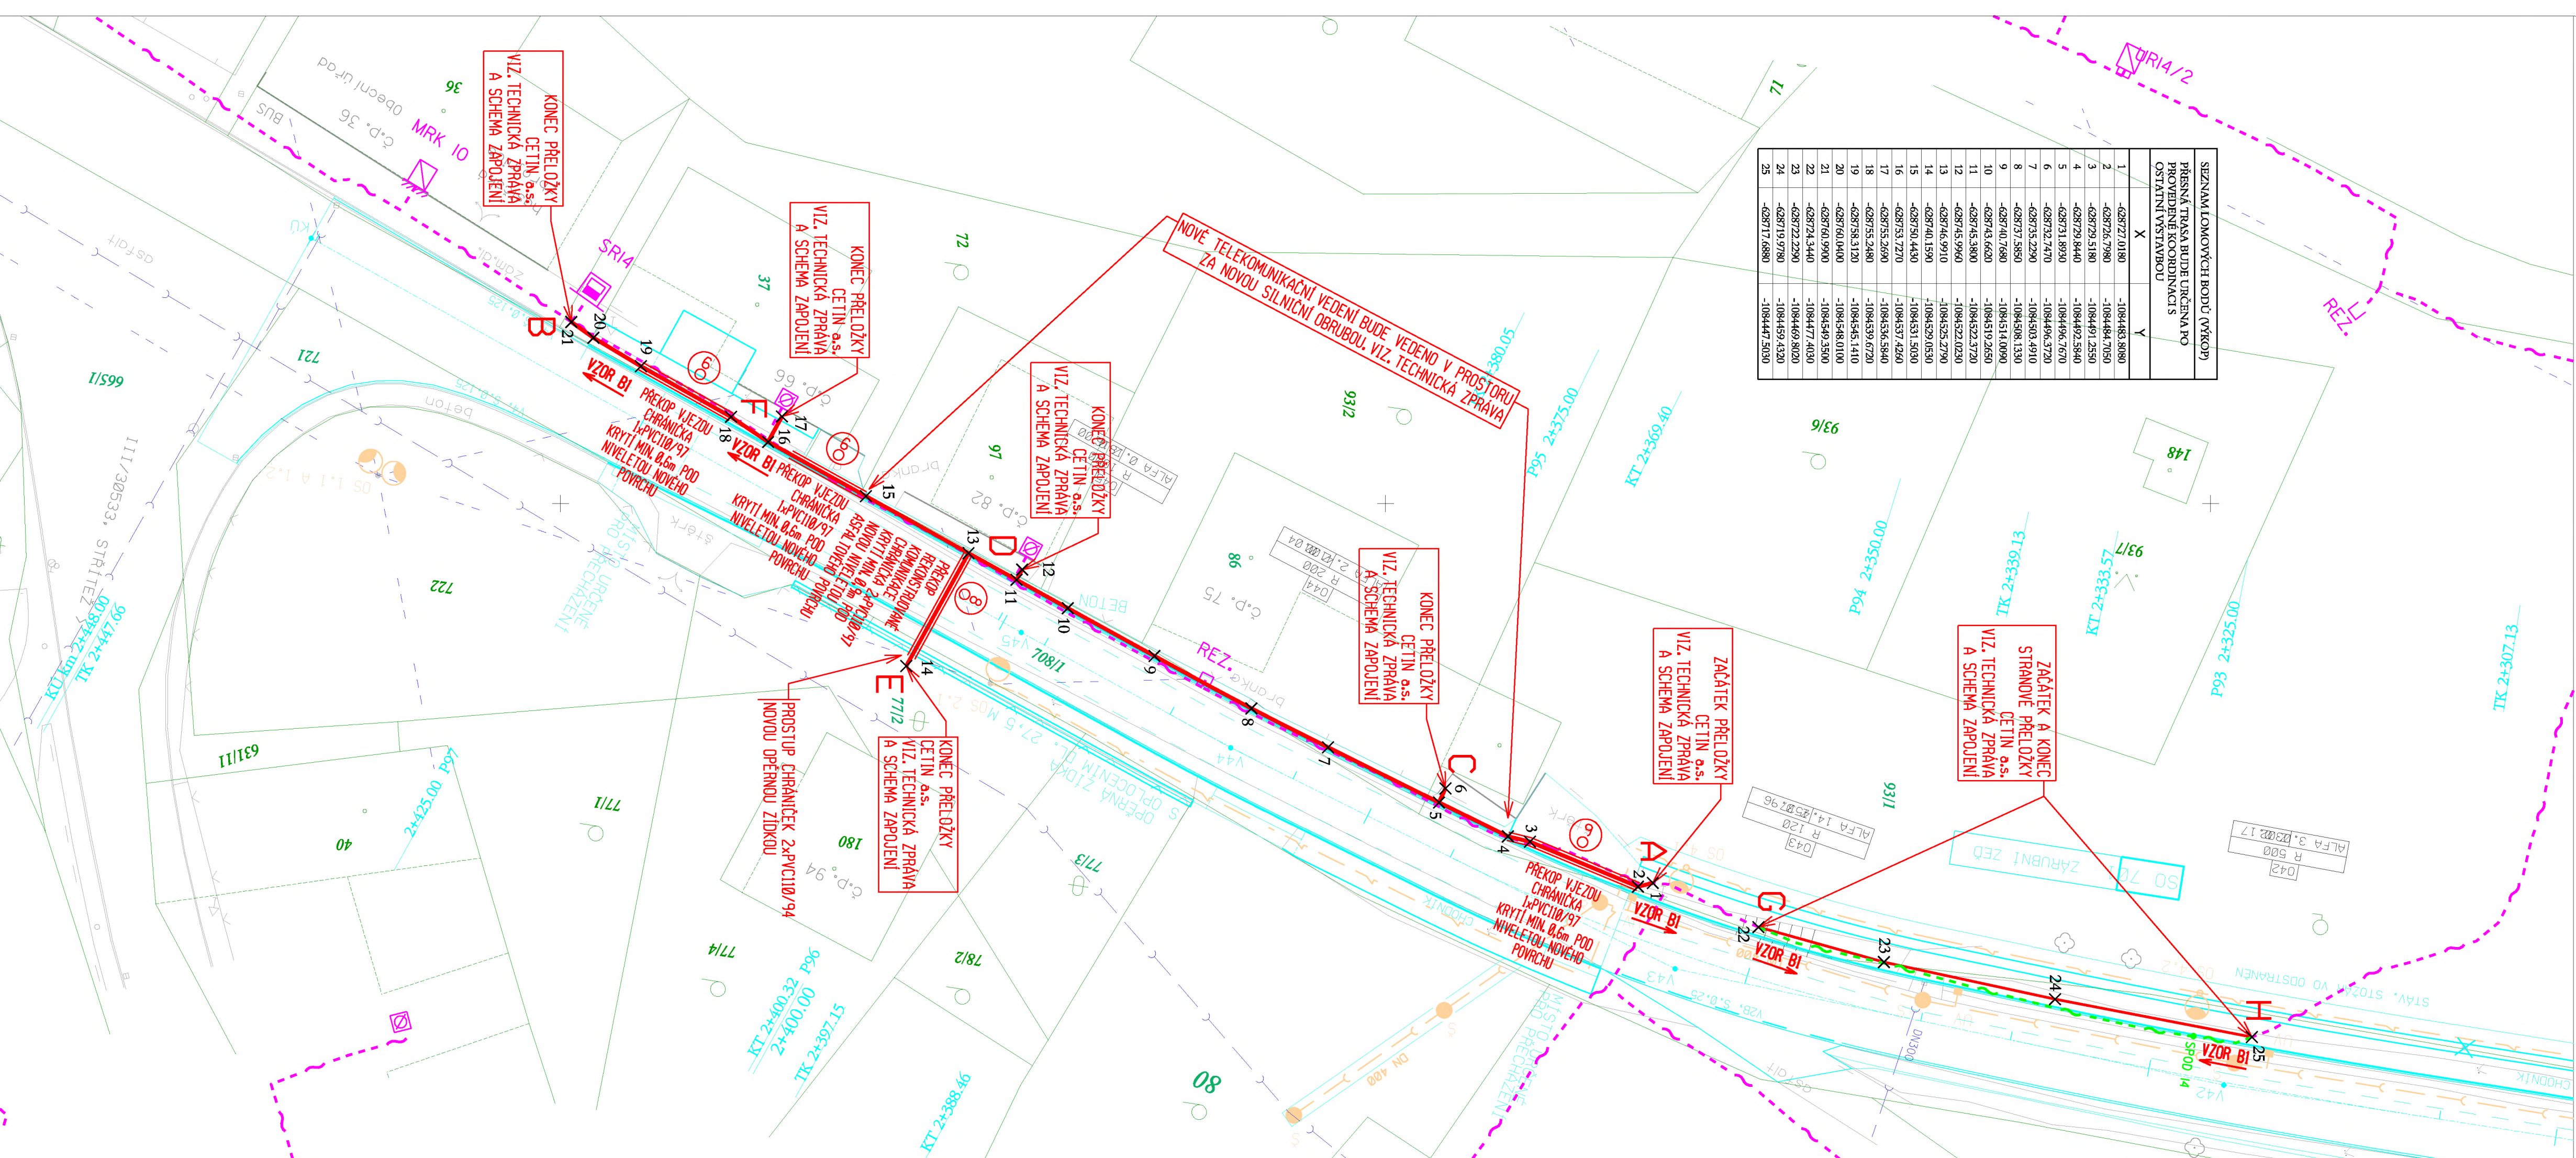

SEZNAM LOMOVÝCH BODŮ (VÝKOP)	
PŘESNÁ TRASA BUDE URČENA PO PROVEDENÉ KORDINACI S OSTATNÍ VÝSTAVBOU	
X	Y
1	-628727.0180 -1084483.8080
2	-628726.7980 -1084484.7050
3	-628729.5180 -1084491.2550
4	-628729.8440 -1084492.5840
5	-628731.8930 -1084496.7670
6	-628732.7470 -1084496.3720
7	-628735.2290 -1084503.4910
8	-628727.3850 -1084508.1330
9	-628730.7680 -1084514.0990
10	-628733.6620 -1084519.2650
11	-628735.3800 -1084522.3720
12	-628735.9960 -1084525.2790
13	-628736.9910 -1084529.0530
14	-628750.4430 -1084531.5030
15	-628753.7270 -1084537.4280
16	-628755.2690 -1084539.5840
17	-628755.2480 -1084545.1110
18	-628758.3120 -1084548.0100
19	-628760.9900 -1084549.3500
20	-628762.4440 -1084477.4090
21	-628722.2290 -1084469.8020
22	-628719.9780 -1084459.4320
23	-628717.6880 -1084447.5030
24	-628719.9780 -1084459.4320
25	-628717.6880 -1084447.5030

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

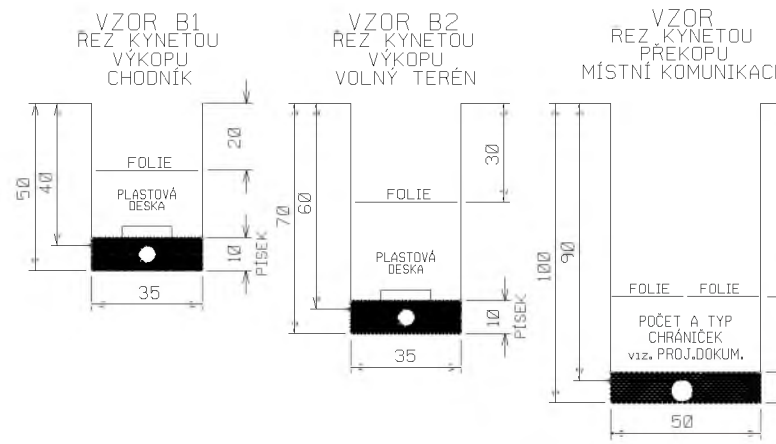

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**

 - PLYNOVOD
 - EL. SIL. KABELY NN (1 KV)
 - VEŘEJ. OSV.
 - VODOVOD
 - KANALIZACE
 - HORKOVOD
- LEGENDA:**

 - SILNIČNÍ OBRUBNÍK
 - ULIČNÍ VPUŠŤ
 - KÁCENÍ STROMŮ
 - KANALIZACE, ŠACHTA
 - ŠACHTA, VPUŠŤ, HORSKÁ VPUŠŤ
 - VEŘ. OSVĚTLENÍ


- LEGENDA SÍTÍ CETIN a.s.:**
- NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
 - STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
 - PŘEKLÁDANÉ, RUŠENÉ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ ZEMNÍ

POZNÁMKA:


PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELŮ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELŮ - SONDAMI A VYTÝČENÍM.

NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HOPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.


ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

Generální projektant:		INDESING s.r.o. Jezbořice 110, PSČ 53002 mobil: 777886889, email: indesign@email.cz ICO 268 76 035		INDESING s.r.o.	
Hlavní projektant:		ING. JIŘÍ ŠEJNOHA			
Zpracoval:		BULENA PETR			
Technická kontrola:		ING. STANISLAV MARHOLD			
Zodp. projektant:		ING. STANISLAV MARHOLD			
Kraj: PARDUBICKÝ		Okres: CHRUDEM		Obec: HLUBOKÁ	
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje					
Akce:		OPRAVA SILNICE III/3542 BRDO - HLUBOKÁ			
Objekt:		SO 402 - PŘELOŽKA CETIN			
Obsah:		SITUACE TRASY			
		Měřítko: 1:250		Číslo příl. výkresu: B.402.2	
		Kóty: M			

SCHEMA TRUBIČEK

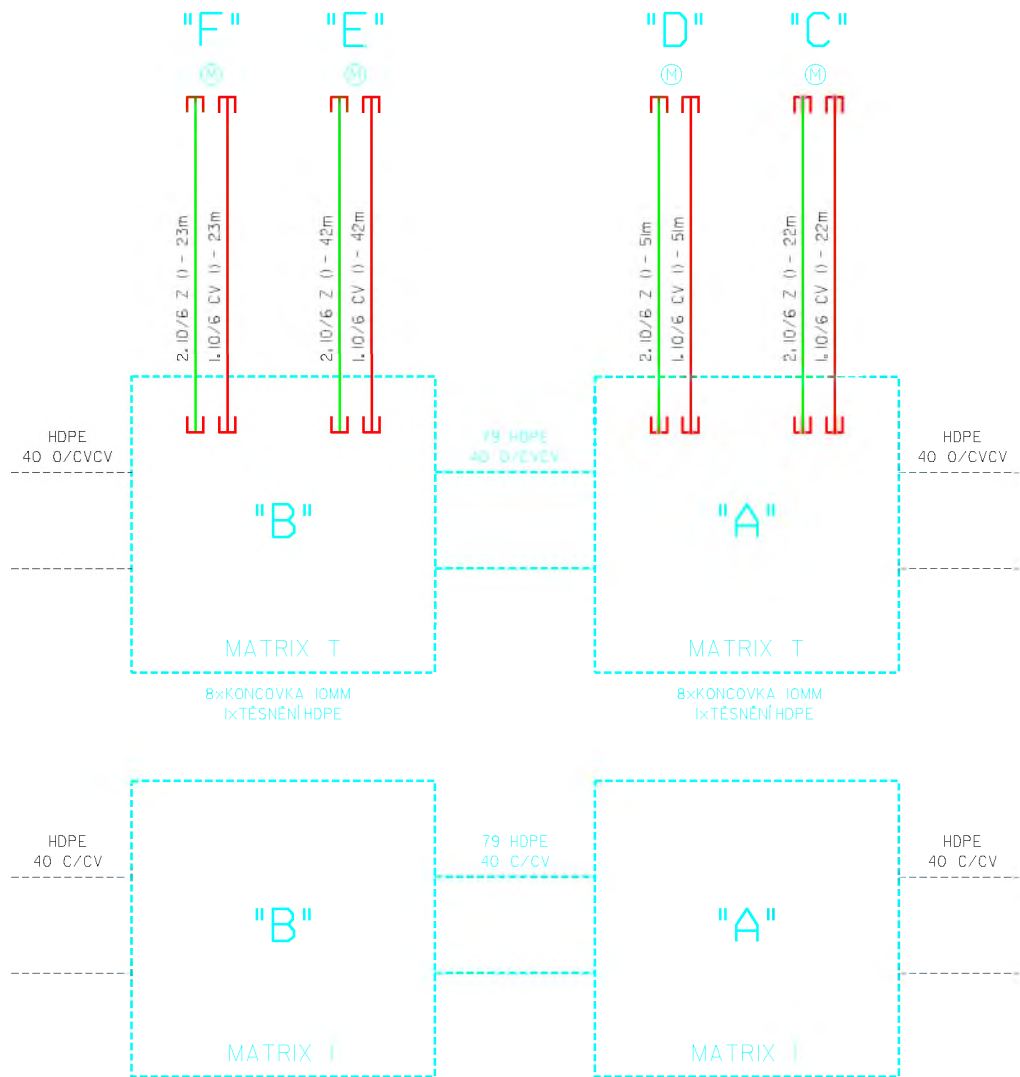

SCHEMA METALICKÝCH KABELŮ A TRUBEK HDPE

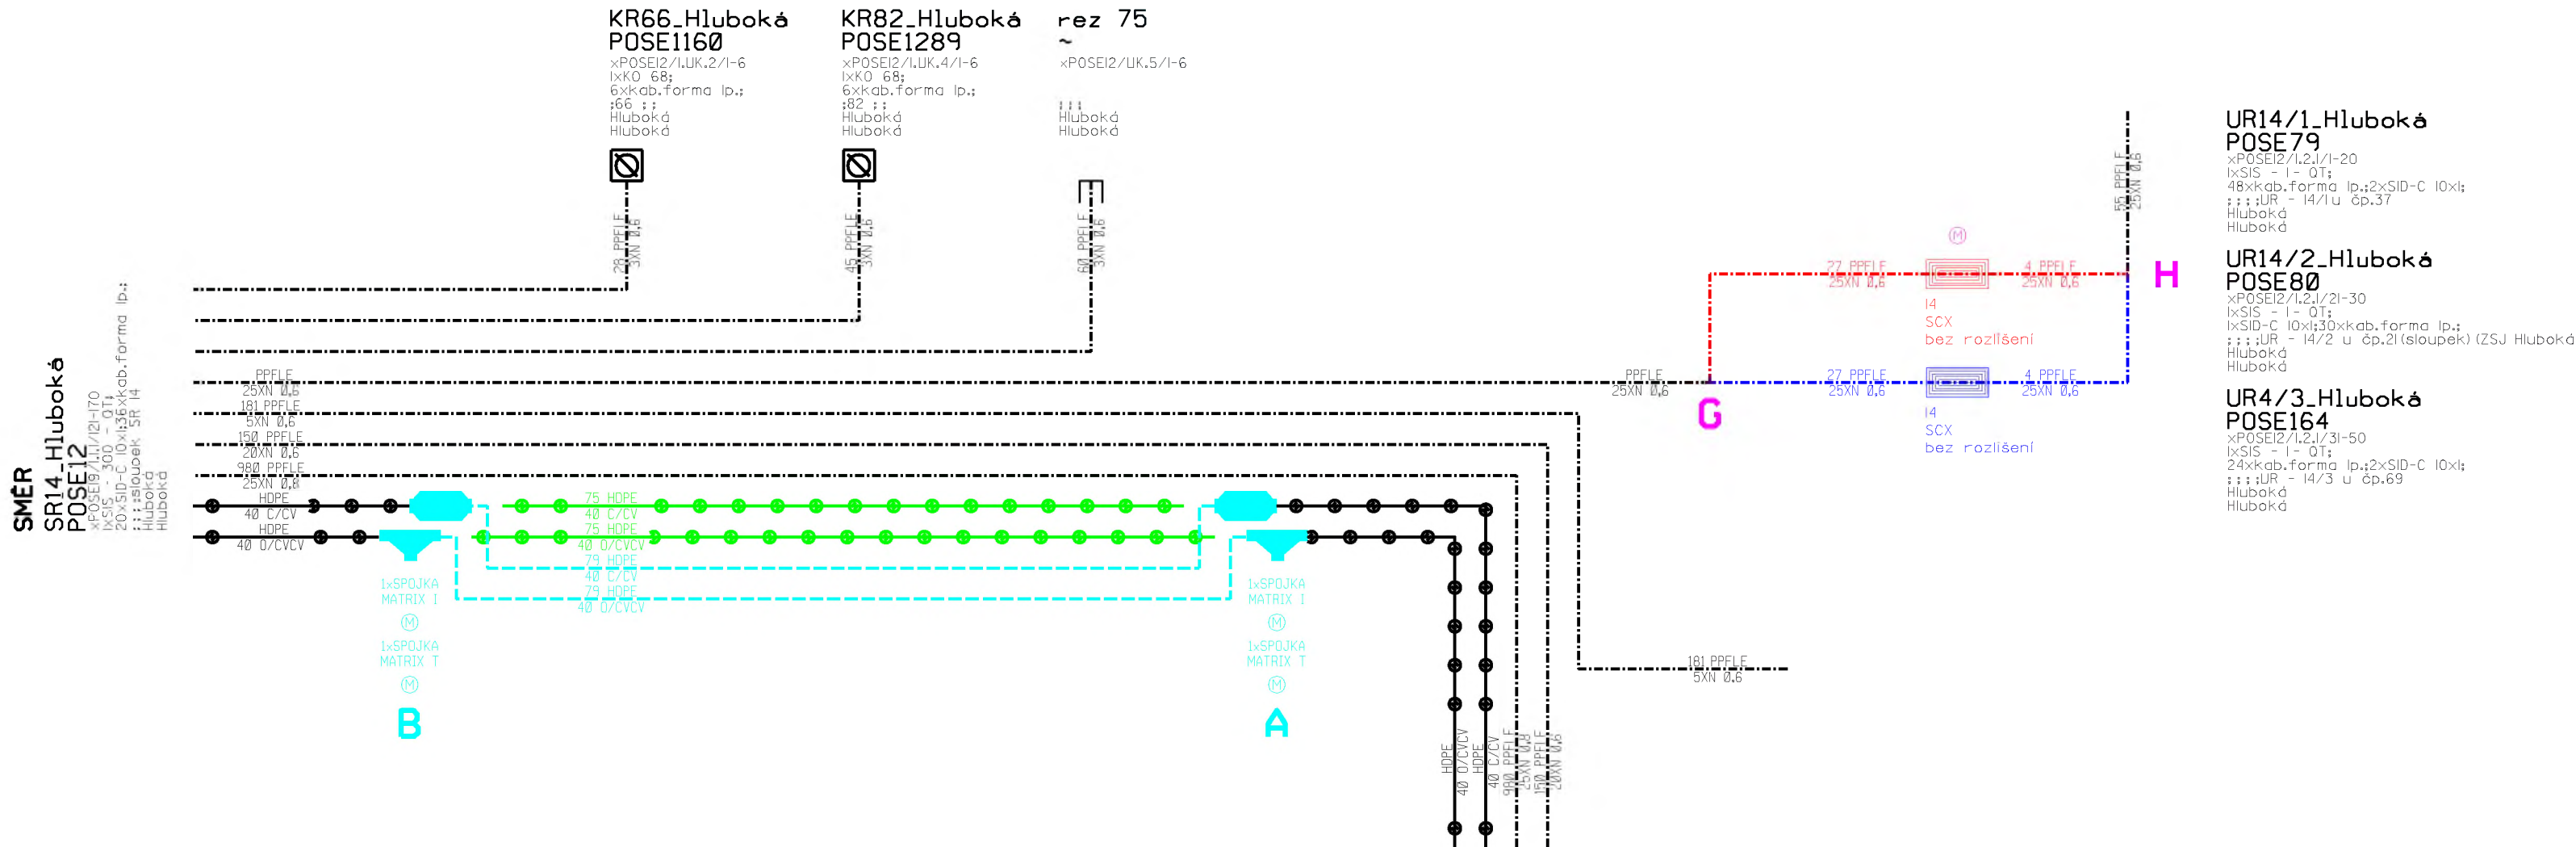

SO402

LEGENDA SÍTÍ CETIN:

- projektovaný telekomunikační kabel
- projektovaná trubka HDPE
- přeložený telekomunikační kabel
- přeložená trubka HDPE
- překládaný telekomunikační kabel
- překládaná trubka HDPE
- stávající telekomunikační kabely
- stávající trubky HDPE
- zrušené telekomunikační kabely
- zrušené trubky HDPE

POZNÁMKA:

Neoznačené kabely jsou typu TCEPKPFLE

Generální projektant:	INDESING s.r.o. Jezbořice 110, PSČ 53002 mobil: 777886889, email: indesing@email.cz IČO 268 76 035	
Hlavní projektant:	ING. JIŘÍ ŠEJNOHA	
Zpracoval:	BULENA PETR	
Technická kontrola:	ING. STANISLAV MARHOLD	
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD	
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: HLUBOKÁ
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje		
Akce: OPRAVA SILNICE III/3542 BRDO - HLUBOKÁ		
Objekt: SO 402 - PŘELOŽKA CETIN		
Obsah: SCHEMA ZAPOJENÍ		
Stupeň:	RDS	
Zak. č.:	1175	
Arch. č.:	1175	
Datum:	11/2024	
Formát:	3 A4	
Měř.:	Číslo příl. výkresu:	
Kóty: M	B.402.3	

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/3542 BRDO - HLUBOKÁ

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	116 995,51 Kč
MONTÁŽ	37 499,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 347,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 347,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	21 360,35 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 192 549 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	183 202,46 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	9 347,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		37.00 m	909,46 Kč
954974 S	Povrchy nad rámeč zámková dlažba		2.00 m2	2 199,18 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		3813.00 JV	3 813,00 Kč
Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení bez jeho porušení - 31m				
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		12.00 m	865,80 Kč
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		2.00 ks	98,32 Kč
955552 S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm		6.00 m	127,62 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm		30.00 m	7 506,90 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		26.00 m	23 201,88 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		94.00 m	43 114,98 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		30.00 m	3 948,90 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		31.00 m	18 779,18 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100		5.00 m	10 174,90 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		117.00 m	1 926,99 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks	328,40 Kč
MONTÁŽ				
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN		31.00 m	880,09 Kč
958303 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		276.00 m	612,72 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		158.00 m	854,78 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		3.00 ks	615,39 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		22.00 ks	1 041,04 Kč

952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	758,16 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	110,49 Kč
955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové	1968.00 JV	1 968,00 Kč
Zhotovení prostupů opěrnou zdí (2xPVC110)				
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	9840.00 JV	9 840,00 Kč
Finance na případné vícenáklady				
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	1 497,54 Kč
955945	S	Montáž spojky T (Y) (I)	2.00 ks	945,84 Kč
955946	S	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.	16.00 ks	623,36 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	125,86 Kč
955948	S	Montáž těsnění svazku trubíček	2.00 ks	644,26 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	158.00 m	3 806,22 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	31.00 m	1 025,17 Kč
956049	S	Pokládka tlustostěnné trubíčky	276.00 m	4 071,00 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	4814.22 JV	4 814,22 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 265,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	17.00 m	382,50 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	17.00 m	382,50 Kč
956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 964,50 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	2000.00 JV	2 000,00 Kč
Správní poplatek				

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838	S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	92.00 ks	1 948,56 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	150.00 m	618,00 Kč
303777	S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	234.00 m	521,82 Kč
301765	S	Koncovka trubíčky HDPE 10mm s pojistkou	16.00 ks	314,24 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	17.00 ks	4 445,33 Kč
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	1.00 ks	587,75 Kč
311878	S	Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná	2.00 ks	2 036,10 Kč
314663	S	Spojka trubky HDPE T 40-40-40mm Matrix	2.00 ks	2 452,90 Kč
311791	S	Těsnění trubíček 5x10mm do trubky HDPE	2.00 ks	159,28 Kč
323235	S	Trubíčka HDPE 10/6mm č.1 červená polopr	138.00 m	790,74 Kč
323236	S	Trubíčka HDPE 10/6mm č.2 zelená poloprůs	138.00 m	790,74 Kč
300025	S	Trubka HDPE 40/33 černá -červený pruh	79.00 m	2 317,86 Kč
300037	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr.	79.00 m	2 317,86 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	37.00 m	2 008,73 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	50,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0,00 Kč

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:
Spis. Zn.:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů:
Počet příloh:

CR 038836/2024 STO/Št
CR 014624/2024 STO/Št
280.3 A/20



Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

V Chrudimi dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako speciální stavební úřad věcně příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21. 2. 2024 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 a Obec Hluboká, IČO 00654639, Hluboká č. p. 36, 539 73 Skuteč, které zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Oprava silnice III/305 32 Brdo-Hluboká

(dále jen "stavba") **na stavebních parcelách číslo 91 (zastavěná plocha a nádvoří) a 92 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 963/4 (ostatní plocha), 1650/1 (ostatní plocha), 1663/1 (ostatní plocha), 1663/2 (ostatní plocha), 1723/1 (ostatní plocha), 1723/3 (ostatní plocha), 1741 (ostatní plocha), 1807 (ostatní plocha), 1849 (ostatní plocha), 2003 (ostatní plocha) a 2162 (ostatní plocha) v katastrálním území Doly, na stavebních parcelách číslo 37 (zastavěná plocha a nádvoří) a 86 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách číslo 77/2 (ostatní plocha), 77/3 (ostatní**

plocha), 80 (zahrada), 93/1 (ovocný sad), 179/1 (lesní pozemek), 665/1 (ostatní plocha), 708/1 (ostatní plocha), 708/8 (ostatní plocha), 721 (ostatní plocha), 746 (trvalý travní porost), 767 (trvalý travní porost), 772 (ostatní plocha), 843 (orná půda), 873 (ostatní plocha) a 874 (orná půda) v **katastrálním území Hluboká u Skutče**.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 - Komunikace Brdo - průtah** - délka upravovaného úseku je 450 m a trasa přibližně sleduje trasu původní. Koruna vozovky bude rozšířena na kategorii S 5,5/40. Jízdní pruhy budou zpravidla ohraničeny krajnicemi zpevněnými šterkodrtí. Ve staničení km 0,068 (ve směru od Perálce), bude pravostranně vybudována autobusová zastávka opatřená bezbarierovým nástupištěm. Délka nástupní hrany bude 12 m a výška podsádky 160 mm. Stávající konstrukce vozovky bude recyklována za studena nebo bude odtěžena a provedena nově. Vozovka přibližně sleduje původní niveletu. Zpravidla s odchylkami do +100 mm. Niveleta po trase stoupá a její sklon se pohybuje v rozmezí +1 % až +6 %. Odvodnění silnice bude řešeno příčným a podélným spádem do stávající dešťové kanalizace (majetek obce), uliční a horské vpusti, rigoly, silniční příkopy a příčné propustky. Případně bude voda svedena přes silniční krajnici na přilehlý terén. Stávající silniční příkopy budou reprofilovány.
- **SO 102 - Komunikace extravilán** - délka upravovaného úseku je 1595 m a trasa přibližně sleduje trasu původní v úseku staničení 0,450 km až 2,045 km. Koruna vozovky bude rozšířena na kategorii S6. Jízdní pruhy budou ohraničeny dlážděnými rigoly, obrubami nebo nezpevněnými krajnicemi. Stávající konstrukce vozovky bude recyklována za studena, nebo bude odtěžena a provedena nově. Vozovka přibližně sleduje původní niveletu. Zpravidla s odchylkami do +100 mm. Niveleta po trase stoupá a její sklon se pohybuje v rozmezí + 9,7 až + 0,0 %. Odvodnění bude řešeno příčným spádem do horské vpusti, rigolů, silničních příkopů a příčných propustků. Případně bude voda svedena přes silniční krajnici na přilehlý terén. Stávající silniční příkopy budou reprofilovány a krajnice budou zpevněny šterkodrtí v šíři 750 mm. Stávající dopravní značení a zařízení bude obnoveno a doplněno. V lesním úseku bude levostranně osazeno ocelové silniční svodidlo. Nově budou také provedeny vodící čáry V4 šíře 125 mm.
- **SO 103 - Komunikace Hluboká - průtah** - délka upravovaného úseku je 403 m a trasa přibližně sleduje trasu původní v úseku staničení 2,045 km až 2,448 km. Koruna vozovky bude rozšířena na kategorii S6. Jízdní pruhy jsou zpravidla ohraničeny dlážděnými rigoly, silničními obrubami nebo nezpevněnými krajnicemi. Stávající konstrukce vozovky bude zpravidla recyklována za studena nebo bude odtěžena a provedeny nové konstrukční vrstvy. Vozovka přibližně sleduje původní niveletu. Zpravidla s odchylkami do +100 mm. Niveleta po trase trvale klesá a její sklon se pohybuje v rozmezí -7,3 % až - 1 %. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do uličních vpustí, které budou napojeny do nové dešťové kanalizace a do silničních příkopů. Případně je voda svedena přes silniční krajnici na přilehlý terén. Krajnice budou zpevněny šterkodrtí v šíři 500 mm. Případně 750 mm v počátečním "polním" úseku, kde budou osazeny i směrové sloupky. Stávající dopravní značení a zařízení bude obnoveno a doplněno. Nově budou provedeny vodící čáry V4 šíře 125 mm.
- **SO 104 - Chodník Hluboká** - chodník s povrchem z betonové dlažby o šířce 1,65 m a v délce 443 m bude od silnice č. III/305 32 oddělen betonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,12 m. Z druhé strany bude chodník lemován záhonovým obrubníkem s výškou podsádky 0,06 m nebo opěrnou zídkou s oplocením, které budou sloužit jako vodící linie. Na začátku a na ukončení chodníku bude výška podsádky 0,02 m s varovným pásem šíře 0,4 m. Ve staničení km 2,360 bude chodník přecházet z pravé strany silnice na stranu levou, kde bude vybudováno místo pro usnadnění přejítí. Šířka levostranného chodníku v souběhu se stávajícím oplocením klesá na 1,55 m. V tomto úseku je i "úzké hrdlo", kde šířka mezi stávajícím dvousloupem vrchního vedení a okrajem chodníku je bodově snížena na 900 mm. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem do uličních vpustí.
- **SO 301 - Kanalizace Hluboká** - dešťová kanalizace je zásadní pro odvodnění SO 103 a SO104 v obci Hluboká. Délka kanalizace bude 171,4 m - potrubí PVC DN 300 a 56,1 m - potrubní PVC DN 400 mm. Na celém úseku bude osazeno 8 ks šachet, které budou opatřeny litinovými poklopy nosnosti D 400. Všechny poklopy budou umístěny v ose jízdního pruhu silnice. Kanalizace bude napojena na stávající potrubí umístěné levostranně ve staničení 2,370 km a slouží pouze pro odvodnění silnice, chodníku a místní komunikace. Součástí dešťové kanalizace bude 7 uličních vpustí s přípojkou DN 150 mm. Ukončení kanalizace bude napojením na stávající dešťovou kanalizaci DN 600 na pozemkové parcele číslo 80 v k. ú Hluboká u Skutče.

- **SO 701 - Zárubní zeď** - funkcí zárubní zdi je zajištění pravostranného svahu, do kterého se zařezává nově zřizovaný navrhovaný chodník SO 104. Zárubní zeď šířky 0,5 m bude zřízena z gabionů (ocelové drátokoše chráněné zinkotitanem, modul (1000/1000/500 mm) vyplněných lomovým kamenem se sklonem líce 10 : 1. Vybudována bude pravostranně v úseku staničení 2,198 km až 2,358 km v celkové délce 160 m. Výška zdi bude konstantní 950 mm nad niveletou přilehlého chodníkového krytu. Výškově a směrově je zeď navázána na souběžný chodník. Základ zdi z prostého betonu bude "zazuben" do skalního podloží, které tvoří opuka. Do doby vybetonování základu bude základová spára neustále chráněna proti promrznutí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 91 a 92 a na pozemkových parcelách číslo 963/4, 1650/1, 1663/1, 1663/2, 1723/1, 1723/3, 1741, 1807, 1849, 2003 a 2162 v katastrálním území Doly a dále na stavebních parcelách číslo 37 a 86 a na pozemkových parcelách číslo 77/2, 77/3, 80, 93/1, 179/1, 665/1, 708/1, 708/8, 721, 746, 767, 772, 843, 873 a 874 v katastrálním území Hluboká u Skutče a to v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy katastrálních situací v měřítku 1:500 se zakreslením jednotlivých pozemků dotčených stavbou, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění, které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
5. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.
6. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno příslušnému správci zařízení.
7. V průběhu provádění zemních prací zajistíte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k jejich nemovitostem. Výkopy zajistíte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující tyto služby.
8. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.
9. V místech sjezdů a na ukončení chodníku bude varovný pás o šířce 0,4 m v odlišné barvě od ostatní dlažby např. dlažba šedé barvy v celé délce chodníku, včetně sjezdů a varovný pás v barvě červené.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Chrudim – Odboru dopravy ze dne 11. 9. 2023 pod spis. zn. CR 064972/2023 ODP/LD.
11. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 12. 10. 2023 pod č. j. KRPE-70202-3/ČJ-2023-170306.
12. Při stavbě budou splněny podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí ze dne 13. 3. 2024 pod č. j. CR 016818/2024 OŽP/Ku a to:
 - Před zahájením stavby bude na jednotlivých pozemcích vytyčena plocha a bude zajištěno její nepřekročení.
 - V místě stavby bude na částech pozemků p. č. 874 a p. č. 843 v k. ú. Hluboká u Skutče provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkové kubatuře 39 m³. Skrývka bude využita na pozemku p. č. 843 v k. ú. Hluboká u Skutče. Do doby využití vrchní kulturní vrstvy půdy zajistí investor ochranu před znehodnocením a ztrátami a její řádné ošetření. O činnostech souvisejících se skrývkou vrchní kulturní vrstvy půdy, jejím přemístění a zpětné využití, ošetřování a rozprostření budou vedeny záznamy v protokolu.
 - V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 se uděluje výjimka z povinnosti provést skrývku vrchní kulturní vrstvy půdy na částech pozemků p. č. 93/1, 746 a 767 v k. ú. Hluboká u Skutče.
 - Za trvalé odnětí půdy nebude v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů předepsán odvod.
 - Zemědělské pozemky, na kterých se trvale odnímá půda ze ZPF, budou geodeticky zaměřeny a odděleny od stávajících zemědělských pozemků.
13. Při stavbě budou splněny podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí ze dne 13. 10. 2023 pod č. j. CR 065112/2023 OŽP/Je a to:
 - Trvale zabraná část lesního pozemku č. 179/1 v k. ú. Hluboká u Skutče bude pro provedení stavby před povolením užívání oddělena geometrickým plánem a trvale vyjmuta z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 - V souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty ani jejich kořenový systém a lesní pozemky nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy ani stavebního materiálu.
 - Před započatím prací bude rozhodnuto o dočasném odnětí PUPFL na části lesního pozemku č. 179/1 v k. ú. Hluboká u Skutče.
14. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2021 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude přednostně využita, přebytečná bude likvidována na řízené skládce v souladu s jejím provozním řádem. Odpad ze živičných povrchů komunikace bude předán k recyklaci. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci všech odpadů.
15. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací.
16. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
17. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
18. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle § 23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.
19. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
20. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí

- být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
21. Při provádění stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
 22. Dodavatele stavby seznámte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např. zápis do stavebního deníku).
 23. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.
 24. V souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. **Současně stavebník předloží geometrické a geodetické zaměření stavby, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutní zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Obec Hluboká, Hluboká č. p. 36, 539 73 Skuteč

Odůvodnění

Dne 21. 2. 2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterých je více než 30, speciální stavební úřad oznámil dne 10. 4. 2024 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 správního řádu, tj. že oznámil zahájení řízení formou veřejné vyhlášky. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v tomto řízení aplikuje ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákon, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely pro něž lze odejmout nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 silničního zákona je stavba dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšnými stavbami, pro které lze ve smyslu § 17 odst. 2 silničního zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí příslušenství nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu není tedy třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Chrudim – Odbor dopravy, MěÚ Chrudim – Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, MěÚ Chrudim – Odbor školství, kultury a sportu, odd. památkové péče, MěÚ Chrudim – Odbor ŽP, odd. přírodního prostředí ze dne 13. 10. 2023 a ze dne 13. 3. 2024, Policie ČR – DI Chrudim, Krajský úřad Pk – Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti, KHS Pk územní pracoviště Chrudim,

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, obce, vlastníka stavby na které má být stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, vlastníka pozemku na kterém má být stavba prováděna nebo ten, kdo má ke stavbě věcné právo a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem - § 94k písm. a), b), c) a d)), také osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ve smyslu § 97k písm. e). Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Krajský úřad Pk – Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti vydal dne 11. 1. 2024 pod spis. zn. KUPA-294/2024 ODSH ODO vyjádření k projektové dokumentaci, kde je mj. uvedeno, že z projektové dokumentace je patrné, že autobusová zastávka v obci Brdo bude obsluhována jednosměrně. K tomu stavební úřad uvádí, že dojde k úpravě stávající zastávky naproti č. p. 19 a autobusová zastávka naproti č. p. 16 nebude upravována, respektive není součástí projektu. Z toho vyplývá, že autobusové zastávky budou obsluhované obousměrně.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 62, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 90/2, 93, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 173, 197 a 217 a pozemkové parcely číslo 724/1, 724/2, 724/3, 741, 742, 748/1, 748/2, 753/1, 755, 756, 757, 762, 765, 790, 791/1, 855, 896, 897, 899, 944, 953/1, 956/2, 961, 962/1, 962/2, 963/2, 967/2, 968/2, 969, 1001/1, 1006, 1025/2, 1026/1, 1034/2, 1048/1, 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1658/1, 1725, 1738, 1742, 1746, 1748, 1751, 1757, 1808, 1809, 1810, 1811, 1814, 1841, 1842, 1931, 1934, 2001, 2002, 2004, 2038, 2210, 2211, 2311, 2373, 2374, 2421 a 2422 v katastrálním území Doly,

Stavební parcely číslo 36, 92/1, 92/2, 94, 95, 97, 98/1, 98/2, 99 a 180 a pozemkové parcely číslo 72, 74/1, 77/4, 78/1, 78/2, 81, 82/1, 82/2, 93/2, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 179/2, 227/1, 227/2, 227/11, 227/18, 227/21, 227/39, 631/3, 631/11, 631/20, 631/21, 714/1, 722, 728, 765, 770, 788, 789, 814, 815, 816, 841, 842, 870, 872, 875, 876, 904, 907, 908, 909, 954 a 1033 v katastrálním území Hluboká u Skutče

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Budovy Luže, Brdo č. p. 5, č. p. 6, č. p. 8, č. p. 9, č. p. 10, č. p. 11, č. p. 12, č. p. 14, č. p. 15, č. p. 16, č. p. 19, č. p. 20, č. p. 21, č. p. 24, č. p. 26, č. p. 27, č. p. 28, č. p. 29, č. p. 30, č. p. 31 a č. p. 32, Luže, Doly č. e. 44, Hluboká č. p. 36, č. p. 52, č. p. 64, č. p. 80, č. p. 82, č. p. 84 č. p. 85 a č. p. 94.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích platnost 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude



Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek se podle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručeno do vlastních rukou):

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 sídlo: Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2, který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice
č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě zřizovací listiny

Obec Hluboká, IDDS: p2tb2n9 sídlo: Hluboká č. p. 36, 539 73 Skuteč, kterou zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Pardubice, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19 na základě plné moci

Město Luže, IDDS: zh7b2rg sídlo: náměstí Plk. Josefa Koukala č. p. 1, 538 54 Luže

Josef Dejdar, Na Rybníčkách č. p. 170, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21

Josef Peřina, Brdo č. p. 12, 538 54 Luže

Jarmila Vostřelová, Brdo č. p. 1, 538 54 Luže

Milan Drahoš, Brdo č. p. 28, 538 54 Luže

Jiří Drahoš, Rabouň č. p. 15, 538 54 Luže

Ladislav Tměj, Hluboká č. p. 78, 539 73 Skuteč

Iveta Jiráňová, Za Pilou č. p. 355, 538 54 Luže

Ivona Holanová, Perálec č. p. 90, 539 44 Proseč u Skutče

Jiří Nádvorník, Hluboká č. p. 75, 539 73 Skuteč

Bc. Pavlína Vodičková Lebedová, Hluboká č. p. 94, 539 73 Skuteč

Lukáš Vodička, Hluboká č. p. 94, 539 73 Skuteč

Richard Pohl, IDDS: 2iqzpj6 trvalý pobyt: Hluboká č. p. 82, 539 73 Skuteč

Pavlína Lebedová, Hluboká č. p. 30, 539 73 Skuteč

Zderaz, zemědělské družstvo, IDDS: ubpvvhz sídlo: Zderaz č. p. 103, 539 44 Proseč u Skutče

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 62, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 90/2, 93, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 173, 197 a 217 a **pozemkové parcely číslo** 724/1, 724/2, 724/3, 741, 742, 748/1, 748/2, 753/1, 755, 756, 757, 762, 765, 790, 791/1, 855, 896, 897, 899, 944, 953/1, 956/2, 961, 962/1, 962/2, 963/2, 967/2, 968/2, 969, 1001/1, 1006, 1025/2, 1026/1, 1034/2, 1048/1, 1650/4, 1650/5, 1650/6, 1658/1, 1725, 1738, 1742, 1746, 1748, 1751, 1757, 1808, 1809, 1810, 1811, 1814, 1841, 1842, 1931, 1934, 2001, 2002, 2004, 2038, 2210, 2211, 2311, 2373, 2374, 2421 a 2422 v katastrálním území Doly,

Stavební parcely číslo 36, 92/1, 92/2, 94, 95, 97, 98/1, 98/2, 99 a 180 a **pozemkové parcely číslo** 72, 74/1, 77/4, 78/1, 78/2, 81, 82/1, 82/2, 93/2, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 179/2, 227/1, 227/2, 227/11, 227/18, 227/21, 227/39, 631/3, 631/11, 631/20, 631/21, 714/1, 722, 728, 765, 770, 788, 789, 814, 815, 816, 841, 842, 870, 872, 875, 876, 904, 907, 908, 909, 954 a 1033 v katastrálním území Hluboká u Skutče

Budovy Luže, Brdo č. p. 5, č. p. 6, č. p. 8, č. p. 9, č. p. 10, č. p. 11, č. p. 12, č. p. 14, č. p. 15, č. p. 16, č. p. 19, č. p. 20, č. p. 21, č. p. 24, č. p. 26, č. p. 27, č. p. 28, č. p. 29, č. p. 30, č. p. 31 a č. p. 32, **Luže, Doly** č. e. 44, **Hluboká** č. p. 36, č. p. 52, č. p. 64, č. p. 80, č. p. 82, č. p. 84 č. p. 85 a č. p. 94.

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Doprvní inspektorát, IDDS:

ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Městský úřad Luže

Obecní úřad Hluboká

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl Pr, vložka 162

Datum vzniku a zápisu:	28. srpna 2002
Spisová značka:	Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo:	Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Identifikační číslo:	000 85 031
Právní forma:	Příspěvková organizace
Předmět činnosti:	výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti Pardubického kraje, správa a údržba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci působnosti organizace, opravy, údržba a majetková správa silnic ve vlastnictví České republiky na území Pardubického kraje, u nichž je tato činnost převedena a vymezena smlouvou uzavřenou ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. Doplňková činnost: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej, - provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - silniční doprava nákladní, - inženýrská činnost v investiční výstavbě, - ubytovací činnost.
Statutární orgán:	
Ředitel:	Ing. ZDENĚK VAŠÁK , dat. nar. 12. dubna 1978 č.p. 111, 537 01 Tuněchody Den vzniku funkce: 1. září 2023
Způsob jednání:	Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel jedná ve všech věcech týkajících se organizace
