

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2024/00058**

mezi

CETIN a.s.

a

město Veselí nad Moravou

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Petrem Bílkem, supervizorem, VFS Morava jih, na základě pověření ev.č.

PŘ/4808/2024

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka : qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Veselí nad Moravou

se sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

zastoupená JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

datová schránka: ismbss3

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Veselí-Předměstí spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 19.12.2024 vydané pod čj. 354533/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.
- 3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
- (iii) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) a (iii) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **662.629,- Kč** (slovy: šest set šedesát dva tisíc šest set dvacet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordináční výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **16.152,- Kč** (slovy: šestnáct tisíc jedno sto padesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Ivo Zámečník
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ivo.zamecnik@cetin.cz; tel.: +420 720 935 931

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
funkce: starosta
e-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz, tel.: 518 670 100

ve věcech technických: Ing. Vladislava Nováková
funkce: referent odboru financí, majetku a rozvoje
e-mail: novakova@veseli-nad-moravou.cz, tel.: 518 670 126

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy CETIN:VPI/MJ/2024/00058
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005512
Registr smluv: ANO

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 56. schůzi dne 25.11.2024 usnesením č. 8/56/RMV/2024.

CETIN:

V Brně dne




Petr Bílek

supervizor, Výstavba fixní sítě Morava jih
na základě pověření

Stavebník:

Ve Veselí nad Moravou dne



Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD.
starosta

VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 76380/24/0003 na zpracování CTN: VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu výstavby okružní křižovatky a výstavby vjezdu do Průmyslové zóny ve Veselí nad Moravou, dojde k přeložení stávajících prvků společnosti CETIN.

Jedná se o dva samostatné objekty:

- SO410 – tento objekt obsahuje metalický kabel typu PFLE 35XN0,4 přecházejícího na kabely 3x PFLE 10XN0,4 a 1x PFLE 5XN0,4.
- SO413 – tento objekt obsahuje trubky HDPE40 oranžové barvy, HDPE40 černé barvy se zafouknutým OK 651 030 01 a metalický kabel typu PFLE 10XN0,4.

Přeložení SEK spol. CETIN je navrženo na dvou místech:

1) SO410. PRVNÍ ETAPA

Předmětem objektu SO410 je přeložení metalických kabelů typu PFLE z důvodu výstavby okružní křižovatky na silnici I/54 - ul. Blatnická.

Na začátku a konci překládky budou kabely přerušeny a pomocí kabelových spojek XAGA se naspojkují na nové prvky SEK stejných typů i kapacit. Kabely budou přeloženy do nové trasy.

Pod pojízdnými plochami budou prvky SEK zataženy do chrániček typu PE110mm.

2) SO413. DRUHÁ ETAPA

Předmětem objektu SO413 je zajištění ochrany stávající SEK (trubky HDPE40 oranžové a černé barvy s OK 651 030 01) a přeložení metalického kabelu typu PFLE 10XN0,4.

U trubek HDPE40 je uvažováno o výškové úpravě, z důvodu zajištění předepsaného krytí pod novým vjezdem.

U metalického kabelu je uvažováno o jeho přeložení do nové trasy. Bude použito nového prvku stejného typu i kapacity a kabelových spojek typu XAGA500.

Pod pojízdnými plochami bude metalický kabel zatažen do chráničky typu PE110mm, stávající prvky SEK budou uloženy do dělených chrániček typu SYSPRO200/160, resp. SYSPRO160/110mm.

Spojky XAGA budou umístěny v nepojízdných plochách a budou, společně s konci kabelových chrániček, opatřeny detekčními markery miniBall.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabel typu PFLE 0,4

PE110, SYSPRO200/160_160/110

Spojka XAGA

Mini Markér Ball

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -
Metalické kabely (část III.)
TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Stavebník: Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 00285455.
e-mail, na který se bude zasílat návrh překládky (vždy alespoň jeden e-mail musí být na stavebníka) : Ing. Vladislava Nováková - novakova@veseli-nad-moravou.cz + v kopii Ing. Daniela Šlaisová - slaisova@dik-hk.cz
věci smluvní: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta - 518 670 100, starosta@veseli-nad-moravou.cz (podpis smlouvy)
ve věcech technických: Ing. Vladislava Nováková, referent odboru MI - 518 670 126, novakova@veseli-nad-moravou.cz
Projektant: Ing. Hojný, MT: 739 633 151, mail: hojny@dik-hk.cz

Michal Novotný, MT: 725 743 505 _ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:

PD: NE
ÚR: Stavební titul zajistí stavebník
VBŘ: ANO (pouze nové trasy SEK) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
SoUZ: NE
PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
Překážky v nové trase SEK, silniční panely, aj.: odstraní investor

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušeni metalických kabelů) - min. 40 dnů předem!

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CETIN časové období realizace stavby, termíny provedení záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.

Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ


- 1

ŘEŠENÁ KŘÍŽOVATKA SILNICE I/54 - ul. BLATNICKÁ
- 2

ŘEŠENÁ KŘÍŽOVATKA SILNICE III/4994 - ul. KOLLÁROVA
- 3

MOŽNOST VÝHLEDOVÉHO PROPOJENÍ PŘELOŽKY I/55 - TRANZIT (2040)
- 4

OK I/54 - ul. DVOŘÁKOVA A KOLLÁROVA
- BUDOUCÍ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
- AREÁL ŽELEZÁREN

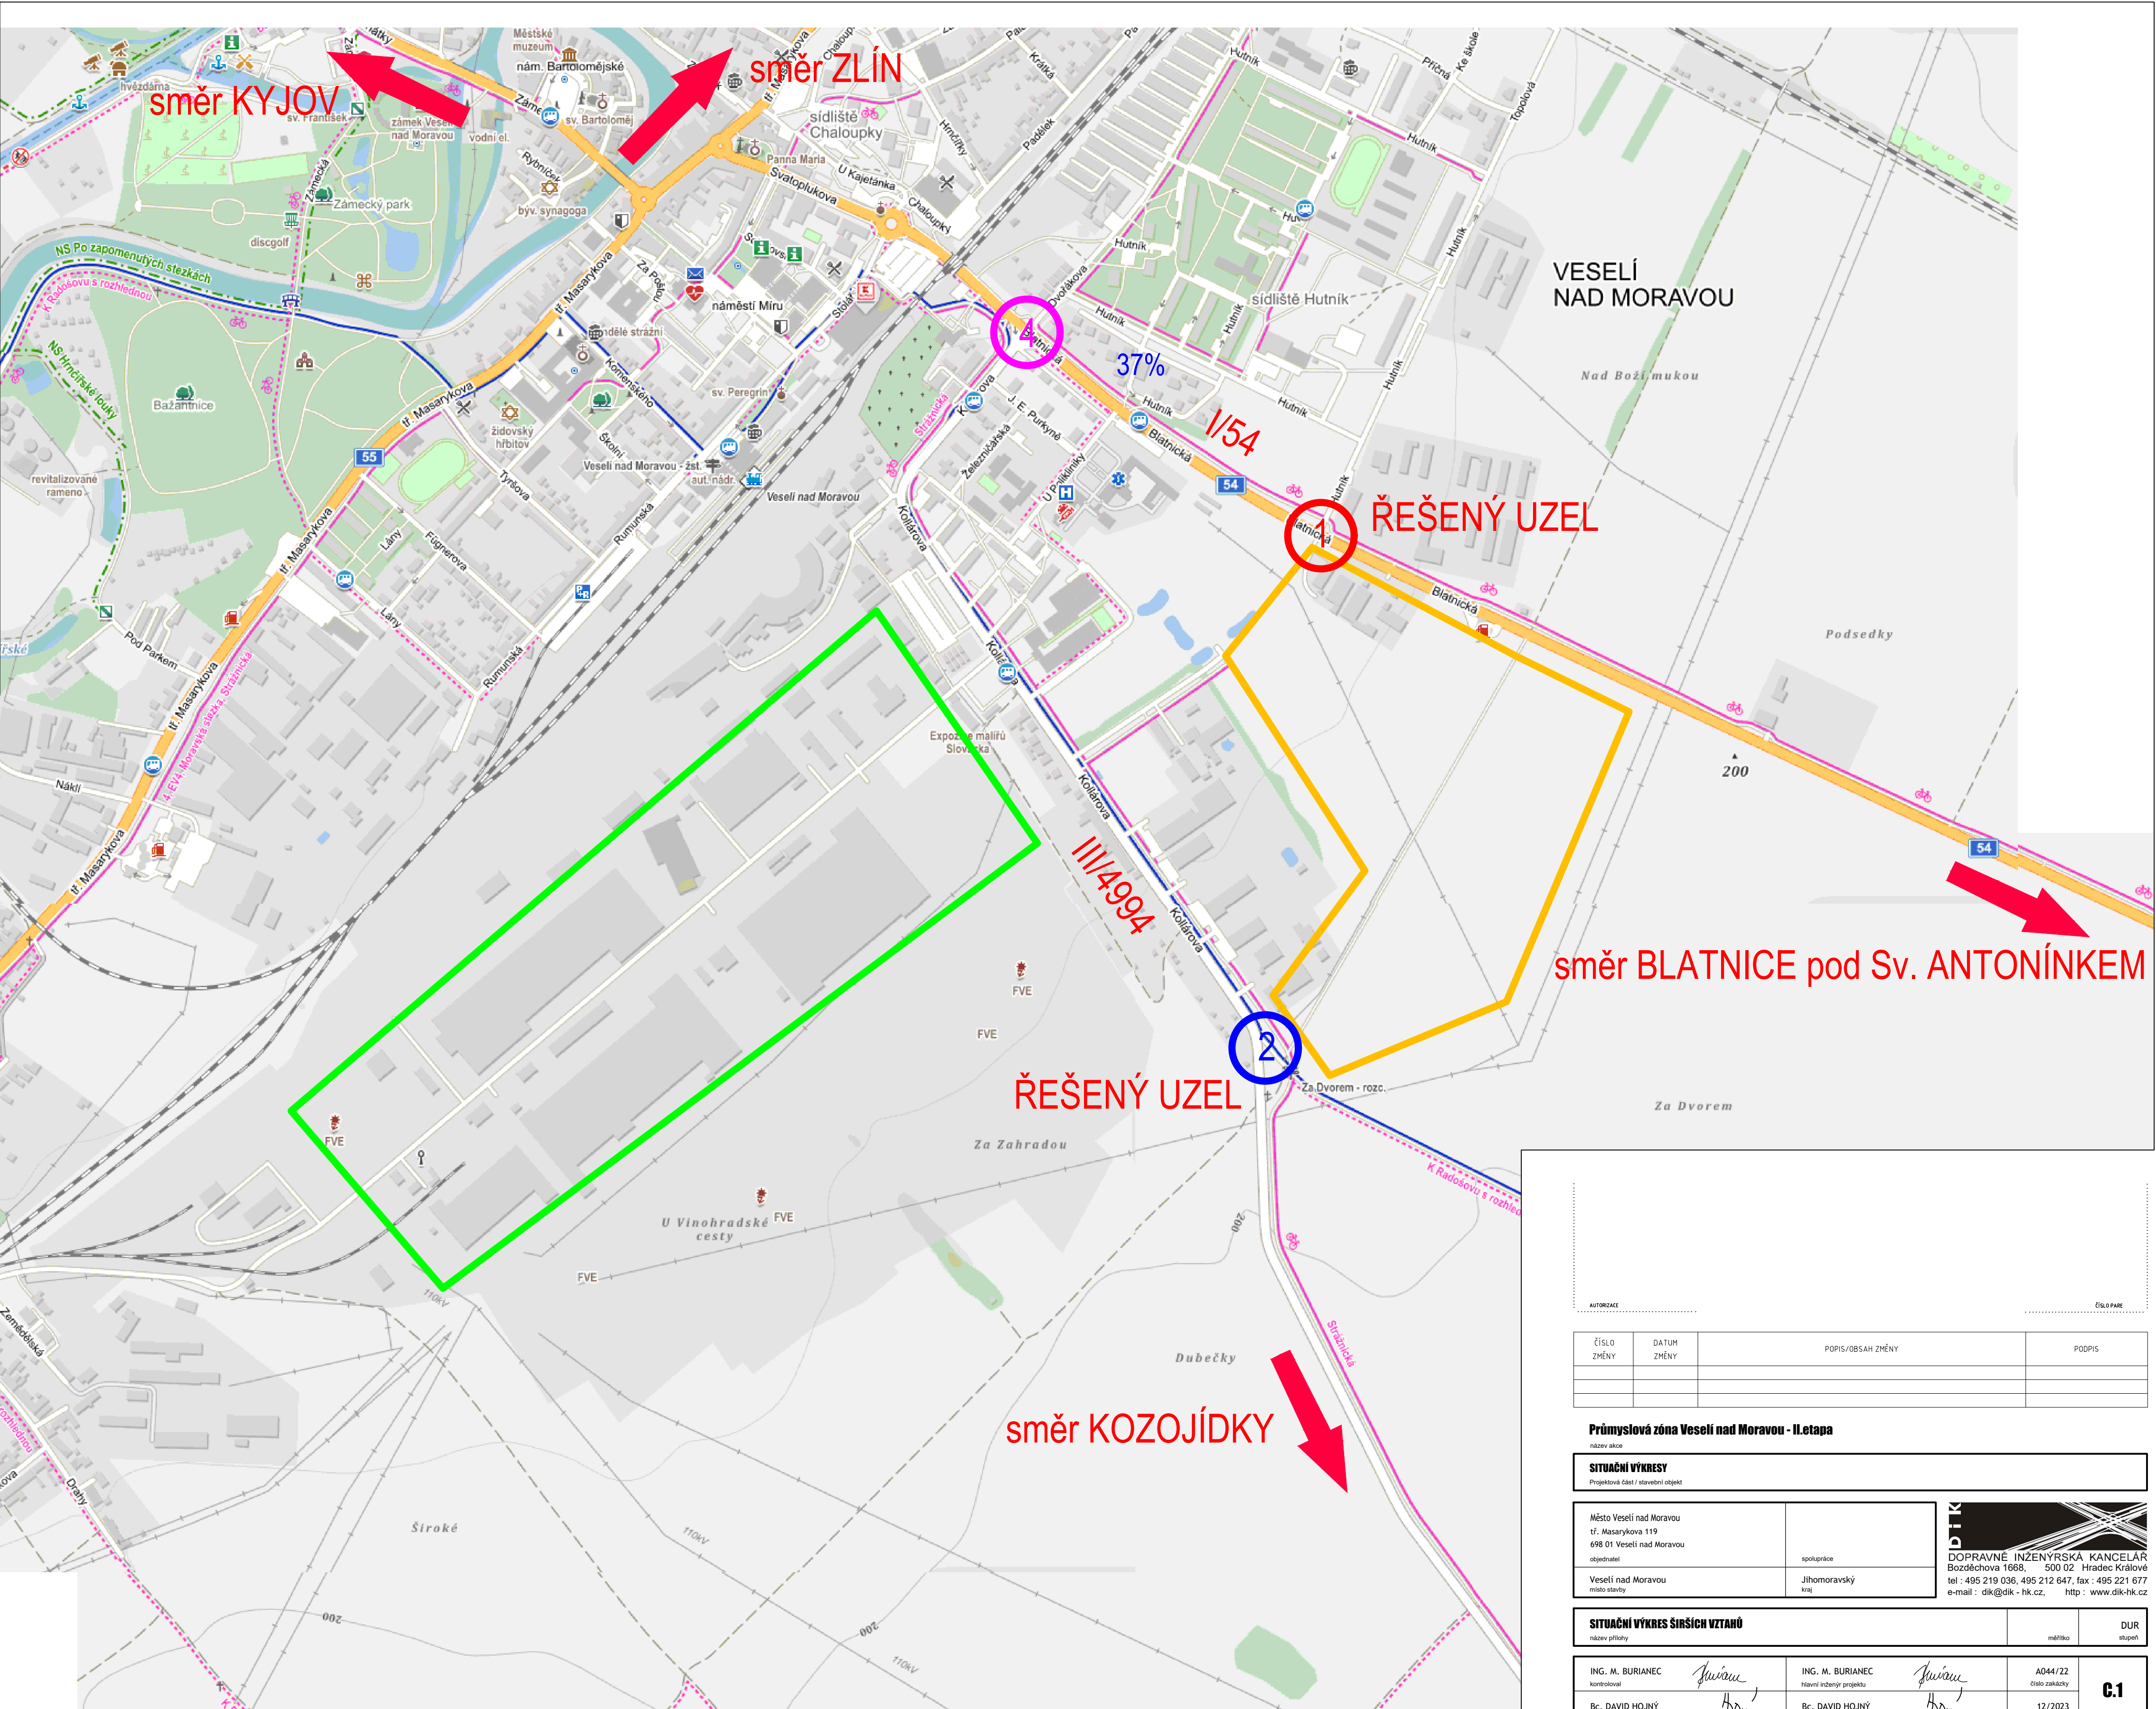

Průmyslová zóna Veselí nad Moravou - II. etapa


SITUACNÍ VÝKRESY


Projektová část / stavění objektů

Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou objednatel	spolupracovník	
Veselí nad Moravou místo stavby	Jihomoravský kraj	

SITUACNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ING. M. BURIANEC kontrola	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A044/22 číslo zakázky	C.1
Bc. DAVID HOJNÝ zodpovědný projektant	Bc. DAVID HOJNÝ vedoucí projektant	12/2023 datum	

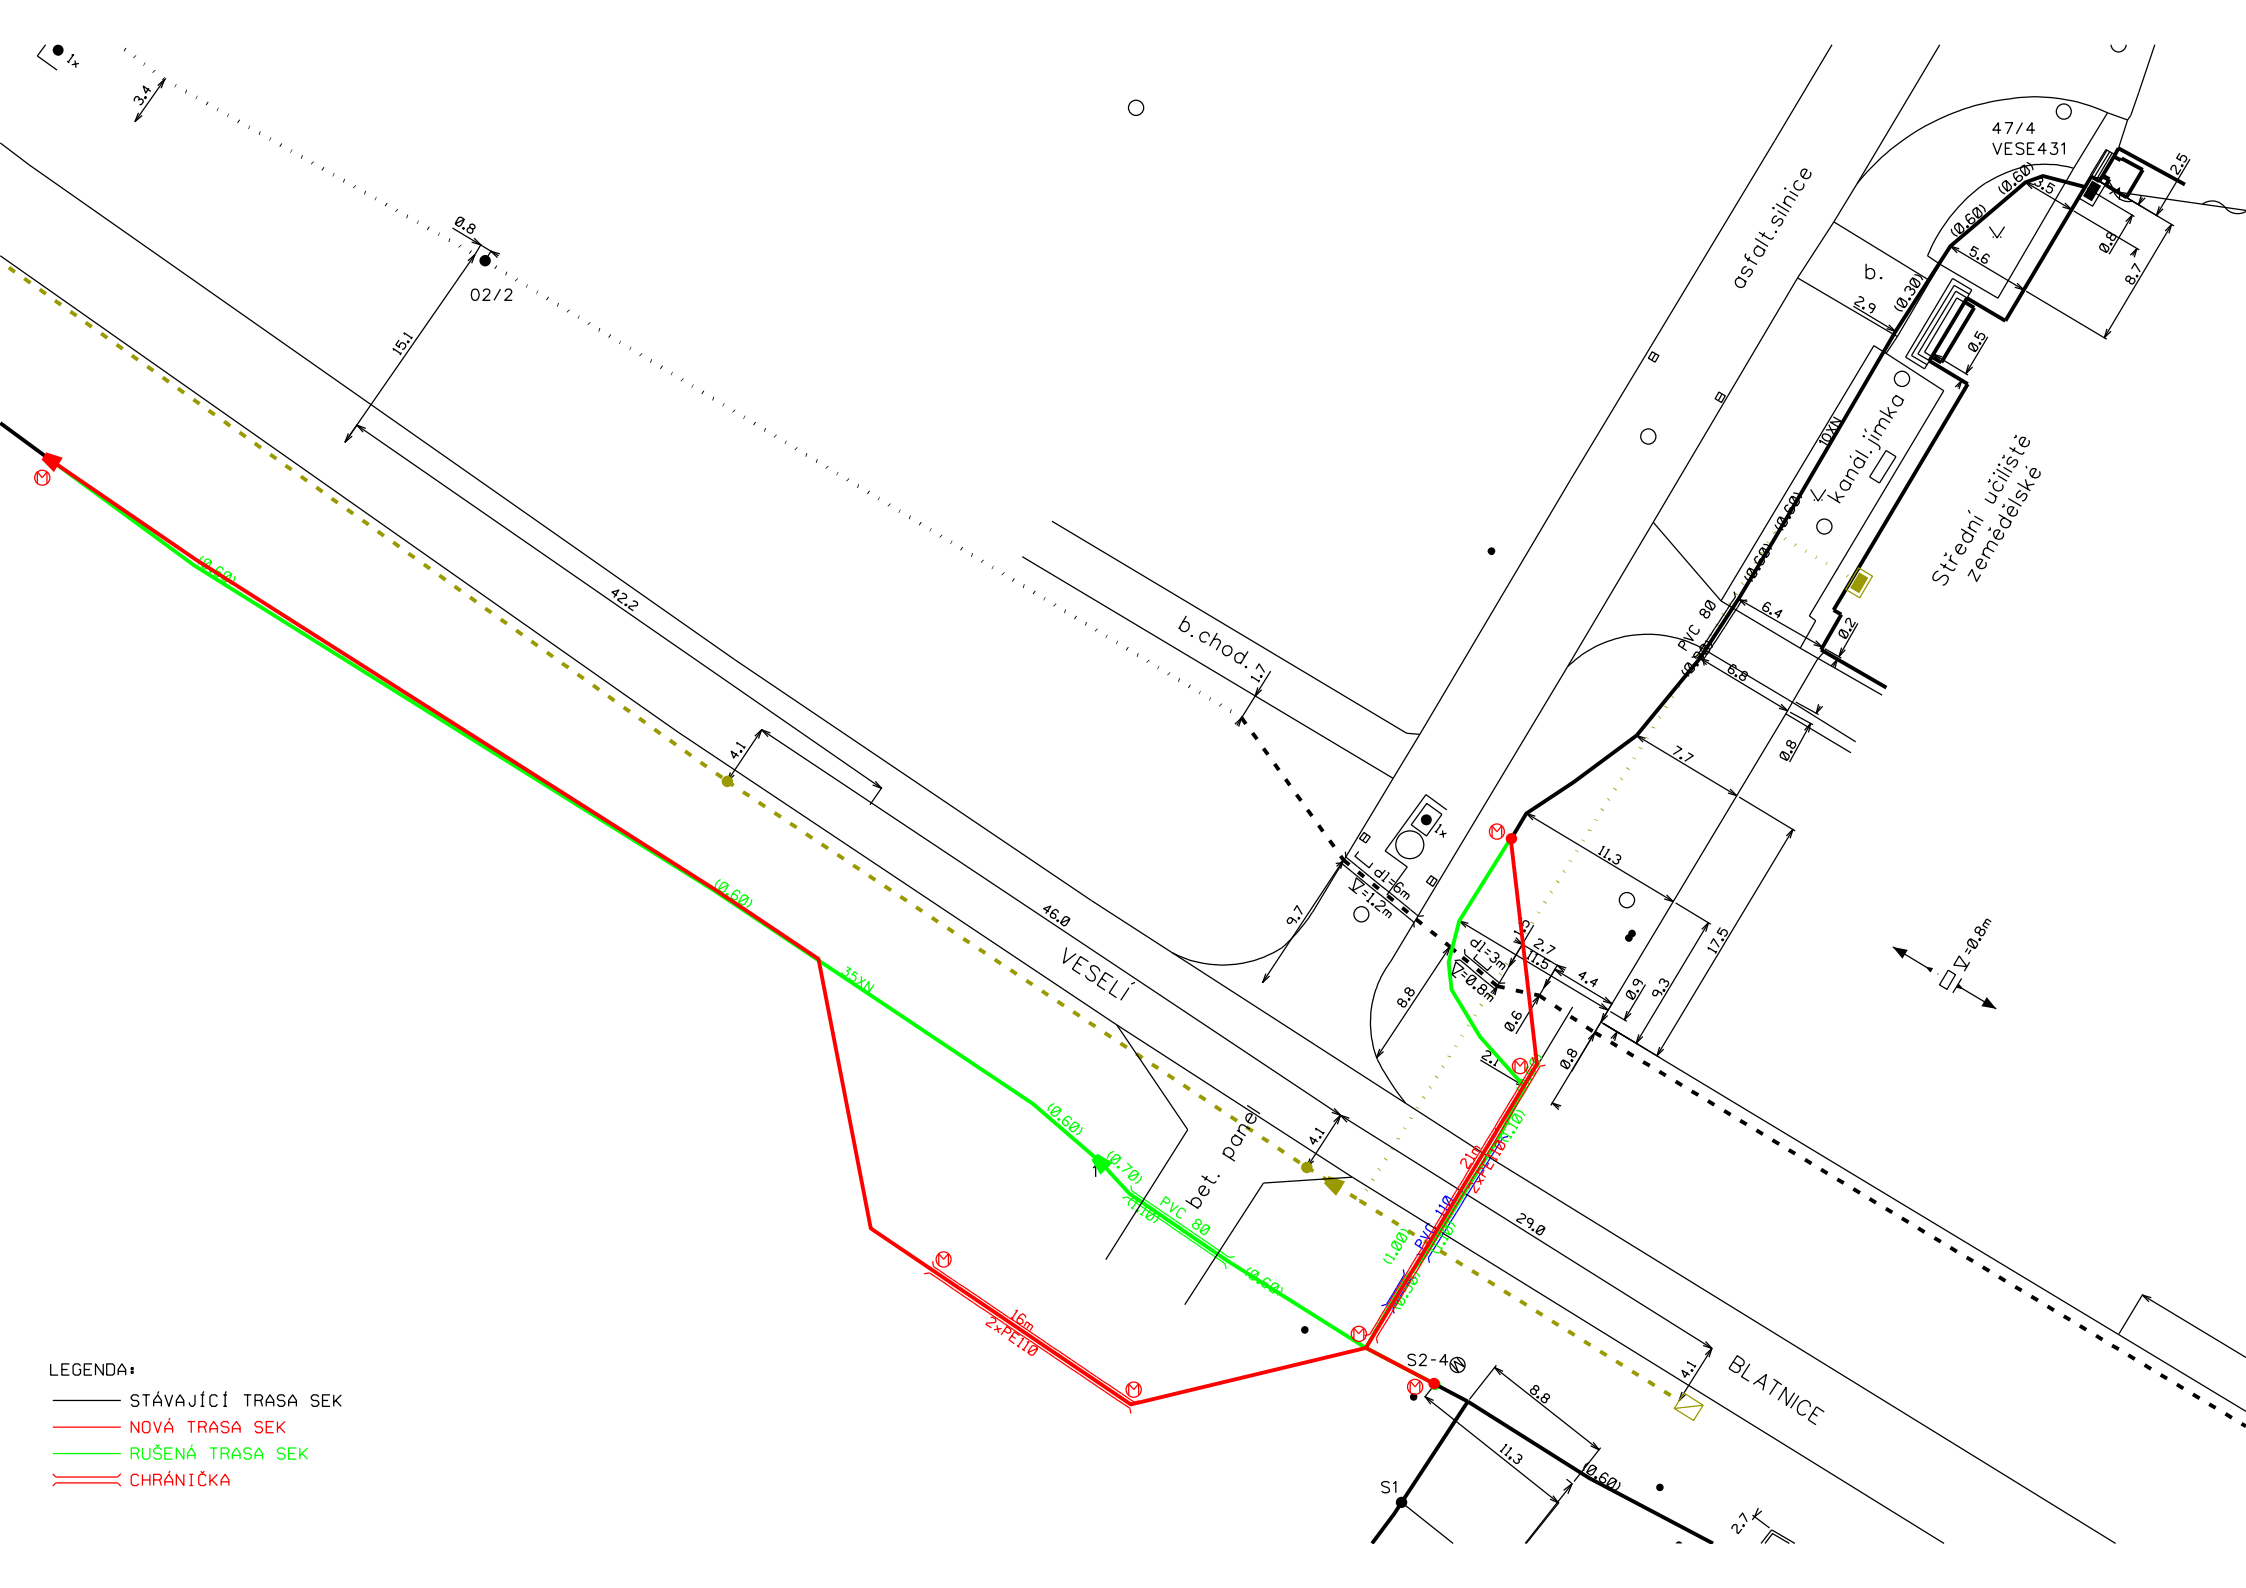

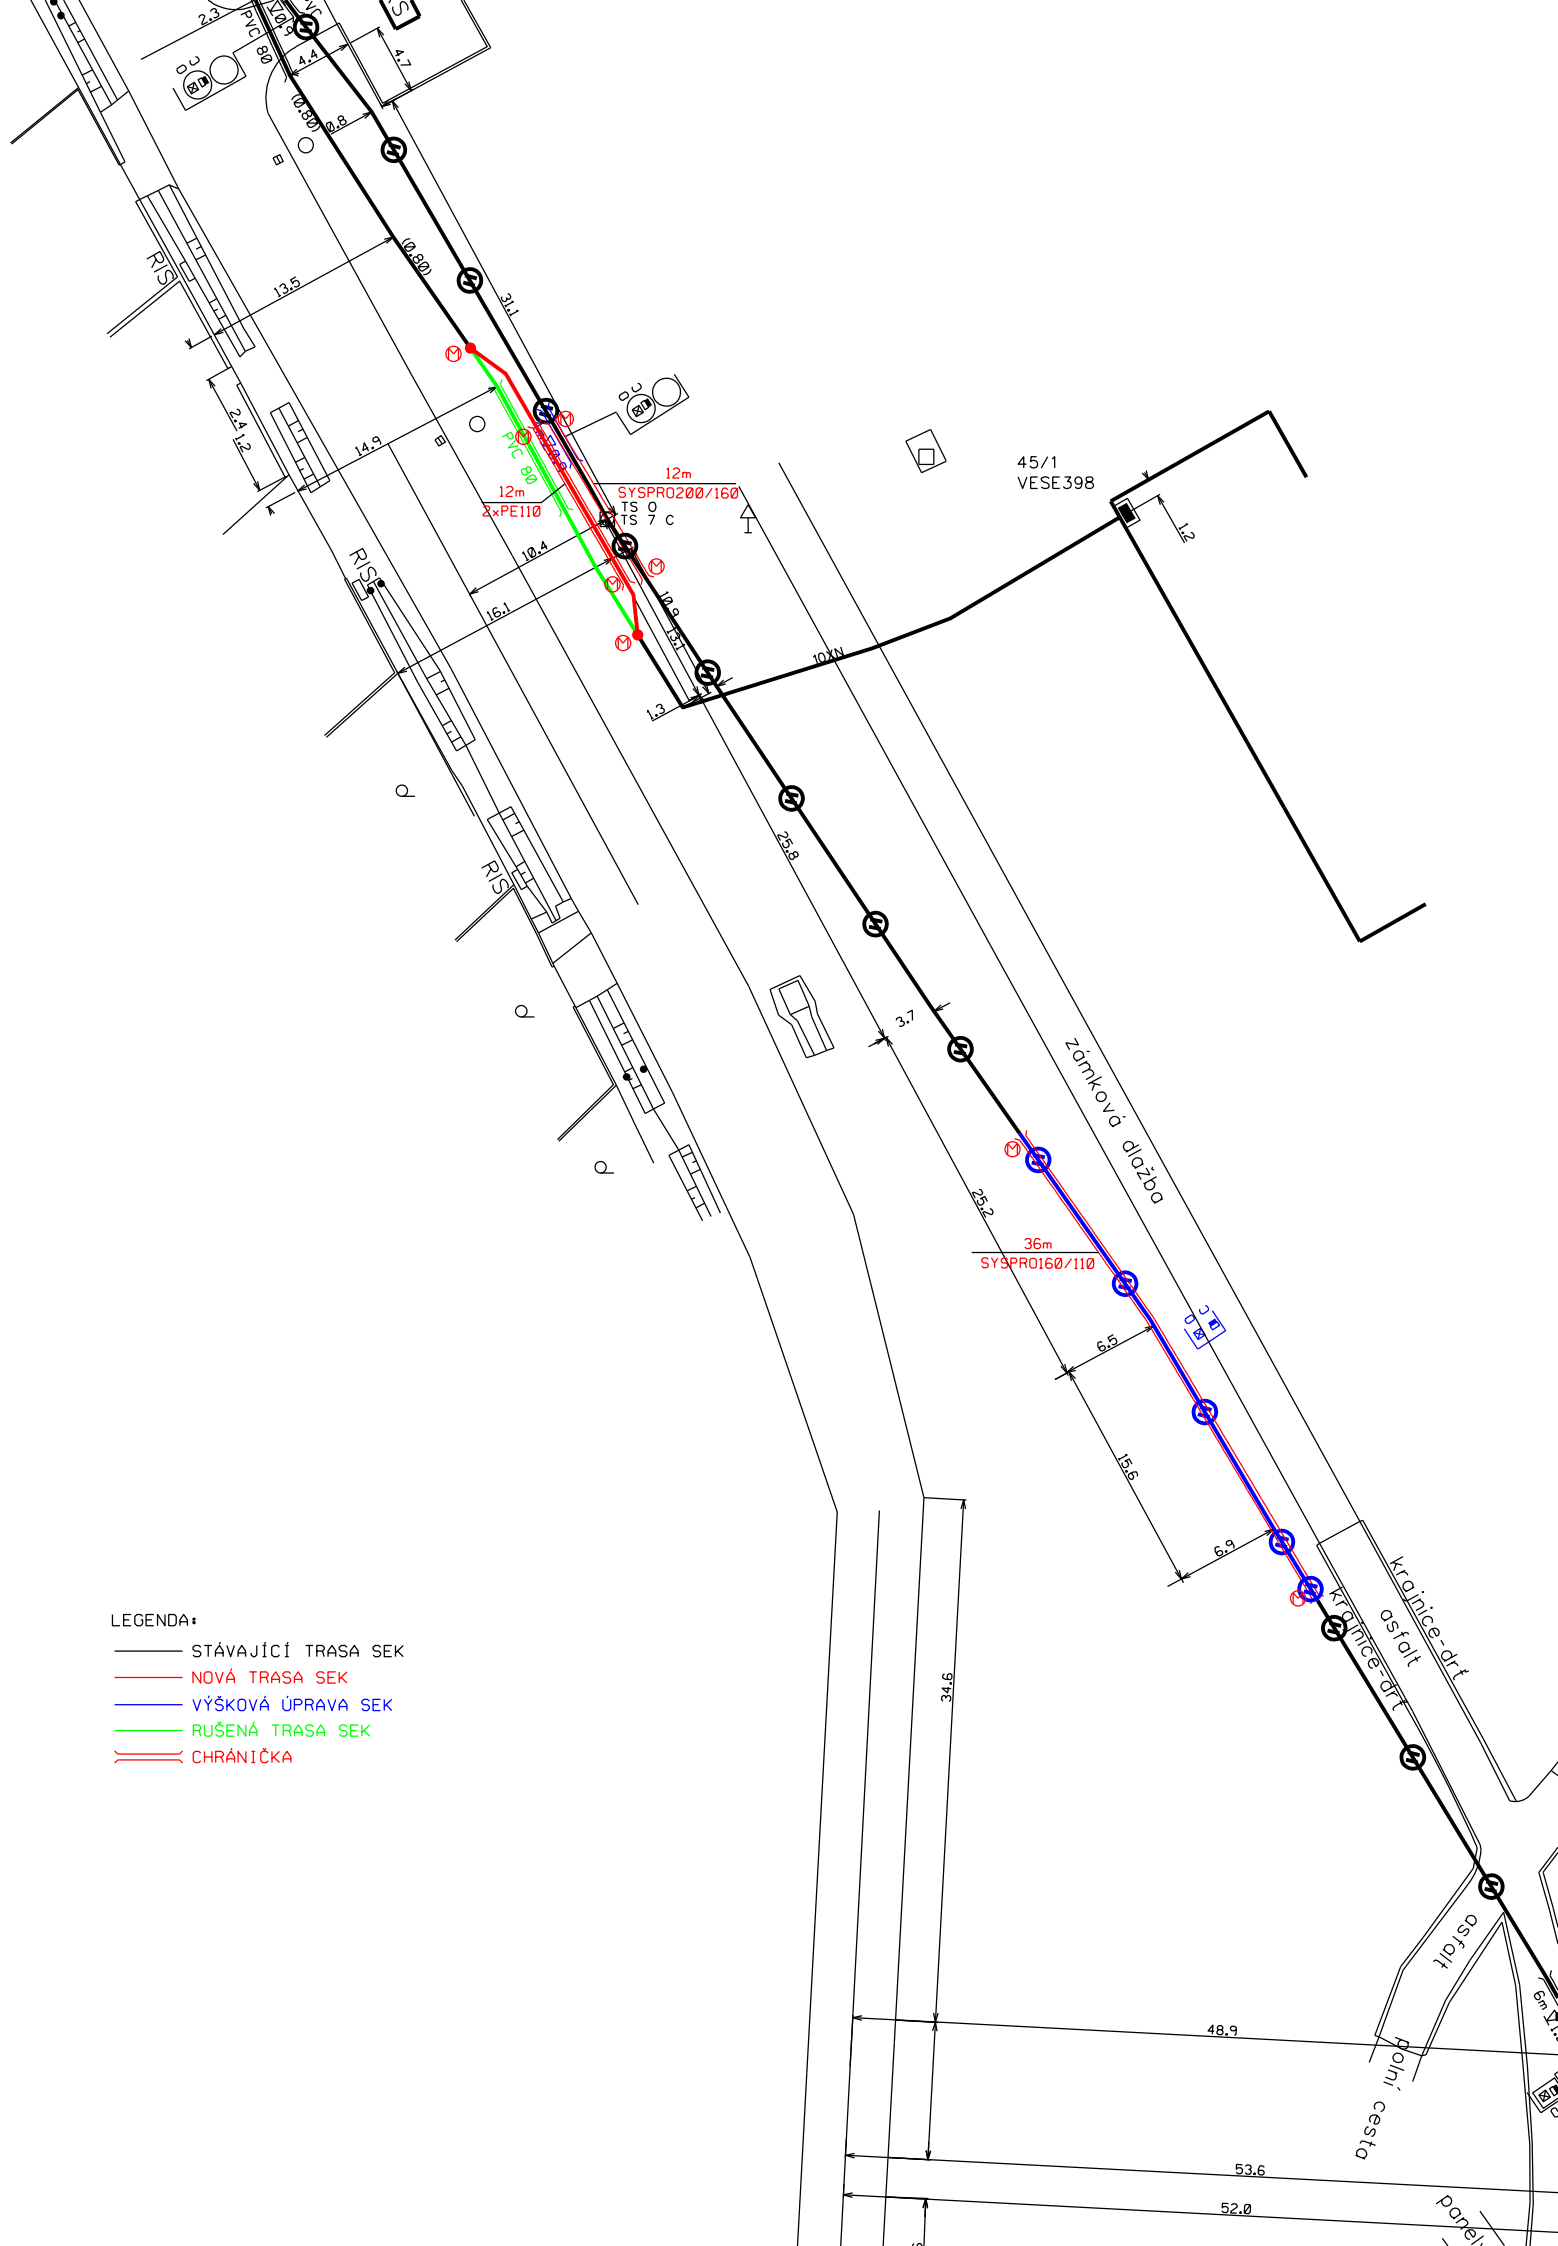

LEGENDA - NÁVRH

[illegible]

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEOVĚŘENÉ

LEGENDA - SO

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ


Průmyslová zóna Veselí nad Moravou - II. etapa


SO 413 PŘELOŽKA A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Ilkko Vespi and Maroussi of Jamar-Kyros 119 698 01 Vespi and Maroussi department	solutions Jamar-Kyros 119
---	---------------------------------

SITTING		DUR
number of people		minutes
ING. M. BURANEC last arrival	<i>Buranec</i>	1:500
Bc. DAVID HOJNÝ reached by people from	<i>HOJNÝ</i>	class priority
ING. M. BURANEC last arrival	<i>Buranec</i>	class priority
Bc. DAVID HOJNÝ reached by people from	<i>HOJNÝ</i>	1/2024

Název stavby CETIN: VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II. etap
Investor: Město Veselí nad Moravou
Zpracovatel CTN: Vegacom a.s, Michal Novotný
Zpracovatel PD: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

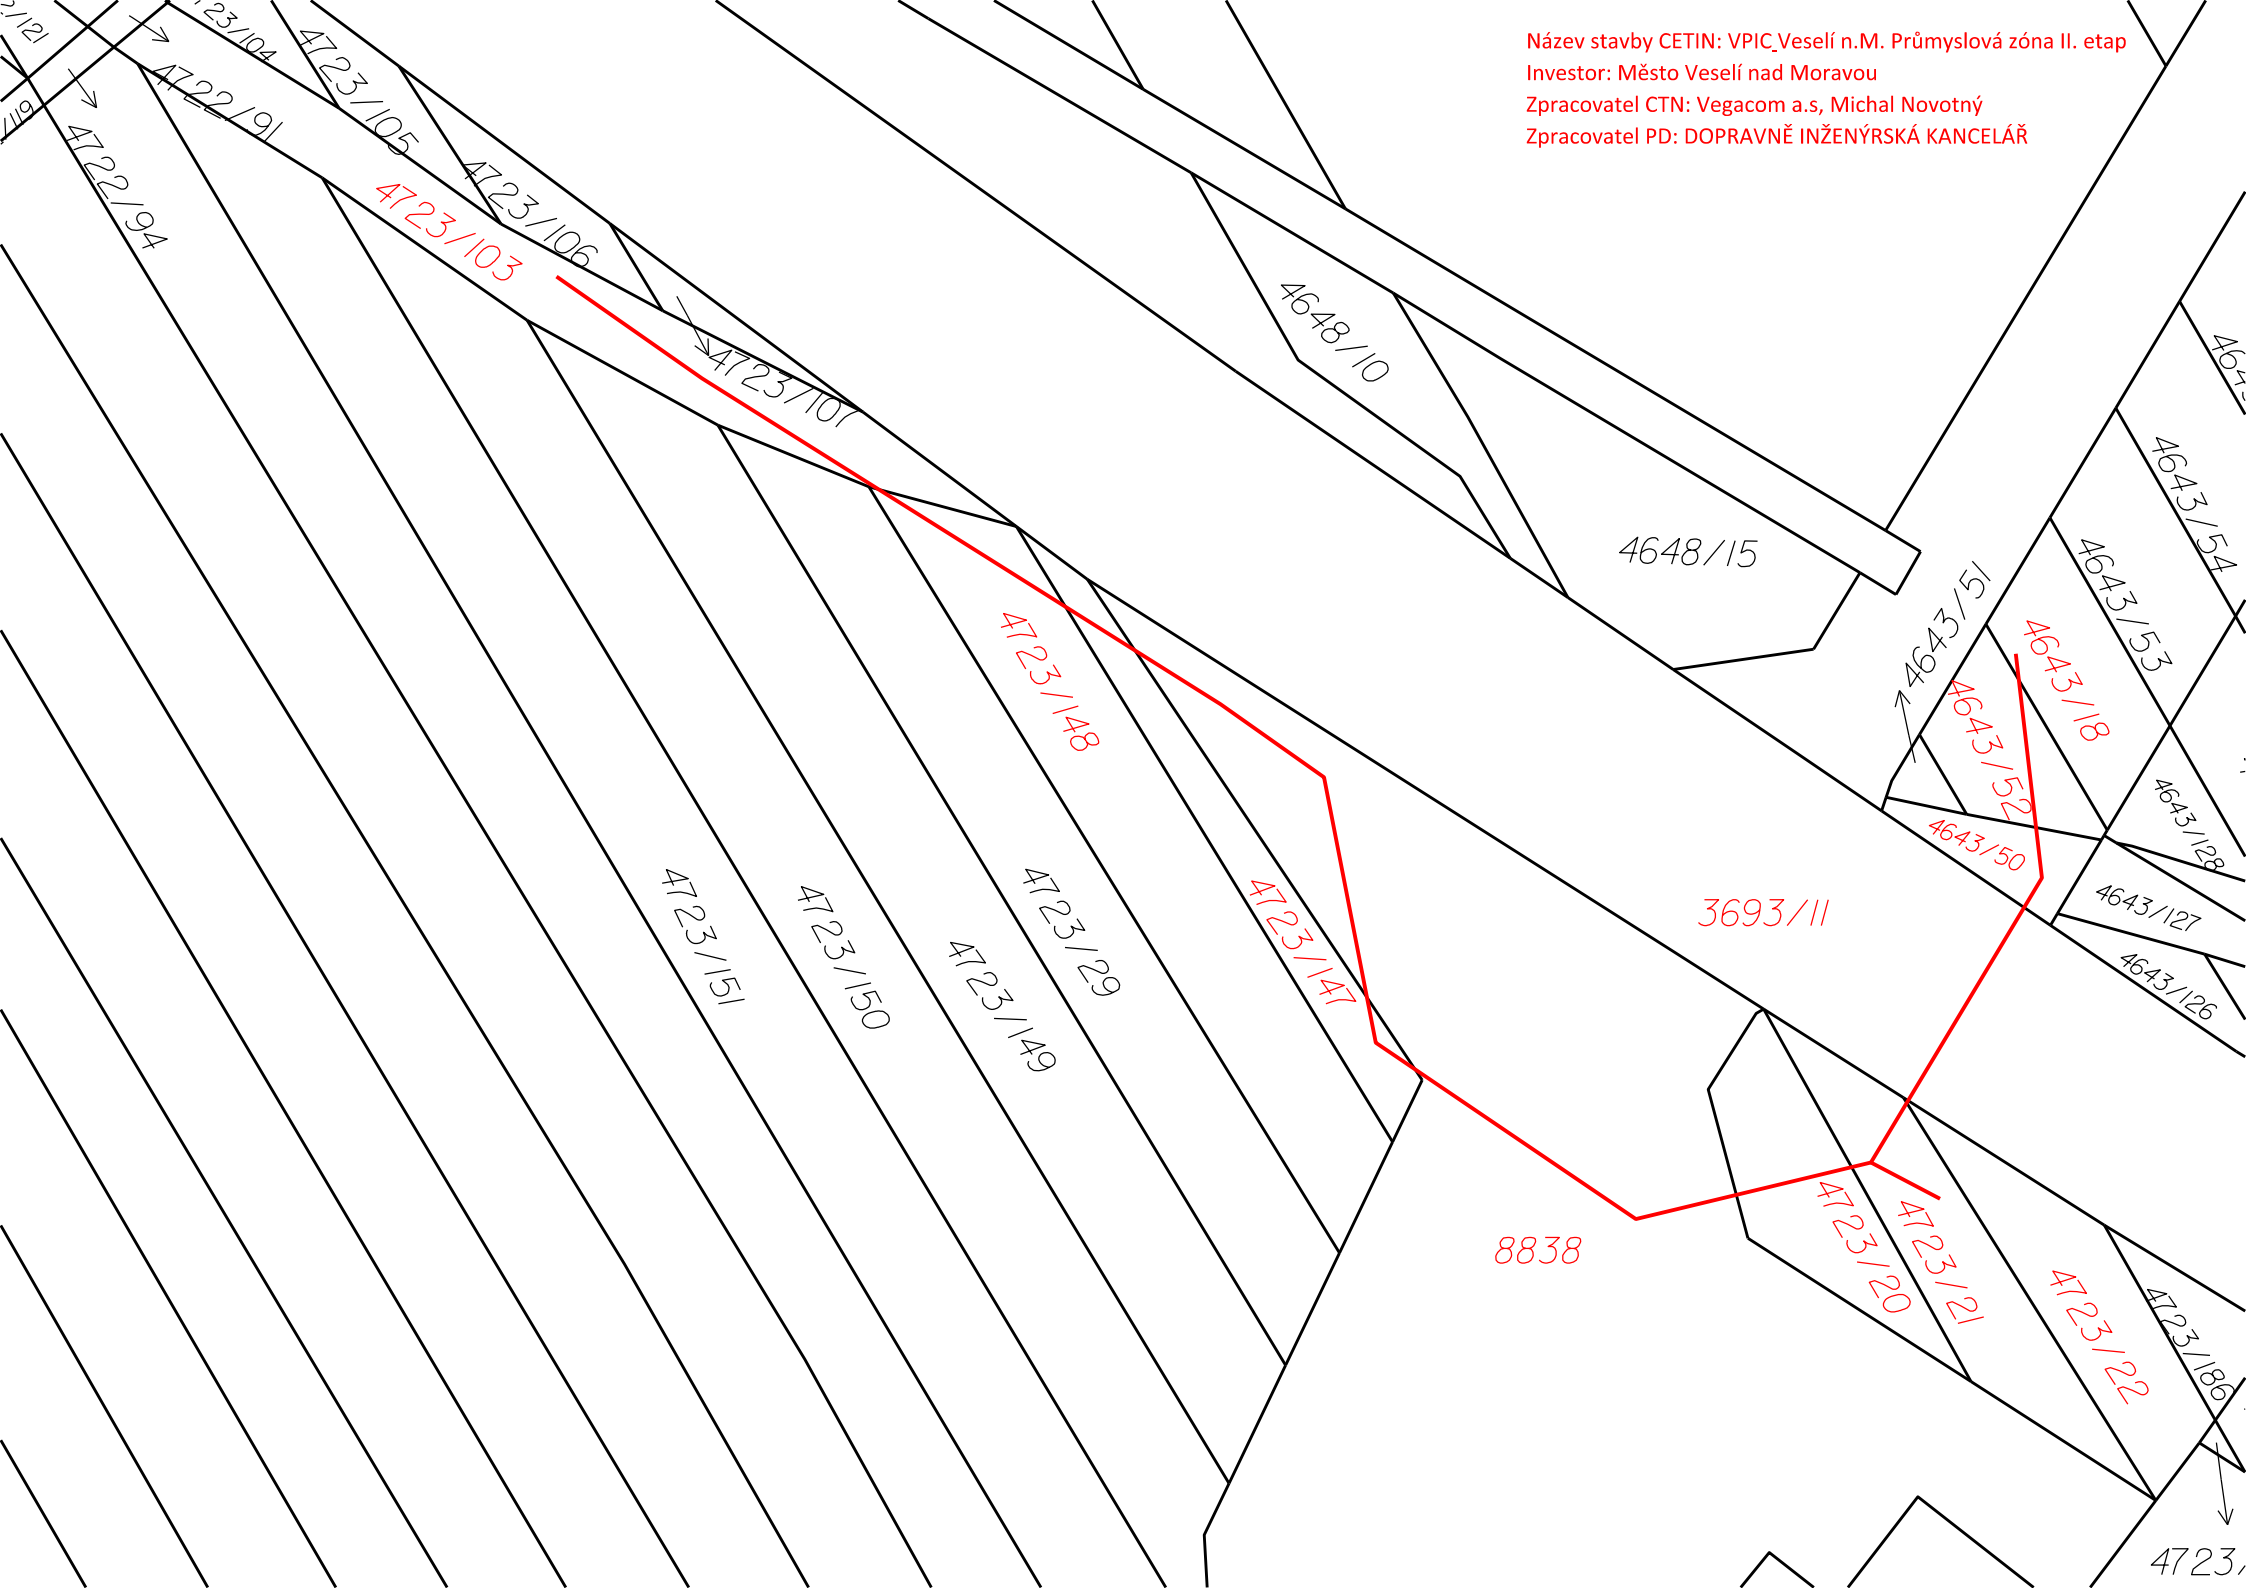

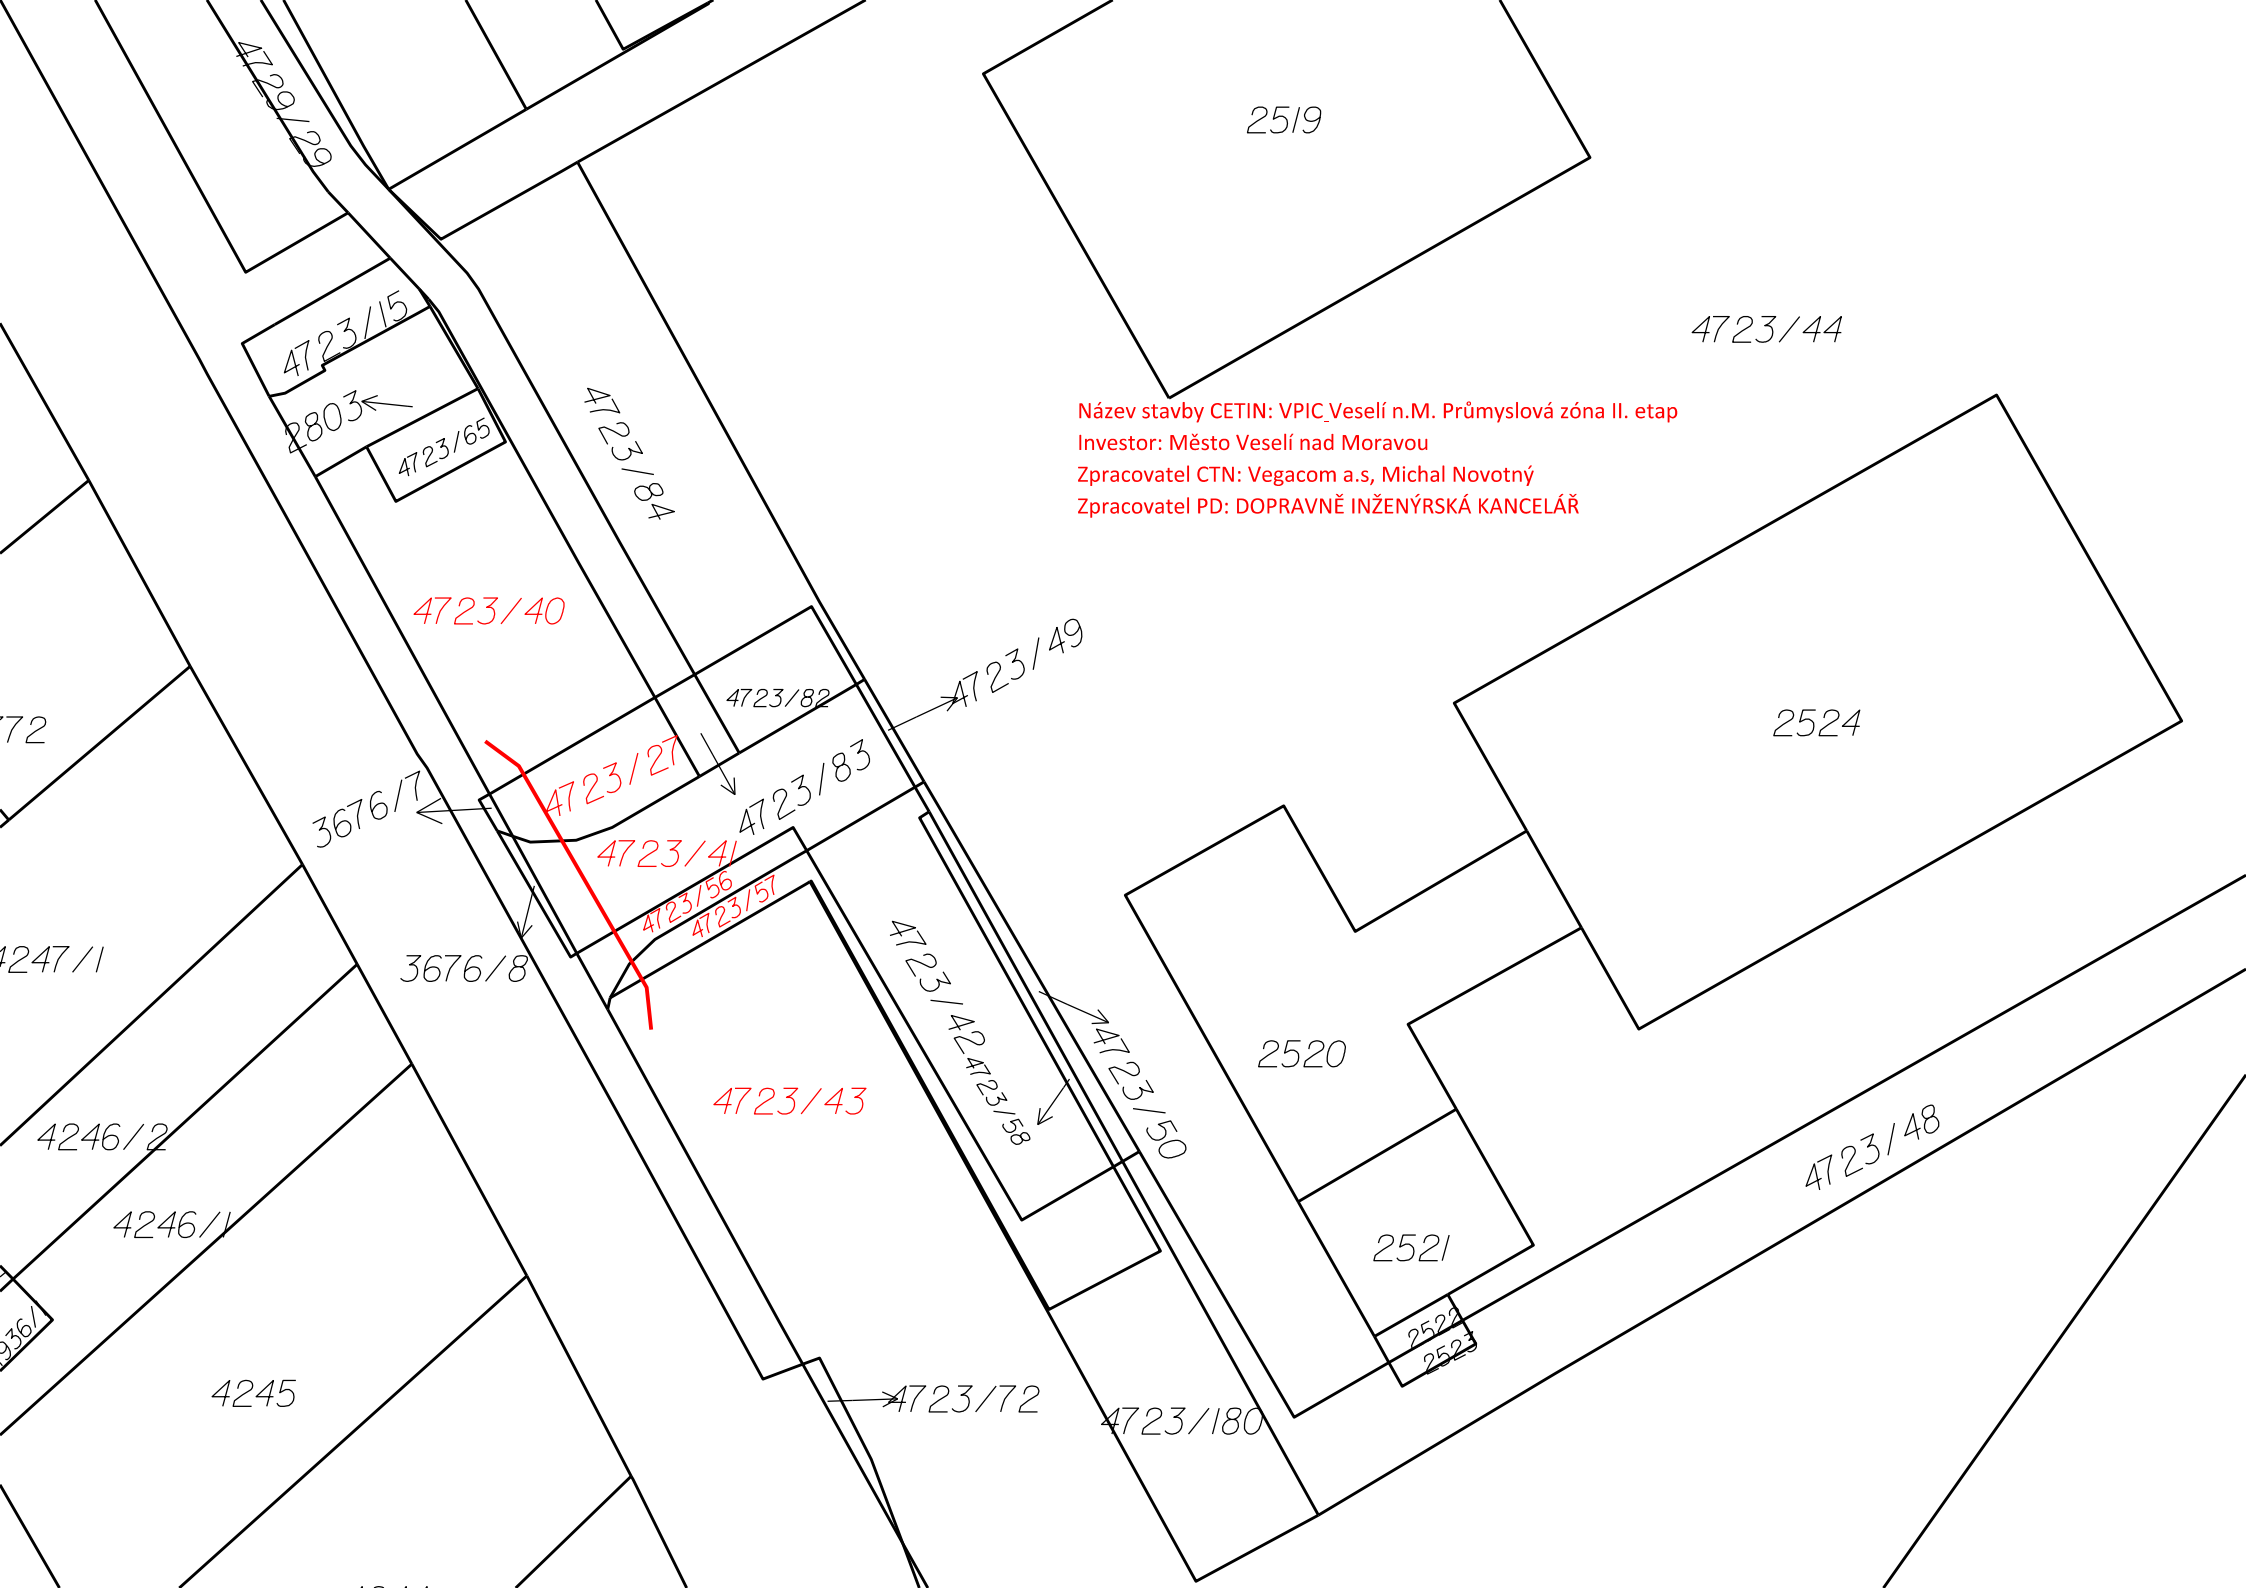

Název stavby CETIN: VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II. etap
Investor: Město Veselí nad Moravou
Zpracovatel CTN: Vegacom a.s, Michal Novotný
Zpracovatel PD: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/103
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	302
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda


Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

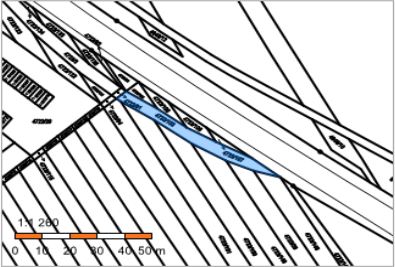

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/148
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	364
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda


Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

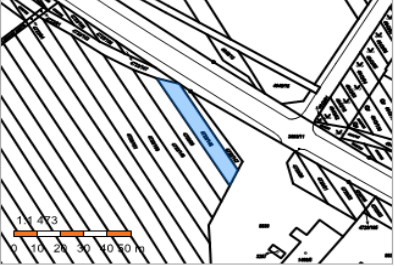

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/147
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	134
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda


Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

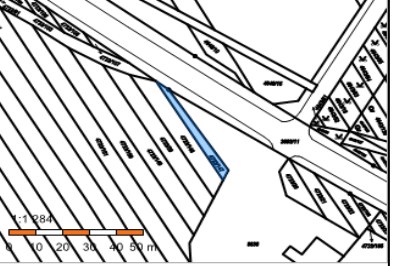

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	8838
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	2849
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/20
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	139
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda


Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

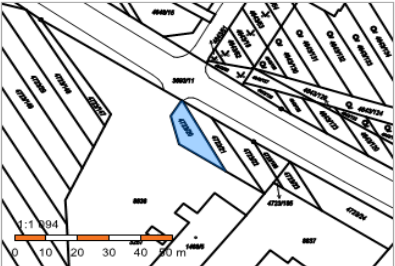

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/21
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	205
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl


Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou



76380/24/0003 VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zña II.etapa

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/22
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	195
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

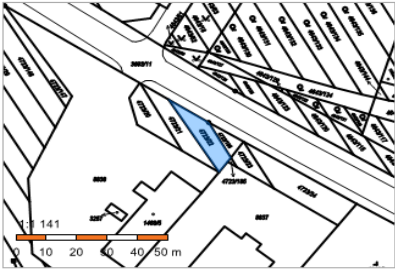

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3693/11
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	13935
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha




Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4643/50
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	47
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

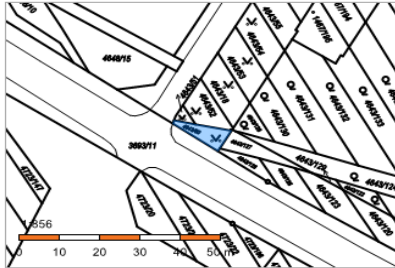

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4643/52
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	87
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4643/18
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	113
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/40
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	267
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	orná půda

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/27
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	70
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	orná půda

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/41
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	5105
Výměra [m²]:	170
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/56
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	5105
Výměra [m²]:	34
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	



Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/57
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	5105
Výměra [m²]:	105
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno	




Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4723/43
Obec:	Veselí nad Moravou [586722]
Katastrální území:	Veselí-Předměstí [780731]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	3415
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	orná půda

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou	

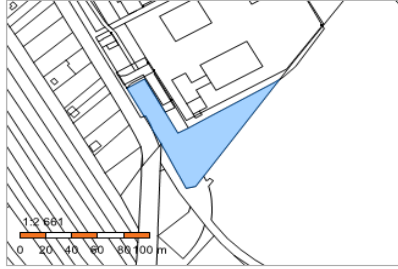

Specifikace nákladů VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - zpracování CTN

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.09

Položková 2024.09

Název stavby: 76380/24/0003 VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - zpracování CTN

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Hodonín

VUJ: Veselí nad Moravou

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	16 151,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykaz	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 16 151,52 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	16 151,52 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč

Specifikace nákladů VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO410

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.09

Položková 2024.09

Název stavby: **76380/24/0003 VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO410**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Hodonín

VUJ: Veselí nad Moravou

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	138 001,24 Kč
MONTÁŽ	94 282,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	15 254,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 808,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc	41 385,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk:	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 310 885,62 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	298 770,33 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	12 115,29 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	74.00 m	2 219,26 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	99.00 m	75 801,33 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	12.00 m	2 654,64 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	63.00 m	33 836,04 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	9.00 m	1 305,27 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	6.00 m	17 904,12 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	168.00 m	2 829,12 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	4.00 m	1 283,08 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	168,38 Kč
MONTÁŽ				
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	8.00 ks	1 809,12 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	40.00 ks	2 089,60 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	31.00 ks	1 078,49 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	487,20 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	904,56 Kč

954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	35.00 ks	1 217,65 Kč	
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	35.00 ks	1 522,85 Kč	
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické - kvalifik	16.00 hod.	10 854,40 Kč	
Koordinace se stavbou				
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	28290.00 JV	28 290,00 Kč	
Rozpočtová rezerva				
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	2 433,42 Kč	
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	6 607,12 Kč	
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	555.00 m	16 511,25 Kč	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV	6 765,00 Kč	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	3 102,00 Kč	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč	
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	3.00 ks	3 443,67 Kč	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5596.50 JV	5 596,50 Kč	
Vytyčení nové trasy SEK				
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	60.00 m	2 043,00 Kč	
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev	1.00 ks	7 614,89 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	9 846,76 Kč	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	500.00 JV	500,00 Kč	
náhrada za VBř odhadovaná				
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z k	1.00 ks	4 230,22 Kč	
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		169.00 ks	7 699,64 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		12.00 m	50,28 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		169.00 m	809,51 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		425.00 m	15 895,00 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		130.00 m	3 198,00 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný		140.00 ks	257,60 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		7.00 ks	1 864,31 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		7.00 ks	188,86 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15		3.00 ks	504,42 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		1.00 ks	475,67 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		3.00 ks	1 786,92 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1.00 ks	830,31 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		10.00 ks	446,10 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		13.00 ks	7 275,97 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm		4.00 ks	102,72 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				

304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	5.00 ks	0,00 Kč
----------	--	---------	---------

Specifikace nákladů VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO413

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.09

Položková 2024.09

Název stavby: **76380/24/0003 VPIC Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO413**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Hodonín

VUJ: Veselí nad Moravou

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	140 643,85 Kč
MONTÁŽ	99 370,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 211,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	8 308,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	23 345,92 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	50 712,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 335 591,87 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	308 861,29 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	26 730,58 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	24.00 m	719,76 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	10.00 m	1 039,80 Kč
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	8.00 m	2 271,20 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	4.00 m	4 045,88 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	4.00 m	2 148,32 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	12.00 m	1 740,36 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	17.00 m	11 344,95 Kč
958753 S		Rýha v trávě 50/130	40.00 m	43 801,60 Kč
958754 S		Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm	80.00 m	17 206,40 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	18.00 m	53 712,36 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	83.00 m	1 397,72 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	2.00 m	641,54 Kč
954971 S		Znovuosazení obrubníků záhonových beton.	2.00 m	405,58 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	168,38 Kč
MONTÁŽ				

958318 S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	31.00 ks	11 696,61 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	452,28 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	12.00 ks	626,88 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	313,11 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	121,80 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	226,14 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	347,90 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	435,10 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	30750.00 JV	30 750,00 Kč
Rozpočtová rezerva			
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	3 303,56 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné - kvalifikovaná	15.00 hod.	10 176,00 Kč
Montáž SYSPRO			
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	30.00 m	892,50 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	72.00 m	1 593,36 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	22 952,81 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6765.00 JV	6 765,00 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	1 551,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	5596.50 JV	5 596,50 Kč
Vytyčení nové trasy SEK			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	8 308,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 923,38 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3500.00 JV	3 500,00 Kč
Náhrada za VBŘ odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	6 462,10 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	2.00 ks	8 460,44 Kč
Limitka materiálů			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	29.00 ks	1 321,24 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	57.00 m	238,83 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	109.00 m	522,11 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	30.00 m	1 122,00 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný	80.00 ks	147,20 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	2 130,64 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 191,28 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	2.00 ks	89,22 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	288.00 ks	10 512,00 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	36.00 m	20 829,96 Kč
319210 S	Trubka dělená SYSPRO 200/160	12.00 m	10 317,72 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	4.00 ks	2 238,76 Kč

303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	51,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč

	Přehled nákladů	náklady
1	VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - CTN	16 151,52 Kč
2	VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO 410 PRVNÍ ETAPA	310 885,62 Kč
3	VPIC_Veselí n.M. Průmyslová zóna II.etap - SO413 DRUHÁ ETAPA	335 591,87 Kč
	Náklady celkem	662 629,01 Kč

[•]

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, senior specialistou výstavby sítě –
smlouvy
datová schránka: qa7425t
(„**CETIN**“)

a

Město Veselí nad Moravou

se sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 00285455
zastoupená JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou
datová schránka: ismbss3
(„**Partner**“)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) tuto

**DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda“)**

**Čl. I
PŘEDMĚT DOHODY**

1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („**Správní orgán**“) dne [•], pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („**Správní rozhodnutí**“) povoleno umístit stavbu [•] („**Stavba**“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací („**Stavba telekomunikačního vedení a zařízení**“). Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

**Čl. II
PŘEVOD PRÁV**

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:
 - a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním rozhodnutím,

- b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 Dohody.
3. Písemným stykem či pojmem „*písemně*“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.
5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převládá text Dohody.
7. Smluvní strany se dohodly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; (i) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující

[•]

osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(ii) Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí

CETIN:

Partner:

V Brně

V _____

za **CETIN a.s.**
Ludmila Uhrová
senior specialista výstavby sítě - smlouvy

za **Město Veselí nad Moravou**
JUDr. PhDr. Petr Kolář, PhD.
starosta
