

SMLOUVA O DÍLO**Dobranovský potok, ř. km 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200****Č. S956/2025/003**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

tel.: [redacted], e-mai [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HBAPS, s.r.o.

se sídlem Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5

IČO: 272 66 036

DIČ: CZ27266036

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

zastoupená Tomášem Unčovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172393349/0600

datová schránka: gww9v5w

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Dobranovský potok, ř. km 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2025/003**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací vypracovanou [REDACTED] a touto smlouvou (dále jen „*dílo*“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

např.

- vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací, staveb na těchto pozemcích ležících ,
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení vč. zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejných ploch včetně zajištění stanovení přechodné úravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby
- uzavření smlouvy se správcem komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného,
- zajištění slovení rybí a živočišné obsádky odborně způsobilou osobou včetně pořízení protokolu o slovení,
- provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody – záchranný přenos odborně způsobilou osobou,
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu,
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům,
- využití či likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **30. 1. 2025**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **odstranění dřevin a sedimentů nejpozději do 30. 4. 2025, úklid a předání pozemků do 30. 5. 2025.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **257 938,62 Kč (slovy: dvě setě padesát sedm tisíc devět set třicet osm korun českých a šedesát dva haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována)

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednatelem. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednatelem.

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - protokolární předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - zadávací dokumentace

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V Liberci, dne:.....
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Unčovský
jednatel
HBAPS, s.r.o.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOBRANOVSKÝ 1,330-1,420 A 5,140-5,200

Zodpovědný projektant:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO. 09602194

Č. AUTORIZACE.

[REDACTED]

Vypracoval:


[REDACTED]

Okres:

Česká Lípa

Katastrální území:

Dobranov, Písečná u Dobranova



Název: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Specifikace prací:

Odstranění sedimentu a náplavů z koryta toku, odstranění křovin a stromu.

Identifikační údaje:

název toku: Dobranovský potok

IDVT: 10234638

ČHP: 1-14-03-0510-0-00

ř. km: 1,330-1,420 (Dobranov) a 5,140-5,200 (Písečná)

ZP číslo: 414733 (Dobranov)

Místo prací:

k. ú.: Dobranov, Písečná u Dobranova

obec: Česká Lípa

okres: Liberec

kraj: Liberecký

intravilán

Technické řešení:

Jedná se o odstranění sedimentů a náplavů z koryta toku s jeho odvozem a uložením na určené místo vč. kácení stromu, křovin, jejich odvozu na určené místo a ochrany stromů před poškozením dalších souvisejících činností.

 SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

Vzhledem k dočasnému záboru pozemků města Česká Lípa (komunikace a městská zeleň), zajistí zhotovitel souhlas města k tomuto záboru prostřednictvím příslušných formulářů:

<https://www.mucl.cz/komunikace/ds-1172/>

<https://www.mucl.cz/mestska-zelen/ds-1174/>

Zhotovitel zajistí i uzavření smlouvy s městem vč. poplatku za dočasný zábor dle platné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 9/2023:

<https://www.mucl.cz/vyhlasky%2Da%2Dnarizeni%2Dmesta/ds-1030/p1=46310>

Návrh DIO, který je nutno přílohou výše uvedených žádostí, je samostatnou přílohou této zprávy - zhotovitel rovněž zajistí vyjádření i Dopravního inspektorátu Policie ČR OŘ Česká Lípa k DIO.

V rámci prací se předpokládá dočasný zábor komunikací a pozemků vč. osazení přechodného dopravního značení.

Zhotovitel tedy zajistí povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (rozhodnutí vč. nabytí právní moci) a stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) - Odbor dopravy MÚ Česká Lípa:

<https://www.mucl.cz/silnicni-a-dopravni-urad/ds-1161/>

Zhotovitel zajistí **vytýčení podzemního vedení** - vodovodní vedení pitné vody společnosti SČVK a. s. před zahájením prací. Doklad o vytýčení zhotovitel ihned předá objednateli.

Před zahájením prací bude provedena **ochrana stromů** dle ČSN 83 9061 v blízkosti pojezdu mechanizace:

- na vtoku do mostu 1 x vrba na pravém břehu průměru 110 cm
- na výtoku z mostu 1 x bříza na pravém břehu průměru 30 cm
- na výtoku z mostu vrba jako křovina na pravém břehu celkového rozměru kmenů 2 x 2 m.

Po zajištění výše uvedených dokladů provede zhotovitel odstranění dřevin rostoucích v těžném sedimentu v průtočném profilu koryta:

číslo / skupina	druh	pozemek	k. ú.	vlastník	Ø 15 cm	o. 130 cm	plocha m ²	způsob kácení
A	vrba sp.	629/65	Dobranov	LČR s.p.	---	---	7 x 3	---
1.	vrba sp.	629/65	Dobranov		19	48	---	volné

Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo, viz níže.

Pozemky dotčené dočasným zábořem v předpokládaném rozsahu:

pozemek	k. ú.	vlastník	dočasný zábor m ²
363	Dobranov	Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa	510
397/1	Dobranov		65

Zhotovitel oznámí vlastníkovvi předem vstup na pozemek (emailem či písemně), po dokončení prací uvede pozemky do stavu odpovídajícímu stavu původnímu a tyto pozemky protokolárně předá zpět jejich vlastníkovvi.

Objem sedimentů byl počítán jako plocha části koryta násobená průměrnou tloušťkou sedimentu v každé jednotlivé ploše. Dále je uvažováno vyčištění otvorů mostu lžící mechanizace z každé jeho strany.

vtok do mostu

koryto jako plocha lichoběžníku * průměrná tloušťka sedimentu = $((4,5 \text{ m} + 3 \text{ m}) / 2) * 20 \text{ m} = 75 \text{ m}^2 * 0,3 \text{ m} = 22,5 \text{ m}^3$

koryto jako plocha lichoběžníku * průměrná tloušťka sedimentu = $((5 \text{ m} + 2,3 \text{ m}) / 2) * 47 \text{ m} = 171,55 \text{ m}^2 * 0,9 \text{ m} = 154,395 \text{ m}^3$

výtok z mostu (levý břeh)

koryto jako plocha trojúhelníku * průměrná tloušťka sedimentu = $(22,5 \text{ m} * 4 \text{ m}) / 2 = 45 \text{ m}^2 * 0,8 \text{ m} = 36 \text{ m}^3$

mostní otvory

6 m³

Přístup mechanizace do koryta toku se uvažuje od mostu vždy z pravého břehu koryta. Objednatel **upozorňuje**, že dno koryta je převážně rozbahněné, z toho důvodu je nutné pro realizaci prací použít **odpovídající krácející rypadlo** (např. min. Menzi Muck M3x). Mechanizace se tedy bude pohybovat podél koryta toku i přímo v korytě.

Koryto toku je upravené vodním dílem. Nad mostem se jedná o pobřežní zdi z lomového kamene, pod mostem pak o dlažby z lomového kamene. Na tyto úpravy navazuje opevnění paty břhů polovegetačními tvárnici, které jsou skryty pod sedimentem. Odtěžení sedimentů bude provedeno až na poloveget. tvárnice.

Požadavky ochrany přírody obsažené ve výjimce ZCHD viz níže.

Odtěžený sediment bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Šidlov (lesní pozemek LČR, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 8 km. Zde bude účelně využit k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu. Po uložení veškerého sedimentu dojde ke strojní úpravě povrchu terénu a případnému dočištění lesní linky.

Byly zajištěny rozborý sedimentu podle tabulky 5.3 sloupec I. a 5.4 přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v účinném znění. Sediment vyhověl ve všech ukazatelích.

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

Vzhledem k dočasnému záboru pozemků Libereckého kraje (komunikace), které spravuje Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., zajistí zhotovitel uzavření smlouvy s KSSLK vč. poplatku za dočasný zábor prostřednictvím příslušných formulářů:

<https://www.ksslk.cz/zvlastni-uzivani-komunikaci/>

<https://www.ksslk.cz/cenik-pronajmu/>

Návrh DIO, který je nutno přílohou výše uvedených žádostí, je samostatnou přílohou této zprávy - zhotovitel rovněž zajistí vyjádření i Dopravního inspektorátu Policie ČR OŘ Česká Lípa k DIO.

V rámci prací se předpokládá dočasný zábor komunikací a pozemků vč. osazení přechodného dopravního značení.

Zhotovitel tedy zajistí povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (rozhodnutí vč. nabytí právní moci) a stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) - Odbor dopravy MÚ Česká Lípa:

<https://www.mucl.cz/silnicni-a-dopravni-urad/ds-1161/>

Před zahájením prací bude provedena **ochrana stromů** dle ČSN 83 9061 v blízkosti pojezdu mechanizace: 1 x dub a 1 x skupina 3 ks dubů na pravém břehu u mostu pod autobusovou zastávkou.

Pozemky dotčené dočasným záborem v předpokládaném rozsahu:

pozemek	k. ú.	vlastník	dočasný zábor m2
104	Písečná u Dobranova	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec	10
278	Písečná u Dobranova	<i>správa nemovitosti:</i> Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec	85
81	Písečná u Dobranova		215

Zhotovitel oznámí vlastníkově předem vstup na pozemek (emilem či písemně), po dokončení prací uvede pozemky do stavu odpovídajícímu stavu původnímu a tyto pozemky protokolárně předá zpět jejich vlastníkově.

Pozn.: Odstranění sedimentů z mostního profilu (objem cca 53,094 m3) vč. likvidace zajišťuje vlastními silami Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.

Objem náplavů v korytě toku byl počítán jako plocha části koryta násobená průměrnou tloušťkou sedimentu v každé jednotlivé ploše.

vtok do mostu

koryto jako plocha lichoběžníku * průměrná tloušťka náplavu = $((11,3 \text{ m} + 3,2 \text{ m}) / 2) * 18 \text{ m} = 130,5 \text{ m}^2 * 0,5 \text{ m} = 65,25 \text{ m}^3$

výtok z mostu

koryto jako plocha lichoběžníku * průměrná tloušťka náplavu = $((11,3 \text{ m} + 2,3 \text{ m}) / 2) * 18 \text{ m} = 122,4 \text{ m}^2 * 0,525 \text{ m} = 64,26 \text{ m}^3$

Přístup mechanizace do koryta toku se uvažuje od mostu vždy z pravého břehu koryta. Doporučuje se pro realizaci prací použít odpovídající krácející rypadlo (např. min. Menzi Muck M3x). **Mechanizace se bude pohybovat výhradně podél koryta toku!**

Koryto toku eviduje správce toku jako přírodní a neupravené. Pouze ve vzdálenosti do cca 5 m od každého čela mostu je v březích patrná dlažba z lomového kamene, která je součástí opevnění prostoru pod mostem.

Požadavky ochrany přírody obsažené ve výjimce ZCHD viz níže.

Odtěžený náplav bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Šidlov (lesní pozemek LČR, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 5 km. Zde bude účelně využito k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu. Po uložení veškerého materiálu dojde ke strojní úpravě povrchu terénu a případnému dočištění lesní linky.

Byly zajištěny rozborů sedimentu podle tabulky 5.3 sloupec I. a 5.4 přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v účinném znění. Sediment vyhověl ve všech ukazatelích.

Výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů:

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal na základě žádosti správce toku dne 14.10.2024 výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů pod zn. KULK 73503/2024, která nabyla právní moci dne 31.10.2024.

Výjimka je vydána pro tyto druhy živočichů:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - mihule potoční | - vranka obecná |
| - rak říční | - střevle potoční |
| - klínatka rohata | - mník jednovousý. |

Výjimka byla udělena zejména za těchto podmínek, které objednatel přenáší na zhotovitele prací:

1. Práce v korytě řeky je **možné provádět pouze v době mimo rozmnožování a mimo období vývoje raných stádií raka říčního, mihule potoční, vranky obecné, mníka jednovouseho a střevle potoční tj. mimo období říjen-listopad a květen-červenec běžného kalendářního roku.**
2. Koryto Dobranovského potoka bude využíváno pro pojezdy strojů v minimálním rozsahu jen v pracovním úseku, odstranění naplavenin bude prováděno primárně ze břehů nebo ručně.
3. **Maximálně 1 den před zahájením prací** v korytě potoka na každém úseku stavby zajistí žadatel na své náklady **provedení odlovu mihule potoční, vranky obecné, mníka jednovouseho, raka říčního v úseku**, kde bude prováděna těžba sedimentů. Odlovení živočichové **budou bez prodloužení přemístění do toku min. 500 m nad nebo pod realizovaný úsek stavby. Odlov smí provést odborně způsobilá osoba.**
4. Je třeba se zaměřit na **specifika odlovu mihulí** v Dobranovském potoce, tzn. **prolovit nejen vodní tok, ale i sedimenty**. Z důvodu výskytu **raka říčního**, je třeba **prolovit i kořeny dřevin či spáry původního opevnění** koryta Dobranovského potoka.
5. **Záchranný prolov ryb, mihulí a raků nesmí být prováděn:** a) za zvýšených průtoků, které by znemožnily slovně ryb, b) při zvýšeném zákalu vody, c) při teplotě vody nižší než 0 °C.
6. **Lokalita č. 1 Dobranov:** Úsek od ř.km 1,330 + 22,5m, tj. ř.km 1,3525 od mostu z rámů Beneš (levý břeh) bude ponechán pás šíře min. 1,5 m od břehu bez zásahu. Prostor pod mostem bude vybrán.
7. **Lokalita č. 2 Písečná:** Nebude prohlubováno koryto toku, budou odstraněny zarostlé naplaveniny a naplaveniny v podmostí.
8. **Odtěžený sediment a odstraňovaná vodní makrofytní vegetace** z koryta nebudou okamžitě odváženy na definitivní místo, ale **minimálně tři dny budou sediment i vegetace ponechány na vhodných místech v těsné blízkosti koryta toku, do 1 m od hrany koryta**, ale nejlépe na bermách koryta toku.
9. **Pro obě lokality platí, že nebude zasahováno do rostlého dna vodního toku.** Budou odstraněny pouze zarostlé sedimenty.

10. Při provádění prací žadatel zajistí, aby **nedošlo k úniku ropných látek a provozních náplní** mechanismů do vody.
11. Veškeré **změny oproti odsouhlasenému je nutné předem projednat** s krajským úřadem.
12. Krajský úřad bude minimálně dva týdny předem písemně nebo e-mailem **informován o zahájení záměru** v souladu s § 56 odst. 6 zákona a **bude přizván na odtěžení sedimentů**.
13. Za každý kalendářní rok, kdy bude záměr realizován, předá žadatel do **31. 12. zprávu** o průběhu těch částí prací týkajících se zvláště chráněných druhů živočichů včetně výsledků prolovů ryb, mihulí a raků.
14. **Výjimka má platnost do 30.4.2026.** V případě, že dojde k realizaci popsaného zásahu dříve, končí platnost výjimky ukončením těchto prací.

Práce v korytě toku mohou být prováděny v období **1.12.2024 až 30.4.2025**.

Zhotovitel zajistí slovení každého úseku koryta max. 1 den před zahájením prací odborně způsobilou osobou s důrazem na mihuli a raka vč. přemístění slovených živočichů min. 0,5 km od řešeného úseku. **Doklad o odborné způsobilosti** osoby vybrané zhotovitelem bude předložen objednateli ještě před zahájením jakýchkoliv prací v korytě toku. **Doklad o druhovém a početním složení slovených živočichů** bude bezodkladně předán objednateli.

Veškerý vytěžený sediment vč. vodních rostlin bude vždy ponechán max. 1 m od koryta toku pod dobu min. 3 dny. Teprve poté může být naložen a odvezen.

Zhotovitel bude informovat objednatele o termínu slovení a prací na každém jednotlivém úseku min. 1 den předem.

Ostatní ujednání:

Na staveništi budou přítomni vždy min. 2 pracovníci z důvodu zajištění základní bezpečnosti.

Zhotovitel provede fotodokumentaci dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících (ploty, zábradlí, drobné stavby, zařízení atd.) - před zahájením a po dokončení prací a fotodokumentaci průběhu prací, kterou předá objednateli v elektronické podobě.

Zhotovitel se bude řídit svým interním firemním plánem BOZP a havarijním plánem přizpůsobeným pro tuto akci.

Po dokončení prací zhotovitel uvede dotčené pozemky do stavu odpovídajícímu původnímu stavu a takto je protokolárně předá zpět jejich vlastníkům.


V průběhu prací nedojde k znečištění nebo poškození koryta toku, nadzemních vedení, dotčeného pozemků, místní komunikace včetně staveb a porostů na něm. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí zhotovitel prací.

Zdůvodnění prací:

Nařízení Povodňového orgánu Města Česká Lípa č. j. MUCL/36683/2024 ze dne 12.3.2024.

Dne 6.11.2024, [REDACTED]

Přehledná situace:

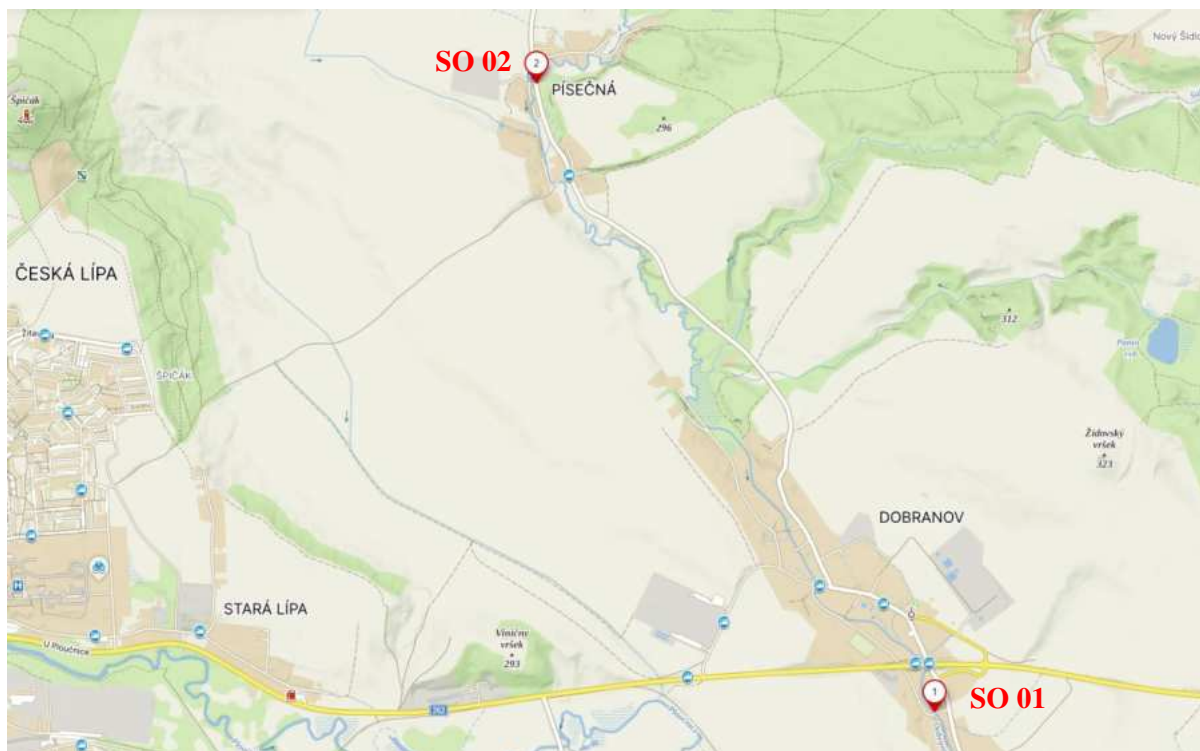

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420




<https://mapy.cz/s/demalekulu>

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200



<https://mapy.cz/s/karomupulu>

místo uložení sedimentů:

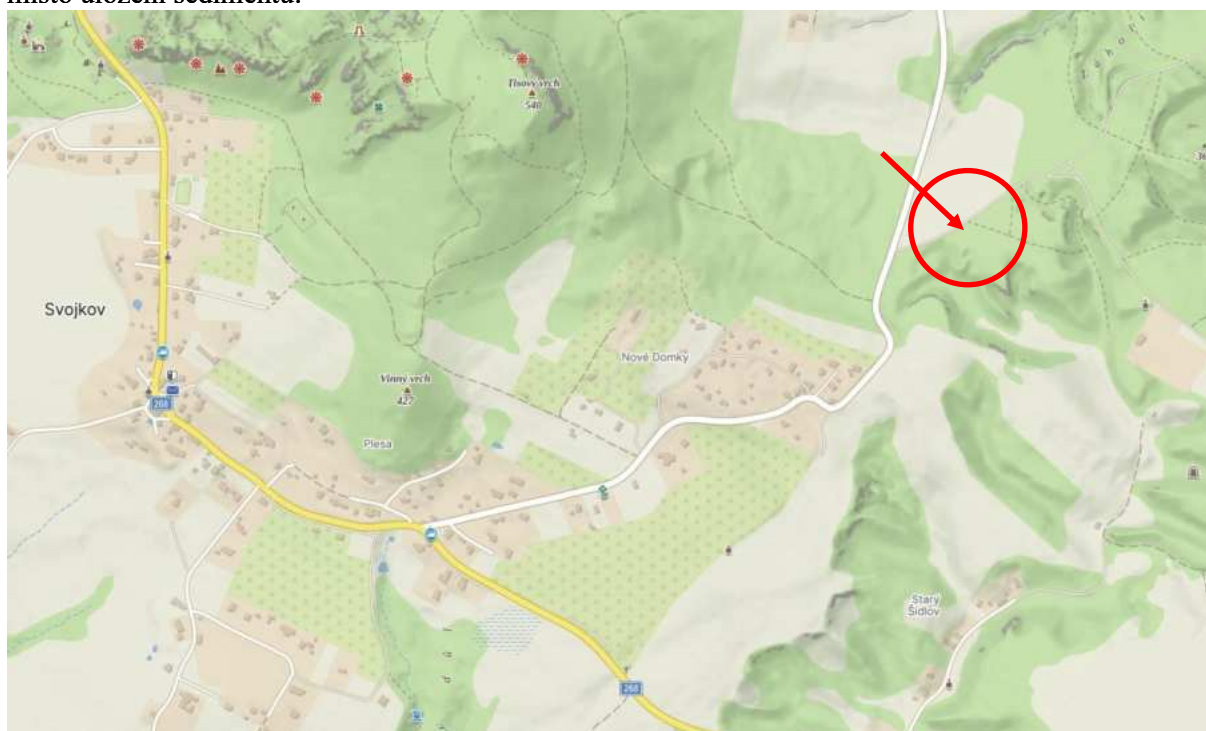

<https://mapy.cz/s/lefaguhura>

Situace dočasných záborů:

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420





SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200




Podrobná situace:


SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

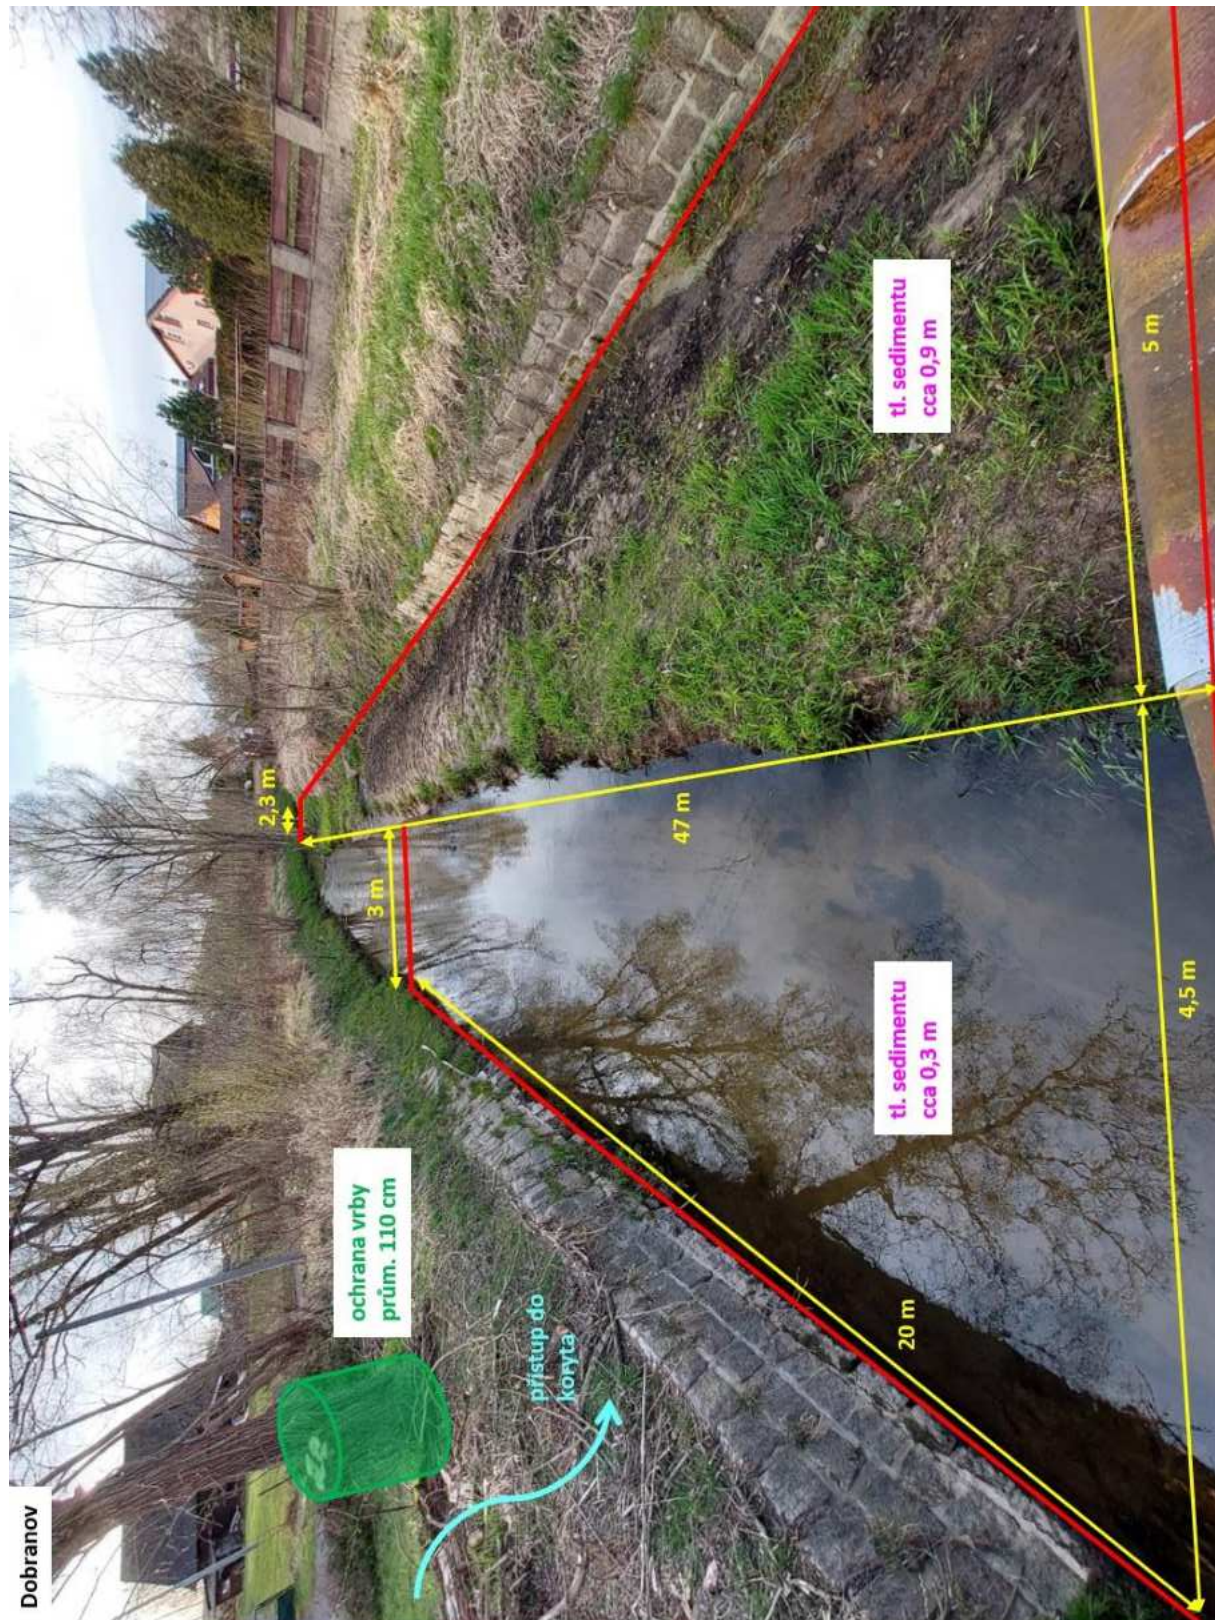



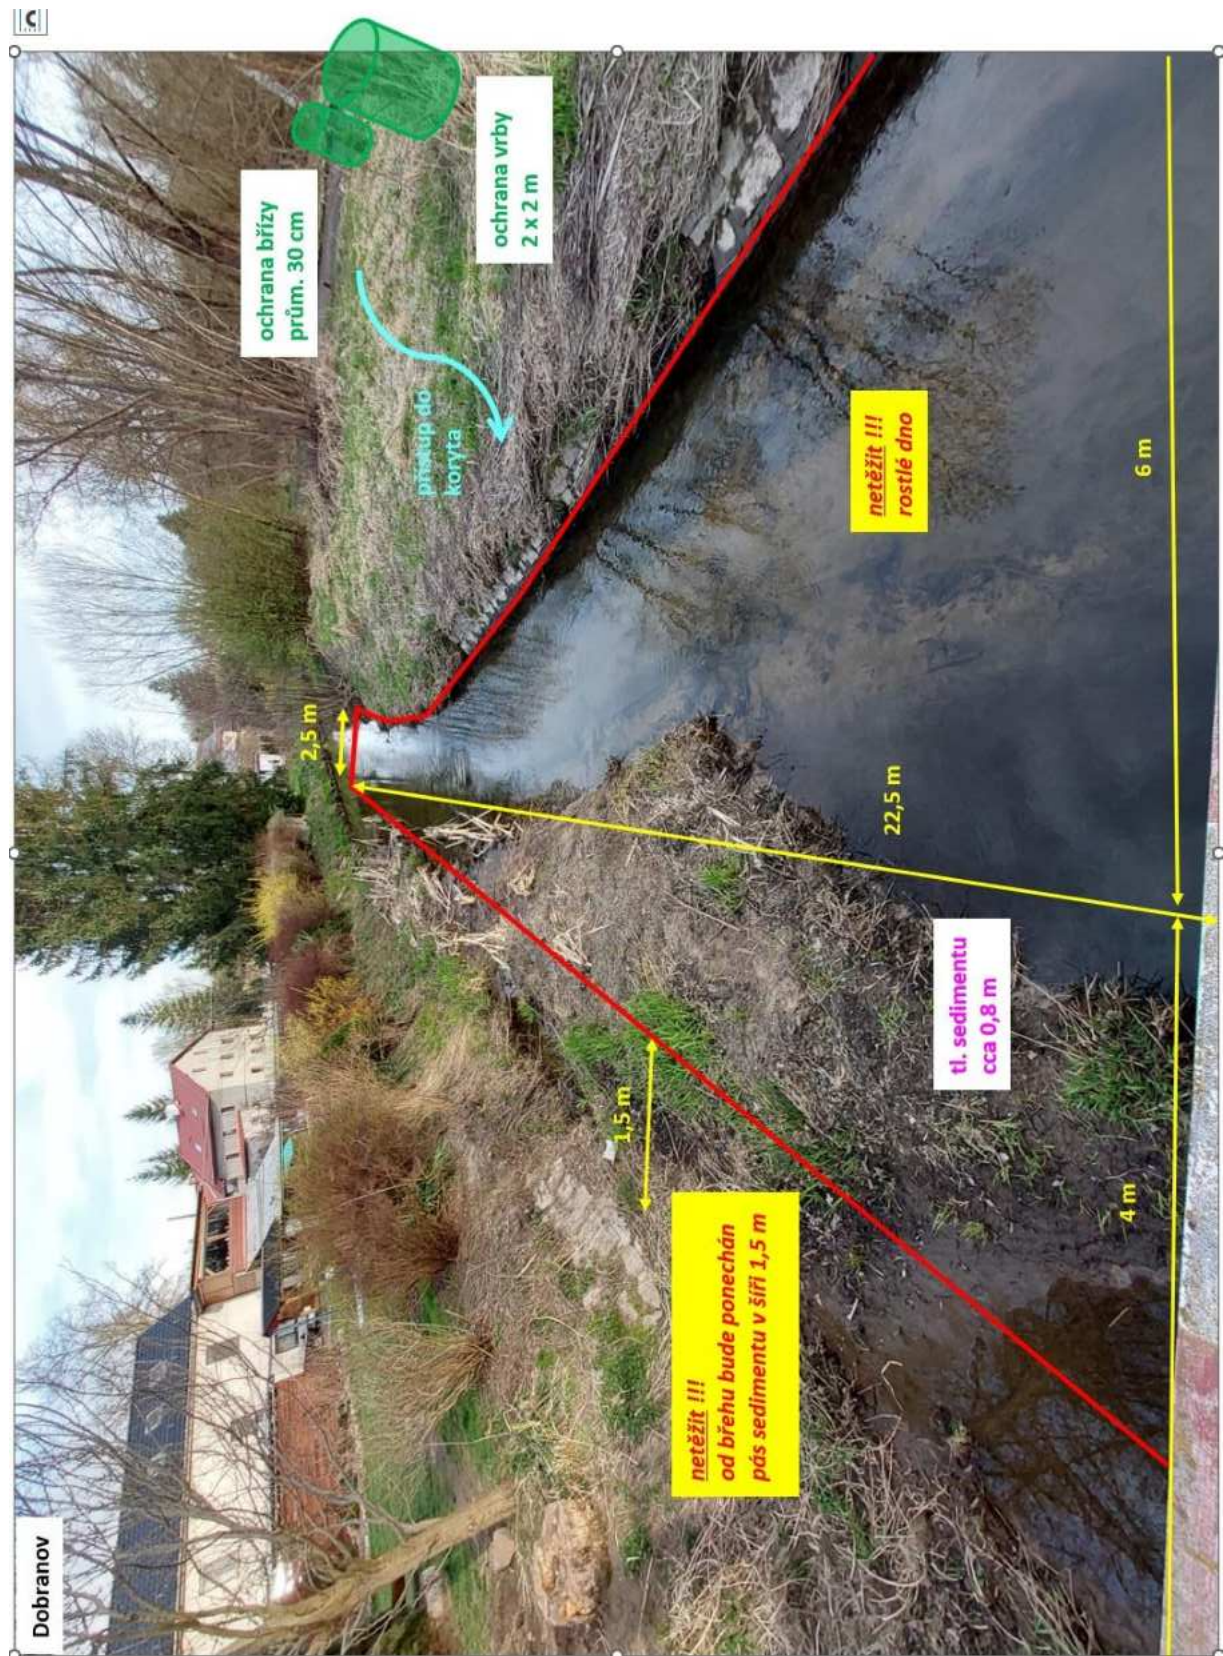


SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

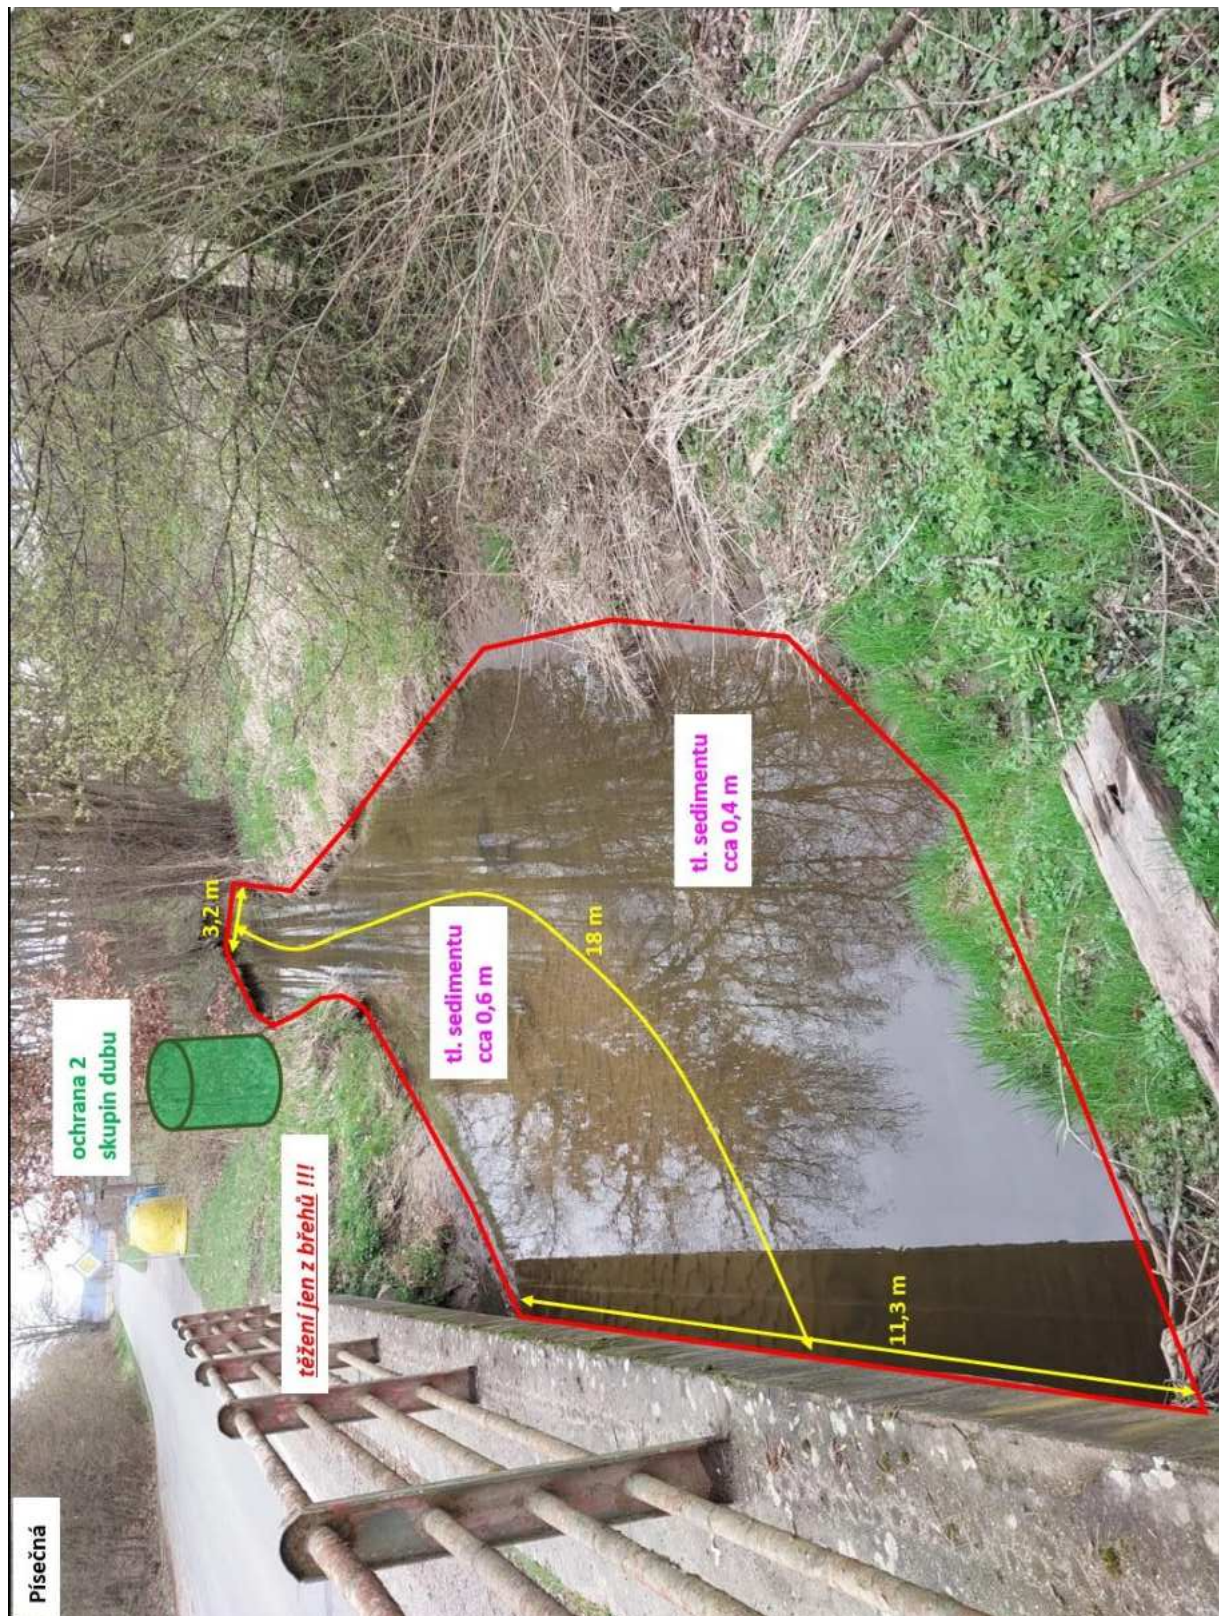

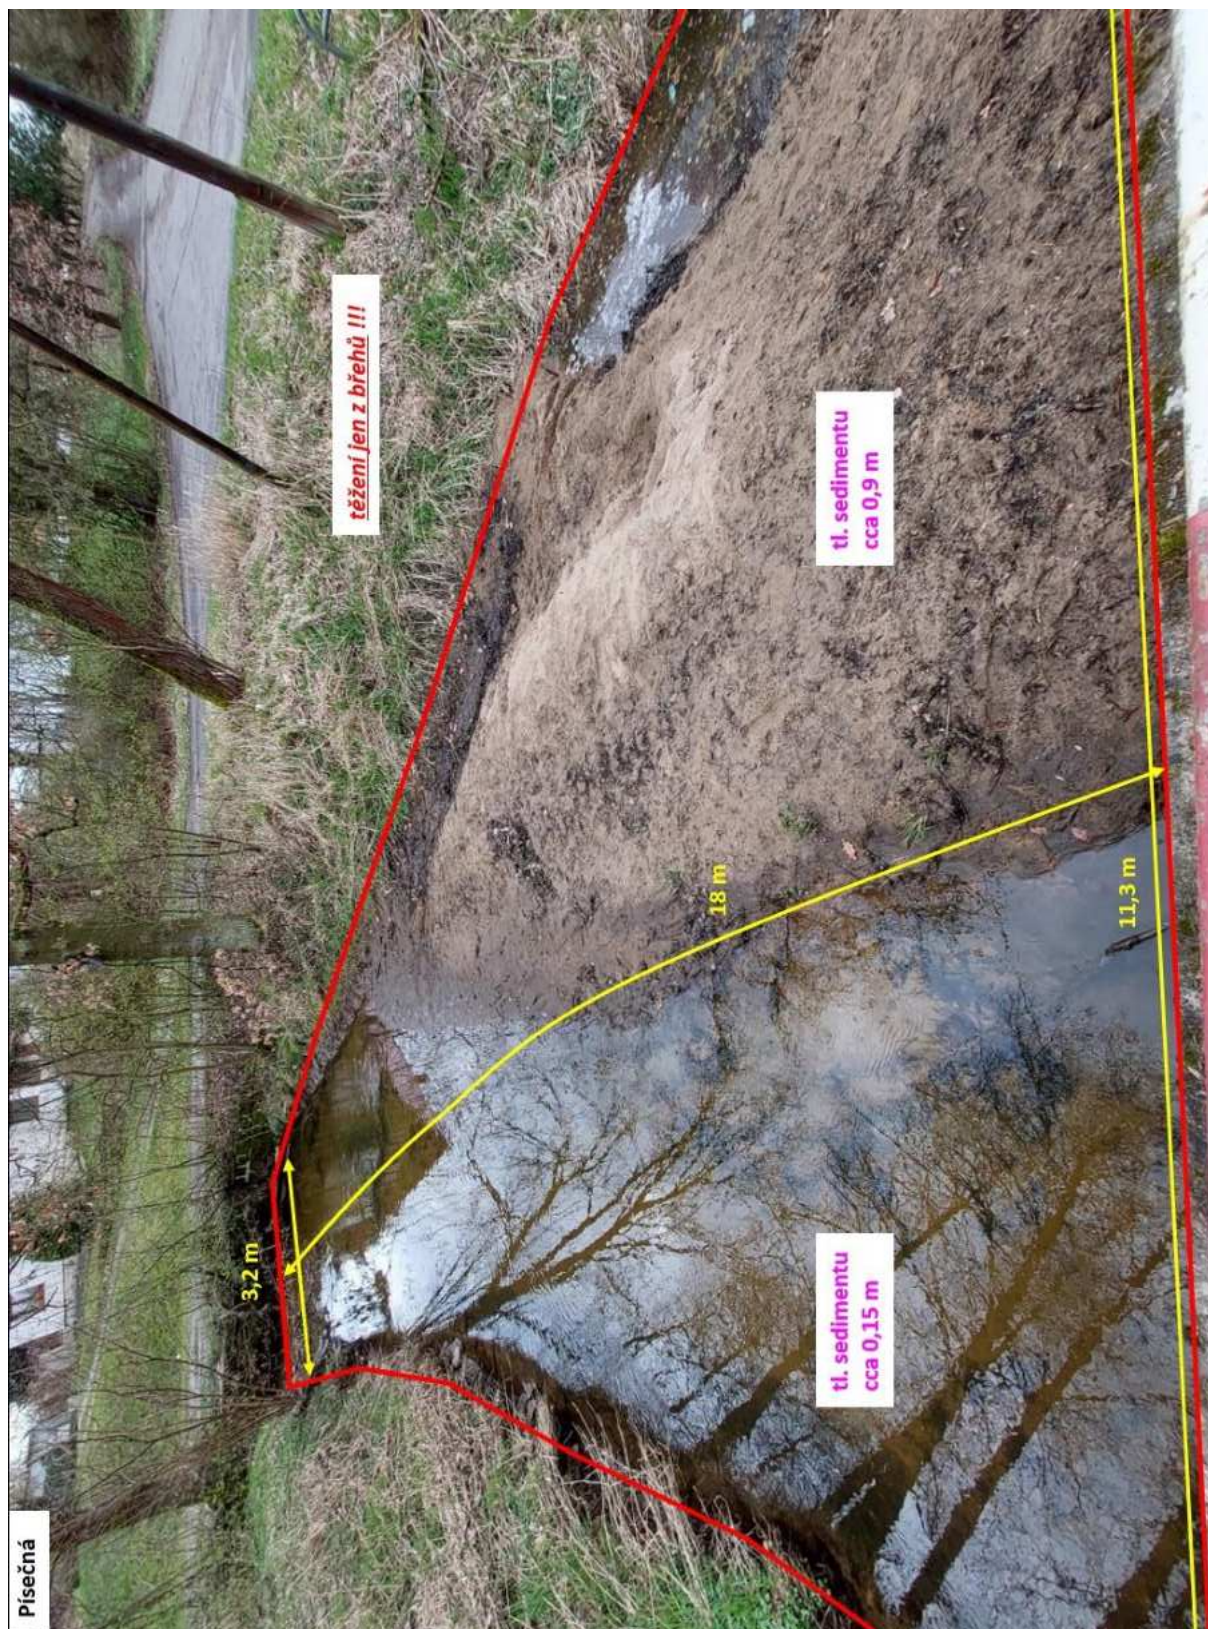

Vzorový výkres ochrany stromu:

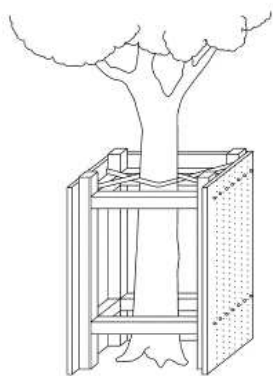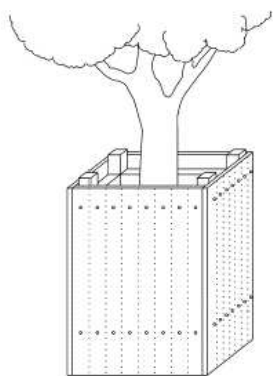


Fotodokumentace:

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420





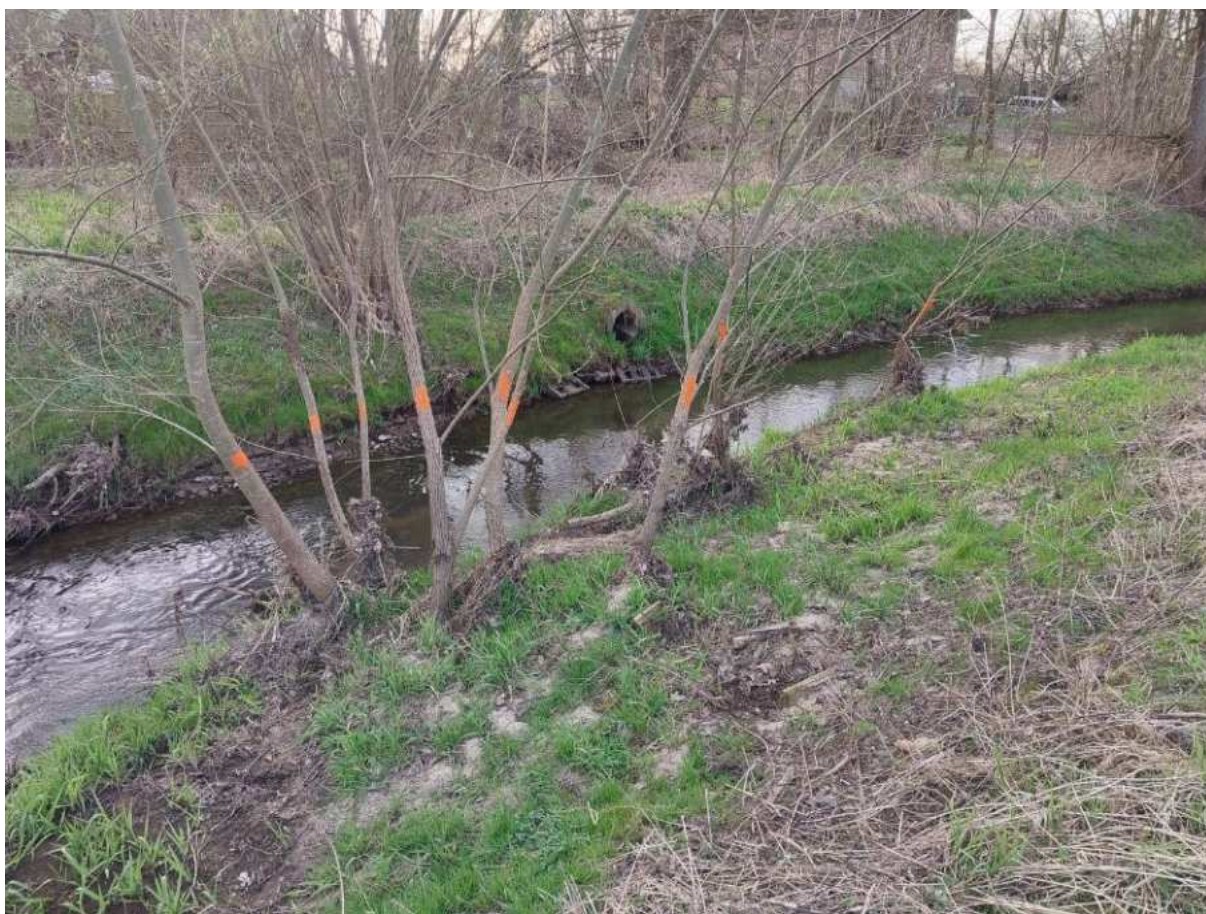

odstranění křovin a stromu

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200










ochrana 2 skupin stromů

Místo uložení sedimentů:

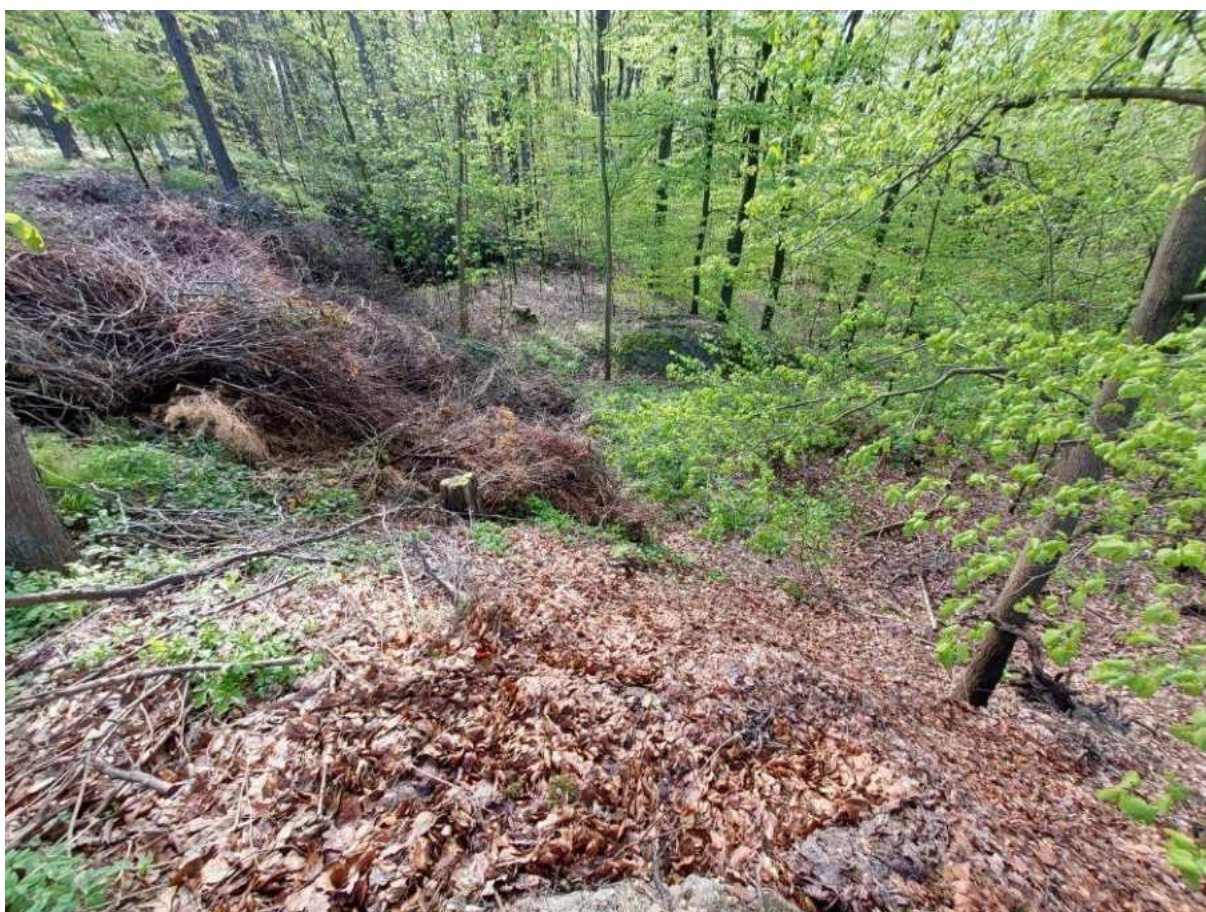

Nařízení Povodňového orgánu Města Česká Lípa:

poš

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:
Ze dne: 23.1.2024
Spisová značka: MUCL/6693/2024/OŽP/Piš
Č. j. dokumentu: MUCL/36683/2024
Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Počet stran dokumentu: 7
Počet listů příloh:
Datum: 12.3.2024

Zápis

z povodňové prohlídky která se konala dne 28.02.2024

Jedná se o preventivní prohlídku povodňového orgánu v době, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí povodně, tzv přípravná opatření dle ust. § 65 odst. 2 písm. d) vodního zákona.

Účel prohlídky:

povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky (§ 72 odst. 1 VZ).

Kontrolované vodní toky:

- Dobranovský potok (Dobranov u České Lípy, Písečná)
- Šporka (Dolní Libchava)
- Ploučnice (Česká Lípa, Žizníkov)

Přítomni:

město Česká Lípa - Brož Martin (I. místostarosta)
Mencl Jakub (II.místostarosta)

Povodí Ohře, s.p. - [REDAKCE]

Lesy ČR, s.p. - [REDAKCE] správa vodních toků oblast severní Čechy)
[REDAKCE] správa vodních toků oblast severní Čechy)

KSSLK - [REDAKCE] (KSS LK)

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
<http://www.mucl.cz>

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Dobranovský potok**Písečná:**

Na horním úseku Dobranovského potoka v Písečné je opakovaný problém, a to v úseku křížení komunikace s vodním tokem – pod mostní konstrukcí (most č. 2622-4) v Písečné. Most a komunikace je ve správě KSSLK a ve vlastnictví Libereckého kraje. Dobranovský potok je ve správě státního podniku Lesy ČR.

Koncem roku 2022 byl v tomto úseku Dobranovský potok pročištěn (před, pod, za mostem). Po povodni z prosince 2023 na Dobranovském potoce v lokalitě Písečná, je koryto před, pod a za mostem opět silně zaneseno.

Tento stav je nevyhovující a vykazuje povodňové riziko pro dané území, jelikož se snižuje kapacita koryta pod konstrukcí mostu. Nános je nezbytně nutné opět odstranit. Nutno podotknout že na tomto stavu se z velké části podepisuje mostní konstrukce, která nemalou měrou zapříčiňuje zanášení této části toku.

Na části Dobranovského potoka v Písečné byly dále zjištěny částečně zanesené propustky ve vlastnictví města Česká Lípa, ve správě technického odboru. Tento stav je též nevyhovující a je nutno zajistit plnou průtočnost.

Celkově bylo na povodňové prohlídce Dobranovského potoka v části Písečná zjištěno a konstatováno dlouhodobého zanedbání úseku Dobranovského potoka od „Bukovan k Dobranovu“. Jelikož tuto problematiku je nutno projednat koncepčně, bude městem Česká Lípa svolána samostatná schůzka se správci Dobranovského potoka, tj zástupci státního podniku Lesy ČR, kdy ze strany města Česká Lípa, jejímž tématem, bude pročištění zmiňovaného úseku.

Dobranov:

V k.ú. Dobranov je Dobranovský potok správcem udržován, pouze v místě u mostku mezi objekty č.p. 84 a č.p. 13, se vytvořily v korytě toku náplavy (lavice), které je nutno též odstranit, jelikož snižují průtočný profil toku

Nariadení povodňového orgánu:

Povodňový orgán Města Česká Lípa nařizuje:

- *správcí vodního toku Dobranovský potok v součinnosti s KSS LK, pročistit koryto Dobranovského potoka v Písečné v úseku před, pod a za mostem v Písečné a to do konce měsíce srpna 2024 (dle informace Krajského úřadu, OŽPaZ, je možné odstraňovat sediment nejdříve v červenci a to až na základě vydané výjimky ze zvlášť chráněných druhů živočichů),*
- *správcí vodního toku pročistit koryto vodního toku Dobranovský potok mezi objekty RD č.p. 84 a č.p. 135 v Dobranově, kde vznikly v korytě toku zarůstající lavice ze sedimentů,*
- *Městu Česká Lípa pročištění propustků v Písečné a dále částečnou úpravu konvexní části břehu před mostkem v Písečné tak, aby nezasahoval do průtočného profilu mostku, který je ve vlastnictví města Česká Lípa.*

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Č.j. MUCL/36683/2024

str. 3

2024 – pohled na Dobranovský potok v místě křížení s mostem KSS LK



ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Č.j. MUCL/36683/2024

str. 4



2024 mostky v Písečné ve vlastnictví města Česká Lípa



ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
<http://www.mucl.cz>

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Č.j. MUCL/36683/2024

str. 5



2024 Dobranovský potok v Dobranově u mostu mezi objekty RD č.p. 84 a č.p. 135



ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Č.j. MUCL/36683/2024

str. 6



Šporka:

Prohlídka zpevněné části úseku od mostu v D. Libchavě. Povodí Ohře s. p., v předchozích letech vyčistilo tok ve vydlážděném úseku, tj. v úseku stavby opevnění koryta toku. Za vydlážděným úsekem – za kamenným prahem bylo provedeno vyčištění koryta toku.

Požadavek plynoucí z povodňové prohlídky:

Město Česká Lípa žádá správce vodního toku o zajištění pravidelného sekání břehů dle plánu, jelikož se jedná o velmi turisticky využívanou lokalitu, podél vodního toku.

Ploučnice:

Vodní tok Ploučnice nevykazuje žádné úseky momentálně k řešení. V úseku mezi Žizníkovem a Českou Lípou byl zaznamenán výskyt bobra. Povodí Ohře s.p. stav monitoruje.

Požadavek plynoucí z povodňové prohlídky:

Nebyl vznesen.

Zapsala:

ID DS: bkfb3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Č.j. MUCL/36683/2024

str. 7

Obdrží:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa I
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
 sídl: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
 sídl: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
 sídl: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
 sídl: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec I (vlastník mostu č. 2622)

ID DS: bkfbc3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
[http: www.mucl.cz](http://www.mucl.cz)

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka I
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2024-6693.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 163627139-470602-240318105310. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1328651730 byla systémem přenesena dne 13.03.2024 06:47:40. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 18.03.2024. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 60 E1 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 13.03.2024 09:56:31, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 73 91, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1328651730	ID schránky příjemce: e8jcfan
ID schránky odesílatele: bktfbc3p	Datum a čas dodání: 13.03.2024 06:47:40

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 12.03.2024 15:28:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 18.03.2024 10:28:37. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 7E 75, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 259, Městský úřad Česká Lípa, Město Česká Lípa. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 12.03.2024 15:28:00. Údaje o časovém razítku: 12.03.2024 15:28:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 41, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Teplice 1

Datum vyhotovení: 18.03.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka [REDACTED]

Otisk úředního razítka [REDACTED]

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.

Rozbory sedimentu:



Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2462617	Datum vystavení	: 15.7.2024
Zákazník	: Lesy České republiky s.p.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: [REDACTED]	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Oblastní ředitelství severní Čechy Dr. Vrbenského 2874/1 415 01 Teplice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: [REDACTED]	E-mail	: [REDACTED]
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Dobranovský potok - sediment	Stránka	: 1 z 5
Číslo objednávky	: OBJ-00042-2024-956	Datum přijetí vzorků	: 29.5.2024
Místo odběru	: Dobranovský potok, IDVT 10234638, ČHP 1-14-03-0510, k.ú. Písečná u Dobranova, Dobranov	Číslo nabídky	: ----
Vzorkoval	: ALS Česká Lípa	Datum zkoušky	: 29.5.2024 - 9.7.2024
		Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku. Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Protokol o odběru vzorku č. 435/MKO/2024 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Pozice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Datum vystavení : 15.7.2024
 Stránka : 2 z 5
 Zakázka : PR2462617
 Zakazník : Lesy České republiky s.p.



Výsledky zkoušek

Vyhl. 273/2021 - odpad - zasypávání - výluh - ekotoxikologické testy - tab. 5.3 - I

Matrice: VÝLUH

Název vzorku				Sediment		Vyhl. 273/2021 - odpad - zasypávání - výluh - ekotoxikologické testy - tab. 5.3 - I			
Identifikace vzorku				PR2462617-001					
Datum odběru/čas odběru				29.5.2024 09:00					
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
ekotoxikologické parametry - Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus									
Inhibice D. s. (původní vzorek)	W-ALGF-VT	1.0	%	1.2	---	---	30	%	Vyhovuje
ekotoxikologické parametry - Daphnia magna									
Imobilizace (původní vzorek)	W-DAPH-VT	1	%	0	---	---	30	%	Vyhovuje
ekotoxikologické parametry - bakteriální bioluminiscenční test									
Inhibice (původní vzorek) - 15 min (pro ředění 500 mL/L)	W-BBTT-ND	1.0	%	9.4	---	---	25	%	Vyhovuje
Inhibice (původní vzorek) - 30 min (pro ředění 500 mL/L)	W-BBTT-ND	1.0	%	6.3	---	---	25	%	Vyhovuje

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.3 - odpad k zasypávání - ekotoxikologický test - skupina I

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku				Sediment		Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.3 - odpad k zasypávání - ekotoxikologický test - skupina I			
Identifikace vzorku				PR2462617-001					
Datum odběru/čas odběru				29.5.2024 09:00					
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	65.4	± 5.0%	---	---	---	---
Souhrnné parametry									
extrahovatelné organické halogeny (EOX)	S-EOX-COU	1.0	mg/kg suš.	<1.0	---	---	---	---	---
extrahovatelné kovy / hlavní kationty									
As	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	4.26	± 20.0%	---	---	---	---
Ba	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	56.0	± 20.0%	---	---	---	---
Be	S-METAXHB1	0.010	mg/kg suš.	0.662	± 20.0%	---	---	---	---
Cd	S-METAXHB1	0.40	mg/kg suš.	0.86	± 20.0%	---	---	---	---
Co	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	18.3	± 20.0%	---	---	---	---
Cr	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	8.62	± 20.0%	---	---	---	---
Cu	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	9.1	± 20.0%	---	---	---	---
Hg	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	<0.20	---	---	---	---	---
Ni	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	10.1	± 20.0%	---	---	---	---
Pb	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	28.6	± 20.0%	---	---	---	---
V	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	9.70	± 20.0%	---	---	---	---
Zn	S-METAXHB1	3.0	mg/kg suš.	57.8	± 20.0%	---	---	---	---
BTEX									
benzen	S-VOCGMS01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
ethylbenzen	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---	---	---
meta- & para-xylene	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---	---	---
orto-xylene	S-VOCGMS01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
suma BTEX	S-VOCGMS01	0.090	mg/kg suš.	<0.090	---	---	---	---	---
suma xyleneů	S-VOCGMS01	0.030	mg/kg suš.	<0.030	---	---	---	---	---
toluen	S-VOCGMS01	0.030	mg/kg suš.	<0.030	---	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.041	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthracen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.118	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	S-SMVGMS05	0.0050	mg/kg suš.	0.0925	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(b)fluoranthene	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.127	± 30.0%	---	---	---	---

Datum vystavení : 15.7.2024
 Stránka : 3 z 5
 Zakázka : PR2462617
 Zákazník : Lesy České republiky s.p.



Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.3 - odpad k zasypávání - ekotoxikologický test - skupina I

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku				Sediment		Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.3 - odpad k zasypávání - ekotoxikologický test - skupina I			
Identifikace vzorku				PR2462617-001					
Datum odběru/čas odběru				29.5.2024 09:00					
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
benzo(g,h,i)perylen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.049	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(k)fluoranthren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.048	± 30.0%	----	----	----	----
chrysen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.088	± 30.0%	----	----	----	----
fenanthren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.214	± 30.0%	----	----	----	----
fluoranthren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.307	± 30.0%	----	----	----	----
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.049	± 30.0%	----	----	----	----
naftalen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.039	± 30.0%	----	----	----	----
pyren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.238	± 30.0%	----	----	----	----
suma 12 PAU (odpad)	S-SMVGMS05	0.115	mg/kg suš.	1.41	----	----	----	----	----
PCB									
PCB 101	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 118	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 138	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 153	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 180	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 28	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
PCB 52	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	----	----	----	----	----
suma 7 PCB	S-SMVGMS05	0.140	mg/kg suš.	<0.140	----	----	----	----	----
ekotoxikologické parametry									
inhibice (Lactuca sativa)	S-LACT-ND	0.1	%	20.8	----	----	50	%	Vyhovuje
ropné uhlovodíky									
>C10 - C40 frakce	S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	30	± 30.0%	----	----	----	----

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.4 - sediment k zasypávání - sušina

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku				Sediment		Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.4 - sediment k zasypávání - sušina			
Identifikace vzorku				PR2462617-001					
Datum odběru/čas odběru				29.5.2024 09:00					
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	65.4	± 5.0%	----	----	----	----
Souhrnné parametry									
extrahovatelné organické halogeny (EOX)	S-EOX-COU	1.0	mg/kg suš.	<1.0	----	----	1	mg/kg suš.	Vyhovuje
extrahovatelné kovy / hlavní kationty									
As	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	4.26	± 20.0%	----	30	mg/kg suš.	Vyhovuje
Ba	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	56.0	± 20.0%	----	600	mg/kg suš.	Vyhovuje
Be	S-METAXHB1	0.010	mg/kg suš.	0.662	± 20.0%	----	5	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cd	S-METAXHB1	0.40	mg/kg suš.	0.86	± 20.0%	----	2.5	mg/kg suš.	Vyhovuje
Co	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	18.3	± 20.0%	----	30	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cr	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	8.62	± 20.0%	----	200	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cu	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	9.1	± 20.0%	----	100	mg/kg suš.	Vyhovuje
Hg	S-METAXHB1	0.20	mg/kg suš.	<0.20	----	----	0.8	mg/kg suš.	Vyhovuje
Ni	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	10.1	± 20.0%	----	80	mg/kg suš.	Vyhovuje
Pb	S-METAXHB1	1.0	mg/kg suš.	28.6	± 20.0%	----	100	mg/kg suš.	Vyhovuje
V	S-METAXHB1	1.00	mg/kg suš.	9.70	± 20.0%	----	180	mg/kg suš.	Vyhovuje
Zn	S-METAXHB1	3.0	mg/kg suš.	57.8	± 20.0%	----	600	mg/kg suš.	Vyhovuje

BTEX

Datum vystavení : 15.7.2024
 Stránka : 4 z 5
 Zakázka : PR2462617
 Zákazník : Lesy České republiky s.p.



Výsledek zkoušek

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.4 - sediment k zasypávání - sušina

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku

Sediment

Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění vyhl. č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.4 - sediment k zasypávání - sušina

Identifikace vzorku

PR2462617-001

Datum odběru/čas odběru

29.5.2024 09:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
benzen	S-VOCGMS01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
ethylbenzen	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---	---	---
meta- & para-xylén	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---	---	---
orto-xylén	S-VOCGMS01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
suma BTEX	S-VOCGMS01	0.090	mg/kg suš.	<0.090	---	---	0.4	mg/kg suš.	Vyhovuje
suma xylénů	S-VOCGMS01	0.030	mg/kg suš.	<0.030	---	---	---	---	---
toluen	S-VOCGMS01	0.030	mg/kg suš.	<0.030	---	---	---	---	---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.041	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)anthracen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.118	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(a)pyren	S-SMVGMS05	0.0050	mg/kg suš.	0.0925	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(b)fluoranthén	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.127	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(g,h,i)perylene	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.049	± 30.0%	---	---	---	---
benzo(k)fluoranthén	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.048	± 30.0%	---	---	---	---
chrysen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.088	± 30.0%	---	---	---	---
fenanthren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.214	± 30.0%	---	---	---	---
fluoranthén	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.307	± 30.0%	---	---	---	---
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.049	± 30.0%	---	---	---	---
naftalen	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.039	± 30.0%	---	---	---	---
pyren	S-SMVGMS05	0.010	mg/kg suš.	0.238	± 30.0%	---	---	---	---
suma 12 PAU (odpad)	S-SMVGMS05	0.115	mg/kg suš.	1.41	---	---	6	mg/kg suš.	Vyhovuje
PCB									
PCB 101	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 118	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 138	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 153	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 180	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 28	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
PCB 52	S-SMVGMS05	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---	---	---
suma 7 PCB	S-SMVGMS05	0.140	mg/kg suš.	<0.140	---	---	0.2	mg/kg suš.	Vyhovuje
ekotoxikologické parametry									
inhibice (Lactuca sativa)	S-LACT-ND	0.1	%	20.8	---	---	---	---	---
ropné uhlovodíky									
>C10 - C40 frakce	S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	30	± 30.0%	---	300	mg/kg suš.	Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lipa Česká Republika 470 01	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-EOX-COU	CZ_SOP_D06_07_025.B (DIN 38414-S17) Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX) coulometricky.
S-LACT-ND	CZ_SOP_D06_07_357 (ČSN ISO 11269-1) Stanovení inhibice růstu kořene salátu Lactuca sativa.
W-ALGF-VT	CZ_SOP_D06_07_352 (ČSN EN ISO 8692, STN 83 8303) Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas.
W-BBTT-ND	CZ_SOP_D06_07_354 (ČSN EN ISO 11348-2) Zkouška inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri (Luminiscenční bakteriální test).

right solutions. right partner.

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001

www.alsglobal.cz

Datum vystavení : 15.7.2024
 Stránka : 5 z 5
 Zakázka : PR2462617
 Zákazník : Lesy České republiky s.p.




Analytické metody	Popis metody
W-DAPH-VT	CZ_SOP_D06_07_351 (ČSN EN ISO 6341, STN 83 8303) Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna (zkouška akutní toxicity).
<i>Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00</i>	
S-METAXHB1	CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA Method 200.7, ČSN EN ISO 11885, US EPA Method 6010, SM 3120) - Stanovení prvků metodou ICP-OES a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován lučavkou královskou.
S-SMVGMS05	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN 17503; ISO 18287; ISO 18475; ČSN EN 17322) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
S-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039; ČSN EN ISO 16703; ČSN P CEN ISO/TS 16558-2; US EPA Method 8015; US EPA Method 3550) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10 – C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou plynové chromatografie s FID detekcí
S-VOCGMS01	CZ_SOP_D06_03_155 (US EPA Method 8260, US EPA Method 5021A, US EPA Method 5021, US EPA Method 8015, ČSN EN ISO 22155, ČSN EN ISO 15009, ČSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovení těkavých organických látek plynovou chromatografií s FID a MS detekcí a výpočet sum organických kontaminantů z naměřených hodnot
Přípravné metody	Popis metody
<i>Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa Česká Republika 470 01</i>	
*S-PPHOM0.3	CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).
*S-PPHOM10	ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.
*S-PPHOM4	CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).
S-PPL24TOX	CZ_SOP_D06_07_P04 (ČSN EN 12457-4) Příprava vodných výluhů ze zrnitých odpadů a kalů – jednostupňová vsádková zkouška pro ekotoxikologické testy.

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Výjimka ZCHD:



Lesy České republiky s.p.,
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1/1
470 36 Česká Lípa 1

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
KULK 73503/2024

Spisová značka
OŽPZ 1296/2024

Liberec
14.10.2024

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 a § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost právnické osoby **Lesy České republiky s.p.**, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 500 08, IČO: 42196451 (dále jen „žadatel“), o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), dle ustanovení § 56 zákona pro záměr: „**Dobranovský potok ř.km 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200**“, ve věci rozhodl takto:

I. Krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany přírody, podle ustanovení § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. b) zákona

povoluje žadateli výjimku

ze základních ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou chráněni dle práva Evropských společenství:

- v kategorii kriticky ohrožení dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) pro mihuli potoční (*Lampetra planeri*), raka říčního (*Astacus astacus*),
- v kategorii silně ohrožení dle přílohy č. III. vyhlášky pro klínatku rohatou (*Ophiogomphus cecilia*)

v kategorii ohrožený dle přílohy č. III vyhlášky pro vranku obecnou (*Cottus gobio*) uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazů je chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat, sbírat a přemísťovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla.

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-libc.cz

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Datová schránka c5kbvlw
www.kraj-libc.cz

IČO 70801508
DIČ CZ70801508

KULK 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km
1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

II. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona

povoluje žadateli výjimku

ze základních ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou chráněni zákonem:

- v kategorii ohrožení dle přílohy č. III vyhlášky pro stěvli potoční (*Phoxinus phoxinus*) a mníka jednovouseho (*Lota lota*),

uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazů je chytat, rušit, zraňovat, usmrcovat a sbírat a přemísťovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla.

Výjimky se povolují pro realizaci strojního odtěžení naplavenin zarostlých naplavených sedimentů nahromaděných v průtočném profilu a v podmostí Dobranovského potoka, včetně kácení dřevin v jeho v průtočném profilu. Konkrétně se budou těžit zarostlé naplaveniny v lokalitě č. 1 – Dobranov ř.km 1,330-1,420 u mostu z rámu Beneš, dotčené pozemky p.č. 629/65 v k.ú. Dobranov a v lokalitě č. 2 – Písečná ř.km 5,140 – 5,200, křížení komunikace a mostu ev. č. 2622-4 v k.ú. Písečná u Dobranova. Odtěžené sedimenty budou uloženy na určeném pozemku p.č. 576 v k.ú. Starý Šidlov.

Výjimky se udělují za následujících podmínek:

1. Práce v korytě řeky je možné provádět pouze v době mimo rozmnožování a mimo období vývoje raných stádií raka říčního, mihule potoční, vranky obecné, mníka jednovouseho a stěvle potoční **tj. mimo období říjen–listopad a květen–červenec běžného kalendářního roku.**
2. Koryto Dobranovského potoka bude využíváno pro jezdby strojů v minimálním rozsahu jen v pracovním úseku, odstranění naplavenin bude prováděno primárně ze břehů nebo ručně.
3. Maximálně 1 den před zahájením prací v korytě potoka na každém úseku stavby zajistí žadatel na své náklady **provedení odlovu** mihule potoční, vranky obecné, mníka jednovouseho, raka říčního v úseku, kde bude prováděna těžba sedimentů. Odlovení živočichové budou **bez prodloužení přemístění do toku min. 500 m nad nebo pod realizovaný úsek stavby.** Odlov smí provést odborně způsobilá osoba.
4. Je třeba se zaměřit na specifika odlovu mihulí v Dobranovském potoce, tzn. prolovit nejen vodní tok, ale i **sedimenty**. Z důvodu výskytu raka říčního, je třeba **prolovit i kořeny dřevin či spáry původního opevnění koryta Dobranovského potoka.**
5. **Záchranný prolov ryb, mihulí a raků nesmí být prováděn:** a) za zvýšených průtoků, které by znemožnily slovy ryb, b) při zvýšeném zákalu vody, c) při teplotě vody nižší než 0 °C.
6. **Lokalita č. 1 Dobranov:** Úsek od ř.km 1,330 + 22,5m, tj. ř.km 1,3525 od mostu z rámu Beneš (levý břeh) bude ponechán pás šíře min. 1,5 m od břehu bez zásahu. Prostor pod mostem bude vybrán.
7. **Lokalita č. 2 Písečná:** Nebude prohlubováno koryto toku, budou odstraněny zarostlé naplaveniny a naplaveniny v podmostí.

KULK 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km

1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

8. **Odtěžený sediment** a odstraňovaná vodní makrofytní vegetace z koryta nebudou okamžitě odváženy na definitivní místo, ale **minimálně tři dny** budou sediment i vegetace ponechány na vhodných místech v těsné blízkosti koryta toku, do 1 m od hrany koryta, ale nejlépe na bermách koryta toku.
9. **Pro obě lokality platí, že nebude zasahováno do rostlého dna vodního toku.** Budou odstraněny pouze zarostlé sedimenty.
10. Při provádění prací žadatel zajistí, aby **nedošlo k úniku ropných látek a provozních náplní** mechanismů do vody.
11. Veškeré změny oproti odsouhlasenému je nutné předem projednat s krajským úřadem.
12. Krajský úřad bude minimálně dva týdny předem písemně nebo e-mailem **informován o zahájení záměru** v souladu s § 56 odst. 6 zákona a **bude přizván na odtěžení sedimentů.**
13. Za každý kalendářní rok, kdy bude záměr realizován, předá žadatel do **31. 12. zprávu** o průběhu těch částí prací týkajících se zvláště chráněných druhů živočichů včetně výsledků prolovů ryb, mihulí a raků.
14. **Výjimka má platnost do 30.4.2026.** V případě, že dojde k realizaci popsaného zásahu dříve, končí platnost výjimky ukončením těchto prací.

Účastníkem správního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je:

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08, IČO: 42196451

Odůvodnění:

Řízení bylo zahájeno dnem 13.9.2024 podáním žádosti o výjimku dle § 56 odst. 1 zákona. Konkrétně bylo žádáno o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů živočichů: v kategorii kriticky ohrožené mihule potoční (*Lampetra planeri*), raay říčního (*Astacus astacus*), mnika jednovouseho (*Lota lota*), v kategorii silně ohrožený pro klínatku rohatou (*Ophiogomphus cecilia*) a v kategorii ohrožené pro vranku obecnou (*Cottus gobio*) a střevli potoční (*Phoxinus phoxinus*). Vydání výjimek bylo požadováno v souvislosti se záměrem žadatele „Dobranovský potok 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200“, který spočívá v odstranění sedimentů (naplavenin) z koryta toku a z mostního profilu a jejich uložení na určené místo, včetně kácení stromů, křovin a ochrany stromů před poškozením ve dvou lokalitách.

Lokalita č. 1 – Dobranov ř.km 1,330 – 1,420, dotčené pozemky p.č. 629/65 v k.ú. Dobranov, budou káceny vrby o ploše 21 m² rostoucích v průtočném profilu koryta. V úseku od ř.km 1,330 + 22,5m, tj. ř.km 1,3525 od mostu z rámů Beneš (levý břeh) bude ponechán pás šíře min. 1,5 m od břehu bez zásahu. Prostor pod mostem bude vybrán. Odtěžení zarostlých naplavenin bude provedeno pomocí krácejícího bagru (Menzi Muck) ze břehů a vyjimečně z koryta toku. Stroj se nebude pohybovat v celé délce koryta, ale pouze v prolovených pracovních úsecích. Ponechaný pás bez zásahu je významným biotopem klínatky rohaté.

KULK 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km

1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

Lokalita č. 2 – Písečná u Dobranova, ř.km 5,140 – 5,200 pod silničním mostem ev.č. 2622-4. Naplaveniny budou odstraněny strojově z pravého břehu toku, v podmostí ručně. Plocha naplavenin je určena na výtok 62,424 m³ a na vtoku do mostu 66,555 m³.

Výskyt výše uvedených zvláště chráněných druhů je krajskému úřadu znám z jeho dosavadní správní činnosti – řešení povolení výjimek podle ustanovení § 56 zákona pro čištění koryta Dobranovského potoka v minulých pěti letech či pro opravu mostu v Písečné.

Krajský úřad dopisem ze dne 13.9.2024 oznámil zahájení správního řízení o povolení výjimek známým účastníkům řízení a zároveň stanovil lhůtu, ve které se tito účastníci správního řízení mohou k věci vyjádřit. Během této lhůty krajský úřad neobdržel žádná vyjádření či podněty. Zároveň byla v souladu s § 70 zákona informována občanská sdružení a nevládní organizace. K řízení se žádná nevládní organizace ani občanská sdružení nepřihlásilo.

Krajský úřad nařídil dne 7.10.2024 ústní jednání, kde byl upřesněn rozsah prací pro odtěžení naplavenin pro lokalitu č. 1 v k.ú. Dobranov. Z tohoto jednání byl na místě sepsán Protokol, který je zaevidován u krajského úřadu. Dne 7.10.2024 bylo účastníkům řízení zasláno vyrozumění o doplnění spisu pod č.j. KULK 74512/2024. Ve stanoveném termínu se nikdo z účastníků nevyjádřil.

Odůvodnění výroku č. I)

Zvláště chráněné druhy uvedené ve výroku č. I tohoto rozhodnutí – mihule potoční, rak říční, klínatka rohatá a vranka obecná – jsou předmětem ochrany dle práva Evropských společenství. Pro škodlivé zasahování do jejich přirozeného vývoje, konkrétně pro jejich chytání, rušení, zraňování či usmrcování, poškozování jimi užívaných sídel a přemísťování jejich vývojových stádií je nutné povolení výjimek. Ustanovení § 56 zákona stanoví, že „*Výjimky ze zákazů u památných stromů, a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.*”

Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami, ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčítým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou. Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka.

Rak říční se přirozeně vyskytuje především v pomaleji tekoucích málo využívaných potocích a říčkách. Optimální podmínky jsou ve vodách s pevným písčítokamenitým dnem a jílovitými břehy a s přirozeným břehovým porostem, kde mezi kořeny nacházejí raci vhodné úkryty. Rak říční se rozmnožuje od října do listopadu, líhnutí malých ráčků nastává od května do července. Vedle znečištění vodních toků jsou dalším velmi závažným faktorem ohrožení pro raky vodohospodářské zásahy. Jedná se o regulační úpravy na tocích, které většinou znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta. S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování

KUL.K 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km
1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

koryta, při kterém dochází v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů. Velmi významným negativním vlivem působícím na naše původní druhy raků je onemocnění zvané račí mor, jehož původcem je plíseň *Aphanomyces astaci*.

Klinatka rohatá se vyvíjí v čistých nebo málo znečištěných potocích, říčkách a řekách s písčitým nebo štěrkovým dnem se slabou vrstvou detritu a přírodními nebo přírodě blízkými břehy. Vyskytuje se od nížin do podhůří. Vývoj larev je dvouletý až čtyřletý, zimují vajíčka nebo larvy. Larvy žijí na dně v pomaleji proudících úsecích, často se částečně zahrabávají. Tuto vážku ohrožuje především napřimování vodních toků, zpevňování břehů, stavba jezů a přehradních nádrží, těžba písků z říčních koryt. Nebezpečím pro tento druh může být dále nekontrolované a nadměrné vysazování některých rybích druhů, likvidace břehových porostů a znečišťování vody průmyslem a zemědělskou činností. Jako u většiny bezobratlých živočichů spočívá ochrana klinatky rohaté v důsledné ochraně jejího biotopu. Je třeba zachovat dostatečně dlouhé úseky přirozeně meandrujících řek a potoků s nezpevněnými břehy.

Vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, neboť je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. Živí se benthickými živočichy. Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě a je také ohrožená především ničením obývaného biotopu. Toky horních částí povodí s vhodným kamenitým substrátem byly totiž často nevhodně upravovány (v rámci meliorací či protipovodňových opatření). Ohrožovat predacním tlakem ji mohou také lososovité ryby, především pstruh obecný, vysazované v nadměrných počtech. Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s kontrolou čistoty vod a se zamezením necitlivých technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu.

Výjimky z ochranných podmínek lze povolit z těchto zákonem požadovaných důvodů:

- A) § 56 odst. 1 zákona – výjimku lze povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody: Žadatel ve své žádosti uvádí, že záměr je v souladu s protipovodňovými opatřeními. Při posuzování záměru krajský úřad zvažoval, zda naplňuje ustanovení zákona, tj. zda realizace záměru je veřejným zájmem převažujícím nad zájmy ochrany přírody, nebo je v zájmu ochrany přírody. Krajský úřad dospěl k závěru, že odstraněním zarostlých naplavenin, které zmenšují průtočný profil koryta vodního toku zejména v podmostí, a hrozí tak vyběžení do intravilánu obce, lze považovat za veřejný zájem umožňující zachování bezpečného průtočného profilu koryta řeky, a zabrání se tak závažným škodám na majetku. Zkapacitnění koryta toku v zástavbě na jeho původní parametry lze považovat za jiný veřejný zájem vedoucí k e zvýšení protipovodňové ochrany obce.

Záměr je krátkodobým zásahem do vodního toku v intravilánu. Vzhledem k tomu, že zájmy ochrany přírody budou kvůli rozsahu záměru a stanovení podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí dotčeny minimálně, je zřejmé, že odstraněním naplavenin je v tomto případě významně převažujícím veřejným zájmem. V tomto případě dochází k zásahu velice časově omezenému a zároveň do velice malého úseku toku, a tak uvedený zásah nebude významným negativním zásahem do biotopu výše uvedených druhů. Za dodržení stanovených podmínek se tak nezhorší současný stav biotopu a populace zvláště chráněných druhů.

- B) § 56 odst. 2 písm. c) zákona – výjimku ze zákazů lze povolit z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky pro životní prostředí: odůvodnění viz bod A.

KULK 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km
1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

- C) Neexistence jiného uspokojivého řešení: Odstranění naplavenin nelze bez zásahu do koryta vodního toku uskutečnit. Při dodržení podmínek rozhodnutí bude zásah v korytě vodního toku minimální.
- D) Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska jejich ochrany: Biotop výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů je rozsáhlejší, než je místo stavby. Povolovaná činnost pro svůj omezený rozsah a minimální dopad na biotopy i jedince zvláště chráněných druhů živočichů, pro které je povolována tato výjimka, při splnění podmínek stanovených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu těchto druhů z hlediska jejich ochrany.

Odůvodnění výroku č. II:

Střevle potoční – drobná ryba o délce obvykle 6 - 10 cm. Střevle žijí v hejnech v čistých potocích a horských tocích s písčitým nebo kamenitým dnem, často spolu se pstruhy. Živí se drobnějšími bezobratlými živočichy. Velice důležitý ukazatel kvality vod – bioindikátor. Je ohroženým druhem dle přílohy č. III vyhlášky. Pro škodlivé zasahování do jejího přirozeného vývoje, tj. pro jeho chytání, rušení, zraňování či usmrcování, poškozování jimi užívaných sídel a přemísťování jejich vývojových stádií je nutné povolení výjimky.

Mník jednovousý – žije při dně a v úkrytech, aktivita narůstá s večerem a při zakalené vodě. Tření probíhá od prosince do konce ledna v trdlištích s písčitým či jemně štěrkovitým dnem s pomalu proudící či stojatou vodou. Líhnutí jiker nastává po 80-100 dnech při teplotě 4-6 °C. Dorůstá délky 50-80 cm. Špatně snáší nevhodné úpravy a regulace řek a také znečištění vody. Je jediným sladkovodním zástupcem čeledi mníkovitých u nás.

Veřejným zájmem pro povolení výjimek bylo v daném případě odstranění naplavenin v uvedených lokalitách. Vzhledem k velikosti a charakteru záměru nelze očekávat významný vliv na stav střevle potoční a mníka jednovouseho. Další ochrana těchto druhů bude zajištěna prolovením pracovních úseků a minimálním pojezdem stroje v korytě vodního toku.

Dle § 56 odst. 1 lze výjimku pro střevli potoční a mníka jednovouseho povolit, když jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody – viz výše odůvodnění bodu A) výroku č. I tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad dále v rámci ustanovení § 56 odst. 6 zákona specifikuje tyto činnosti:

- I. Množství ovlivněných zvláště chráněných druhů není možné přesně stanovit. Předpokladem vydaného rozhodnutí je, že v dotčeném území je potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů: mihule potoční (*Lampetra planeri*), raka říčního (*Astacus astacus*), vranky obecné (*Cottus gobio*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), mníka jednovouseho (*Lota lota*) a klínatky rohaté (*Ophiogomphus cecilia*) dle Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP).
- II. Podmínky, časové a místní okolnosti, za nichž lze záměr realizovat, jsou stanoveny v podmínkách tohoto rozhodnutí (podrobněji níže v rámci odůvodnění podmínek rozhodnutí).
- III. Způsob kontrol, které krajský úřad bude provádět – krajský úřad bude kontrolovat dodržování podmínek rozhodnutí v rámci individuálních kontrol stavby. Vzhledem ke

KULK 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km
1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

skutečnosti, že vliv záměru na zvláště chráněný druh nebude nijak významný, jeví se krajskému úřadu takový způsob kontroly jako zcela dostačující.

Protože zásahy do koryta budou v omezené míře, strojně jak ze břehů, tak z koryta, byl uložen prolov ryb, mihulí a raků. Jedinci ryb, mihulí a raků by neměli být zásahem po provedených prolovech nijak negativně dotčeni.

Krajský úřad na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že výjimku z ochranných podmínek dle ustanovení § 50 zákona všech výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů lze pro záměr „*Dobranovský potok 1,330 – 1,420 a 5,140 – 5,200*“ **povolit** za podmínek, které jsou stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

K podmínkám rozhodnutí:

Podmínka č. 1 směřuje k zabránění rušení, usmrcování či zraňování zvláště chráněných druhů v době rozmnožování. Bude umožněno nerušené rozmnožování i následný vývoj nových jedinců.

Podmínky č. 2, 3, 4 a 5 směřují k minimalizaci negativního dopadu záměru na zvláště chráněné durhy a zničení jejich biotopu.

Podmínky č. 6, 7 a 8 byly stanoveny zejména k ochraně larválních stádií klínatky rohaté, kdy v úseku toku přírodě blízkém nebude zasahováno do rostlého dna, a ponechá se 1,5m pás od břehu. Zarostlé sedimenty na levém břehu toku, které se odtěží budou omezenou dobu ponechány na břehu, aby se mohly larvy klínatek dostat vlastními silami zpět do toku. Jiné opatření není možné, protože odlov larev ze sedimentů metodami používanými pro ryby, mihule a raky není realizovatelný. Uvedenými opatřeními, jak ponecháním zarostlého pásu bez zásahu, tak ponecháním zarostlých odtěžených sedimentů po dobu min. 3 dnů, se tak zajistí zachování místní populace v nezměněné kvalitě i kvantitě.

Podmínka č. 9 byla ustanovena z důvodu zachování biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, kteří jsou vázáni na jemný písčitý či štěrkovitý sediment dna toku.

Podmínka č. 10 čistota vod je jedním z hlavních podmínek výskytu výše uvedených zvláště chráněných druhů. Poškozením stávající čistoty vody by mohlo dojít k přímému negativnímu vlivu na tyto živočichy.

Podmínka č. 11 byla stanovena z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů, a to pro případ, že by došlo ke změně záměru během jeho realizace.

Podmínka č. 12 Byla stanovena z důvodu možnosti kontroly a informační povinnosti, která vyplývá ze zákona, a naplňují tak ustanovení § 56 odst. 6 zákona (analogie s ustanovením § 5b odst. 3 písm. d) zákona).

Podmínka č. 13 byla stanovena kvůli možnosti využití dat z odlovu pro účely ochrany přírody, a tudíž možnosti erudovaně rozhodovat v území na základě kvalitních a aktuálních dat.

Podmínkou č. 14 krajský úřad omezuje platnost výjimky do **30.4.2026**. Tento termín stanovil krajský úřad proto, že výrazně omezil období roku, kdy je možné práce v korytě toku provádět. Tento termín považuje krajský úřad za dostatečný pro realizaci záměru. Jsou v něm zahrnuty 2 sezóny, pokud by žadatel nestihl z klimatických nebo jiných důvodů realizovat záměr, plánovaný žadatelem v roce 2025.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

KUL.K 73503/2024

Rozhodnutí o výjimce Dobranovský potok ř.km
1,330-1,420 a 5,140 – 5,200

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat. Lhůta pro podání odvolání je dle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí. Podání odvolání je nutno učinit u Krajského úřadu Libereckého kraje. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Podle § 85 odst. 1 správního řádu, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek

RNDr. Jitka Šádková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa I

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ NA KOMUNIKACÍCH

DOBRANOVSKÝ 1,330-1,420 A 5,140-5,200

Zodpovědný projektant:

[REDACTED]

Hájkova 2410, Žatec 43801

IČO. 09602194

Č. AUTORIZACE. 0402492

Vypracoval:


[REDACTED]

Okres:

Česká Lípa

Katastrální území:

Dobranov, Písečná u Dobranova



Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

dopravně inženýrské opatření na komunikacích



vypracoval: XXXXXXXXXX
datum: 6.11.2024

Technická zpráva

1. Základní údaje

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

Dojde k omezení provozu na místní a účelové komunikaci města Česká Lípa pod dobu 10 dnů v Dobranově.

Důvodem je odstranění sedimentů z koryta toku na základě nařízení povodňového orgánu města. Dotčené komunikace kříží koryto toku a nachází se za mostem.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu při provádění prací je řešeno osazení přechodného dopravního značení a zvláštní užívání části komunikace dočasným záborem pozemku p.p.č. 363 v k. ú. Dobranov (Město Česká Lípa) v rozsahu 50 m².

Objízdná trasa není stanovena.

Předpoklad provedení prací je v období srpen až prosinec 2024.

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

Dojde k omezení provozu na komunikaci III/2622 a místní komunikaci Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o. pod dobu 10 dnů v Písečné.

Důvodem je odstranění sedimentů z koryta toku na základě nařízení povodňového orgánu města. Dotčené komunikace kříží koryto toku a nachází se podél koryta.

Z důvodu bezpečnosti silničního provozu při provádění prací je řešeno osazení přechodného dopravního značení a zvláštní užívání části komunikace dočasným záborem pozemku p.p.č. 81 a p.p.č. 278 v k. ú. Písečná u Dobranova (KSSLK, p. o.) v rozsahu 50 m² a 85 m².

Objízdná trasa není stanovena.

Předpoklad provedení prací je v období srpen až prosinec 2024.

2. Návrh dopravních opatření

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

Jedná se o krátkodobé omezení provozu na komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při realizaci prací.

Po dokončení prací bude proveden úklid komunikací a pozemky bude uvedeny do stavu, který odpovídá původnímu stavu.

Pracovní místo bude zajištěno a označeno dopravním značením.

Zhotovitel zajistí volný průjezd dopravní obsluhy a IZS po celou dobu provádění prací.

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

Jedná se o krátkodobé omezení provozu na komunikacích a omezení části jednoho jízdního pruhu z důvodu zajištění bezpečnosti provozu při realizaci prací.

Po dokončení prací bude proveden úklid komunikací a pozemky bude uvedeny do stavu, který odpovídá původnímu stavu.

Pracovní místo bude zajištěno a označeno dopravním značením.

Zhotovitel zajistí volný průjezd dopravní obsluhy a IZS po celou dobu provádění prací.

3. Návrh dopravního značení

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

Návrh dopravního značení koresponduje s návrhem dopravního opatření.

Řidiči budou na probíhající práce upozorněni formou dopravních značek. Max. rychlost bude omezena na 30 km/h.

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

Návrh dopravního značení koresponduje s návrhem dopravního opatření.

Řidiči budou na probíhající práci upozorněni formou dopravních značek. Max. rychlost bude omezena na 30 km/h.

Vlastní pracovní místo bude zabezpečeno mobilními zábranami pro označení uzavírky.

4. Výkaz dopravních značek

SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420

Svislé dopravní značky:

A15	práce na silnici	3 ks
B20a	nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h	3 ks
B20b	konec nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h	3 ks

SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200

Svislé dopravní značky:

A15	práce na silnici	4 ks
B20a	nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h	4 ks
B20b	konec nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h	2 ks
A6b	zúžená vozovka z jedné strany	2 ks
Z2	zábrana pro označení uzavírky	2 ks

5. Závěr


Bude použito dopravních značek základního rozměru, jejich barva a provedení bude respektovat normu ČSN EN 12899-1.

Osazení dopravních značek bude odpovídat platným „Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Případné jiné stávající dopravní značení, které bude v rozporu s tímto návrhem, bude zakryto.

Na místě bude při provádění prací vždy přítomna náležitě poučená osoba.

přehledná situace

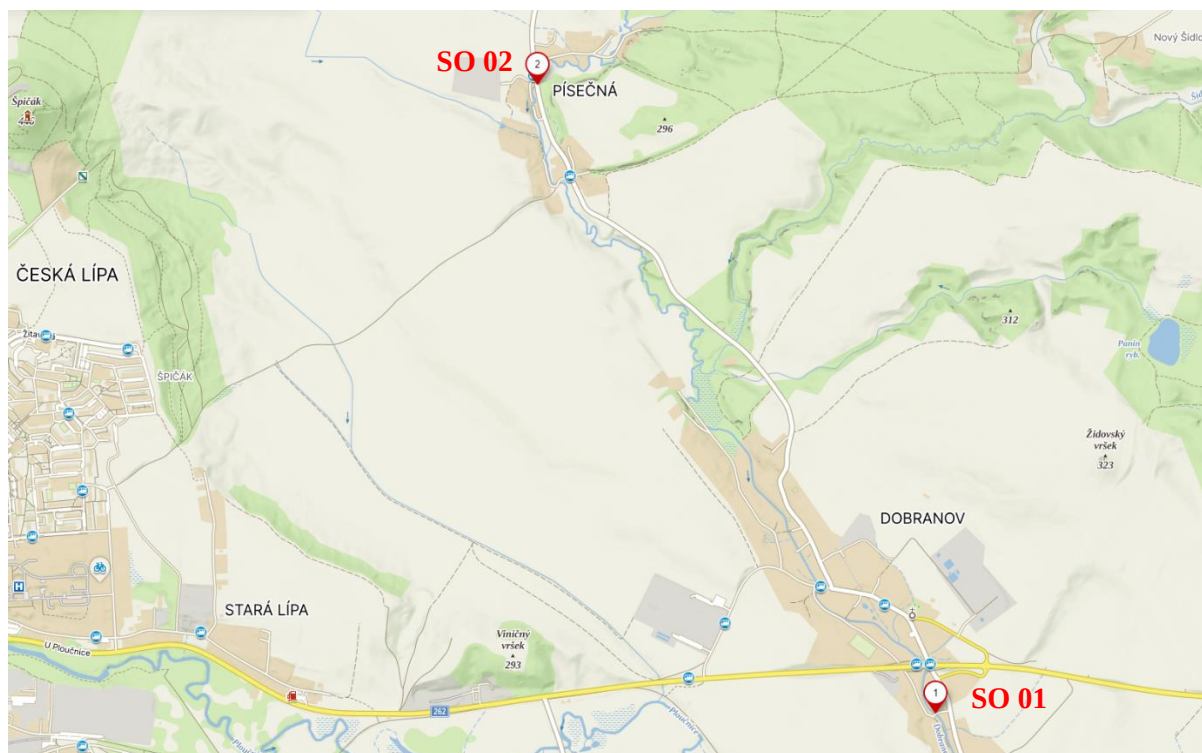

situace DIO: SO 01 Dobranov ř. km 1,330-1,420



situace DIO: SO 02 Písečná ř. km 5,140-5,200



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/28
Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200



KSO:
Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:
Datum: 14.01.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			257 938,62
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	257 938,62	54 167,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			312 105,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2024/28		
Stavba:	Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200		
Místo:	Dobranov, Písečná u Dobranova	Datum:	14.01.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	██████████ý
Uchazeč:	HBAPS, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		257 938,62	312 105,82
SO 02	Písečná ř. km 5,140-5,200	71 321,12	86 298,62
SO 01	Dobranov ř. km 1,330-1,420	135 717,50	164 218,20
SO 03	VON	50 900,00	61 589,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Objekt:

SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420

KSO:

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum: 14.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 717,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 717,50	21,00%	28 500,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 218,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200
Objekt: **SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420**
Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 14.01.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		135 717,50
HSV - Práce a dodávky HSV		135 717,50
1 - Zemní práce		132 511,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 180,00
998 - Přesun hmot		26,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200
Objekt: SO 01 - Dobranov ř. km 1,330-1,420

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 14.01.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 135 717,50

D HSV Práce a dodávky HSV 135 717,50

D 1 Zemní práce 132 511,10

1	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818231 P Poznámka k položce: bříza	kus	1,000	690,00	690,00
2	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818235 P Poznámka k položce: vrba	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
3	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 1100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818239 P Poznámka k položce: vrba jako křovina	kus	1,000	1 790,00	1 790,00
4	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201 P Poznámka k položce: vrba sp. VV 7*3	m2	21,000	20,00	420,00
5	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501 P Poznámka k položce: Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.	m2	21,000	45,00	945,00
6	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301981 P Poznámka k položce: Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.	m2	63,000	19,00	1 197,00
7	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101 P Poznámka k položce: vrba sp.	kus	1,000	290,00	290,00
8	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411 P Poznámka k položce: Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.	kus	1,000	360,00	360,00
9	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	7,000	20,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951				
	P		<i>Poznámka k položce: Dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena společně se sedimentem na určené místo.</i>				
10	K	127751111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	212,895	280,00	59 610,60
	PP		Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127751111				
	VV		"vtok do mostu - koryto jako plocha lichoběžníku*průměrná tloušťka sedimentu" ((4,5+3)/2)*20*0,3		22,500		
	VV		"vtok do mostu - koryto jako plocha lichoběžníku*průměrná tloušťka sedimentu" ((5+2,3)/2)*47*0,9		154,395		
	VV		"výtok z mostu - koryto jako plocha lichoběžníku*průměrná tloušťka sedimentu" (22,5*4)/2*0,8		36,000		
11	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,895	40,00	8 755,80
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121				
	P		<i>Složení vytěženého materiálu na břehovou hranu koryta (max. 1 m od koryta) pod dobu min. 3 dnů dle výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.</i>				
	VV		212,895+6		218,895		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	218,895	48,00	10 506,96
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
13	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,895	180,00	39 401,10
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115				
	P		<i>Poznámka k položce: Odtěžený sediment bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Šidlov (lesní pozemek LČR, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 8 km. Zde bude účelně využít k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu.</i>				
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	218,895	32,00	7 004,64
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
	P		<i>Poznámka k položce: Po uložení veškerého sedimentu dojde ke strojní úpravě povrchu terénu a případnému dočištění lesní linky.</i>				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 180,00
15	K	952904111	Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	6,000	530,00	3 180,00
	PP		Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů strojně				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952904111				
	D	998	Přesun hmot				26,40
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,120	220,00	26,40
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200

KSO:

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum: 14.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 321,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 321,12	21,00%	14 977,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 298,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Objekt:

SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Datum:

14.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 321,12

HSV - Práce a dodávky HSV

71 321,12

1 - Zemní práce

71 315,40

998 - Přesun hmot

5,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200
Objekt: SO 02 - Písečná ř. km 5,140-5,200

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 14.01.2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 71 321,12

D HSV Práce a dodávky HSV 71 321,12

D 1 Zemní práce 71 315,40

1	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	690,00	1 380,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818231				
P			Poznámka k položce: 2 skupiny dubu				
2	K	127751111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně	m3	129,510	280,00	36 262,80

PP			Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/127751111				
VV			"vtok do mostu - koryto jako plocha lichoběžníku*průměrná tloušťka sedimentu" ((11,3+3,2)/2)*18*0,5	65,250			
VV			"výtok z mostu - koryto jako plocha lichoběžníku*průměrná tloušťka sedimentu" ((11,3+2,3)/2)*18*0,525	64,260			

3	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,510	40,00	5 180,40
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121				
P			Poznámka k položce: Složení vytěženého materiálu na břehovou hranu koryta (max. 1 m od koryta) pod dobu min. 3 dnů dle výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.				

4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	129,510	48,00	6 216,48
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				

5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	129,510	140,00	18 131,40
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112				
P			Poznámka k položce: Vytěžený materiál bude odvezen k uložení na pozemek p.p.č. 576 v k. ú. Starý Šídlov (lesní pozemek LČR, s. p.) do místa bývalého pískovcového lomu, vzdálenost 8 km. Zde bude účelně využit k zasypání terénních nerovností a modelaci terénu.				

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	129,510	32,00	4 144,32
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
P			Poznámka k položce: Po uložení veškerého materiálu dojde ke strojní úpravě povrchu terénu a případnému docíštění lesní linky.				

D 998 Přesun hmot 5,72

7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	0,026	220,00	5,72
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Objekt:

SO 03 - VON

KSO:

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova

CC-CZ:

Datum: 14.01.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

IČ:

27266036

DIČ:

CZ27266036

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 900,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 900,00	21,00%	10 689,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 589,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200

Objekt:

SO 03 - VON

Místo:

Dobranov, Písečná u Dobranova

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Datum:

14.01.2024

Projektant:



Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 900,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dobranovský 1,330-1,420 a 5,140-5,200
Objekt: SO 03 - VON

Místo: Dobranov, Písečná u Dobranova
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Datum: 14.01.2024
Projektant: [REDACTED]ý
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 900,00

1	K	R02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení vč. zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Vytýčení inženýrských sítí a zařízení vč. zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí				
	P		Poznámka k položce: Dobranov - vodovod DN 500 SČVK. Vytýčovací protokol bude ihned předán objednateli.				
2	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících vč. průběhu prací	soubor	1,000	500,00	500,00
	PP		Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících vč. průběhu prací				
	P		Poznámka k položce: Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě.				
3	K	R10	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00
	PP		Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyhláška) a dopravního značení v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.				
	P		Poznámka k položce: Komunikace města Česká Lípa a Krajské správa silnic Libereckého kraje, p. o. Dopravní značení v rozsahu návrhu DIO po celou dobu stavby. Položka vč. všech souvisejících činností.				
4	K	R11	Uzavření smlouvy se správce komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Uzavření smlouvy se správce komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.				
	P		Poznámka k položce: Pozemky města Česká Lípa a Krajské správa silnic Libereckého kraje, p. o. Nájem za dočasné užití pozemků a komunikací po dobu prací. Položka vč. všech souvisejících činností.				
5	K	R12	Zajištění slovení rybí a živočišné obsádky odborně způsobilou osobou včetně pořízení protokolu o slovení.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Zajištění slovení rybí a živočišné obsádky odborně způsobilou osobou včetně pořízení protokolu o slovení.				
	P		Poznámka k položce: Maximálně 1 den před zahájením prací v korytě potoka na každém úseku stavby zajistí zhotovitel provedení odlovu mihule potoční, vranky obecné, mnika jednovousého, raka říčního, střevle potoční v úseku, kde bude prováděna těžba sedimentů. Odlov smí provést odborně způsobilá osoba. Doklad o odborné způsobilosti osoby vybrané zhotovitelem bude předložen objednateli ještě před zahájením jakýchkoliv prací v korytě toku. Specifika odlovu mihulí - prolovit nejen vodní tok, ale i sedimenty. Specifika odlovu raka říčního - je třeba prolovit i kořeny dřevin či spáry opevnění koryta. Záchranný prolov ryb, mihulí a raků nesmí být prováděn: a) za zvýšených průtoků, které by znemožnily slovení ryb, b) při zvýšeném zákalu vody, c) při teplotě vody nižší než 0 stupňů. Doklad o druhovém a početním složení slovených živočichů bude bezodkladně předán objednateli.				
6	K	R13	Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody - záchranný přenos odborně způsobilou osobou.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody - záchranný přenos odborně způsobilou osobou.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Odlovení živočichové dle výjimky budou bez prodlení přemístěni do toku min. 500 m nad nebo pod realizovaný úsek stavby.</i>				
7	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.				
8	K	R18	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníky.				
