



Smlouva o dílo

č. objednatele 0063/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: ... č. účtu: ...

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

... ; tel.: ...; e-mail: ...

... ; tel.: ...; e-mail: ...

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.

Adresa: Masarykovo nám. 66, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupen: Ing. David Musil

IČO: 05323797

DIČ: CZ05323797

Zapsán: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 126403

ID datové schránky: y3qzzqh

Kontaktní údaje: ...

Bankovní spojení: ...

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

..., mobil ..., e-mail: ...

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.
- 1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná.

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
- 2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Bývalé házenkářské hřiště - pumptrack Kopřivnice“ se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle Vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 10/2024.
- 2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace, textová část zadávací dokumentace, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v *odst. 2.4* této smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: BÝVALÉ HÁZENKÁŘSKÉ HŘIŠTĚ – PUMPTRACK KOPŘIVNICE.
- 3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Bc. Monikou Vostárkovou a Ing. Václavem Vrzgoulou v červnu 2024. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když byla Přílohou č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.
- 3.3 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace

s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo víceprací).

- 3.4 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti zadání, a to na základě dohody obou smluvních stran. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentaci zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
- 3.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

- 4.1 Termín zahájení realizace díla: ode dne předání staveniště.
- 4.2 Dokončení a předání kompletního díla: do 60 dnů ode dne předání staveniště.
- 4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 3 po sobě jdoucí dny, termín dokončení a předání kompletního díla se automaticky posunuje o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly.
- 4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení a předání kompletního díla automaticky posunuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele technický dozor na stavbě, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušování nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v *odst. 4.2* této smlouvy.
- 4.6 Místem plnění je lokalita bývalého házenkářského hřiště mezi ulicemi Kadláčkova a Československé armády v Kopřivnici, pozemek parc. č. 1318/1 k. ú. i obec Kopřivnice.

5. Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč včetně DPH
Celkem	3.973.715,93	834.480,35	4.808.196,28

- 5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- 5.3 Cena za dílo sjednaná dle *odst. 5.1* této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- 5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit, pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku ponížené o 10 % (tj. $0,9 \times \text{ÚRS}$).
- 5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky ceny díla

- 6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání objednateli.
- 6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli. Faktura bude vytvořena ve formátu ISDOC a zaslána elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli.
- 6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatel a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura neúplná či v jiném formátu než ISDOC, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
- 6.5 Objednatel nebude poskytovány zálohy.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), zhotoviteli po podpisu této smlouvy, objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště minimálně 5 dní před dnem předání a převzetí. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.
- 7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatel a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správcí.
- 7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
- 7.6 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
- 7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.10 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.
- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v *odst. 3.2* této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

- 8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 8.7 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatелеm.
- 8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště.
- 8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti autorského dozoru projektanta (případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě, je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající autorský dozor, a to bezodkladně.
- 8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.14 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 8.15 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol vykonávaných objednatелеm budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou svolávány objednatелеm, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.16 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

- 8.17 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.18 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v *odst. 1.1* této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad.
- 8.19 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů.
- 8.20 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.21 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 8.22 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny od 7:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, např. zápisem ve stavebním deníku.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.
- 9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamená do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a zpracovatele projektové dokumentace (případně i koordinátora BOZP). Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.
- 9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a zpracovatel projektové dokumentace (případně i koordinátor BOZP), nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě.
- 9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.
- 9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.8 Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
- 9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 9.11 Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Harmonogram provádění díla

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

11. Převzetí díla

- 11.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
- 11.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem objednatel písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla.
- 11.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělků je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 10 pracovních dnů od předání díla, nesjedná-li smluvní strany lhůtu jinou.
- 11.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělků byly zhotovitelem odstraněny.

- 11.5 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v *odst. 11.2 až 11.5* této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 11.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) cenu za dílo ve znění všech dodatků,
 - e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle,
 - f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam předané dokumentace.
- 11.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami jsou:
- a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací zhotovitelem a autorským dozorem a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), včetně geodetického zaměření;
 - b) originál stavebního deníku,
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - d) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, návody pro montáž, obsluhu a údržbu apod.,
 - e) doklady o likvidaci odpadů.
- 11.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v *odst. 11.7* této smlouvy a přílohy uvedené v *odst. 11.8* této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání díla.

12. Záruka za dílo

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám,

standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
- 12.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 12.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v *odst. 1.2* této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.
- 12.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.
- 12.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady.
- 12.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48 hodin od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy.
- 12.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v *odst. 12.8* této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
- 12.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

13. Odpovědnost za škodu

- 13.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,

technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 13.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
- 13.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.5 Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, došlo-li k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 13.6 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- 13.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

14. Poddodavatelé

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.
- 14.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně schopné a zdatné dané plnění poskytnout.
- 14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jejichž podíl na provádění díla přesáhne 5 % celkové ceny díla, a to předtím, než daný poddodavatel započne s poskytováním plnění. Dojde-li ke změně těchto poddodavatelů, je zhotovitel povinen o tomto objednateli informovat písemně bez zbytečného odkladu.

15. Smluvní pokuty

- 15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 4.2* této smlouvy (příp. prodloužené dle *čl. 4.* této smlouvy).
- 15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 7.9* této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla dle *odst. 11.3* této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v *odst. 12.8* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 15.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.6 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

16. Ukončení smlouvy

- 16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
- 16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
- a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle *odst. 4.2* této smlouvy o více než 30 dní,
 - b) nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 30 dnů ode dne předání staveniště,
 - c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
 - e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.
- 16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
- 16.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní

záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

- 16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

17. Závěrečná ujednání

- 17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 17.3 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 48. schůzi dne 14.01.2025 usnesením č. 1710.
- 17.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 17.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 17.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 17.8 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 17.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- a) č. 1 - položkový rozpočet stavby;
 - b) č. 2 - časový harmonogram postupu provedení díla.

V Kopřivnici dne 11.02.2025

V Bystřici pod Hostýnem 10.02.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta města

Ing. David Musil
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-213
Stavba: Pumptrack Kopřivnice

KSO:
Místo: 1318/1

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:
Město Kopřivnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Bc. Monika Vostárková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 973 715,93
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 973 715,93	834 480,35
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 808 196,28

Ing. David T. Datum: 12/18/
Musil 2023:27:58 PM

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-213		
Stavba:	Pumptrack Kopřivnice		
Místo:	1318/1	Datum:	30. 10. 2024
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	Bc. Monika Vostárková
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 973 715,93	4 808 196,28	
01	Stavební práce	3 973 715,93	4 808 196,28	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pumptrack Kopřivnice
Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: 1318/1
Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 10. 2024
Projektant: Bc. Monika Vostárková
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 973 715,93
HSV - HSV	3 852 215,93
1 - Zemní práce	1 298 217,89
2 - Zakládání	69 508,54
5 - Komunikace pozemní	2 207 375,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 024,06
8 - Trubní vedení	63 079,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 642,00
998 - Přesun hmot	36 368,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	121 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	61 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pumptrack Kopřivnice
Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: 1318/1 Datum: 30. 10. 2024
Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant: Bc. Monika Vostárková
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 973 715,93	
D HSV HSV							3 852 215,93	
D 1 Zemní práce							1 298 217,89	
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 239,000	5,20	6 442,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
VV			54*23-13*15-6*8+16*15		1 239,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	247,800	120,00	29 736,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			přesun ornice na meziskládku		123,900			
VV			1239*0,1					
VV			přesun ornice pro zpětné použití		123,900			
VV			1239*0,1					
VV			Součet		247,800			
3	K	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,144	3 200,00	460,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213711					
VV			pro základy mobiliář		0,144			
VV			0,3*0,3*0,8*2					
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	71,764	150,00	10 764,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100					
VV			vsaky					
VV			venkovní - 1,5m hl.					
VV			1,0*2,5*1,5*2		7,500			
VV			1,5*3,0*1,5*6		40,500			
VV			vnitřní -1m hl.					
VV			4,0*1,2*1,0		4,800			
VV			4,0*2,3*0,5*1,0		4,600			
VV			pi*1,2*1,2*1,0		4,524			
VV			3,8*1,7*1,0		6,460			
VV			2,6*1,3*1,0		3,380			
VV			Součet		71,764			
5	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,495	150,00	2 924,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101					
VV			rýhy pro odvodnění		19,495			
VV			0,5*0,7*(5,5*2+5,5+5,0+7,5+5,2+5,5+16)					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	754,288	19,00	14 331,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
VV			pořízení materiálu					
VV			uložení zeminy pro modelaci terénu po dovozu materiálu		754,288			
VV			754,288					
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1 193,193	390,00	465 345,27	CS ÚRS 2024 02
VV			dovoz a pořízení zeminy		1 193,193			
VV			(754,288-0,144-71,764-19,495)*1,8					
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	52,950	120,00	6 354,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102					
P			Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odkop - srovnání podloží bez přebytkového výkopku - převrstvení (1239-180)*0,05		52,950			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	845,691	25,00	21 142,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
		W	přemístění z výkopku na meziskládku		91,403			
		W	0,144+71,764+19,495					
		W	přemístění v rámci stavby		754,288			
		W	Součet		845,691			
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	754,288	9,00	6 788,59	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		W	nakládání pro přesuny v rámci stavby		754,288			
		W	754,288					
11	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	754,288	21,00	15 840,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
		W	násyp do tvaru dráhy					
		W	malý okruh					
		W	(0,65+3,65)*0,5*0,6*(7,0+11,0)		23,220			
		W	(0,65+3,0)*0,5*(0,6+0,0)*0,5*3,0		1,643			
		W	(0,65+2,5)*0,5*0,6*6,0		5,670			
		W	1,0*0,6*0,5*5,0		1,500			
		W	(0,65+1,8)*0,5*0,6*0,8*9,0		5,292			
		W	Mezisoučet		37,325			
		W	velký okruh					
		W	2,0*0,6*5,0		6,000			
		W	(3,1+5,7)*0,5*1,1*0,5*3,0		7,260			
		W	(3,1+5,7)*0,5*1,1*0,5*5,5		13,310			
		W	(0,4+3,8)*0,5*1,1*0,5*6		6,930			
		W	(0,8+6,15)*0,5*1,1*17		64,983			
		W	(0,6+1,1)*0,5*7		5,950			
		W	(1,5+6,15)*0,5*1,1*2,5		10,519			
		W	(1,5+6,15)*0,5*1,1*4,5		18,934			
		W	(1,4+5,3)*0,5*1,1*0,3*7		7,739			
		W	(1,5+6,15)*0,5*1,1*0,5*2,5		5,259			
		W	(1,85+4,6)*0,5*1,1*0,5*6		10,643			
		W	(0,8+5,0)*0,5*1,1*18		57,420			
		W	(1,2+5,1)*0,5*1,1*25		86,625			
		W	1,8*6,0*1,1*0,3		3,564			
		W	3,3*1,1*0,5*28		50,820			
		W	4,0*1,1*0,5*8		17,600			
		W	1,54*1,1*9		15,246			
		W	Mezisoučet		388,802			
		W	street park					
		W	(1,4+4,5)*0,5*1,2*24,5		86,730			
		W	3,4*3,0*1,2*0,5		6,120			
		W	3,7*3,5*0,2		2,590			
		W	4,0*3,5*1,2*0,5		8,400			
		W	1,7*1,2*0,5*6,0		6,120			
		W	5,3*8,5*0,2		9,010			
		W	Mezisoučet		118,970			
		W	plocha					
		W	1059*0,15		158,850			
		W	Mezisoučet		158,850			
		W	odečet kameniva a asfaltu					
		W	-753,735*0,1		-75,374			
		W	doplnění na hutnění					
		W	koeficient na hutnění - dopočet zeminy					
		W	628,573*0,2		125,715			
		W	Součet		754,288			
12	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	357,650	215,00	76 894,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101					
		W	hutnění násypu					
		W	malý okruh					
		W	zelený svah					
		W	1,75*(12+2,0*2+5,0+5,0+5,0)+1,2*(3,5+4,0)		63,250			
		W	(2,2*1,0+3,0*5,0*0,5)*0		0,000			
		W	Mezisoučet		63,250			
		W	velký okruh					
		W	zelený svah					
		W	2,0*(22+6,5+3,5*2+2,3+1,2+5,5+11+8,5+11+5,0+7,5+4,5+8,0)+3,25*9		229,250			
		W	(8,5*3,9+6,0*3,1+3,1*1,8+6,1*5,7*0,5+7,8*6,0*0,5)*0		0,000			
		W	Mezisoučet		229,250			
		W	street park					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV zelený svah					
			W 31*2,0+2,1*1,5		65,150			
			W Mezisoučet		65,150			
			W Součet		357,650			
13	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	729,546	185,00	134 966,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151101					
		W	hutnění násypu					
		W	malý okruh					
		W	0,65*40+1,8*39		96,200			
		W	1,0*5,0*1,2		6,000			
		W	Mezisoučet		102,200			
		W	velký okruh					
		W	2,0*4,8+1,8*1,85*2+2,5*4,0		26,260			
		W	3,1*3,0*1,1+0,4*3,1*2+3,1*2,8*2*1,1		31,806			
		W	6*0,6+6,0*2,2*1,1		18,120			
		W	0,7*16+2,2*16+3,5*3,5*1,1		59,875			
		W	1,5*5,0+2,2*5,0		18,500			
		W	2,2*4,5+2,1*4,5*1,1		20,295			
		W	2,0*5,0+2,0*5,0*1,1		21,000			
		W	1,85*6+2,2*6,0		24,300			
		W	0,8*16+2,2*16		48,000			
		W	1,5*5,5*1,1+1,1*20+1,0*3,5*1,1*2		38,775			
		W	3,0*27+1,5*4,0+1,5*5,4		95,100			
		W	(2,5+1,0)*0,5*2,3*2+8,0*1,7+0,8*4,6*0,5		23,490			
		W	2,3*3,0*1,1+3,5*4,7		24,040			
		W	street park					
		W	1,2*22+2,5*22		81,400			
		W	0,8*6,5*1,1+3,0*7,0*1,1		28,820			
		W	1,5*1,5*1,1+3,0*2,8*1,1		11,715			
		W	6,0*1,8		10,800			
		W	5,3*8,5		45,050			
		W	Mezisoučet		627,346			
		W	Součet		729,546			
14	K	116951101	Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou	m3	754,288	12,00	9 051,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/116951101					
		W	754,288		754,288			
15	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	2 663,318	85,00	226 382,03	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
		W	hutnění vrstev při násypu - vodorovně - základní vrstva					
		W	1239-180		1 059,000			
		W	-(2,2*1,0+3,0*5,0*0,5)		-9,700			
		W	-(8,5*3,9+6,0*3,1+3,1*1,8+6,1*5,7*0,5+7,8*6,0*0,5)		-98,115			
		W	Mezisoučet		951,185			
		W	rozsah hutnění vrstev po 200mm od plochy 951m2 do plochy cca 250m2 - koeficient 1,8					
		W	951,185*1,8		1 712,133			
		W	Součet		2 663,318			
16	K	181111123	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	645,465	50,00	32 273,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111123					
		W	ornice					
		W	180		180,000			
		W	1,75*(12+2,0*2+5,0+5,0+5,0)+1,2*(3,5+4,0)		63,250			
		W	(2,2*1,0+3,0*5,0*0,5)		9,700			
		W	2,0*(22+6,5+3,5*2+2,3+1,2+5,5+11+8,5+11+5,0+7,5+4,5+8,0)+3,25*9		229,250			
		W	(8,5*3,9+6,0*3,1+3,1*1,8+6,1*5,7*0,5+7,8*6,0*0,5)		98,115			
		W	31*2,0+2,1*1,5		65,150			
		W	Součet		645,465			
17	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	645,465	58,00	37 436,97	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
18	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice - pořízení a doprava	t	116,184	390,00	45 311,76	CS ÚRS 2024 02
		W	pořízení nad rámec ornice z výkopu - předpoklad - málo vhodná					
		W	645,465*0,1*1,8		116,184			
19	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	645,465	40,00	25 818,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411133					
20	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	12,909	245,00	3 162,71	CS ÚRS 2024 02
		W	645,465		645,465			
		W	645,465*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,909			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	729,546	120,00	87 545,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112 hutnění pod šterkovou vrstvou 729,546		729,546			
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	287,815	48,00	13 815,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403153 645,465-357,65		287,815			
23	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	357,650	48,00	17 167,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403253					
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	6,455	130,00	839,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312 645,465*0,01		6,455			
25	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,455	1 150,00	7 423,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121					
D		2	Zakládání		69 508,54			
26	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	74,840	635,00	47 523,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W W W W W W W W W W W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111 rýhy pro odvodnění 0,5*0,7*(5,5*2+5,5+5,0+7,5+5,2+5,5+16) -8,355 vnitřní vsaky-1m hl. 4,0*1,2*1,0 4,0*2,3*0,5*1,0 pi*1,2*1,2*1,0 3,8*1,7*1,0 2,6*1,3*1,0 venkovní - 1,5m hl. - obsyp košů 1,0*2,5*1,5*2-0,6*0,4*1,2*2*2 1,5*3,0*1,5*6-0,6*0,4*1,2*4*6 Součet		19,495 -8,355 4,800 4,600 4,524 6,460 3,380 6,348 33,588 74,840			
27	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	211,704	32,00	6 774,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W W W W W W W W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121 vsakovací jámy - dno a stěny (4,0+1,2)*2*1,0+4*1,2 (4,0+2,3)*2*1,0+4*2,3 pi*2,4*1,0+pi*1,2*1,2 (3,8+1,7)*2*1,0+3,8*1,7 (2,6+1,3)*2*1,0+2,6*1,3 ((1,0+2,5)*2*1,5+1,0*2,5)*2 ((1,5+3,0)*2*1,5+1,5*3,0)*6 Součet		15,200 21,800 12,064 17,460 11,180 26,000 108,000 211,704			
28	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	250,763	16,00	4 012,21	CS ÚRS 2024 02
		W W	211,704 211,704*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		211,704 250,763			
29	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	8,355	240,00	2 005,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212532111 rýhy pro odvodnění 0,5*0,3*(5,5*2+5,5+5,0+7,5+5,2+5,5+16)		8,355			
30	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	66,840	130,00	8 689,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214 (5,5*2+5,5+5,0+7,5+5,2+5,5+16)*1,2		66,840			
31	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,144	3 500,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611 pro základy mobiliář 0,3*0,3*0,8*2		0,144			
D		5	Komunikace pozemní		2 207 375,73			
32	K	564710002	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC W W	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710002 přístupové mlatové chodníky - odhad 30		30,000			
33	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16- 32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	30,000	203,00	6 090,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101					
34	K	564801012	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801012					
VV			horní vrstva mlatové plochy - hlinitopísčité lomové prosívka frakce 0-4mm					
VV			30					
					30,000			
35	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	729,546	315,00	229 806,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
VV			podklad pod asfalt					
VV			729,546					
					729,546			
36	K	57236111X	Kryt povrchu asfaltovou směsí tl přes 40-80mm včetně tvarování a hutnění, ruční rozvoz směsí	m2	729,546	2 690,00	1 962 478,74	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					51 024,06
37	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	55,764	915,00	51 024,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637121111					
VV			vsakovací jámy - povrch					
VV			vsaky					
VV			venkovní - 1,5m hl.					
VV			1,0*2,5*2					5,000
VV			1,5*3,0*6					27,000
VV			vnitřní -1m hl.					
VV			4,0*1,2					4,800
VV			4,0*2,3*0,5					4,600
VV			pi*1,2*1,2					4,524
VV			3,8*1,7					6,460
VV			2,6*1,3					3,380
VV			Součet					55,764
D 8			Trubní vedení					63 079,15
38	K	897171111	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulčním objemu do 10 m3	m3	8,467	7 450,00	63 079,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171111					
VV			vsakovací boxy 300l - venkovní jezírka - včetně opláštění geotextilií					
VV			(2*2+4*6)*0,42*0,6*1,2					8,467
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					126 642,00
39	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	60,000	385,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
VV			mlatové chodníky					
VV			30*2					60,000
40	M	58381007	kosíka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,600	970,00	12 222,00	CS ÚRS 2024 02
VV			60*0,2*1,05					12,600
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,800	2 400,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
VV			30*0,3*0,2					1,800
42	K	98500	D+M tabule s provozním řádem, konstrukce ocel - pozink	kpl	2,000	23 500,00	47 000,00	
43	K	986000	Směrovací nástřiky	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
44	K	9865000	Betonová street překážka - beton B25/30 včetně armování - dle specifikace	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	
D 998			Přesun hmot					36 368,56
45	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	1 585,594	15,00	23 783,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012					
46	K	998231411	Příplatek za ruční manipulaci s materiálem	t	251,693	50,00	12 584,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231411					
VV			šterkový podklad dráhy					
VV			251,693					251,693
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					121 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					61 500,00
47	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/010001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: vytýčení stavby, lavičky, pomocné konstrukce při stavbě					
48	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000					
49	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	pl...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000					
D VRN3			Zařízení staveniště					60 000,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
P			Poznámka k položce: zřízení, provoz, likvidace, uvedení do původního stavu, dopravní opatření, čištění komunikací, oplocení cca 200m, komunikace s třetími stranami, vstupy na pozemky, skládka materiálu, poplatky správní a pronájem ploch					

HARMONOGRAM

Název akce Rozvoj bývalého házenkářského hřiště - pumptrack Kopřivnice

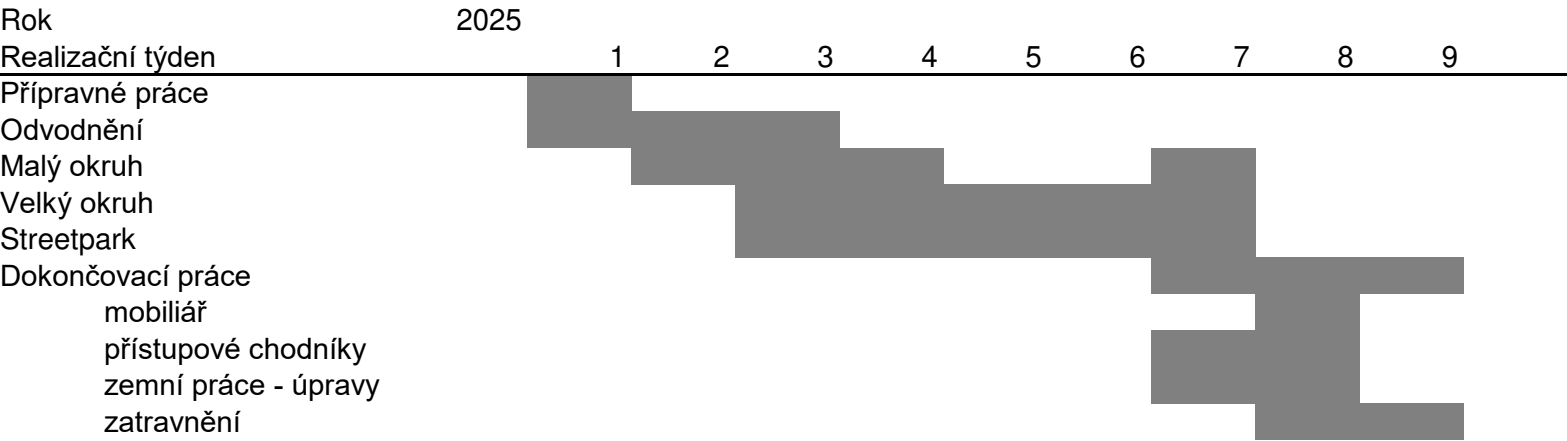

Doba realizace 60 dnů od předání staveniště
