



MUKUP00670E2

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH  
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2017/00121**

---

mezi

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

a

**Město Kuřim**

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění mezi:

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Město Kuřim**

se sídlem Jungmannova 968

IČO :00281964

DIČ :CZ00281964

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [ ] pod spz. [ ]

zastoupená Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

**DEFINICE**

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

**Překládka** je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

**Vyjádření o existenci SEK** je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.8.2016 vydané pod čj. 679719/16, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC\_Kuřim ul. Komenského - most“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka dle této Smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č.1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
  - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

#### 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

##### a) před realizací Překládky:

- i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

##### b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

#### 4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

##### a) před realizací Překládky:

- i) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 8 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Most přes Kuřimku, na ul. Komenského, Kuřim, č.j. MK/2549/17/OSŽP ze dne 7.3.2017, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 4 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 4 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou.

Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebností potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této Smlouvy činí **66.350,-Kč**. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebností vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebností rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebností (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zaslána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

- 7.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou dle čl. 9 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN  
ve věcech smluvních [REDAKCE]

ve věcech technických [REDAKCE]

- 8.2 Za Stavebníka: město Kuřim  
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
funkce: starosta  
e-mail: sukalovsky@kurim.cz tel.: 541 422 301

ve věcech technických: Ing. Dagmar Ševčíková  
funkce: vedoucí oddělení investičního  
e-mail: sevcikova@kurim.cz tel.: 541 422 316

## 9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. V případě, že dojde k zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 10.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 10.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
  - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
  - e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 10.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 10.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 10.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 10.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.



10.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MK/2549/17/OSŽP

Doložka


Tato Smlouva byla schválena Radou města Kuřim na schůzi č. 22 dne 27. 6. 2017, č. usnesení 356/2017

CETIN: 12-07-2017

Stavebník:

V BRNĚ dne \_\_\_\_\_

V KUŘIMI dne 21. 7. 2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Ludmila Uhrová  
specialista pro výstavbu sítě

Město Kuřim  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta



# Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

## *Startovací dokumentace*

### *INVESTIČNÍ AKCE*

*Kategorie*

*Podkategorie*

*Číslo SAP*

*Číslo interní*            69356/17/0011

*Název*

**VPIC\_Kuřim ul. Komenského - most**

**Budoucí uživatel**

GMO-BO Vašák Pavel  
Manažer/KPO

**Zpracoval**

Vedoucí  
Manažer

Michal Novotný  
Petr Švestka  
Petr Švestka

**Schváleno**

**Obsah:**

**1 Souhrnná zpráva**

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

**2 Technická zpráva**

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

**3 Podmiňující a související stavby**

**4 Vyjádření a záznamy**

**5 Přílohy**

# 1. Souhrnná zpráva

## 1.1 Základní údaje

### Identifikační údaje

Název:	VPIC_Kuřim ul. Komenského - most
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod I:	Bez určení
Číslo interní:	69356/17/0011
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	VÚJ Kuřim-RSU

### Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	182.692 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.052 km	kmk mk	1096.154 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	2280 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	0.312 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč. podvrtů a přechodů	0.025 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skříně SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skříně SIS 900 B HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 C HD180	0 ks		
Skříně SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skříně mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skříně SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

### Termíny:

Platnost ÚR od:	29.03.2017
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	17.04.2017
Plánované ukončení přípravy:	15.06.2017
Plánované zahájení realizace:	15.07.2017
Plánované ukončení realizace:	15.10.2017
<b>Nabídka k převjínce (Plán):</b>	<b>15.09.2017</b>

### 1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072.

## 2 Technická zpráva

### 2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 69356/17/001 Ina zpracování CaTN: VPI Kuřim ul. Komenského - most.

### 2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu opravy mostu přes řeku Kuřimku v Kuřimi, dojde k přeložení telefonních kabelů PPFLE 5XN 0,4 a PPFLE 1XN 0,6.

Z UR KURM656 bude odpojen přívodní kabel PPFLE 5XN 0,4 a kabel PPFLE 1XN 0,4, který vede do KR KURM2367 a přerušen na počátku překládky. Na počátku překládky budou kabely naspojovány spojkami XAGA 500 43/8-350 na PPFLE 5XN 0,4 v délce 22m a PPFLE 1XN 0,6 v délce 22m, kabely uloženy do PE 110mm v délce 19m a uloženy do výkopu, který provést v délce 20m až k UR KURM656, kde kabely opět zapojit na stejné pozice. Spojky budou osazeny markéry Ball 3M. Kabely proměřit. Trasu geodeticky zaměřit, zhotovit geometrický plán na pozemky parc.č. 2257/1. Zhotovit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uvedeny pozemek.

### 2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

### 2.4 Použitá technologie:

Mini Markér Ball

PE110

XAGA

PPFLE 0,4\_0,6

### 2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického  
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, polohy a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

### 2.6 Koordinace:

Stavebník: : Město Kuřim; Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, V ZASTOUPENÍ: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta, kontakt: Tel. 541 422 301, mob. 775 978 326

IČO: 00281964;DIČ: CZ00281964 ; Datová schránka: 5dhhbj2

Zástupce pro věci technické: Stanislav Bartoš, vedoucí investičního odboru; Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879; email: bartos@kurim.cz, případně: Ing. Dagmar Ševčíková; email: sevcikova@kurim.cz ; mobil: 776 072 931

Žadatel o překládku: Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ: 29362393, DIČ: CZ29362393, [REDACTED]

## 2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: NE \_ zajistí stavebník.

VBR: ANO

GEO: ANO

SoUZ: NE

PEW: ANO

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.

Měření:

MK = před provedením překládky bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%). Po provedení překládky bude provedeno standardní měření na celém profilu kabelů.

## 3. Podmiňující, související a navazující stavby:

**Podmiňující akce - vložené:**

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

**Navazující akce - vložené:**

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


## 4. Vyjádření a záznamy

## 5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Zadávací podklady.zip	SD
Územní rozhodnutí.zip	SD
Podklady od stavebníka.zip	SD
Vyjádření o existenci SEK.zip	SD
Doplňující podmínky POS.zip	SD

evíd.č.:

zpracoval:

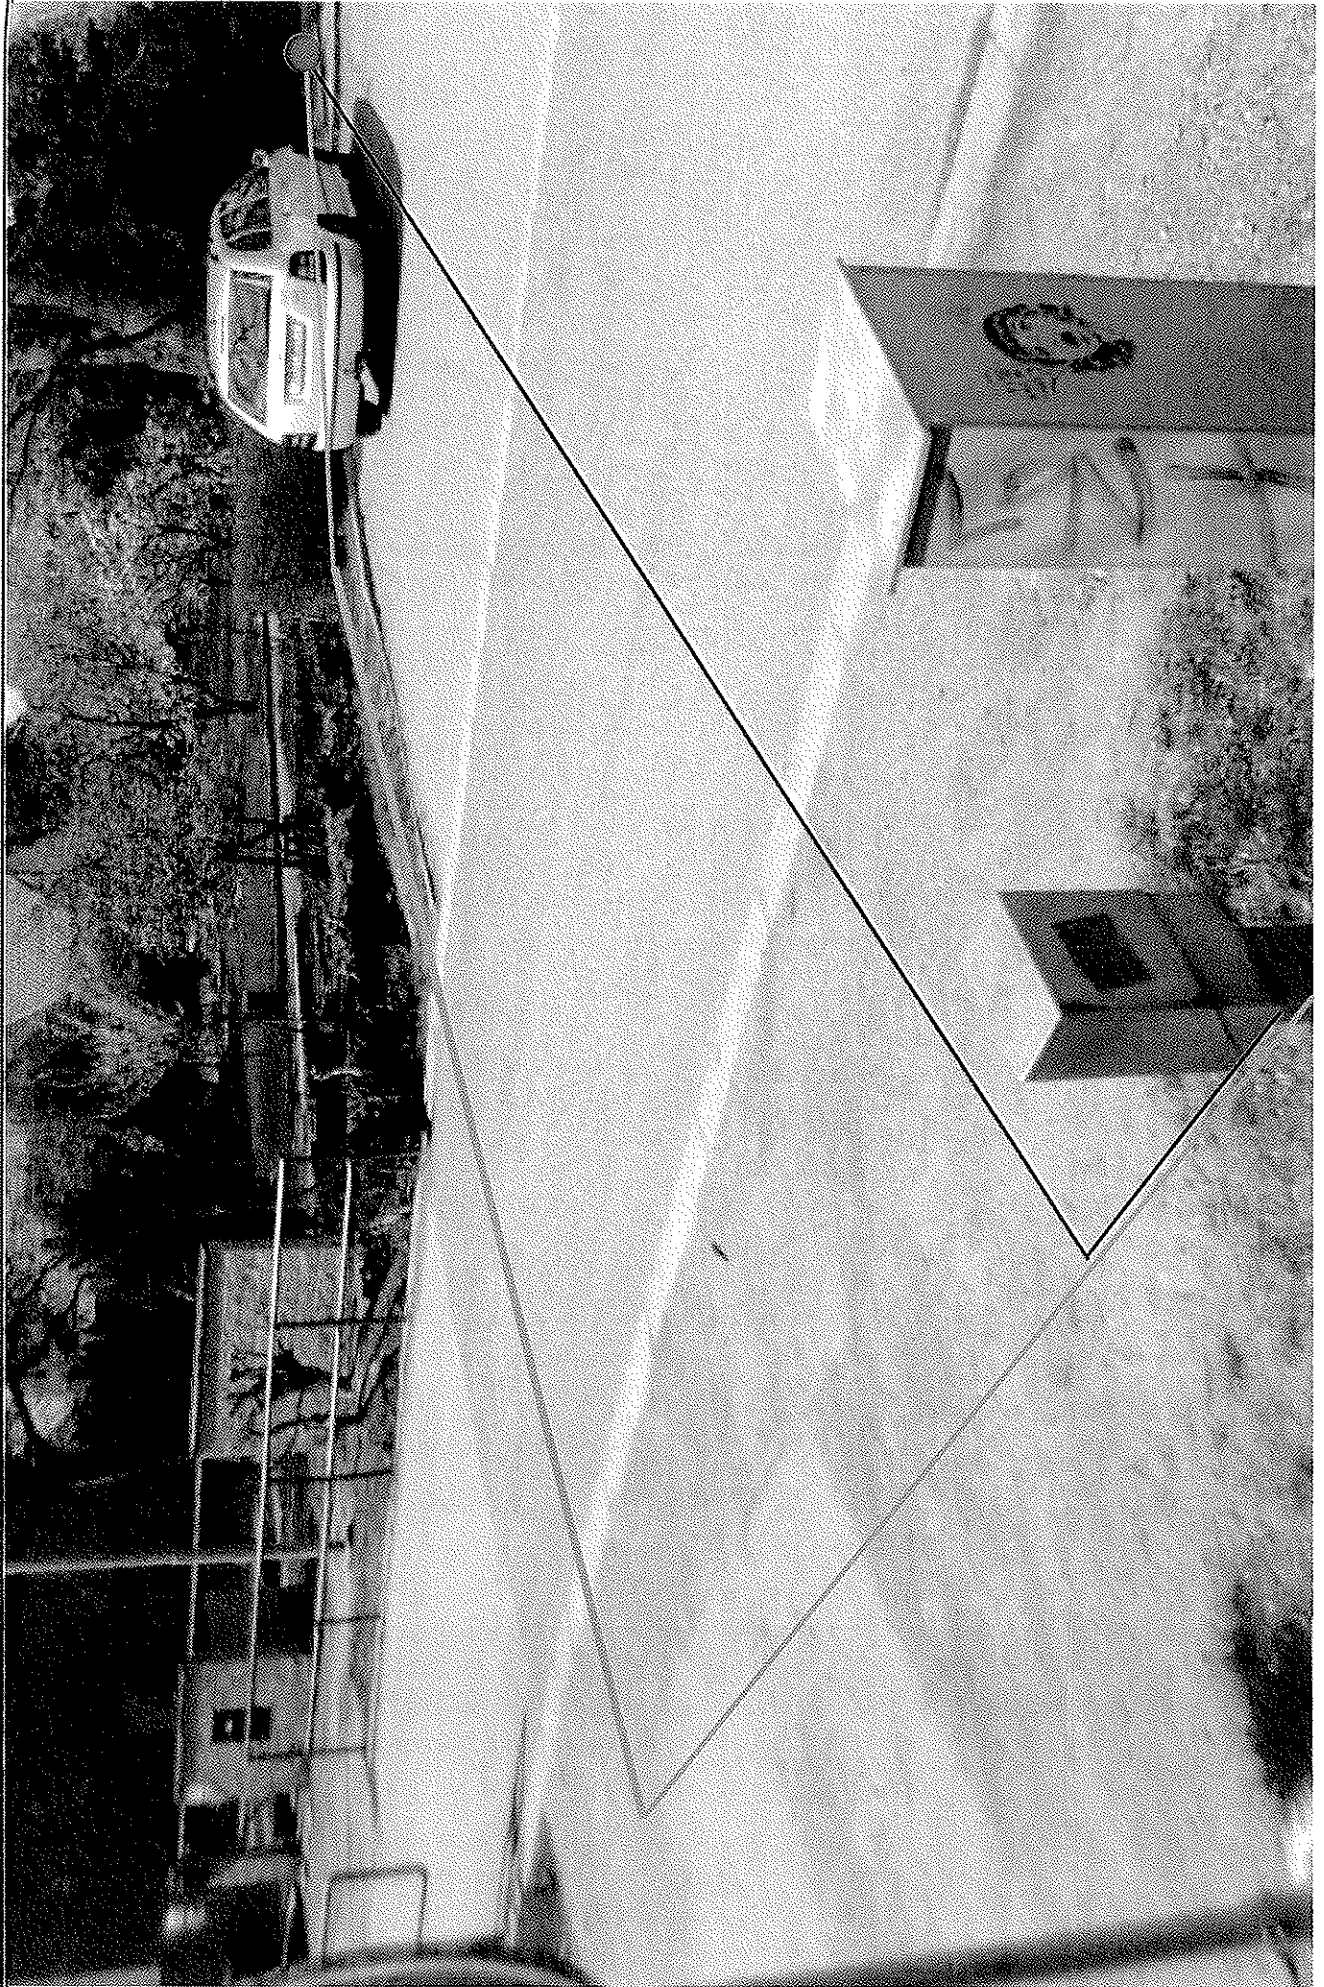

## Informace o pozemku



Parcelní číslo:	<u>2257/1</u>
Obec:	<u>Kuřim [583251]</u>
Katastrální území:	<u>Kuřim [677655]</u>
Číslo LV:	<u>1</u>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1580
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

### Sousední parcely

### Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl


Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim



ev.č.:

73

zpracoval:

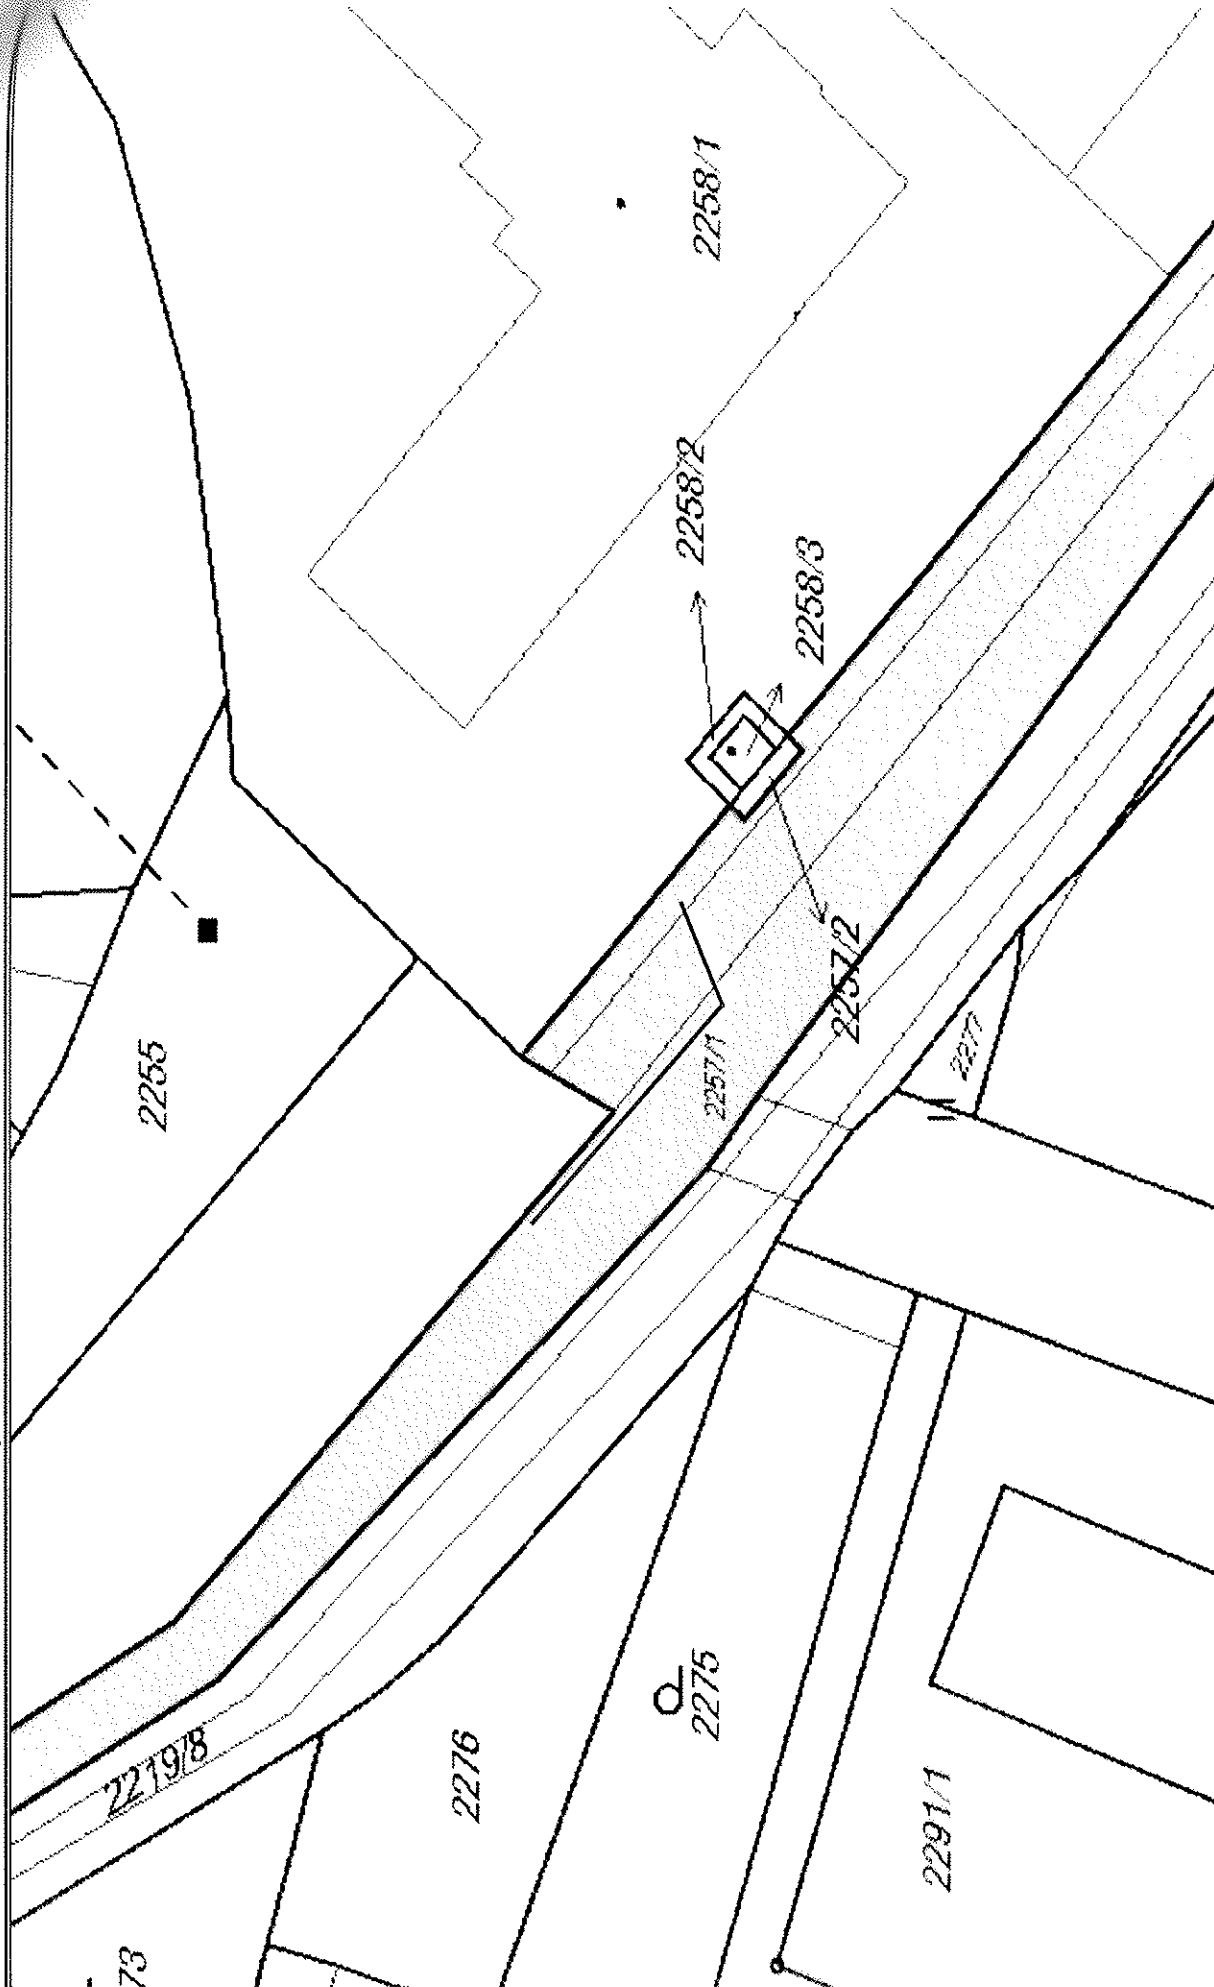

evid.č.:

zpracoval:

2256

XAGA 500 43/8-150 na PPFE 5XN 0,4  
XAGA 500 43/8-150 na PPFE 1XN 0,6

(M)

2x


Výkop 25m  
PE 110mm - 24m  
PPFE 5XN 0,4 - 26m  
PPFE 1XN 0,6 - 26m

10637 - Komenského - U -  
KURM656

4,8

3,5


80

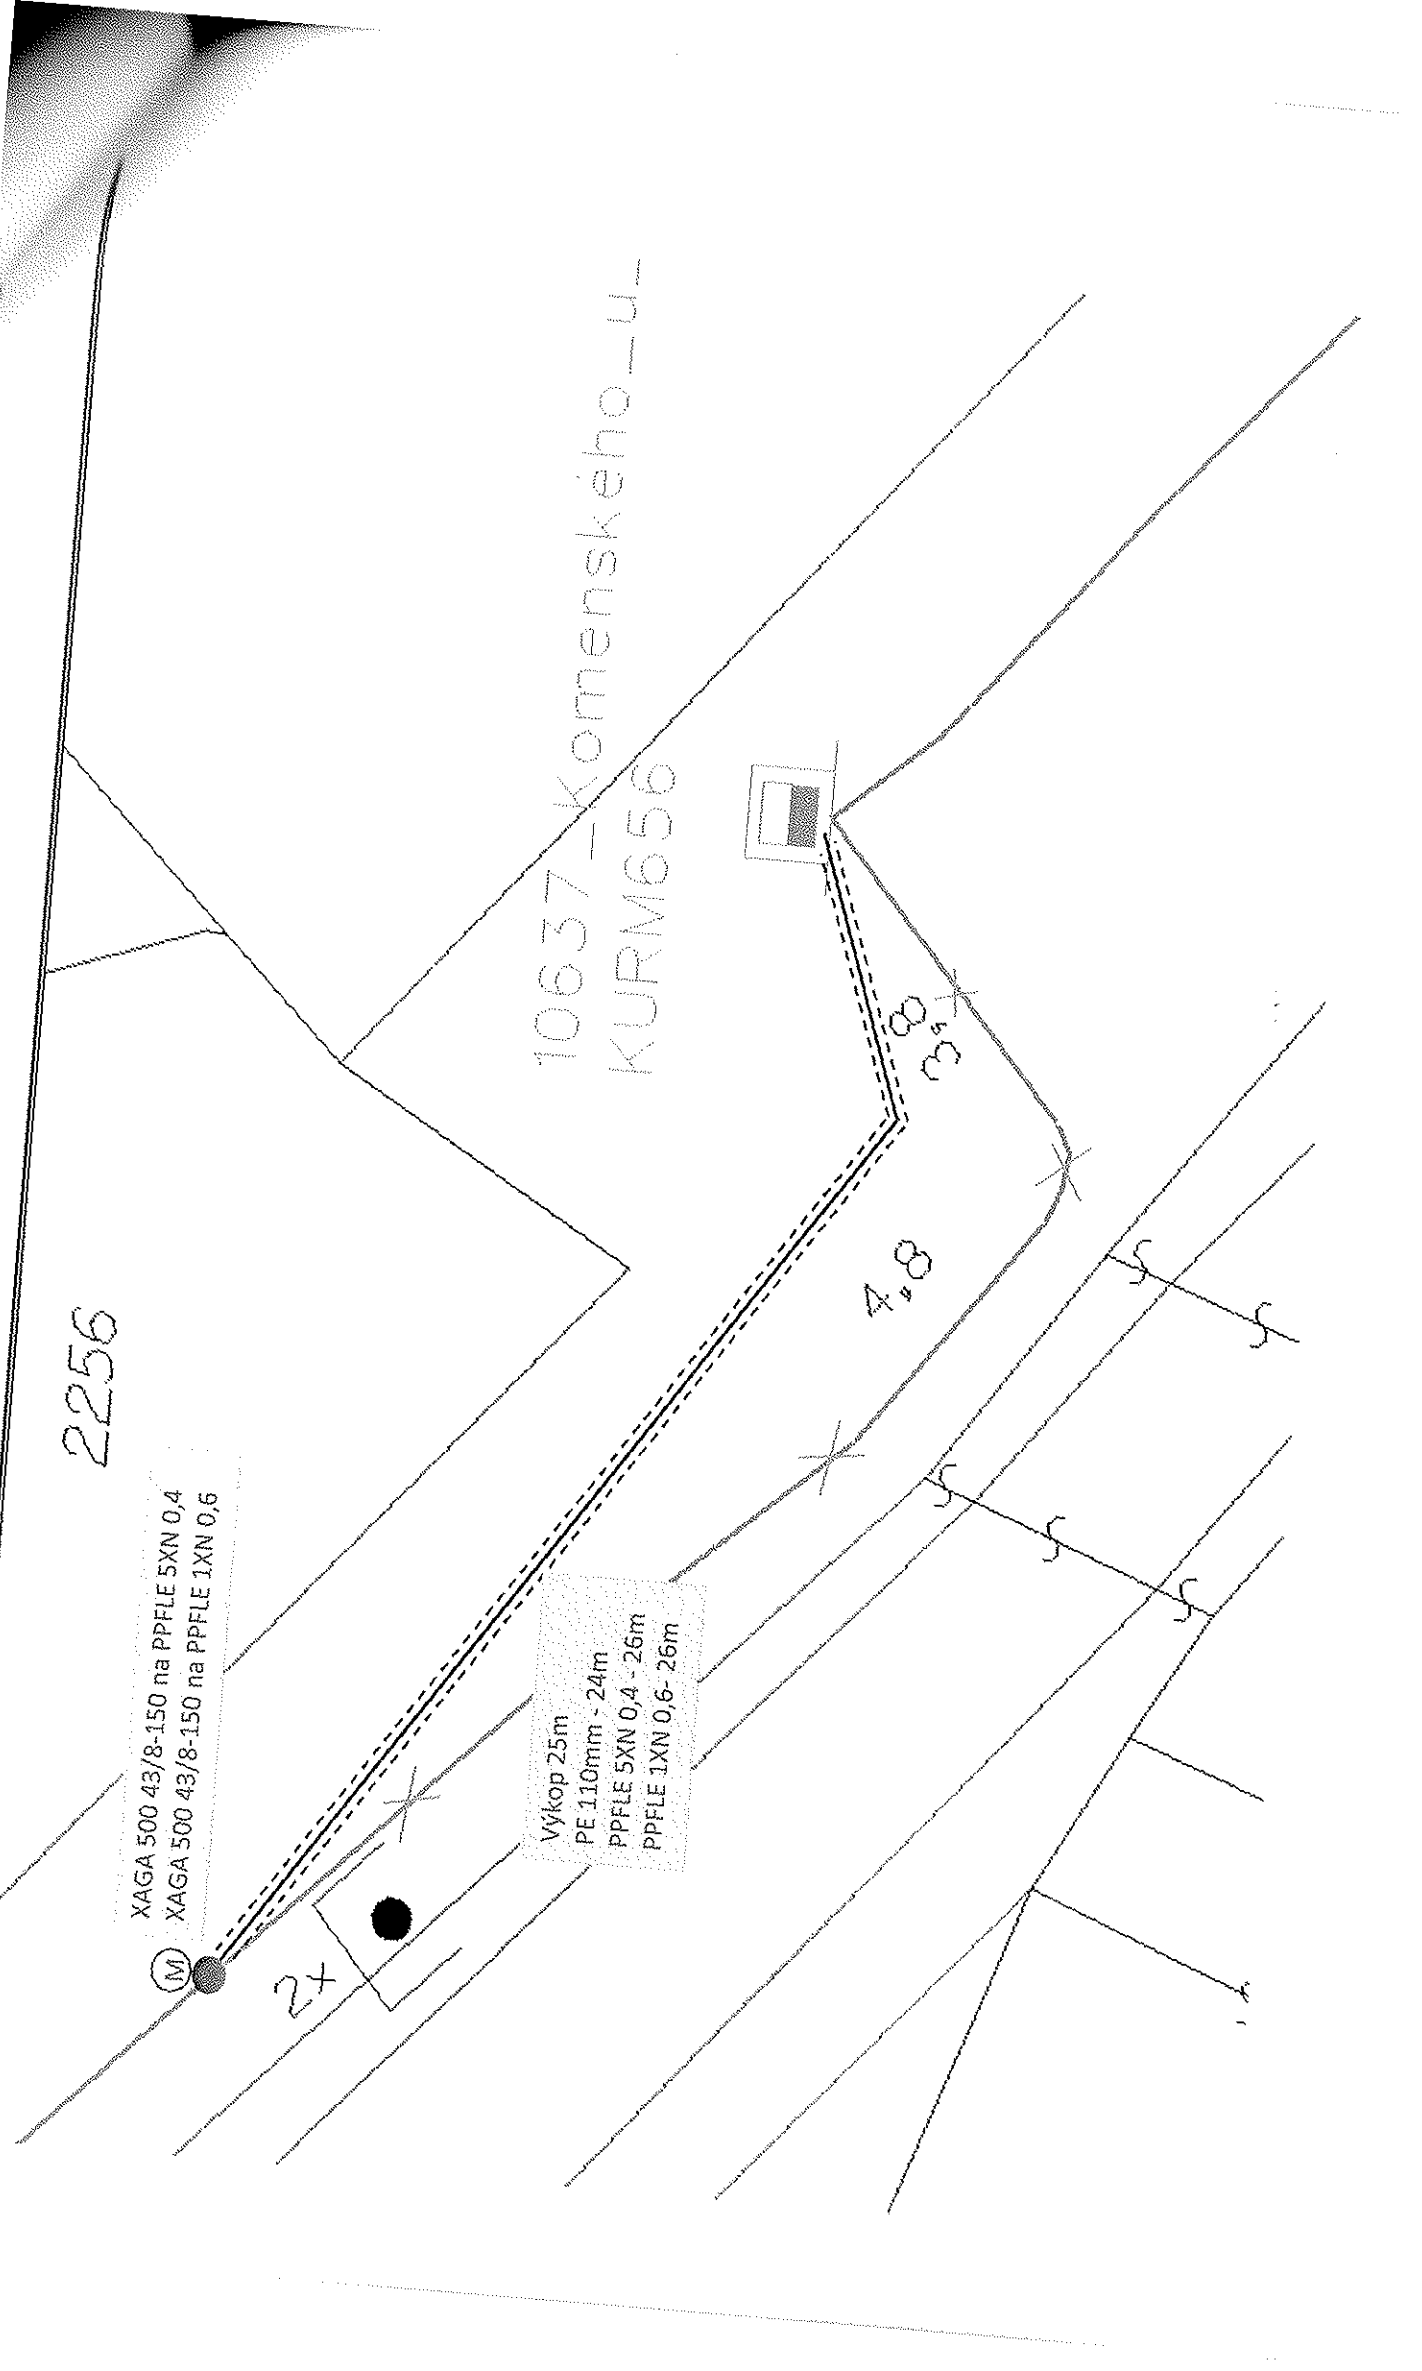

ev. č.:

zpracoval:

# KUŘIM

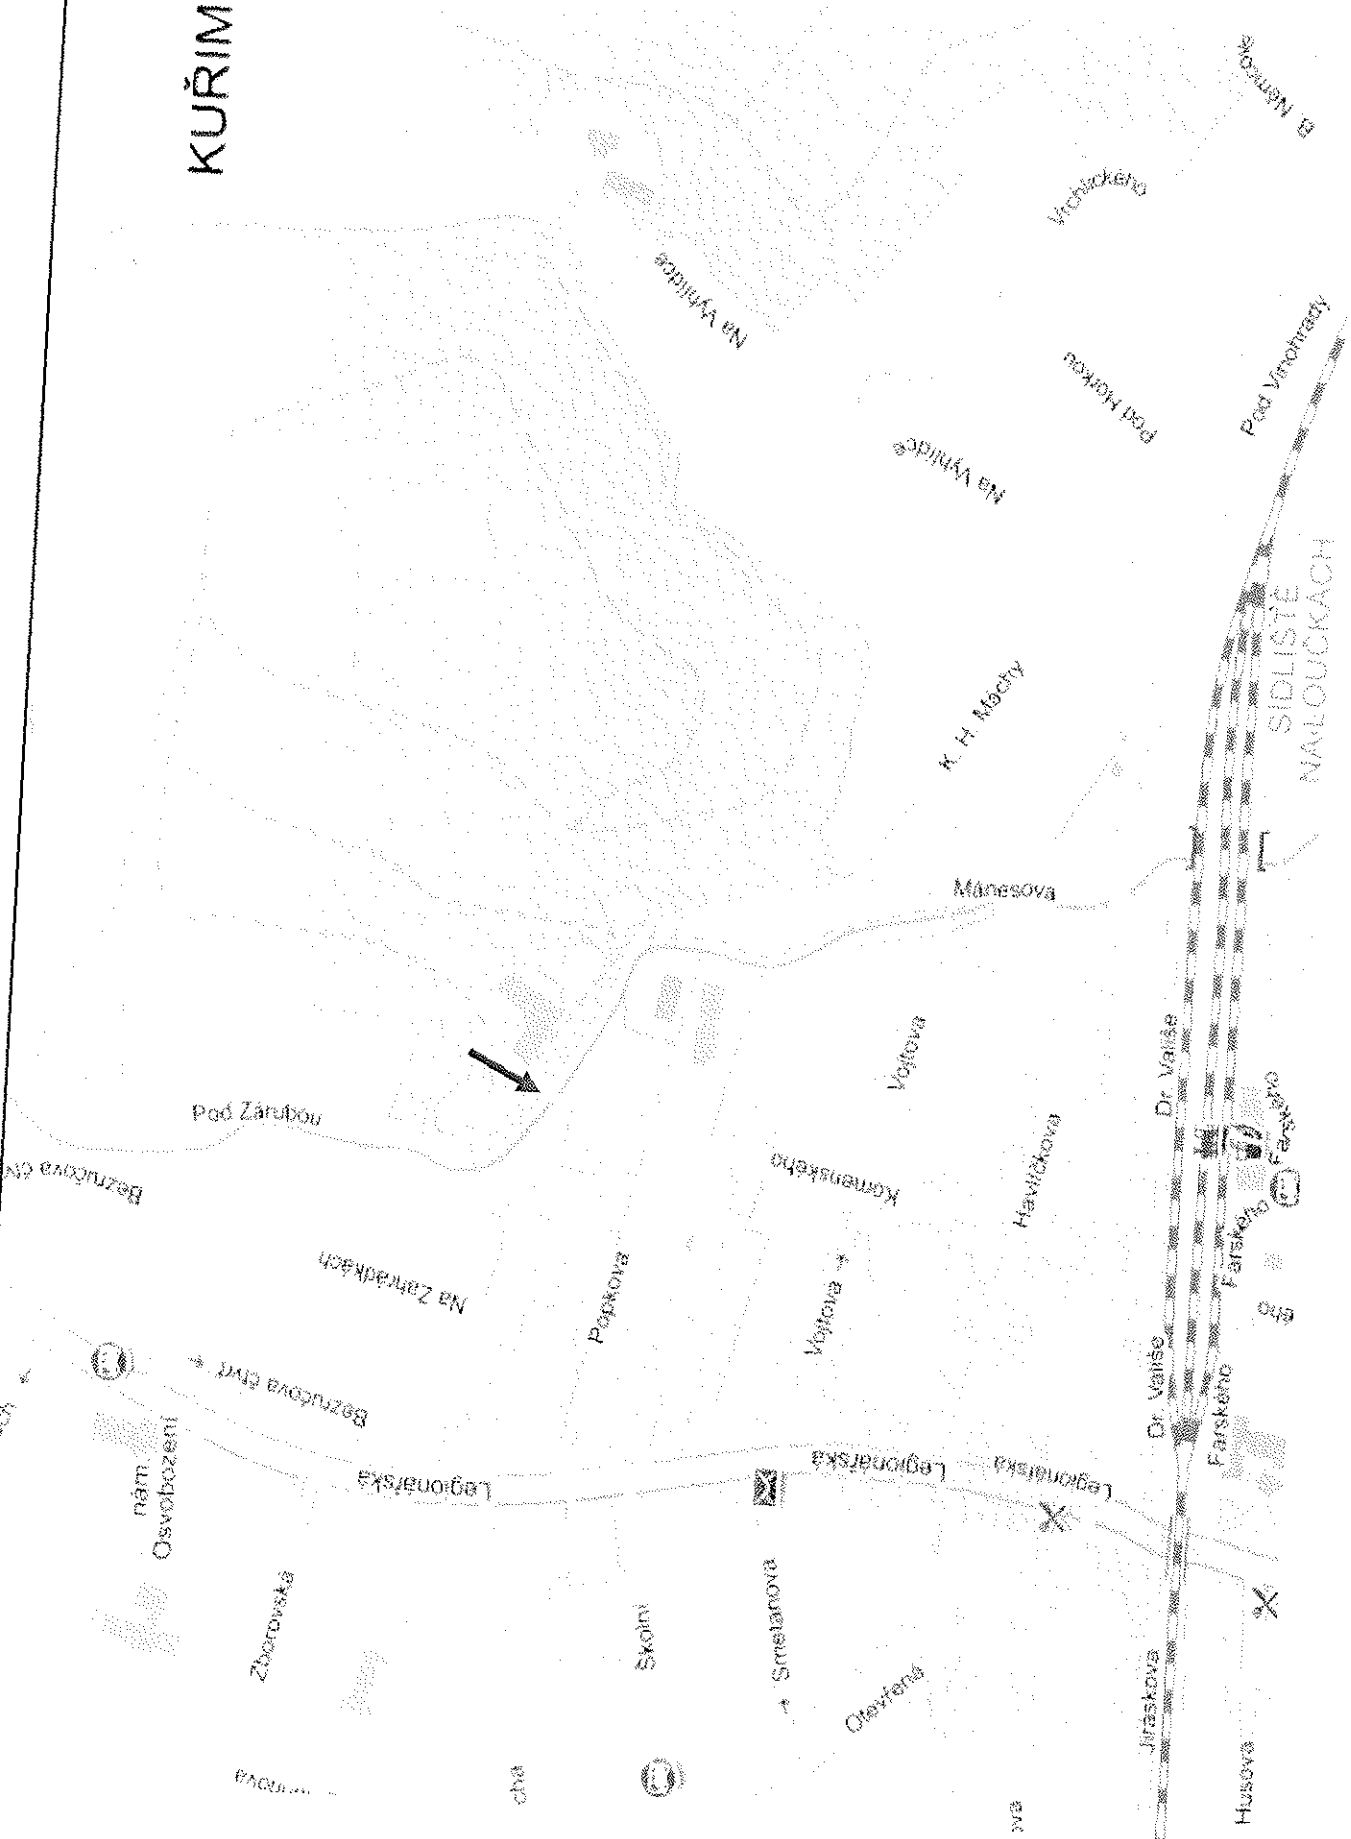

evíd. č.:

zpracoval:

2x XAGA 500 43/8-150

M

100 PPFLE  
5XN 0,4

PPFLE 5XN 0,4 - 26m  
PPFLE 1XN 0,6 - 26m

10637\_Komenského\_u.\_č.511

KURM656

KKURM683/2.1/1-10



1xBOX - A30;


2xsv.FLSA 10x1;

Komenského u č.511 (B&A Komenského 40)

Kufim

Kurim



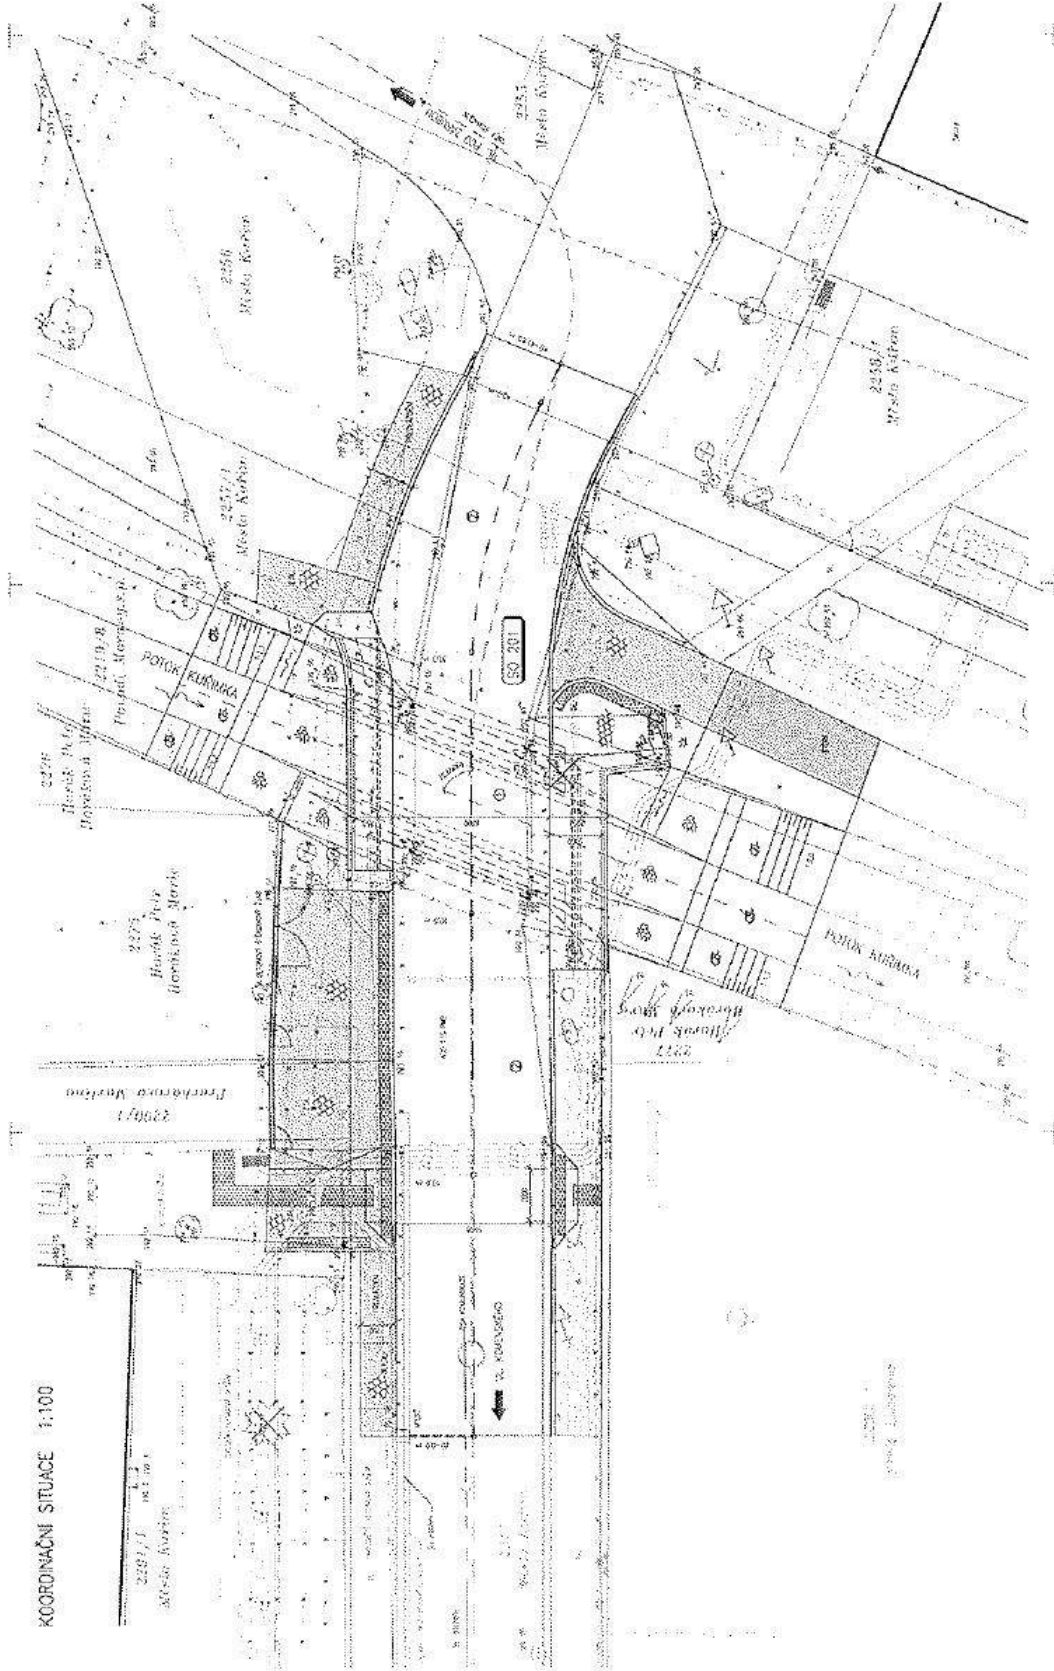

LEGENDA

- KAMENNÝ MOST (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

- PLOŠNÍ STAVBA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

- SEZNAM STAVĚNÝCH OBJEKTŮ:
  - SO 101 PŘELOŽKA D. Z.
  - SO 201 MOST
  - SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

DSP+PDPS

Název stavby: PD - most přes Kurmku na ul. Komenského v Kúrtini	Město: Kúrtina
Místní úřad: Městský úřad Kúrtina	Číslo stavby: 100/2019
Datum: 11. 12. 2019	Stupeň: DSP+PDPS
Projektant: Fuser mosty, s.r.o.	Vypracoval: M. Fuser
Schválil: M. Fuser	Datum: 11. 12. 2019
Koordinace: KOORDINAČNÍ SITUACE	Číslo: B.2

## PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.05a  
 Položková 2017.05  
 databáze: a  
 Název stavby: VPIC\_Kuřim ul. Komenského - most-celkem  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: p. Hudziec  
 KPO: JMO  
 HOST: Brno - Kr. Pole  
 VUJ: Kuřim

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	25 551,35 Kč
MONTÁŽ	16 979,99 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 270,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	404,89 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 121,14 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 66 349,82 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 55 327,40 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 022,42 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	24.00 m	355,68 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	7.00 m	1 935,43 Kč
955820	S	Rýha ve vozovce zámková dlažba 50/100	9.00 m	10 111,14 Kč
954955	S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	9.00 m	7 742,79 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m	222,25 Kč
MONTÁŽ				
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	48.00 m	1 896,00 Kč

952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	6.00 ks	177,78 Kč
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	79,00 Kč
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	138,26 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	6.00 ks	118,50 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
		Rozpočtová min. rezerva		
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	4.00 m	67,16 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	6.00 ks	118,50 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	572,72 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
		Kolaudační rozhodnutí		
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	925,73 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	6.00 ks	82,98 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	2.00 ks	237,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	500,00 Kč
		Náhrada za VBř odhadovaná		
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár	1.00 ks	137,26 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár	2.00 ks	49,38 Kč
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	149,11 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	2.00 ks	69,14 Kč
Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	4.00 ks	146,56 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	106,50 Kč
300115	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6	26.00 m	314,08 Kč
300105	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	26.00 m	414,44 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	4.00 ks	5,56 Kč

VPIC\_Kuřim ul. Komenského - most-celkem \_Specifikace nákladů, Příloha č. 2

302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	947,28 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	1.00 ks	22,22 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	837,14 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	134,00 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	4.00 ks	1 978,24 Kč
302885 S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	2.00 ks	202,92 Kč
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	5.00 m	12,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč





Kuřim

# Městský úřad Kuřim

Odbor stavební a životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim



MUKUP005FH15

SPIS. ZN.: S-MK/2549/17/OSŽP/Ma  
Č.J.: MK/2549/17/OSŽP  
VYŘIZUJE: Ing. Macek  
TEL.: 541422313  
E-MAIL: macek@kurim.cz  
POČET LISTŮ: 9  
DATUM: 7.3.2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUŘIM

Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem 19.3.2017

na vyžádání dle

č. 1/2017

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.2.2017 podalo

Město Kuřim, IČO 00281964, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Most přes Kuřimku na ul. Komenského, Kuřim

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2219/8 (vodní plocha), 2256 (trvalý travní porost), 2257/1 (ostatní plocha – komunikace), 2258/1 (zast. plocha), 2275 (zahradka), 2276 (orná půda), 2277 (trvalý travní porost), 2290/1 (zahradka), 2291/1 (ostatní plocha) a 2311 (ostatní plocha – komunikace) v katastrálním území Kuřim.

Stavba zahrnuje odstranění starého mostu včetně neprovozovaných STL plynovodů, provedení přeložek vodovodu, sdělovacích kabelů CETIN a KABELOVÉ TELEVIZE CZ a výstavbu nového mostu dostatečné šířky pro obousměrný provoz a oboustranný chodník pro pěší. Součástí stavby bude i úprava sjezdů na přilehlé pozemky, terénní úpravy okolí mostu, včetně zpevnění koryta potoka Kuřimky a rovněž dočasné dopravní značení.

#### Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna podle ověřeného situačního výkresu v měřítku 1 : 100 se zakreslením hranic pozemků, schváleným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. V zájmovém území stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) - viz vyjádření č.j. 585015/16 ze dne 14.4.2016. Při stavbě je třeba dodržet tyto požadavky CETIN:
  - a) Stavebník nebo zhotovitel je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK a je výslovně srozuměn s tím, že SEK společnosti CETIN jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními

- předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je třeba respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nelze používat mechanizaci a nevhodné nářadí.
  - c) Před započítím zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
  - d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
  - e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je třeba zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit bez zbytečného odkladu pracovníkovi ochrany sítě (POS) p. Zdeňku Procházkovi. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu POS.
  - g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
  - h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
  - i) Stavebník ani zhotovitel nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN.
  - j) Mimo vozovku nelze trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je třeba respektovat výšku vedení nad zemí.
  - k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nelze měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
  - m) Na pracoviště POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby s SEK.
  - n) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
  - o) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

- p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zeizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit POS na tel.č. 602 521 703 nebo v mimopracovní době na tel.č. 238 462 690.
3. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) - koaxiální kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvaděče ve správě společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. (dále jen KTCZ). Ochranné pásmo podzemního vedení SEK činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při realizaci stavby je stavebník nebo zhotovitel povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK:
- a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma PVSEK, tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s SEK je třeba dodržet ČSN 73 6005, ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54.
  - b) Před započítím zemních prací je třeba nechat zařízení vytýčit (objednat na tel.č. 465 539 103). S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
  - c) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Upozornit je, aby ve vzdálenosti do 1,5 m od SEK nepoužívali nevhodné nářadí ani mechanizaci, prováděli zemní práce ručně s nejvyšší opatrností.
  - d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit na tel.č. 731 517 542.
  - e) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení SEK. Případně odkryté vedení SEK je třeba zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. Při event. změně nivelety terénu je třeba dodržet hloubku uložení SEK. Ke kontrole odkrytého vedení SEK přizvat pracovníka KTCZ (tel.č. 465 539 103). Ten provede o kontrole zápis do stavebního deníku zhotovitele a dá souhlas k záhozu vedení SEK.
  - f) Mimo vozovku nelze trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
  - g) Nad kabelovou trasou je třeba dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům.
  - h) Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch.
  - i) Případné poškození vedení SEK okamžitě ohlásit na tel.č. 465 539 103.
4. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN a podzemní vedení NN v provozování E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD), kterou ve správních řízeních zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je třeba podle zák.č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
- a) Zakreslení trasy podzemního vedení do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  - b) Před zahájením stavby objednání přesného vytýčení podzemního kabelového vedení u příslušné Regionální správy ECZR, příp. vykopání sond. Objednat min. 14 dnů předem na tel. [redacted].
  - c) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů výhradně klasickým ručním nářadím bez použití mechanismů s nejvyšší opatrností.

- d) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, apod.), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami.
  - e) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení stavby s rozvodným zařízením v souladu s příslušnými ČSN.
  - f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.
  - g) Neprodleně ohlášení jakéhokoliv poškození el. vedení či zařízení v provozování ECD na tel.č. 800 225 577.
5. V zájmové lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení dn 63, včetně přípojek, ve správě RWE GasNet, s.r.o. (dále jen RWE). Dále se v zájmovém území nachází nefunkční NTL, STL plynovody. Plynárenské zařízení (dále jen PZ) je chráněno ochranným pásmem dle zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění. Při realizaci stavby musí být dodrženy tyto podmínky:
- a) Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození PZ. V ochranném pásmu PZ musí být práce prováděny výhradně ručním způsobem.
  - b) Při provádění prací v blízkosti PZ je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové či výškové kolize stavby s PZ lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně provozovatel PZ.
  - c) Před zahájením prací v ochranném pásmu PZ je třeba provést jeho vytýčení. Vytýčení zajistí příslušná provozní oblast RWE na základě žádosti podané min. 7 dní předem. O vytýčení bude sepsán protokol.
  - d) Pracovníci stavby budou s polohou PZ a rozsahem ochranného pásma prokazatelně seznámeni.
  - e) Při stavbě bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 a zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění.
  - f) Výkopové práce v ochranném pásmu PZ budou prováděny ručně bez použití mechanizace a nevhodného nářadí.
  - g) Odkryté PZ musí být při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození.
  - h) Každé i sebemenší poškození PZ (včetně izolace, signal.vodiče, výstražné fólie) musí být neprodleně oznámeno RWE na tel.č. 1239.
  - i) Před provedením zásypu PZ je třeba přizvat zástupce RWE ke kontrole na místě.
  - j) Před zásypem výkopu musí být PZ řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.
  - k) Neprodleně po skončení stavební činnosti v ochranném pásmu PZ musí být řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.
  - l) Během stavby musí být poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ stále přístupné a funkční.
  - m) Případné zařízení stavenišť, skládky materiálu a stavebních strojů je třeba budovat mimo ochranné pásmo PZ.
6. Při realizaci stavby budou dotčeny zájmy Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK), a proto je třeba dodržet tyto podmínky BVK:
- a) Součástí stavby je přeložka vodovodu. Přeložený vodovodní řad musí být proveden podle zák.č. 274/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhl.č. 428/2001 Sb., v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a v nich uvedenými normami ČSN EN 545, ČSN 75 5401,

ČSN 73 6005, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 0873. Vodovod nebude zaplacen, bude k němu zajištěn volný příjezd a bude uložen ve veřejném prostranství.

- b) Projekt vodovodního řadu pro veřejnou potřebu musí být odsouhlasen pracovníkem vodárenského provozu BVK [REDACTED].
- c) Vodovodní hydranty musí být umístěny mimo parkovací stání, trvale volně přístupné.
- d) Stavba vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení. Před zahájením vodoprávního řízení je třeba doložit doklad o vztahu stavebníka k pozemku dotčenému vodovodem.
- e) Při realizaci stavby budou dotčena stávající vodovodní a kanalizační zařízení v provozování BVK, která jsou chráněna ochranným pásmem podle zák.č. 274/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu nelze vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál, zvyšovat či snižovat terén bez předchozího souhlasu BVK.
- f) Při stavbě je třeba dodržet také ochranné území vodovodních přípojek, které je stanoveno v Městských standardech pro vodovodní síť v rozsahu 0,75 m měřeno na každou stranu od osy potrubí. V ochranném území nelze vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál, zvyšovat či snižovat terén bez předchozího souhlasu BVK.
- g) Před zahájením stavby je třeba vodovodní řad, včetně přípojek, nechat vytyčit. Vytyčení zajistí [REDACTED]. Zahájení prací je třeba oznámit min. 3 dny předem na vodárenský provoz BVK. Krytí vodovodu musí zůstat v rozmezí 1,5 -2,0 m. Stav dotčených armatur je třeba nechat zkontrolovat před zahájením a po ukončení stavby obvodovým technikem vodárenského provozu BVK [REDACTED]. O kontrole bude sepsán protokol. Během stavby je třeba zajistit plnou ovladatelnost armatur. Poklopy musí být pevně osazeny do úrovně terénu, v nezpevněném terénu obedlážděny dvěma řadami kostek usazených do betonu. Délku armatur a osazení poklopů je třeba přizpůsobit novému povrchu a ke kontrole přizvat technika vodárenského provozu BVK.
- h) Kanalizaci je třeba nechat rovněž vytyčit před zahájením stavby. Dotčené kanalizační šachty musí zůstat během stavby volné, přístupné a funkční. Zpomalovací práh na komunikaci je třeba umístit mimo koncovou kanalizační šachtu. Zahájení prací je třeba oznámit 3 dny předem na kanalizační provoz BVK, za přítomnosti obvodového technika kanalizačního provozu [REDACTED] provést protokolární převzetí a pak i zpětně předání dotčených šachet. Osazení rámu a poklopů šachet je třeba přizpůsobit novému povrchu pomocí vyrovnávacích prstenců. Při změně nivelety poklopu šachty je třeba předat kanalizačnímu provozu BVK geodetické zaměření nové nivelety.
- i) Napojení nových uličních dešťových vpustí do veřejné dešťové kanalizace musí být provedeno jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace (ne útesem). Uliční vpustí budou opatřeny kalovým prostorem, min. spád bude 2% a max. spád do 40%. Přípojka bude z obetonované kameniny se zápachovou uzávěrkou. Prověření napojení nových vpustí do stávající kanalizace technickou kamerou je třeba předložit ke kontrole kanalizačnímu provozu BVK.
- j) Při realizaci přeložek sítí technické infrastruktury je třeba vůči vodovodům a kanalizacím dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005 při souběhu i křížení. Přípojkové a rozpínací skříně umístit mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodů a kanalizací ani přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné a ovladatelné. Kabely při křížení s vodovodem a kanalizací je třeba uložit do chrániček a křížení provést kolmo. Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností.

- k) V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení z titulu činnosti stavby je třeba upozornit dispečink BVK na tel. 5-13212537 a přizvat zástupce BVK ke kontrole a projednání na místě. Následně je třeba zajistit okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka BVK.
- l) Zařízení staveniště a skládky materiálu je třeba umístit mimo ochranná pásna vodovodů a kanalizací a mimo ochranná území vodovodních přípojek.
7. Při realizaci stavby je třeba dodržet požadavky správce vodního toku Kuřimka – Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno (dále jen „Povodí Moravy“):
- a) Kamennou dlažbu je třeba zakončit kamenným záhozem se zarovnaným lícem o hmotnosti 80 – 250 kg.
- b) Technické řešení kamenných skluzů s vyústěním do vodního toku musí být odsouhlaseno Povodím Moravy.
- c) Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nesmí být volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
- d) Zařízení staveniště nesmí být situováno v blízkosti vodního toku a v záplavovém území.
- e) Zásah do břehového porostu je třeba odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a projednat s Povodím Moravy.
- f) Pro provádění stavby musí být zpracován havarijní a povodňový plán. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění stavby. Schválené plány je třeba v jednom vyhotovení předat na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.
- g) Povodí Moravy ( ) je třeba min. týden předem oznámit zahájení a ukončení demoličních a stavebních prací, termíny kontrolních dnů a termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zápisem ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny všechny stavební aktivity v korytě toku a v prostoru do 8 m od břehové hrany. Na závěrečné kontrolní prohlídce bude správci toku předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i digitální formě.
- h) Po dokončení stavebních prací musí být odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti toku.
- i) Před vydáním stavebního povolení je třeba uzavřít smlouvu s Povodím Moravy o právu provést předmětnou stavbu.
8. Při výstavbě a následném provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami ve smyslu § 39 zák.č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), zejména ropnými produkty a ostatními závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek.
9. Stavebník přebírá veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé na majetku při průchodu povodňových průtoků nebo ledochodů. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě toku a v jeho blízkosti a je vázán povinnostmi uvedenými v § 52 vodního zákona.
10. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
11. Min. 3 dny předem je třeba zahájení prací oznámit provozovateli veřejného osvětlení – CTS Kuřim ( ), který provede protokolární předání a pak i zpětné převzetí.
12. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, a také v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Upozorňujeme na povinnost zajistit přednostní využití

- odpadů před jejich uložením na skládku. Dále upozorňujeme na povinnost původců stavebních a demoličních odpadů přednostně zabezpečit využívání těchto odpadů a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu následného recyklátu ke splnění jednoho z cílů POH JmK zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů.
13. Při realizaci stavby je třeba dbát na min. prašnost přijetím příslušných opatření (zkrápkění, čištění nákladních vozidel a komunikací znečištěných stavbou).
  14. Stavbou bude zasažena dřevina rostoucí mimo les s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm.. Proto je třeba podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění, požádat MěÚ Kuřim, odd. životního prostředí o souhlas s jejím kácením.
  15. Stavbou ani jejím provozem nesmí být nijak dotčeny ani poškozeny okolní lesní pozemky a lesní porosty. Nesmí být prováděny žádné zásahy do lesních pozemků a lesních porostů, lesní pozemky nelze využívat k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy ani stavebního odpadu.
  16. Podle § 22 zák.č. 20/1987 Sb., v platném znění, je stavebník povinen min. 30 dnů předem písemně ohlásit zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
  17. Po celou dobu realizace stavby musí být zajištěna bezpečnost chodců pohybujících se v okolí stavby.
  18. Dopravní řešení akce, včetně užití přechodného dopravního značení, musí být předem projednáno a odsouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘ Policie JmK a následně stanoveno příslušným silničním správním úřadem (Odborem dopravy MěÚ Kuřim) při jednání o zvláštním užívání komunikace. O povolení zvláštního užívání komunikace je třeba požádat min. 30 dnů před zahájením prací.
  19. Přeložka vodovodu podléhá vodoprávnímu povolení, které na základě žádosti vydá oddělení životního prostředí MěÚ Kuřim.
  20. Ke kolaudaci přeložky vodovodu je třeba předložit doklad o tom, že ve stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl.č. 409/2005 Sb., o hyg. požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
  21. Ke kolaudaci přeložky vodovodu je rovněž třeba předložit vyhovující laboratorní rozbor pitné vody ze stavby v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 vyhl.č. 252/2004 Sb., v platném znění. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola musí být zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.
  22. K zamezení přístupu na pozemky parc.č. 2275 a 2290/1 v k.ú. Kuřim dojde pouze po dobu provádění výměny vozovky (max. 1 měsíc). Při provádění demolice stávajícího mostu a výstavbě nového mostu budou tyto pozemky přístupné bez omezení.
  23. Po dobu zamezení přístupu na pozemky parc.č. 2275 a 2290/1 v k.ú. Kuřim bude ke každému pozemku zajištěno 1 parkovací místo pro potřebu majitelů těchto pozemků.
  24. Vjezdy na pozemky parc.č. 2275 a 2290/1 v k.ú. Kuřim budou vydlážděny zesílenou zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Odvodnění vjezdů bude provedeno betonovým šterbinovým žlabem, voda bude vyvedena do Kuřimky. Zbývající části pozemků dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
  25. Stavební výkop mostu bude v malé míře zasahovat do parc.č. 2275 v k.ú. Kuřim. Vjezd na parcelu bude zachován po celou dobu výstavby vyjma bodu 22, např. pomocí silničních panelů. Parcela bude sloužit jako sklad materiálu či jako meziskládka vytěžené zeminy. Bude zajištěn trvalý volný přístup do domu bez překážek.
  26. O vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu je třeba požádat Odbor dopravy MěÚ Kuřim.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

#### **Odůvodnění:**

Dne 8.2.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 9.2.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že uskutečněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schváleným Územním plánem Kuřim a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- KHS Jihomoravského kraje dne 7.9.2016 pod č.j. KHSJM 44687/2016/BM/HOK
- HZS Jihomoravského kraje dne 5.9.2016 pod ev.č. HSBM-3-21-54/1-OPST-2016
- MěÚ Kuřim, odbor dopravy dne 11.8.2016 pod č.j. MK/13754/16/OD
- MěÚ Kuřim, odbor životního prostředí dne 20.10.2016 pod č.j. MK/13894/16/OŽP
- MěÚ Kuřim, OŽP – les dne 9.11.2016 pod č.j. MK/19182/16/OŽP
- MěÚ Kuřim, OŽP – ochrana přírody a krajiny dne 1.11.2016 pod č.j. MK/18281/16/OŽP
- MěÚ Kuřim, vodoprávní úřad dne 3.11.2016 pod č.j. MK/18822/16/OSVO

Stavební úřad požadavky dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Mezi účastníky řízení byli, kromě žadatele (Města Kuřim), zahrnuti vlastníci stavbou dotčených a sousedních pozemků - Petr Horák, Marie Horáková, Martina Prachárová, Povodí Moravy, s.p. a Ing. Lubomír Stříž, vlastníci a správci dotčených sítí technické infrastruktury - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., GridServices, s.r.o. a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Ze strany účastníků řízení nebyly vzneseny žádné námítky k předmětu řízení ani k podkladům rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadatelé stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. František Macek  
vedoucí odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, nevyměřuje.

**Obdrží účastníci řízení:**

Město Kuřim, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

Petr Horák, [redacted]

Marie Horáková, [redacted]

Martina Prachárová, [redacted]

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 601 75 Brno 2

Ing. Lubomír Stříž, [redacted]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská č.p. 8, 101 00 Praha 10

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., Sv. Čecha č.p. 600/44, 664 34 Kuřim

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, 603 00 Brno 3

**Obdrží dotčené správní orgány:**

KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00 Brno 2

HZS Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1, 614 00 Brno

Městský úřad Kuřim, odd. životního prostředí, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

**Dále obdrží:**

Policie ČR, KŘ JMK, spec.prac. doprav.inž. BM a BO, Kounicova č.p. 687/24, 611 32 Brno 2  
vlastní
