
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2024_0098**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Lubošem Minářem, supervizorem, VFS Čechy východ

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(„**CETIN**“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.

Pr 162

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítě elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(„**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Faktura znamená daňový doklad nebo zálohový daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Podhořany u Nových Hradů spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „III/35722 Podhořany u Nových Hradů, opěrná zeď, SO 451 – přeložka CETIN a.s.“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 11. 10. 2024 vydané pod č.j. 285347/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Podhořany u N.Hradů, op. zeď SO451**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) zajistit rozhodnutí o povolení záměru o umístění stavby Překládky, přičemž stavba Překládky bude v žádosti o vydání povolení označena jako stavební objekt „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- b) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- c) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru předat společnosti CETIN toto rozhodnutí včetně grafické a dokladové části, a to zasláním na email kontaktní osobě ve věcech smluvních dle odst. 8.1. Smlouvy.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **243 908,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc devět set osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (**„Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“**). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5. Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu,

se změně písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3. a/nebo odst. 5.5. Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:
- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **30 639,- Kč** (slovy: třicet tisíc šest set třicet devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:



8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák

funkce: ředitel

8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.4. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.

9.5. Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

9.6. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.7. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty

údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.
- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

V Praze dne

V Pardubicích dne


Za CETIN:

Za Stavebníka:

Luboš Minář
supervizor, VFS Čechy východ
na základě pověření
CETIN a.s.
(podepsáno elektronicky)

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
(podepsáno elektronicky)

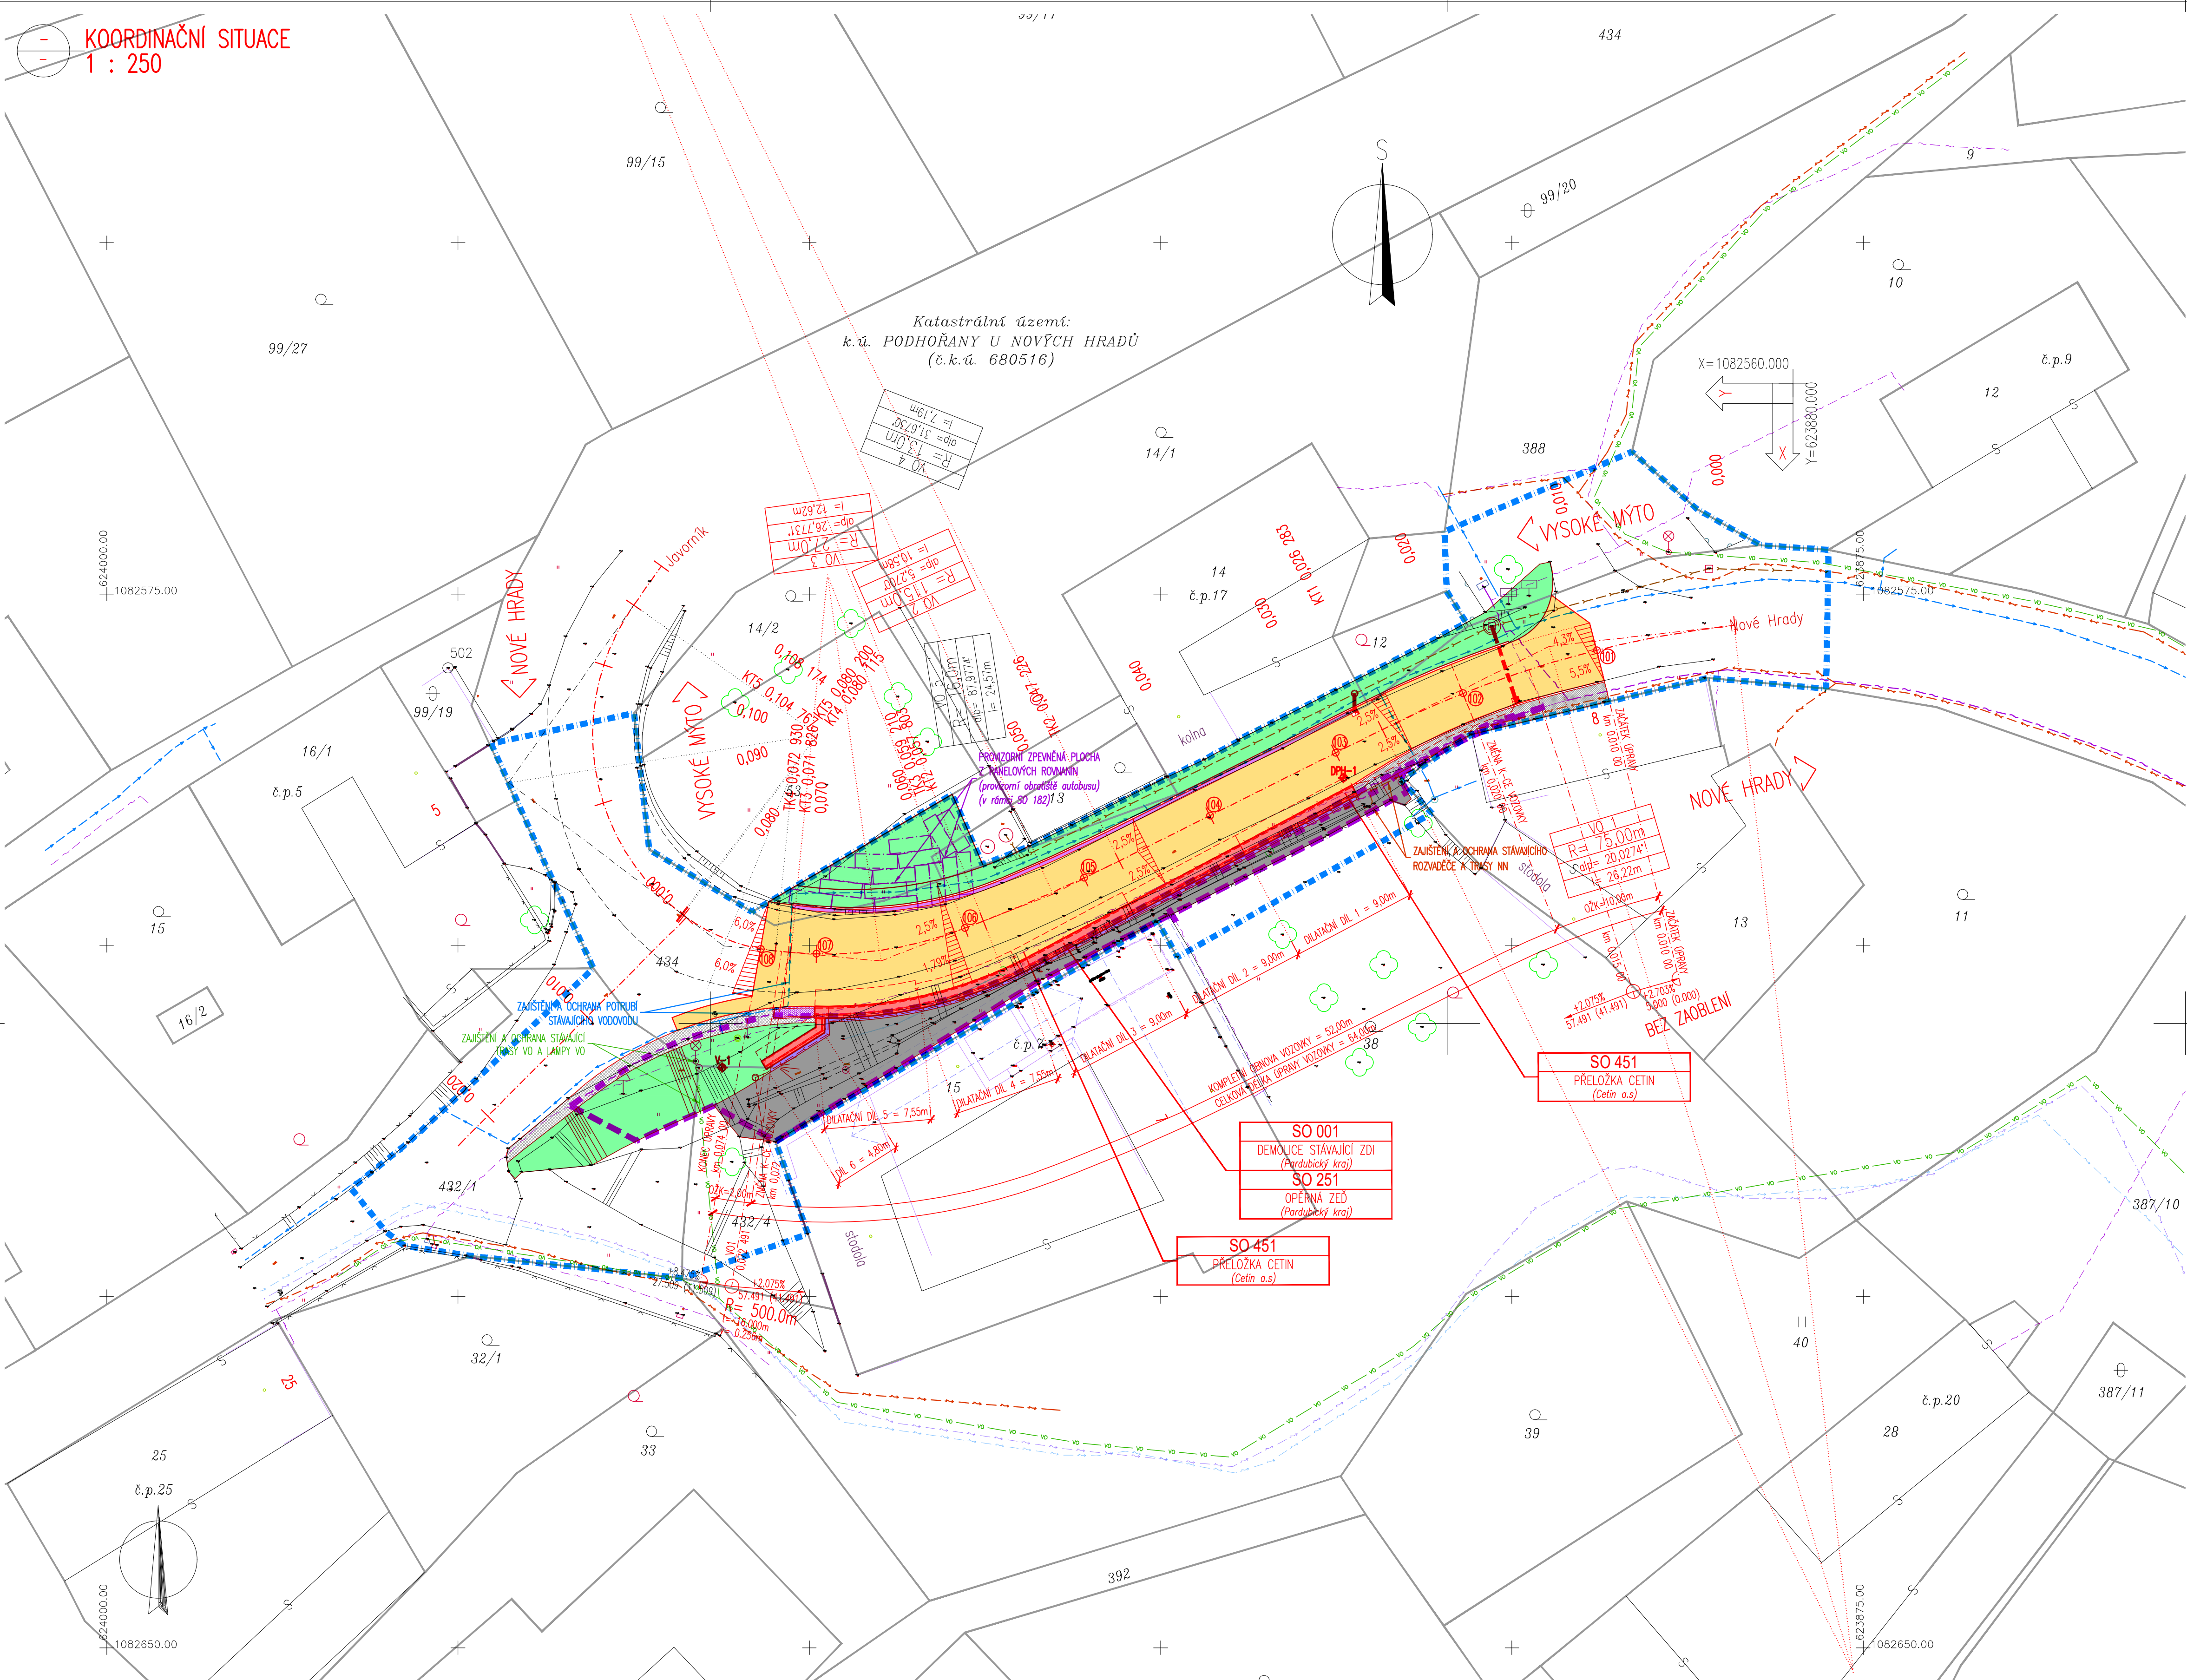

KOORDINAČNÍ SITUACE
1 : 250


- LEGENDA POVRCHŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ASFALTO-BETONOVÁ VOZOVKA
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - TĚŽKÉ KAMENNÉ ROVNANINY
 - ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY
 - ODVODŇOVACÍ PROUŽKY (silniční přídlažba)
 - OHUMUSOVÁNÍ A OSEŤ
 - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
 - NOVÁ KONSTRUKCE
 - OBNOVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV:
- STÁVAJÍCÍ STAV
 - STÁVAJÍCÍ STAV – BUDOVY
 - HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
 - HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
 - PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

- LEGENDA – NAVRHOVANÝ STAV:
- NAVRHOVANÝ STAV
 - OBNOVA ULIČNÍ VPUSTI
 - OCHRANA STROMŮ (dle ČSN 83 9061)
 - STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
 - OBNOVA A ÚPRAVA VODOROVNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- LEGENDA ZÁBORŮ STAVBY:
- DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY (= obvod staveniště)
(po dobu výstavby do 12 měsíců)

- LEGENDA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ:
- POLOHA VRTŮ IG-PRŮZKUMU



- VYTYČOVANÉ BODY:
- OSA KOMUNIKACE III/37522:
- SOUBŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK
- | Č.B.: | Y[m] | X[m] | POZNÁMKA: |
|-------|------------|-------------|-----------|
| 101 | 623893.974 | 1082579.007 | ZÚ |
| 102 | 623903.483 | 1082582.080 | |
| 103 | 623912.541 | 1082586.308 | |
| 104 | 623921.489 | 1082590.774 | |
| 105 | 623930.451 | 1082595.210 | |
| 106 | 623938.932 | 1082598.793 | |
| 107 | 623948.494 | 1082600.619 | |
| 108 | 623953.479 | 1082600.276 | KÚ |
- POZNÁMKY – OBECNĚ:
- PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
 - ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb
 - ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
 - ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
 - TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA č.9
 - TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.


- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ SDELOVACÍHO VEDENÍ – Cetin a.s.
 - SDELOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s.
(zaměřený i nezaměřený přáběh metalického kabelu)
 - SDELOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s.
(zaměř. i nezaměř. přáběh optického kabelu, HDPE trubky či soukenné opt. a metal. kabelu)
 - EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ – VS CHRUDIM a.s.
 - EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.
 - EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN-VO (do 1kV) – OBEC LEŠTINA
 - KANALIZACE – OBEC LEŠTINA
- LEGENDA DEFINITIVNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- DEFINITIVNÍ TRASA PODZEMNÍ SDELOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA. III
- LEGENDA PROVIZORNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- PROVIZORNÍ TRASA PODZEMNÍ SDELOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA. III

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
- SO 001 – DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDI
 - SO 182 – DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
 - SO 251 – OPĚRNÁ ZEď
 - SO 451 – PŘELOŽKA CETIN

SOUBŘADNÝ SYSTÉM:		S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:		Bov		
KRESLIL:	KOLEKTIV			
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: PARUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: PODHOŘANY U N.H.	STUPEŇ:	DUSP
INVESTOR: PARUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARUBICE	ZAK.ČÍSLO:	3116-24-3		
AKCE: III/35722 PODHOŘANY U NOVÝ HRADŮ, OPĚRNÁ ZEď	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	3116		
OBJEKT: C. SITUACNÍ VÝKRESY	DATUM:	03/2025		
OBSAH:	FORMÁT:	BxA4		
	MĚŘÍTKO:	1 : 250		
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	C.3.

KONCEPT

C.
DUSP

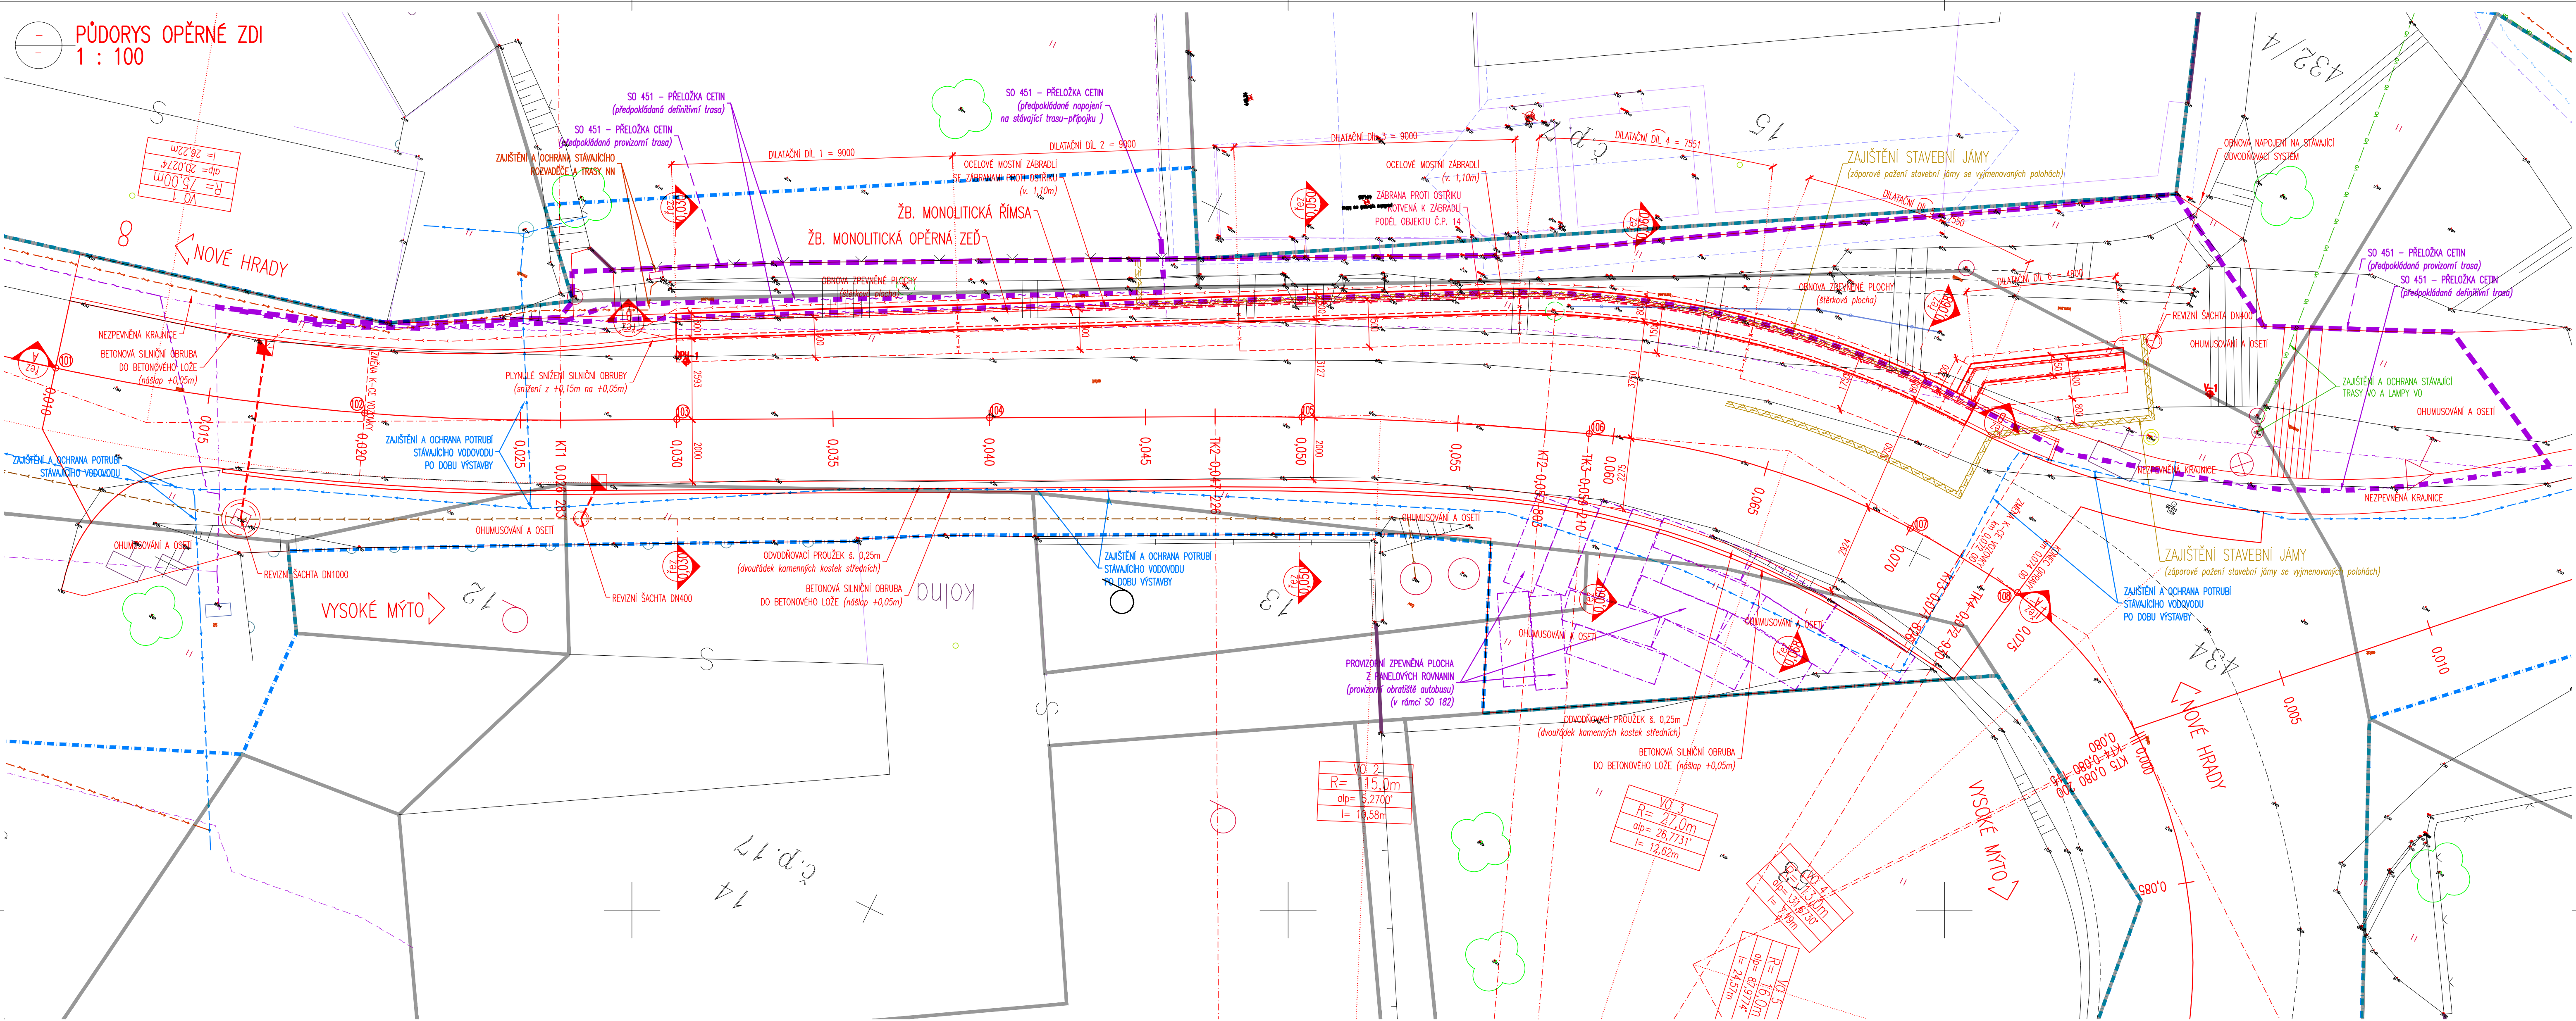

POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY: dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2		
ŽB. MONOLITICKÉ ZÁKLADY	C30/37	XA1 – CI 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÁ ZĚď	C30/37	XF2, XD1 – CI 0,40; Dmax 22 – S4
ŽB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA	C30/37	XF4, XD3 – CI 0,40; Dmax 16 – S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY: dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A2		
PODKLADNÍ BETON (v dosahu CHR.L)	C20/25n	XF3 – CI 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON (mimo dosah CHR.L)	C16/20	X0
MEZEROVITÝ BETON (dle TKP 18.)	MCB-8	
SPÁROVÁNÍ DLAŽEB	CEMENTOVÁ MALTA	XF4

VÝZTUŽ: označení dle ČSN EN 10080, EN 10138	
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

KONSTRUKČNÍ OCEL: označení dle ČSN EN 10080, A TKP 19A	
OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ	S235 JR+AR, S235 JRH
MIKROPILOTY	S355 JR a lepší

SEZNAM SKLADEB VOZOVEK:

SKLADBA VOZOVKY "A" (KOMPLETNÍ OBNOVA VOZOVKY NA PŘEDMOSTÍCH)			
ASFALT.BET. PRO OBRUS. VRSTVY MOD.ACO 11S	PMB 45/80-65	40 mm (ČSN EN 13108-1 ed2)	
SPOL. POST. KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PS-CP	0,35kg/m2 (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)	
ASFALT.BET. PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIF.	ACL 16+ PMB 50/70	50 mm (ČSN EN 13108-1 ed2)	
SPOL. POST. KATAKT. ASF.EM.MOD.	PS-CP	0,35kg/m2 (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)	
ASFALTOVÝ BETON MODIF.	ACP 16+ PMB 50/70	50 mm (ČSN EN 13108-1 ed2)	
INFILTR. POSTŘÍK. KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PI-C	1,0kg/m2 (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENVO	MZK	170 mm (ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 ed2)	
ŠTĚRKODRT (fr. 0-32mm)	SDa	250 mm (ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 ed2)	
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY			

SKLADBA VOZOVKY "B" (OŽK – OBNOVA ŽIVČNEHO KRYTÍ NA PŘEDMOSTÍCH)			
ASFALT.BET. PRO OBRUS. VRSTVY MOD.ACO 11S	PMB 45/80-65	40 mm (ČSN EN 13108-1 ed2)	
SPOL. POST. KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PS-CP	0,35kg/m2 (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)	
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZR. MODIF.	ACL 16+ PMB 50/70	500 mm (ČSN EN 13108-1 ed2)	
SPOL. POST. KATAKT. ASF.EM.MOD.	PS-CP	0,5kg/m2 (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)	
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY			

SKLADBA VOZOVKY "C" (OBNOVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŠTĚRKOVÝ KRYTÍ)			
uzavření krytu	LOMOVÉ VÝSIVKY (25-35kg/m2; fr. 0-22mm)	– mm	Edef= 90MPa
ložní vrstva	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENVO	MZK	Edef= 45MPa
podkladní vrstva	ŠTĚRKODRT	SDb	Edef= 30MPa
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY			

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 – DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDI
- SO 182 – DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
- SO 251 – OPĚRNÁ ZĚď
- SO 451 – PŘELOŽKA CETIN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ SĚLOVACÍHO VEDENÍ – Cetin a.s.
- SĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s. (zanedbat i nezaměstnat práci mediálního kabelu)
- SĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s. (zanedbat i nezaměstnat práci optického kabelu, HDPE trubky či souběh opt. a metal. kabelu)
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – VS CHRUDIM a.s.
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN-VO (do 1kV) – OBEC LEŠŤINA
- KANALIZACE – OBEC LEŠŤINA

LEGENDA DEFINITIVNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- DEFINITIVNÍ TRASA PODZEMNÍ SĚLOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLADANÁ TRASA !!!

LEGENDA PROVIZORNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PROVIZORNÍ TRASA PODZEMNÍ SĚLOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLADANÁ TRASA !!!


VYTÝČOVANÉ BODY:

OSA KOMUNIKACE III/37522:			
SOUDRNÝ SYSTÉM S-JTSK			
Č.B.:	Y[m]	X[m]	POZNAMKA:
101	623893.974	1082579.007	Z0
102	623903.483	1082582.080	
103	623912.541	1082586.308	
104	623921.489	1082590.774	
105	623930.451	1082595.210	
106	623938.932	1082598.793	
107	623949.494	1082600.619	
108	623953.479	1082600.276	K0

POZNÁMKY – OBECNĚ:

- PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
 - ČSN 73 0420 – Přesnost vytýčování staveb
 - ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytýčovací výkresy staveb
 - ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
 - TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 2.9
 - TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.



MĚŘITKO:

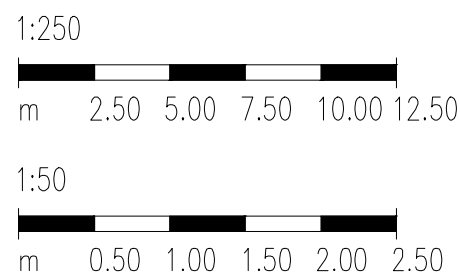

KONCEPT


SO 251
DUSP

SOUDRNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bv	
KRESLIL:	KOLEKTIV	ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: PODHORANY U N.H.
KRAJ: PARUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: PODHORANY U N.H.	STUPEŇ:
INVESTOR: PARUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARUBICE	ZAK.ČÍSLO:	3116-24-3	DUSP
AKCE:	III/37522 PODHORANY U NOVÝ HRADŮ, OPĚRNÁ ZĚď	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	3116
OBJEKT: D.1.3. SO 251 – OPĚRNÁ ZĚď	DATUM:	03/2025	8x44
OBSAH:	MĚŘITKO:	1:100	ČÍSLO SOUPRAVY:
PŮDORYS	ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.3.3.	

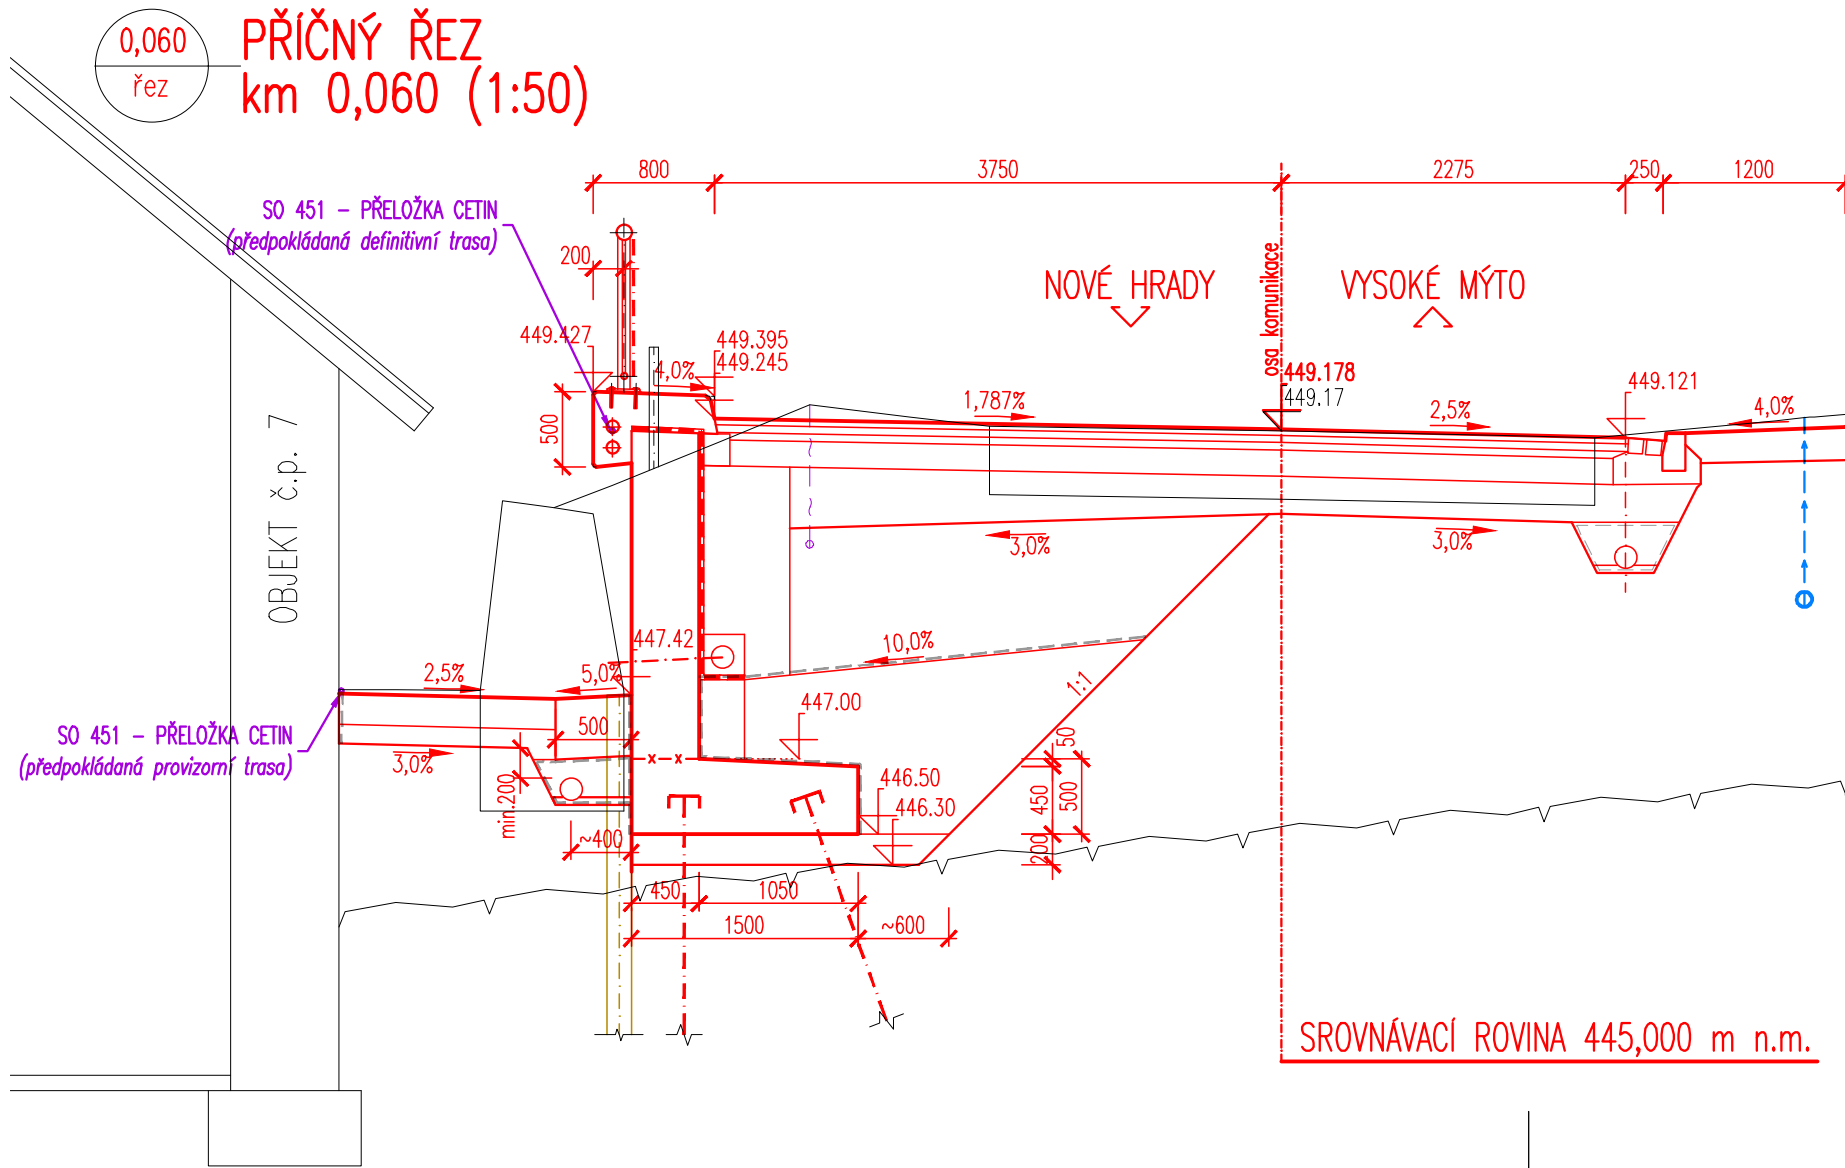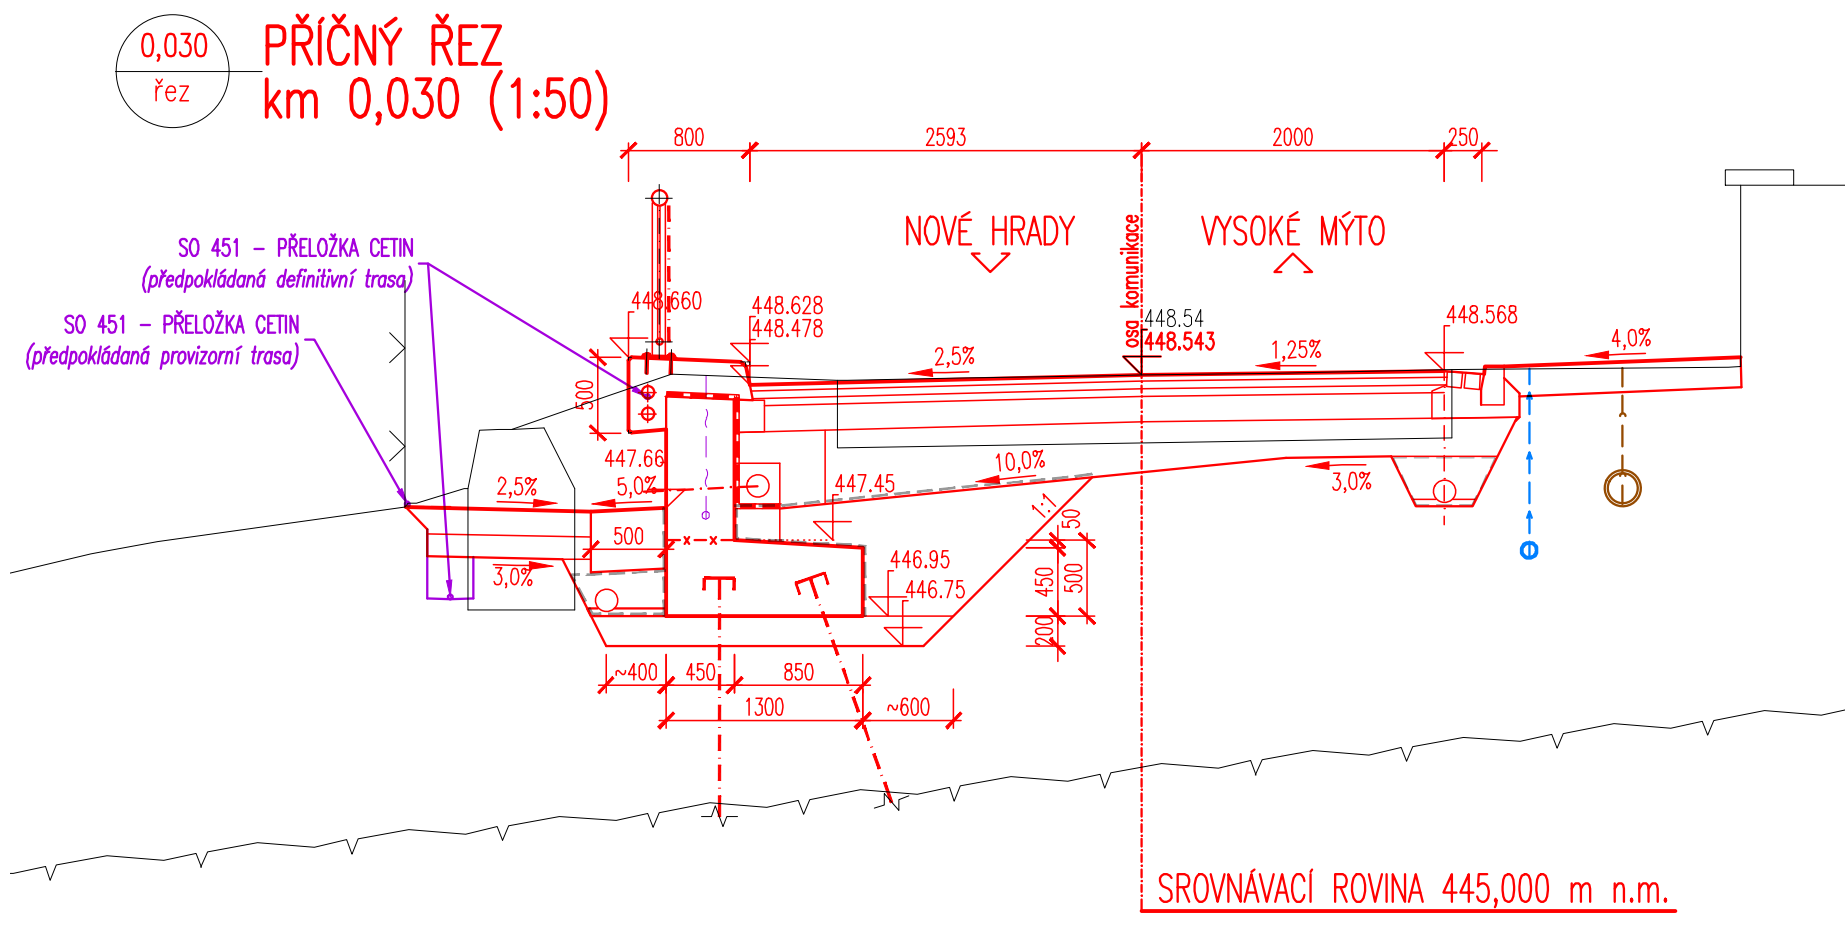

0,068
řez

PŘÍČNÝ ŘEZ (VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ)
km 0,068 (1:25)

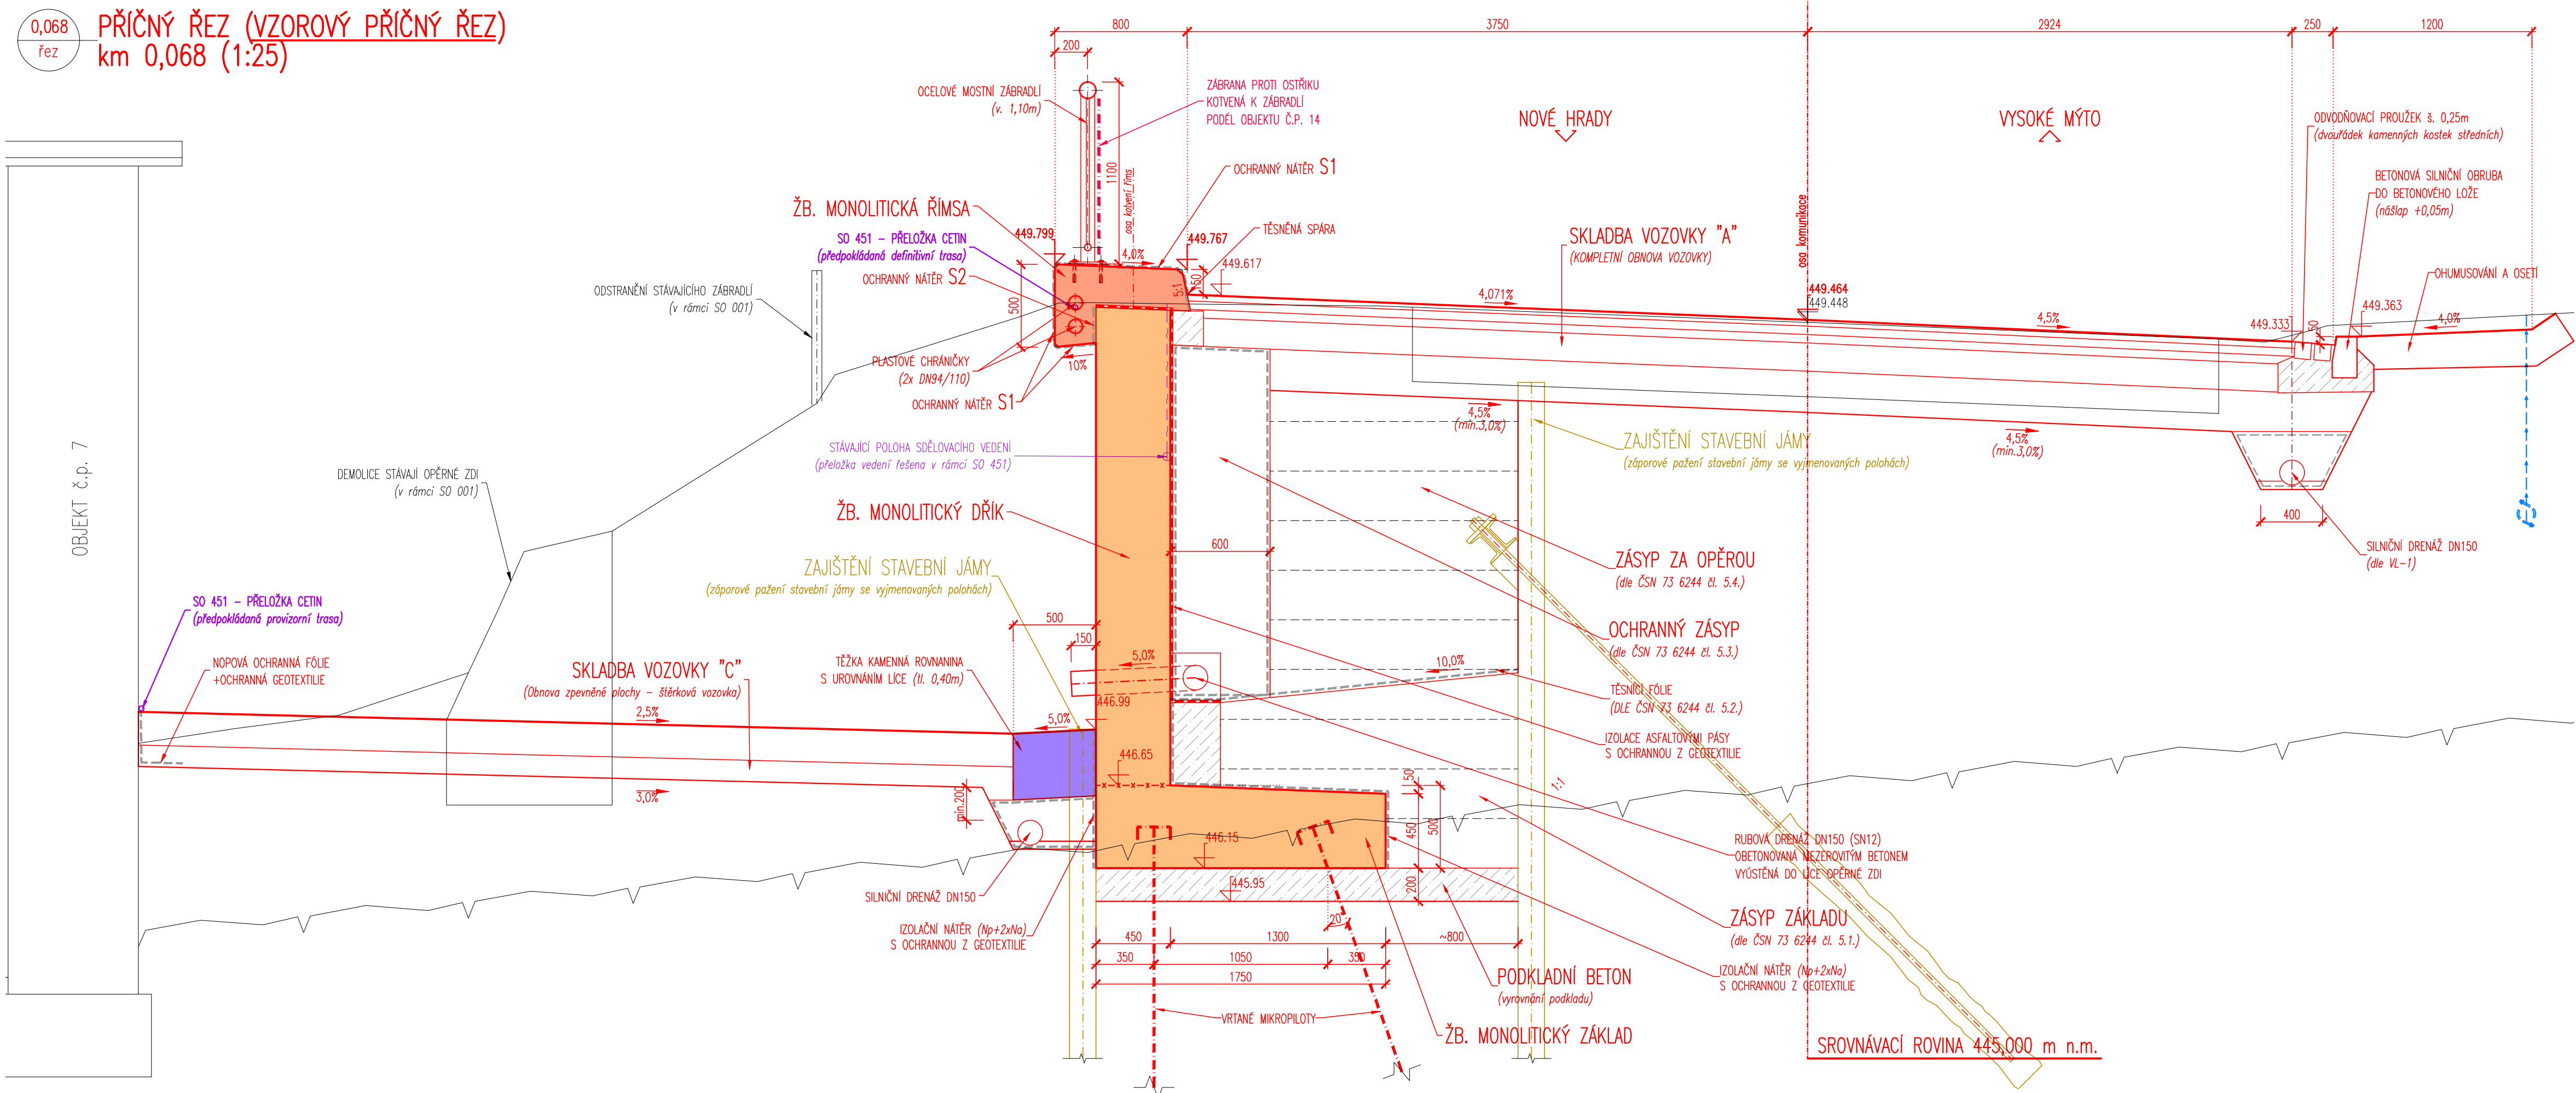

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ SĚLOVACHO VEDENÍ – Cetin a.s.
- SĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s. (zaměřený i nezaměřený průběh metalického kabelu)
- SĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – Cetin a.s. (zaměř. i nezaměř. průběh optického kabelu, KDPÉ trubky či souběh opt. a metal. kabelu)
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – ČEZ Distribuce a.s.
- VODOVODNÍ POTRUBÍ – VS CHRUDIM a.s.
- EL. NN VEDENÍ PODZEMNÍ (do 1kV) – VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S.
- EL. VEDENÍ PODZEMNÍ NN-VO (do 1kV) – OBEC LEŠŤINA
- KANALIZACE – OBEC LEŠŤINA

LEGENDA DEFINITIVNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- DEFINITIVNÍ TRASA PODZEMNÍ SĚLOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLADANÁ TRASA III


LEGENDA PROVIZORNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PROVIZORNÍ TRASA PODZEMNÍ SĚLOVACÍ – CETIN a.s. -> PŘEDPOKLADANÁ TRASA III

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 – DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDI
- SO 182 – DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
- SO 251 – OPĚRNÁ ZEď
- SO 451 – PŘELOŽKA CETIN

MĚŘÍTKO:

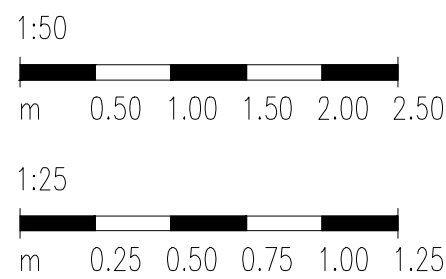

SEZNAM SKLADEB VOZOVEK:

SKLADBA VOZOVKY "A"

(KOMPLETNÍ OBNOVA VOZOVKY NA PŘEDMOSTÍCH)

ASFALT.BET. PRO OBRUS. VRSTVY MOD. ACO 115 PMB 45/80-65	40 mm (ČSN EN 13108-1 ed.2)	
SPOL. POST. KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PS-CP	0,35kg/m ² (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)
ASFALT.BET. PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIF.	ACL 16+ PMB 50/70	50 mm (ČSN EN 13108-1 ed.2)
SPOL. POST. KATAKT. ASF.EM.MOD.	PS-CP	0,35kg/m ² (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)
ASFALOVÝ BETON MODIF.	ACP 16+ PMB 50/70	50 mm (ČSN EN 13108-1 ed.2)
INFILTR. POSTŘIK KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PI-C	1,0kg/m ² (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KÁMENIVO	MZK	170 mm (ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 ed.2)
ŠTERKODRT (fr. 0-32mm)	SdA	250 mm (ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 ed.2)
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		560 mm

SKLADBA VOZOVKY "B"

(OŽK – OBNOVA ŽIVNĚHO KRYTÍ NA PŘEDMOSTÍCH)

ASFALT.BET. PRO OBRUS. VRSTVY MOD. ACO 115 PMB 45/80-65	40 mm (ČSN EN 13108-1 ed.2)	
SPOL. POST. KATIONAKT. ASF. EM. MOD.	PS-CP	0,35kg/m ² (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)
ASFALOVÝ BETON HRUBOZR. MODIF.	ACL 16+ PMB 50/70	500 mm (ČSN EN 13108-1 ed.2)
SPOL. POST. KATAKT. ASF.EM.MOD.	PS-CP	90 mm (ČSN 73 6129; ČSN EN 13808)
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		90 mm

SKLADBA VOZOVKY "C"

(OBNOVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŠTERKOVÝ KRYT)

uzavřený krytí	LOMOVÉ VÝSIVKY (25-35kg/m ² ; fr. 0-22mm)	– mm	E _{del} = 90MPa
ložní vrstva	MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KÁMENIVO	MZK 180 mm (ČSN EN 13285 ed.2)	E _{del} = 45MPa
podkladní vrstva	ŠTERKODRT	SdA 150 mm (ČSN EN 13285 ed.2)	E _{del} = 30MPa
CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		330 mm	

POUŽITÉ MATERIÁLY:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206-1:2013

ŽB. MONOLITICKÉ ZAKLADY

ŽB. MONOLITICKÁ ZEď

ŽB. MONOLITICKÁ ŘÍMSA

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206-1:2013

PODKLADNÍ BETON (v dosahu CHR.L)

PODKLADNÍ BETON (mimo dosah CHR.L)

MEZEROVITÝ BETON (dle TKP 18.)

SPAROVÁNÍ DLAŽEB

VÝZTUŽ:

označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

KONSTRUKČNÍ OCEĽ:

označení dle ČSN EN 10080, A TKP 19A

OCEĽOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

MIKROPILOTY

C30/37 XA1 – C1 0,40; D_{max} 22 – S4
C30/37 XF2, XD1 – C1 0,40; D_{max} 22 – S4
C30/37 XF4, XD3 – C1 0,40; D_{max} 16 – S4

C20/25n XF3 – C1 1,0; D_{max} 22 – S2
C16/20 X0
MCB-8
CEMENTOVÁ MALTA XF4

B 500B

S235 JR+AR, S235 JRH
S355 JR a lepší

KONCEPT

SO 251
DUSP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
KRESLIL:	KOLEKTIV		
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: OST. NAD ORLICÍ	OBEC: PODHORANY U N.H.	
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			
AKCE:	III/35722 PODHORANY U NOVÝ HRADŮ, OPĚRNÁ ZEď		
OBJEKT:	D.1.3. SO 251 – OPĚRNÁ ZEď		
OBSAH:	PŘÍČNÉ ŘEZY		
		STUPEŇ:	DUSP
		ZAK.ČÍSLO:	3116-24-3
		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	3116
		DATUM:	03/2025
		FORMÁT:	BxA4
		MĚŘÍTKO:	1:50, 25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			D.1.3.5.

[illegible]

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ASFALTO-BETONOVÁ VOZOVKA
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	TĚŽKÉ KAMENNÉ ROVNANINY
	ŽB, MONOLITICKÉ ŘÍMSY
	ODVODŇOVACÍ PŘÍKRYTÍ (svislými prázdná)
	CHUMISOVÁNÍ A OŠETŘÍ
	NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
	NOVÁ KONSTRUKCE
	OBNOVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY

STÁVAJÚCI STAV
STÁVAJÚCI STAV – BUDOVY
HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

	NAVÝSOVNÝ STAV
	ODNOVA ULIČNÍ VPUSTI
	OCHRANA STROMŮ (dle ČSN 83 9061)
	STROMY URČENÉ K DOSTRANĚNÍ
	ODNOVA A ÚPRAVA VOZOVORNOHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

LEGENDA ZÁBORŮ STAVBY:

LEGENDA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ:
V1 POLOHA VRTŮ IG-PRŮZKUMU

1:250

m 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50

OSA KOMUNIKACE III/37522:			
SOUDARNÝ SYSTÉM S-JISK			
C.B.:	$\gamma[m]$	$X[m]$	POZNÁMKA:
101	623893,974	1082579,007	ZO
102	623903,483	1082582,080	
103	623912,541	1082586,308	
104	623921,489	1082590,774	
105	623930,451	1082595,210	
106	623938,932	1082598,793	
107	623949,494	1082600,619	
108	623953,479	1082600,276	KO

- PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘIPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 0420 – Přesnost vytýčování staveb
ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytýčovací výkresy staveb
ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 2.9
TKP KAPITOLA 16, 18, A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

LEGENDA PROVIZORNÝCH TRAS PRŮMYŠLOVÝCH SÍTÍ:
PRŮMYŠLOVNÍ TRASA PODZEMNÍ SÍŤOVACÍ - ČETNÍ O.S. -> PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA, II

SO 001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDI
SO 182 - DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
SO 451 - PŘELOŽKA CETIN

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	litv
KRISTAL:	KOLEKT

TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAR
---------------------	----------

PLÁN PRŮJEKTU:	ING. FR.
KRAJ PRŮJEKTU:	OKRES:

PAGE: III/35722 POF

OBJEKT: C. SITUAČNÍ V

KOORDINAČNÍ S

KONCEPT

**C.
DUSP**

FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MYŠKOV
EWA - MOSKOWSKOJE CZ[illegible]

003P	
3116-24	

Control Circle:	3116
-----------------	------

DATE:	03/2025
NAME:	8x44

AltKO:	1 : 250
--------	---------

ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
	C 7

6.3.

polohopis_definitivní řešení



LEGENDA: STAVAJÍCÍ STAV:
STAVAJÍCÍ STAV
STAVAJÍCÍ STAV – BUDOVY
HRANICE PARCEL DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
PARCELNÍ ČÍSLO DLE KATASTRÁLNÍ MAPY


 NAVRHOVANÝ STAV
 OBNOVĚ ULIČNÍ VPUSTI

 OCHRANA STROMŮ (dle ČSN 83 9061)
 STROMY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ

 OBNOVĚ A ÚPRAVA VOZOVOROVÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

LEGENDA ZÁBORŮ STAVBY:

LEGENDA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ:

1:250



m 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50

Č.B.:	$\gamma[m]$	$\chi[m]$	POZNÁMKA:
101	623893,974	1082579,007	Z0
102	623903,483	1082582,080	
103	623912,541	1082586,308	
104	623921,489	1082590,774	
105	623930,451	1082595,210	
106	623938,932	1082598,793	
107	623949,494	1082600,619	
108	623953,479	1082600,276	K0

- PŘESNOST VYTÝČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
 ČSN 73 0420 – Přesnost vytýčování staveb
 ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví, Vytýčovací výkresy staveb
 ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
 TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 2.9
 TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUHRNNĚ

1994-1995	1996-1997	1998-1999	2000-2001	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	2016-2017	2018-2019	2020-2021	2022-2023	2024-2025	2026-2027	2028-2029	2030-2031	2032-2033	2034-2035	2036-2037	2038-2039	2040-2041	2042-2043	2044-2045	2046-2047	2048-2049	2050-2051	2052-2053	2054-2055	2056-2057	2058-2059	2060-2061	2062-2063	2064-2065	2066-2067	2068-2069	2070-2071	2072-2073	2074-2075	2076-2077	2078-2079	2080-2081	2082-2083	2084-2085	2086-2087	2088-2089	2090-2091	2092-2093	2094-2095	2096-2097	2098-2099	2100-2101	2102-2103	2104-2105	2106-2107	2108-2109	2110-2111	2112-2113	2114-2115	2116-2117	2118-2119	2120-2121	2122-2123	2124-2125	2126-2127	2128-2129	2130-2131	2132-2133	2134-2135	2136-2137	2138-2139	2140-2141	2142-2143	2144-2145	2146-2147	2148-2149	2150-2151	2152-2153	2154-2155	2156-2157	2158-2159	2160-2161	2162-2163	2164-2165	2166-2167	2168-2169	2170-2171	2172-2173	2174-2175	2176-2177	2178-2179	2180-2181	2182-2183	2184-2185	2186-2187	2188-2189	2190-2191	2192-2193	2194-2195	2196-2197	2198-2199	2200-2201	2202-2203	2204-2205	2206-2207	2208-2209	2210-2211	2212-2213	2214-2215	2216-2217	2218-2219	2220-2221	2222-2223	2224-2225	2226-2227	2228-2229	2230-2231	2232-2233	2234-2235	2236-2237	2238-2239	2240-2241	2242-2243	2244-2245	2246-2247	2248-2249	2250-2251	2252-2253	2254-2255	2256-2257	2258-2259	2260-2261	2262-2263	2264-2265	2266-2267	2268-2269	2270-2271	2272-2273	2274-2275	2276-2277	2278-2279	2280-2281	2282-2283	2284-2285	2286-2287	2288-2289	2290-2291	2292-2293	2294-2295	2296-2297	2298-2299	2300-2301	2302-2303	2304-2305	2306-2307	2308-2309	2310-2311	2312-2313	2314-2315	2316-2317	2318-2319	2320-2321	2322-2323	2324-2325	2326-2327	2328-2329	2330-2331	2332-2333	2334-2335	2336-2337	2338-2339	2340-2341	2342-2343	2344-2345	2346-2347	2348-2349	2350-2351	2352-2353	2354-2355	2356-2357	2358-2359	2360-2361	2362-2363	2364-2365	2366-2367	2368-2369	2370-2371	2372-2373	2374-2375	2376-2377	2378-2379	2380-2381	2382-2383	2384-2385	2386-2387	2388-2389	2390-2391	2392-2393	2394-2395	2396-2397	2398-2399	2400-2401	2402-2403	2404-2405	2406-2407	2408-2409	2410-2411	2412-2413	2414-2415	2416-2417	2418-2419	2420-2421	2422-2423	2424-2425	2426-2427	2428-2429	2430-2431	2432-2433	2434-2435	2436-2437	2438-2439	2440-2441	2442-2443	2444-2445	2446-2447	2448-2449	2450-2451	2452-2453	2454-2455	2456-2457	2458-2459	2460-2461	2462-2463	2464-2465	2466-2467	2468-2469	2470-2471	2472-2473	2474-2475	2476-2477	2478-2479	2480-2481	2482-2483	2484-2485	2486-2487	2488-2489	2490-2491	2492-2493	2494-2495	2496-2497	2498-2499	2500-2501	2502-2503	2504-2505	2506-2507	2508-2509	2510-2511	2512-2513	2514-2515	2516-2517	2518-2519	2520-2521	2522-2523	2524-2525	2526-2527	2528-2529	2530-2531	2532-2533	2534-2535	2536-2537	2538-
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

LEGENDA DEFINITIVNÍCH TRAS INVENZORNÍCH SÍTÍ:
 ■ — ■ — ■ — ■ DEFINITIVNÍ TRASA PODZEMNÍ SDOVLÁČI - CETIN, n.s. → PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA !!!
 LEGENDA DEFINITIVNÍCH TRAS INVENZORNÍCH SÍTÍ:
 ■ — ■ — ■ — ■ DEFINITIVNÍ TRASA PODZEMNÍ SDOVLÁČI - CETIN, n.s. → PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA !!!

SO 001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ ZDI
SO 182 - DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 251 - OPĚRNÁ ZEĎ
SO 451 - PŘELOŽKA CETIN

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV

TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. J.
---------------------	---------

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. I.
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES:

ANCC: III/35722 PO

OBJEKT: C. SITUAČNÍ

KOORDINAČNÍ

ANTWERP DOORWYK	<i>Antwerpen</i>
IAN BURSA	<i>Antwerpen</i>

FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ	
OSTRÁVSKÉ NAD DRACI	OBEC: DOUBRAVSKÝ II. N.H.

DHOŘANY U NOVÝ HRADŮ.

VÝKRESY

SITUACE STAVBY

NBS
PROJEKT

STUDY	DISC
-------	------

ARCHIVNI ČÍSLO:	3116
-----------------	------

FORMAT:	8xA4
MÉRITO:	1 : 250

C.3.

KONCEPT

Název stavby: III35722 Podhorany u Novych Hradu, opěrná zeď

Rekapitulace nákladů:	
PŘÍPRAVA	22 840,08 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	60 646,15 Kč
MONTÁŽ	81 702,95 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	7 799,24 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	30 908,94 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	21 433,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč
Celkové náklady:	243 908 Kč
z toho Příprava:	30 639 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	173 837,12 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	70 070,82 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 799,66 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		17040.42 J'	17 040,42 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		155.00 m	3 809,90 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		12300.00 J'	12 300,00 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		35.00 m	25 034,80 Kč
958755 S	Rýha v chodníku 50/130		5.00 m	8 845,75 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		20.00 m	9 173,40 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		90.00 m	1 482,30 Kč
MONTÁŽ				
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		205.00 m	11 943,30 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks	410,26 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		11.00 ks	520,52 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		11.00 ks	347,49 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		2.00 ks	220,98 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		46.00 ks	1 453,14 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek		6.00 ks	8 985,24 Kč
958593 S	Provádění PEW o víkendu		2.00 ks	30 062,34 Kč

957753 S	Realizace tratě síťové dohodou projektová rezerva	19680.00 J'	19 680,00 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	4814.22 JV	4 814,22 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	3 265,46 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	7 799,24 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 441,94 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	15000.00 J'	15 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 154,44 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	7 312,56 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		55.00 ks	2 460,70 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		5.00 m	20,60 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		60.00 m	282,60 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		170.00 m	6 388,60 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		35.00 m	689,50 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		3.00 ks	784,47 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		10.00 ks	264,90 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		6.00 ks	3 526,50 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem		65.00 m	3 528,85 Kč
302388 S	Trubka vrapovaná 75/61 s lankem		90.00 m	3 189,60 Kč
309759 S	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50		4.00 ks	297,00 Kč
