

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

ev.č. 0950/2025/OI

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2024/00148**

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Ostrava

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená [REDACTED]
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
datová schránka: qa7425t
(dále jen „**CETIN**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava 729 30
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Zastoupená: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora
Adresa elektronické podatelny: posta@ostrava.cz
datová schránka: ID datové schránky: 5zubv7w
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Mariánské Hory spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 18.10.2023 vydané pod čj. 193857/23, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit geodetické vytyčení hranic pozemků související s Překládkou;
- (ii) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) a zálohovou platbu dle odst. 6.1 písm. (b) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2.
- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.160.955,- Kč** (slovy: jeden milion jedno sto šedesát tisíc devět set padesát pět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do **tří (3)** měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
 Registr smluv: ANO

- pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady Překládky ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit následovně:

- (a) úhradou nákladů na Přípravu Překládky ve výši **48.173,- Kč** (slovy: čtyřicet osm tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých) na základě faktury; fakturu vystaví společnost CETIN do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- (b) zálohovou platbou ve výši **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých) (dále jen „**Záloha**“); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva;
- (c) úhradou doplatku na základě faktury na celkovou výši nákladů Překládky; fakturu vystaví společnost CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30)

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) tohoto odstavce 6.1 Smlouvy.

- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Faktury či výzva k úhradě Zálohy budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.
- 6.4 Jakoukoliv fakturu či výzvu k úhradě Zálohy vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury či výzvy k úhradě Zálohy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na účet společnosti CETIN určený na fakturu či ve výzvě k úhradě Zálohy.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením faktury či výzvy k úhradě Zálohy, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka není nejpozději poslední den splatnosti připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Riger
funkce: náměstek primátora
e-mail: posta@ostrava.cz, [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7)

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
 Registr smluv: ANO

- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoliv jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
- Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
- Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
- 12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00148
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030005705
Registr smluv: ANO

Doložka

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 06418/RM2226/92 ze dne 11.02.2025.

CETIN:

Stavebník:

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

CETIN a.s.

Statutární město Ostrava

Ing. Břetislav Riger
Náměstek primátora

CETIN, a.s.

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE


Kategorie 2 - Přenosová síť (TN)
Podkategorie 1 - Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopů
Číslo SAP
Číslo interní 23443/24/0021
Schvalování akce 2 - kolové schvalování
Název

VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců

Budoucí uživatel CETIN a.s.

Zpracovatel

Předkladatel Vedoucí:
Manažer:



Schvaluje

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců
Kategorie:	2 - Přenosová síť (TN)
Podkategorie:	1 - Opt.kab a trubičk.syst vč. HDPE a výkopů
Typ investice:	VPIC
Důvod 1:	
Číslo interní:	23443/24/0021
Prvek SPP:	
ABC:	
HOST:	
ATÚ:	

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0.000 km	kmp mk
100200_Délka metalických kabelů	0.000 km	kmk mk
100700_Délka nadzemní tratě	0,000 km	km vyk
100100_Délka párů v metalických kabelech	0,000 km	km kv
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.000 km	kmo kv
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.
100400_Páry zakončené v účast. Rozvaděčích	0 pár	
100900_Počet bytových domů	0 BD	
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj	
100500_Počet rodinných domů	0 RD	
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj	

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka Cetin:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-vykazovaný:	0tis. Kč
Materiál zhotovitele-nevykazovaný:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč
Ostatní:	0 tis. Kč
Provozní práce:	0 tis. Kč
VBŘ příprava + realizace:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis.Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis.Kč

Územního rozhodnutí zajistí investor:

Termíny:

Platnost ÚR od:

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace:

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přejímce (Plán):

1.2 Účel stavby:

SD stavby “ VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců“.

Předmětem stavby je vynucená přeložka a ochrana vedení sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s. z důvodu rekonstrukce ulice Přemyslovců v Ostravě, dojde ke střetu se SEK. Je nutné ochránit a stranově přeložit trubky HDPE a metalické kabely.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka Cetin, a.s., podklady TEDO a situace projektu poskytnutá investorem a projektantem.

2.2 Navrhované řešení:

Dle projektové dokumentace stavby, kterou zpracovala Ing. Roman Čechák, Signal KAMARO PROJEKT, svým rozsahem: "Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců" zasahuje do stávajícího zařízení a vyvolala tak přeložky SEK CETIN. Přeložka se týká podzemního metalického vedení a trubek HDPE pro optické kabely. Je potřeba ochránit a stranově přeložit trubky HDPE a metalické kabely.

Překládku nutno koordinovat s ostatními projekčními celky "Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců"

Akce bude rozdělena na několik navazujících částí mezi body A-E viz. Výkresová část PD.

Trasa přeložky:

Trasa přeložek se nachází na parcelách č. 750 a 153/39 k. ú Mariánské Hory [713830].

Část A-B:

V této části budou položeny do trasy (cca 99 m) dvě chráničky DN110 v první budou uloženy dvě trubky HDPE

Část B-C:

Zde bude provedena stranová překládka čtyř metalických kabelů 2x 3 XN a 2x 5 XN tak, že stávající trasy vedení budou odkopány ručně a před hloubením retenčních rýh budou přesunuty blíže k budovám. Do nové polohy budou umístěny po osazení záhonových obrubníků oddělujících záhony od chodníku. Po zapískování trasy budou nad vedením zřízeny konstrukční vrstvy chodníku a zadlážděný povrch.

V této části budou také pokračovat dvě chráničky DN110 v první budou uloženy dvě trubky HDPE. Cca 78 m.

Část C-D:

V této části budou položeny do trasy (cca 216 m) dvě chráničky DN110 v první budou uloženy dvě trubky HDPE

Část D-E:

Zde bude provedena stranová překládka dvou metalických kabelů 2x 5 XN a tří trubek HDPE 40 tak, že stávající trasy vedení budou odkopány ručně a před hloubením retenčních rýh budou přesunuty blíže k budovám. Do nové polohy budou umístěny po osazení záhonových obrubníků oddělujících záhony od chodníku. Po zapískování trasy budou nad vedením zřízeny konstrukční vrstvy chodníku a zadlážděný povrch.

V této části bude také pokračovat jedna prázdná chránička DN110. Cca 52 m.

Část E-F:

V této části proběhne ochránění HDPE trubek půlenou chráničkou

V místech, kde bude trasa vedená pod komunikací nahradí HGR chráničku chránička PE a hloubka výkopu bude minimálně 1200 mm.

Práce:

Metalický kabel a prázdné trubky HDPE

V podstatě podél celé trasy překládky budou nataženy chráničky DN 110 (A-E) V první se budou nacházet rezervní trubky HDPE (A-D) a stávající HDPE (D-F) a druhá bude prázdná (A-F).

V místě B-C bude provedena stranová překládka metalických kabelů 2x 3 XN a 2x 5 XN. Pokud nebude možné některý z kabelů stranově přeložit, bude přerušen a nahrazen novým (**není součástí PPD**).

V místě D-E bude provedena stranová překládka metalických kabelů 2x 5 XN a tří trubek HDPE 40. Pokud nebude možné některý z kabelů, nebo trubek stranově přeložit, budou přerušeny a nahrazeny novými (**není součástí PPD**).

Trubky HDPE budou v místech D-F uloženy do půlené chráničky

PPD může být upraveno podle skutečné situace po odkopání stávající trasy.

Před realizací je nutné provést koordinaci s ostatními sítěmi (zajistí investor s generálním projektantem).

Pro provedení souběhů a křížení s ostatními sítěmi je nutno respektovat ČSN 736005.

Vytýčení hranic pozemků - CETIN

Vytýčení stavby, respektive body a hloubky nové překládané trasy - zajistí CETIN

UR - vyřídí investor

VBŘ - vyřídí CETIN

Kabelové trasy jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Zemní práce - CETIN

Vytýčení hranic pozemků - CETIN

Postup překládky bude následující:

- 1.) – geodetem stavby vytýčit novou trasu přeložení kabelů;
- 2.) – dojde k ochraně metalických kabelů a optických kabelů za provozu;
- 3.) – po uložení kabelů do nové trasy provést jejich geodetické zaměření;
- 4.) – po dokončení přeložení metalických kabelů bude provedeno závěrečné měření.
Veškeré naměřené údaje budou zaneseny do protokolů;
- 5.) – provést kalibraci a tlakovou zkoušku trubek HDPE 40.
- 6.) – po ukončení prací zpracovat dokumentaci skutečného stavu včetně měřicích protokolů;

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

- ochrání a přeložení metalického kabelu a trubek HDPE bude provedeno za provozu; pouze v případě, že by bylo nutné vedení přerušit a nahradit novým bude provoz na dobu překládky přerušen.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

- přeložku je třeba koordinovat se zemními pracemi na staveništi a její provedení s ohledem na okolní teplotu, která musí být vyšší jak +5°C;

2.7 Ostatní:

Stavebník/Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem náměstkem primátora, IČO: 008 45 451

Žadatel:

Ing. Roman Čechák, IČO: 05782856, [REDACTED]

[REDACTED] Web: <https://www.projekt.kamaro.cz/>

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce – vloženy: nejsou

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------


4. Vyjádření a záznamy – viz příloha

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
1.0 Přehledová mapa	SD
2.0 Celkový katastrální situační výkres - Nová podzem. SEK	SD
2.1, 2.2 a 2.3 detailní situační výkresy	SD
3.0 Celkové schéma trubek HDPE a MET	SD
3.1, 3.2 a 3.3 detailní schematické výkresy	SD
Kalkulace nákladů - PPD	SD
Výpisy z KN	SD

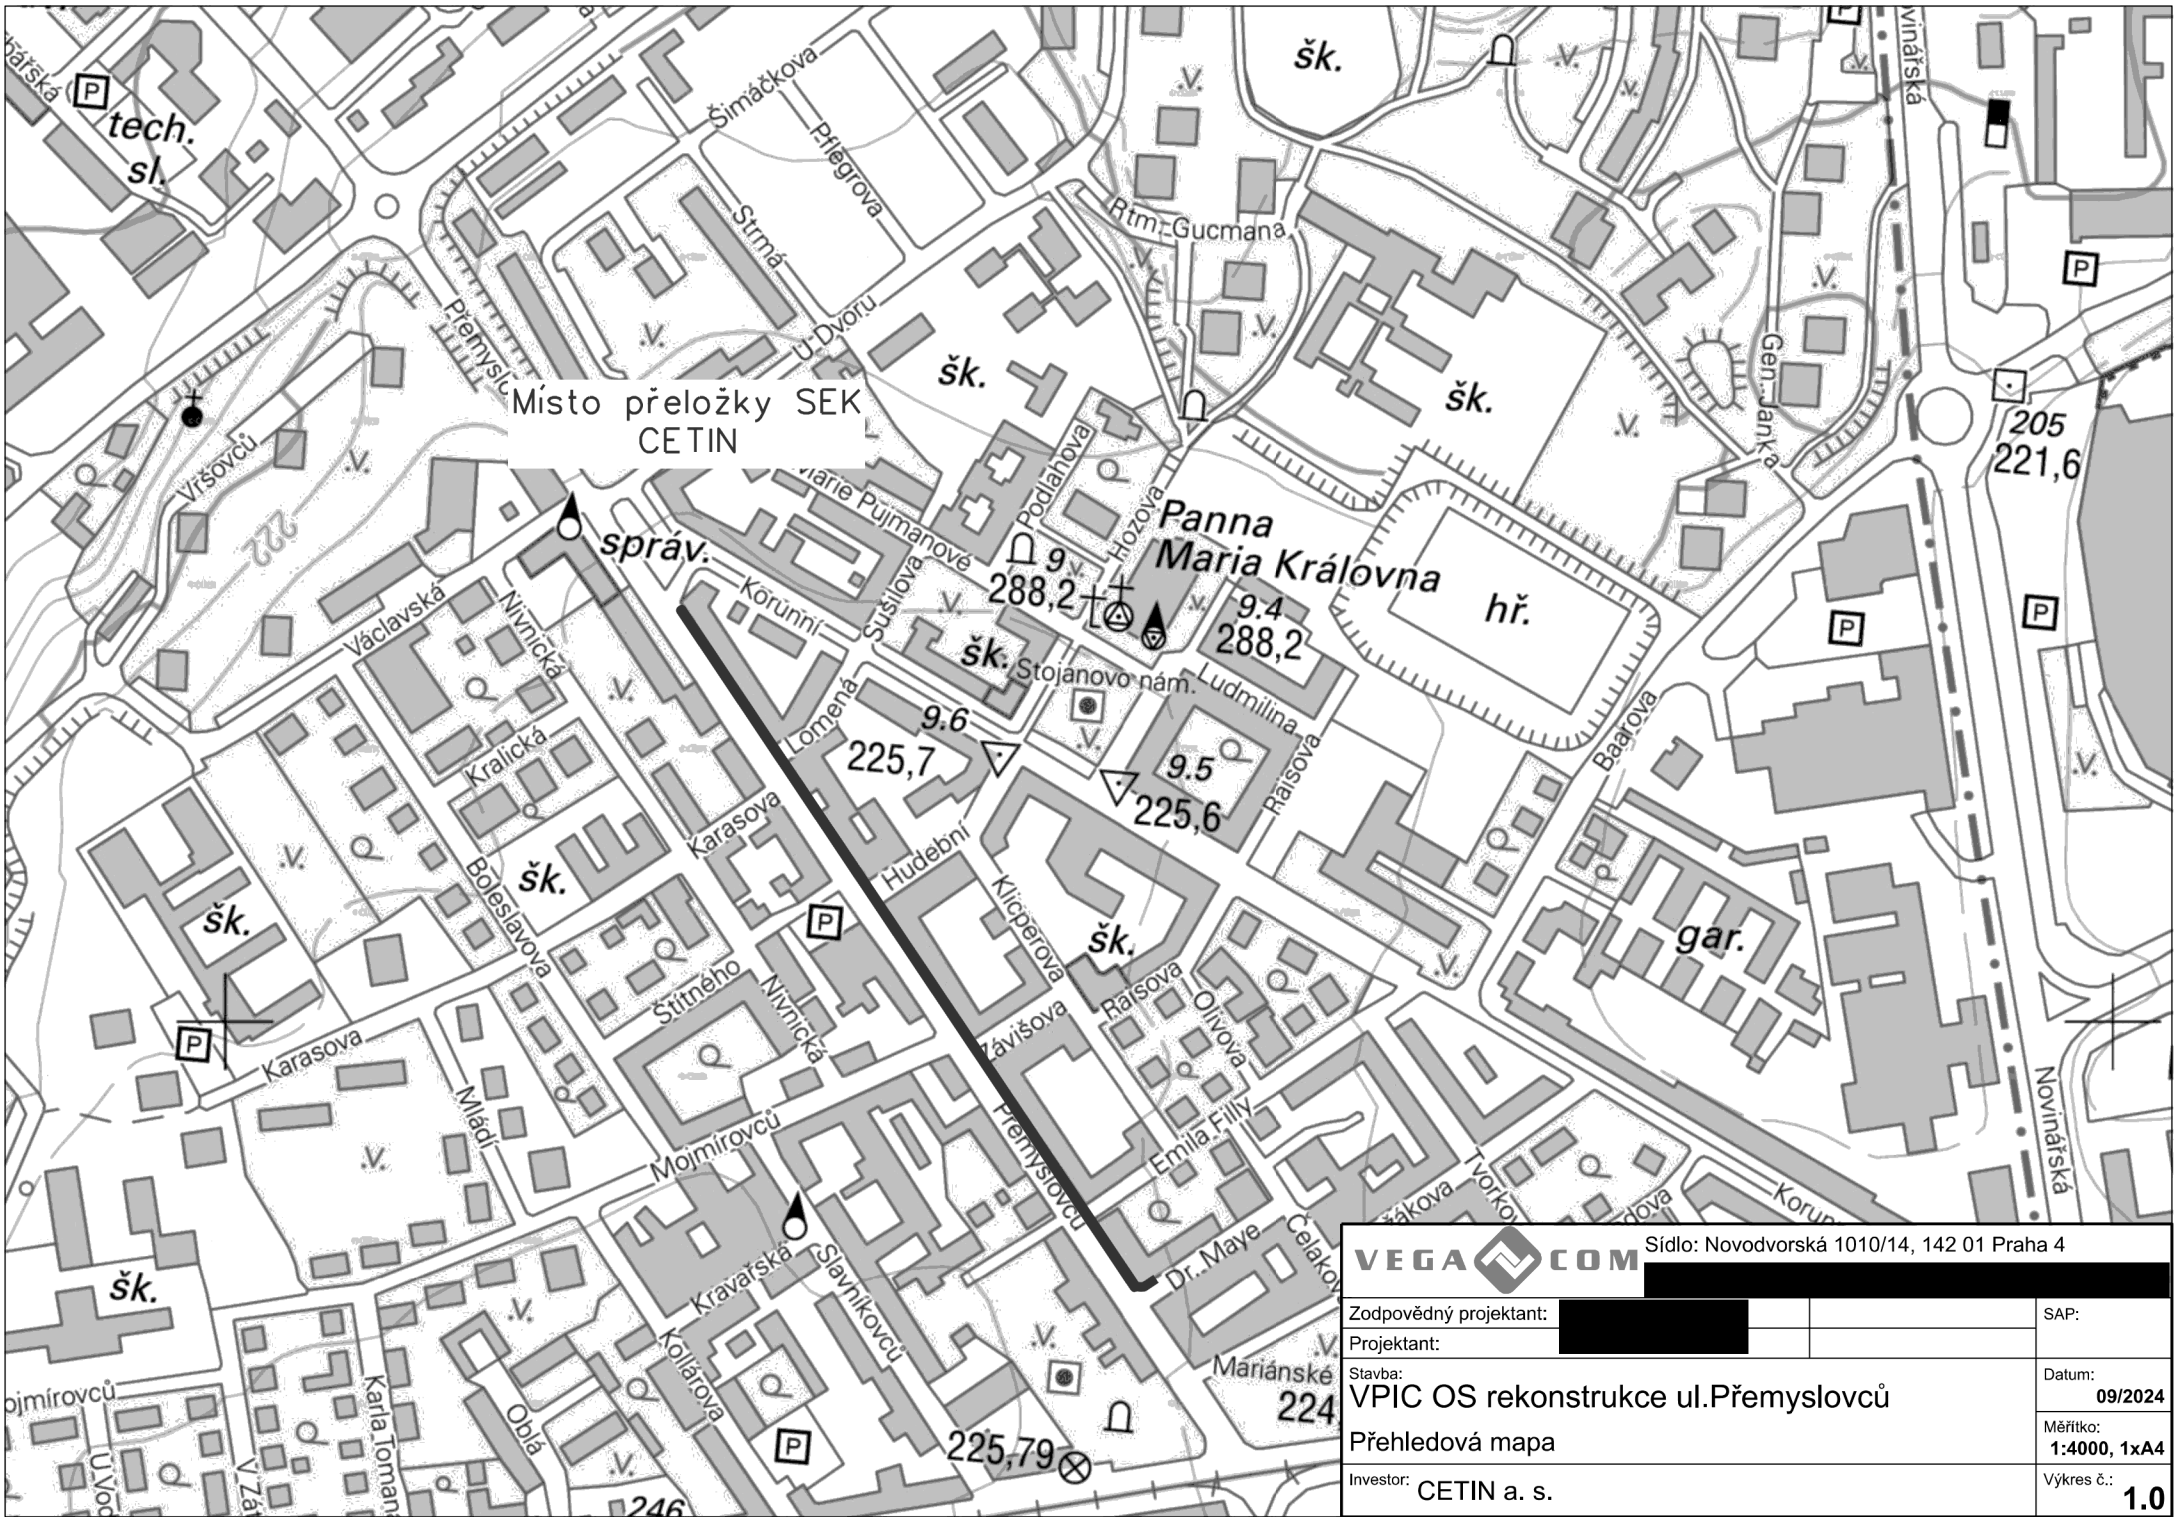

VEGA COM		Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
Zodpovědný projektant:			SAP:
Projektant:			
Stavba:	VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců		
Přehledová mapa			
Investor:	CETIN a. s.		
			Datum: 09/2024
			Měřítko: 1:4000, 1xA4
			Výkres č.: 1.0

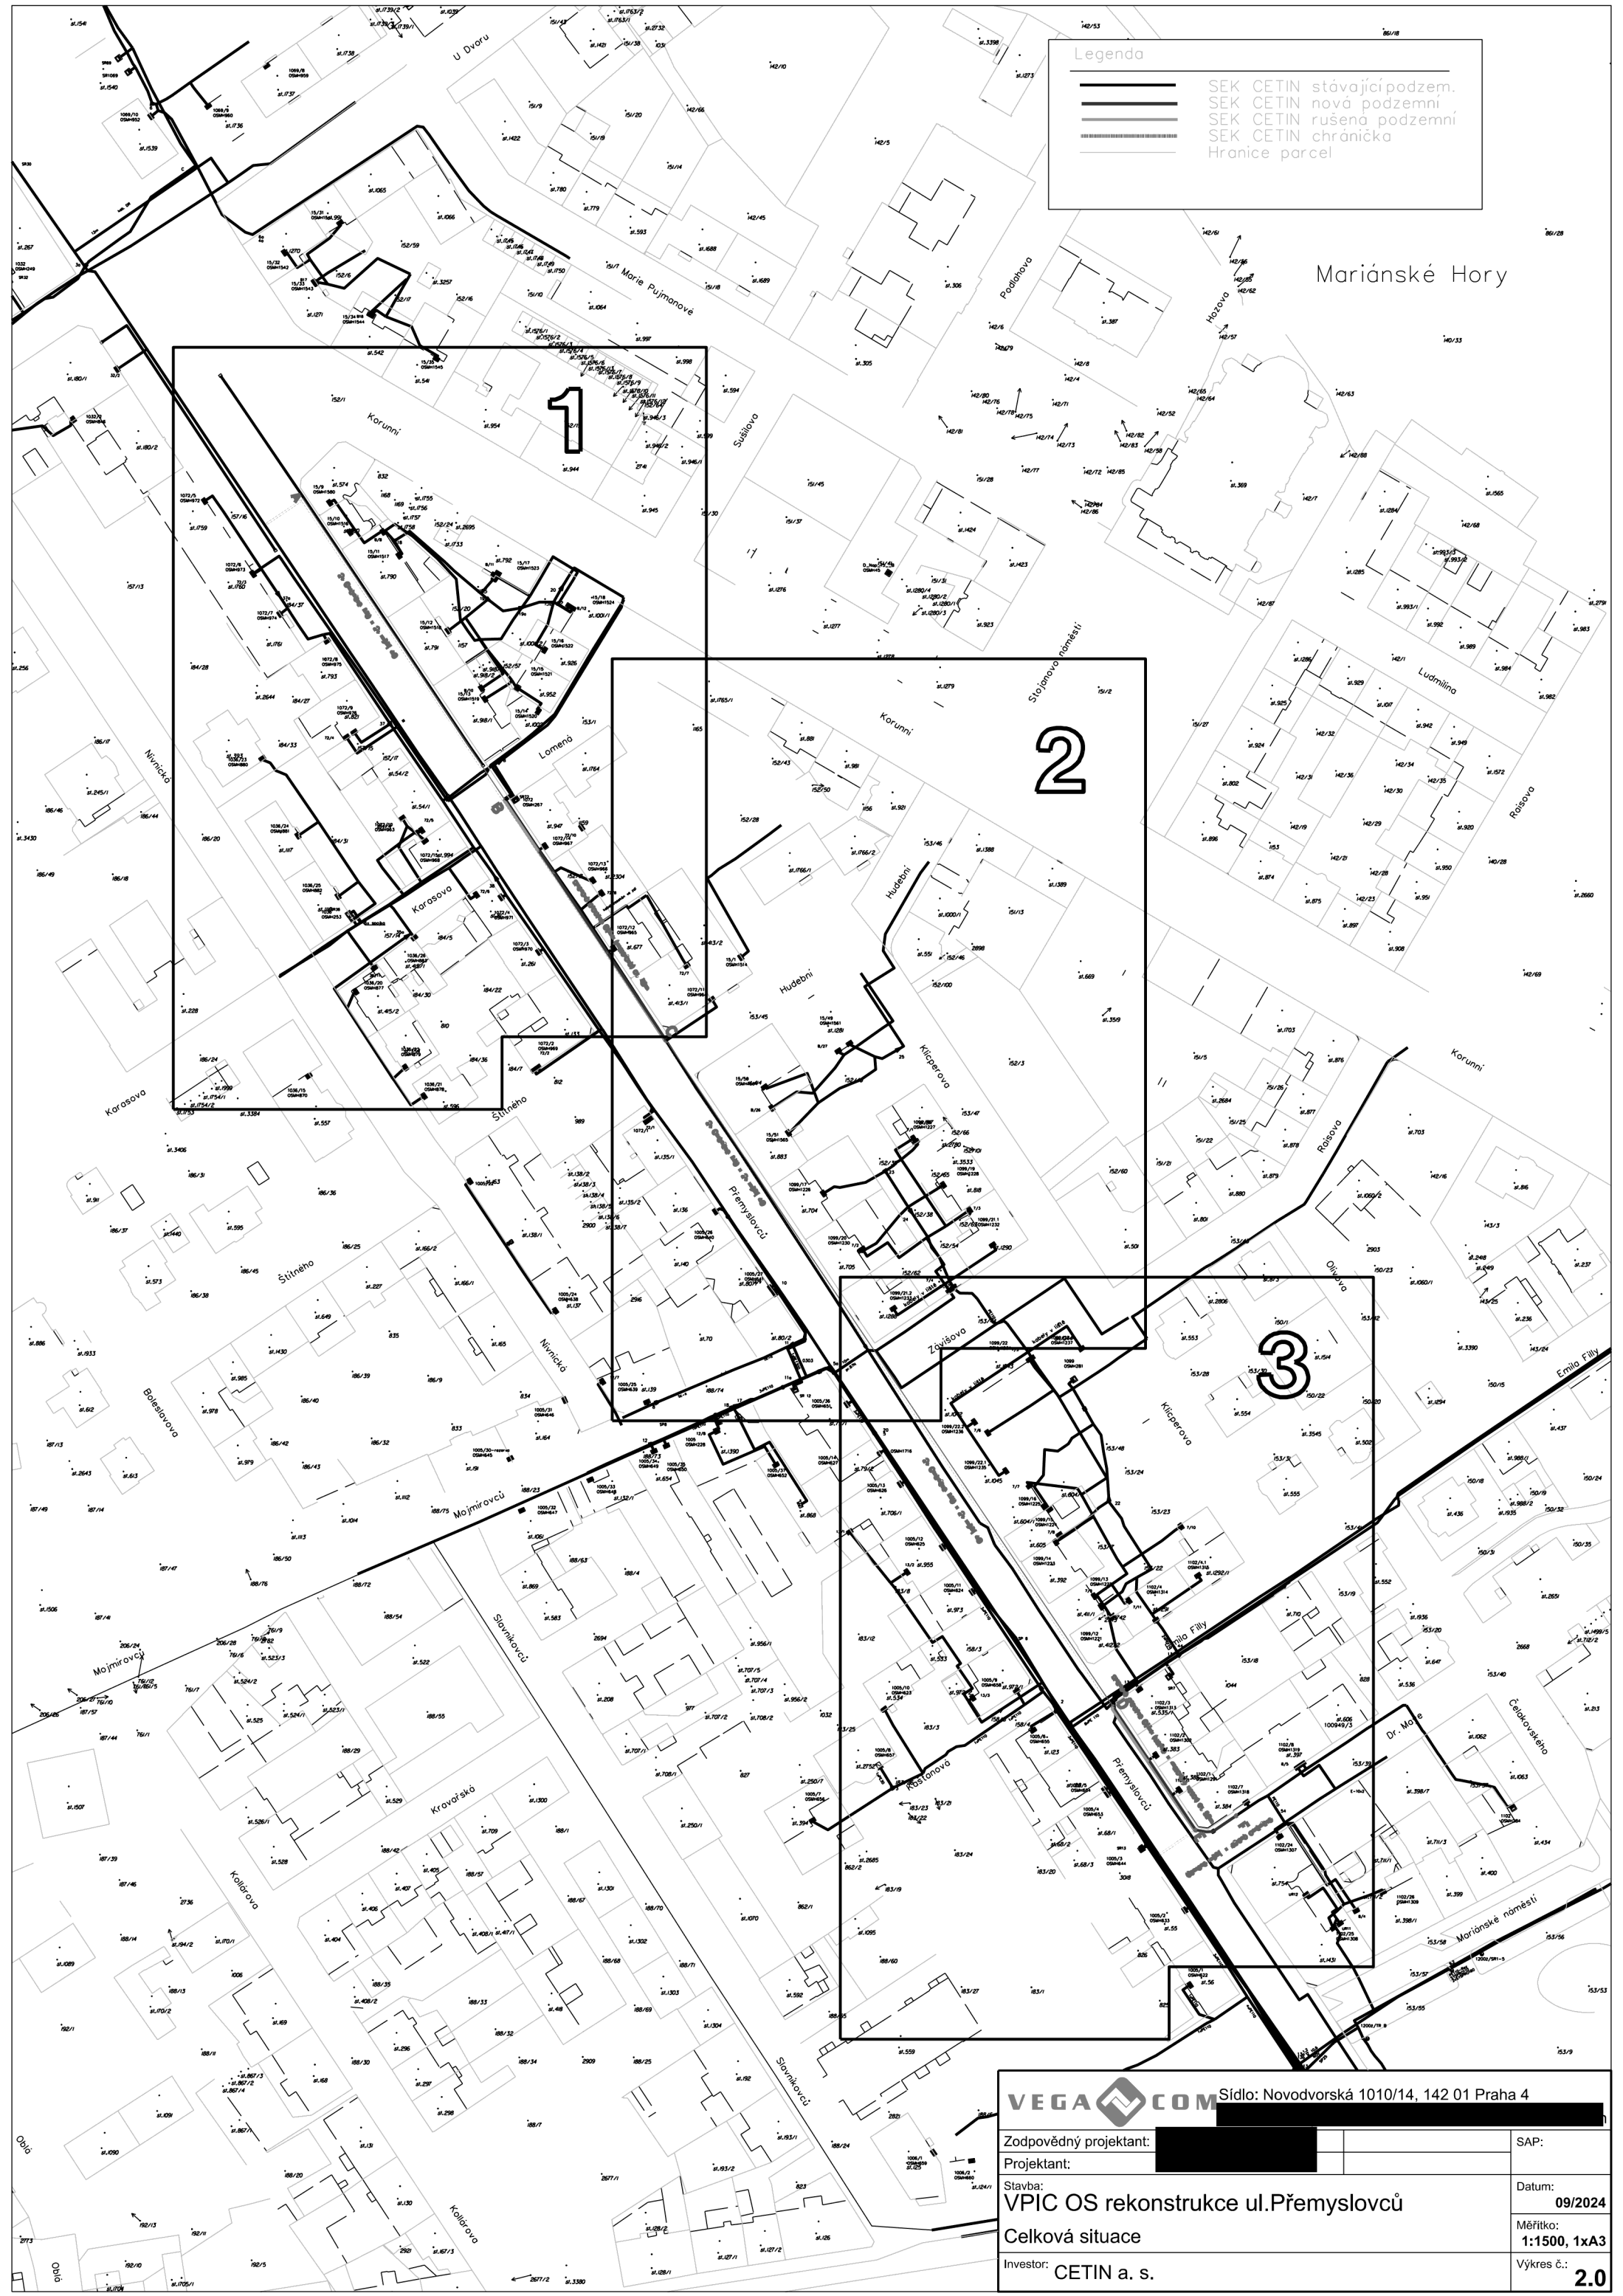

Legenda

SEK CETIN stávající podzemí

SEK CETIN nová podzemní

SEK CETIN rušená podzemní

SEK CETIN chránička

Hranice parcel


Mariánské Hory


VEGA


COM

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4


Zodpovědný projektant:		SAP:
Projektant:		
Stavba:	VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců	Datum: 09/2024
Celková situace		Měřítko: 1:1500, 1xA3
Investor:	CETIN a. s.	Výkres č.: 2.0

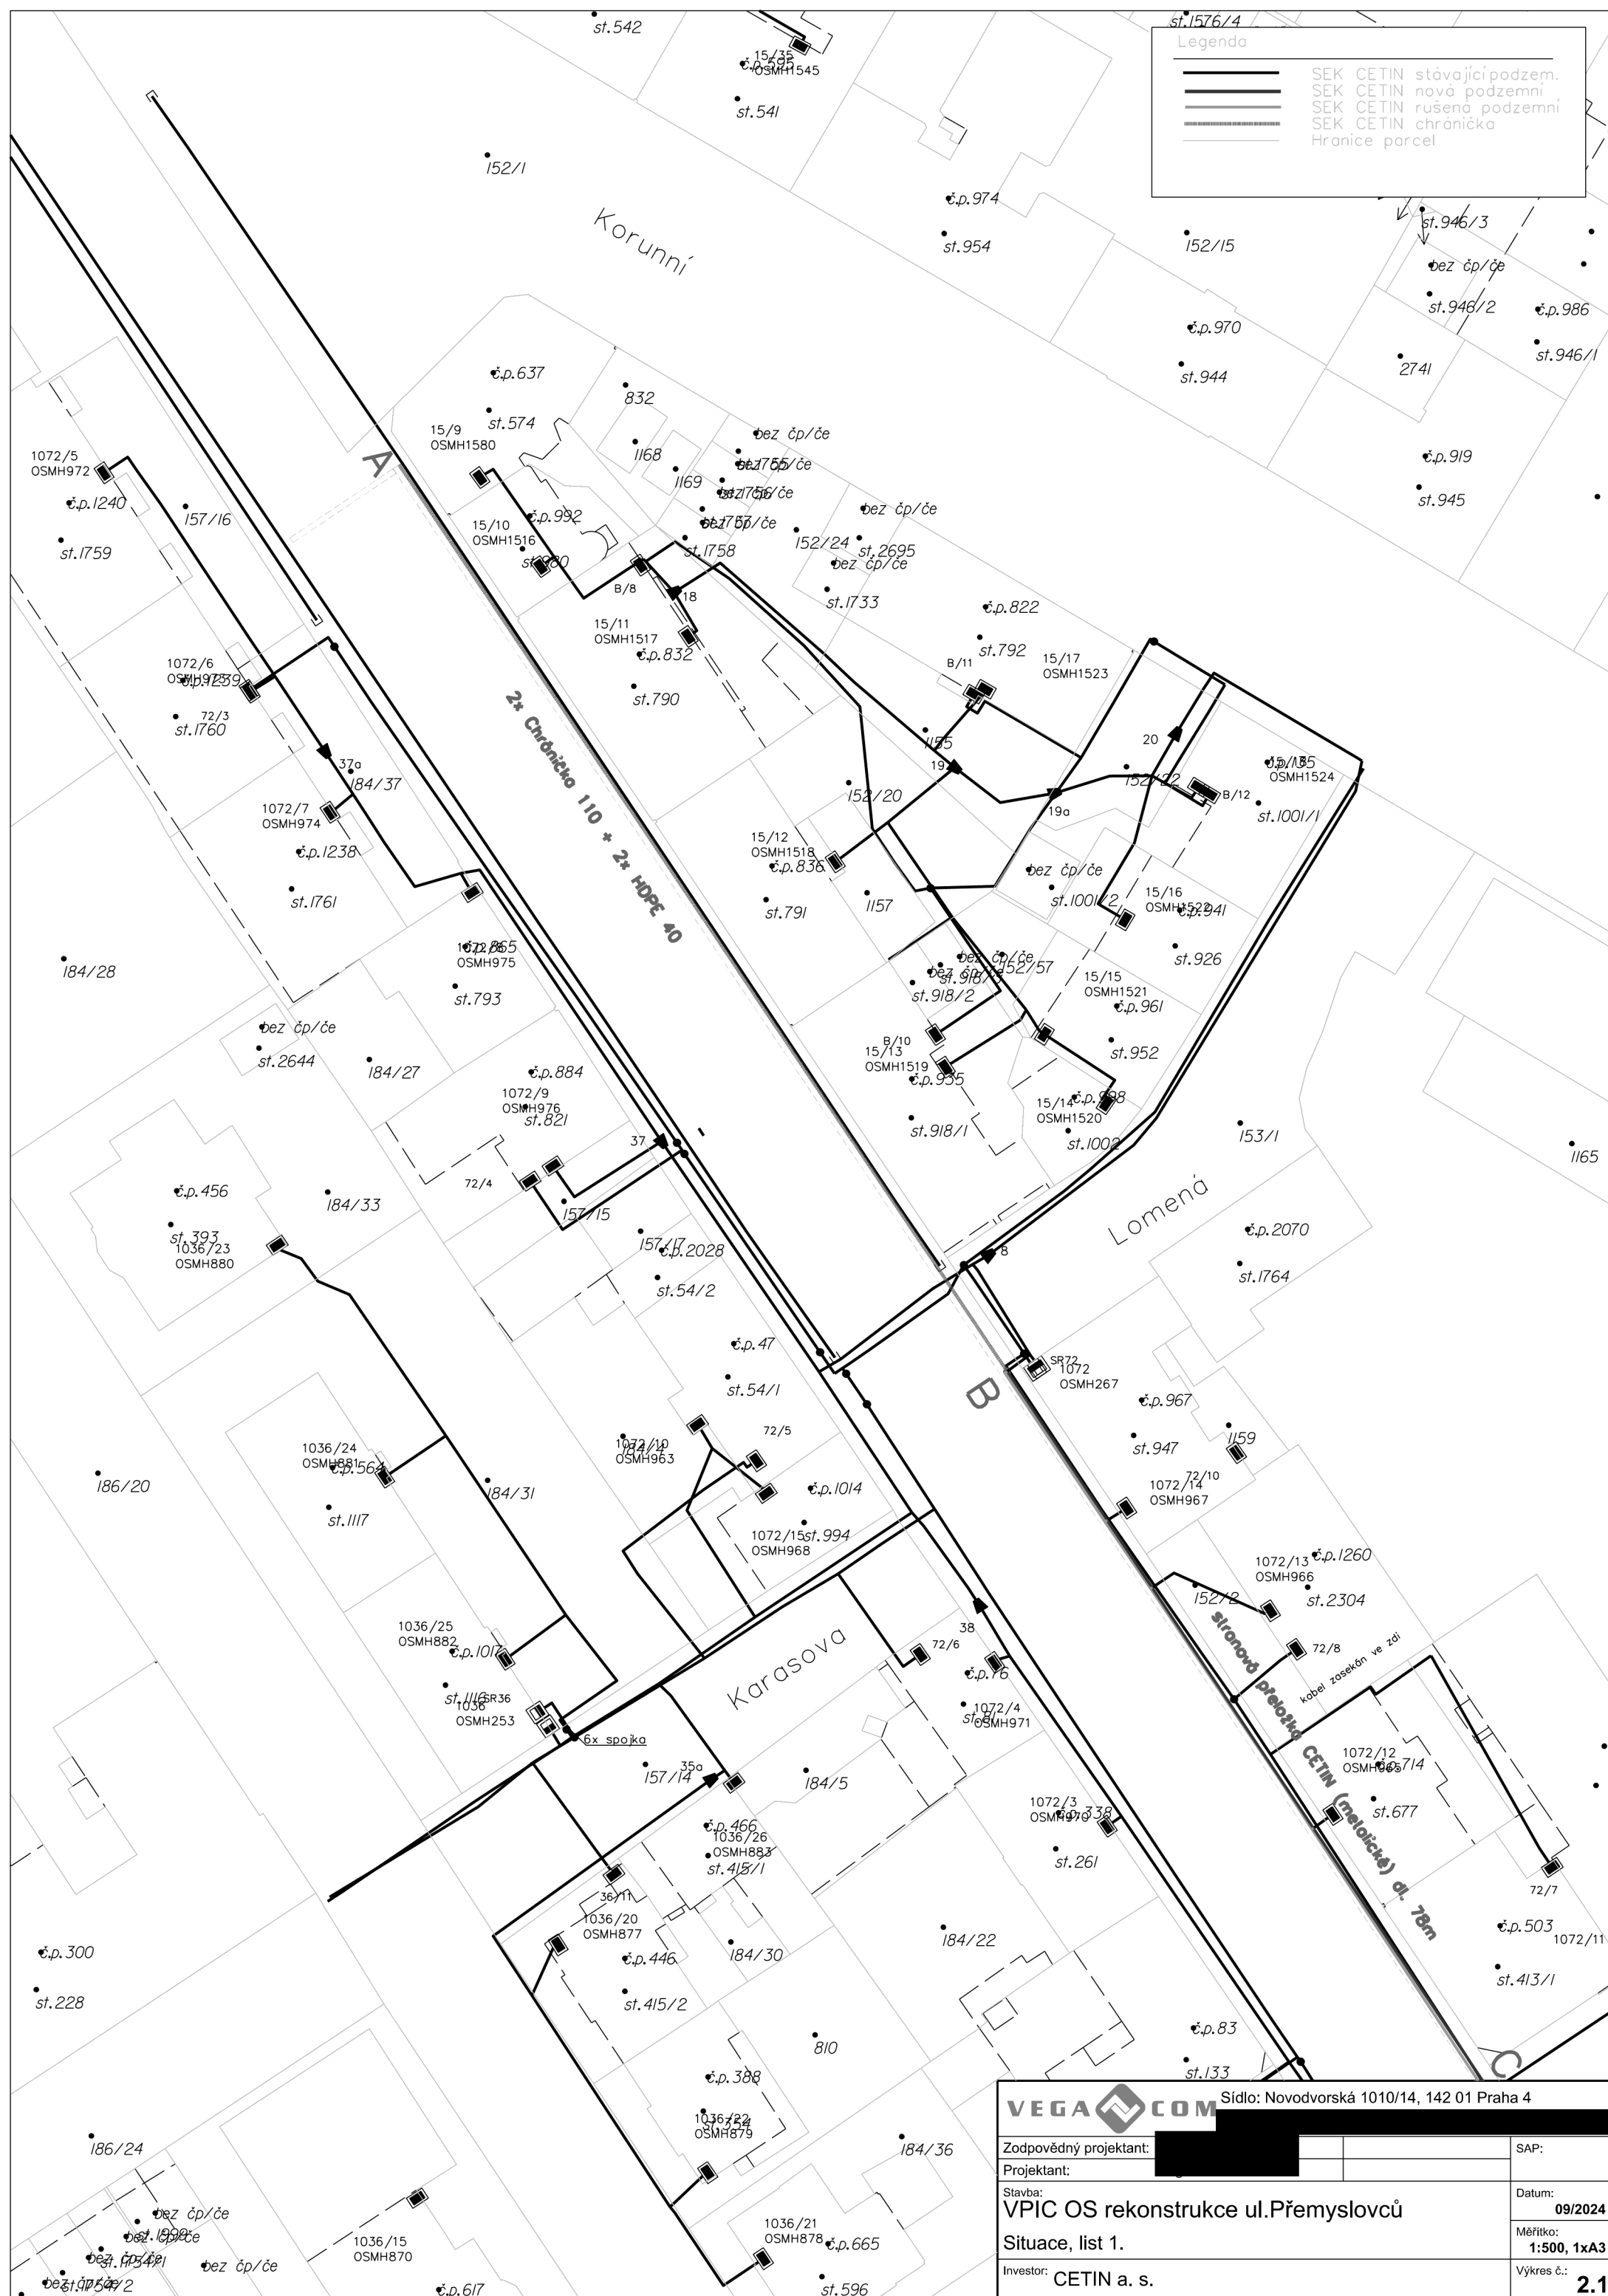


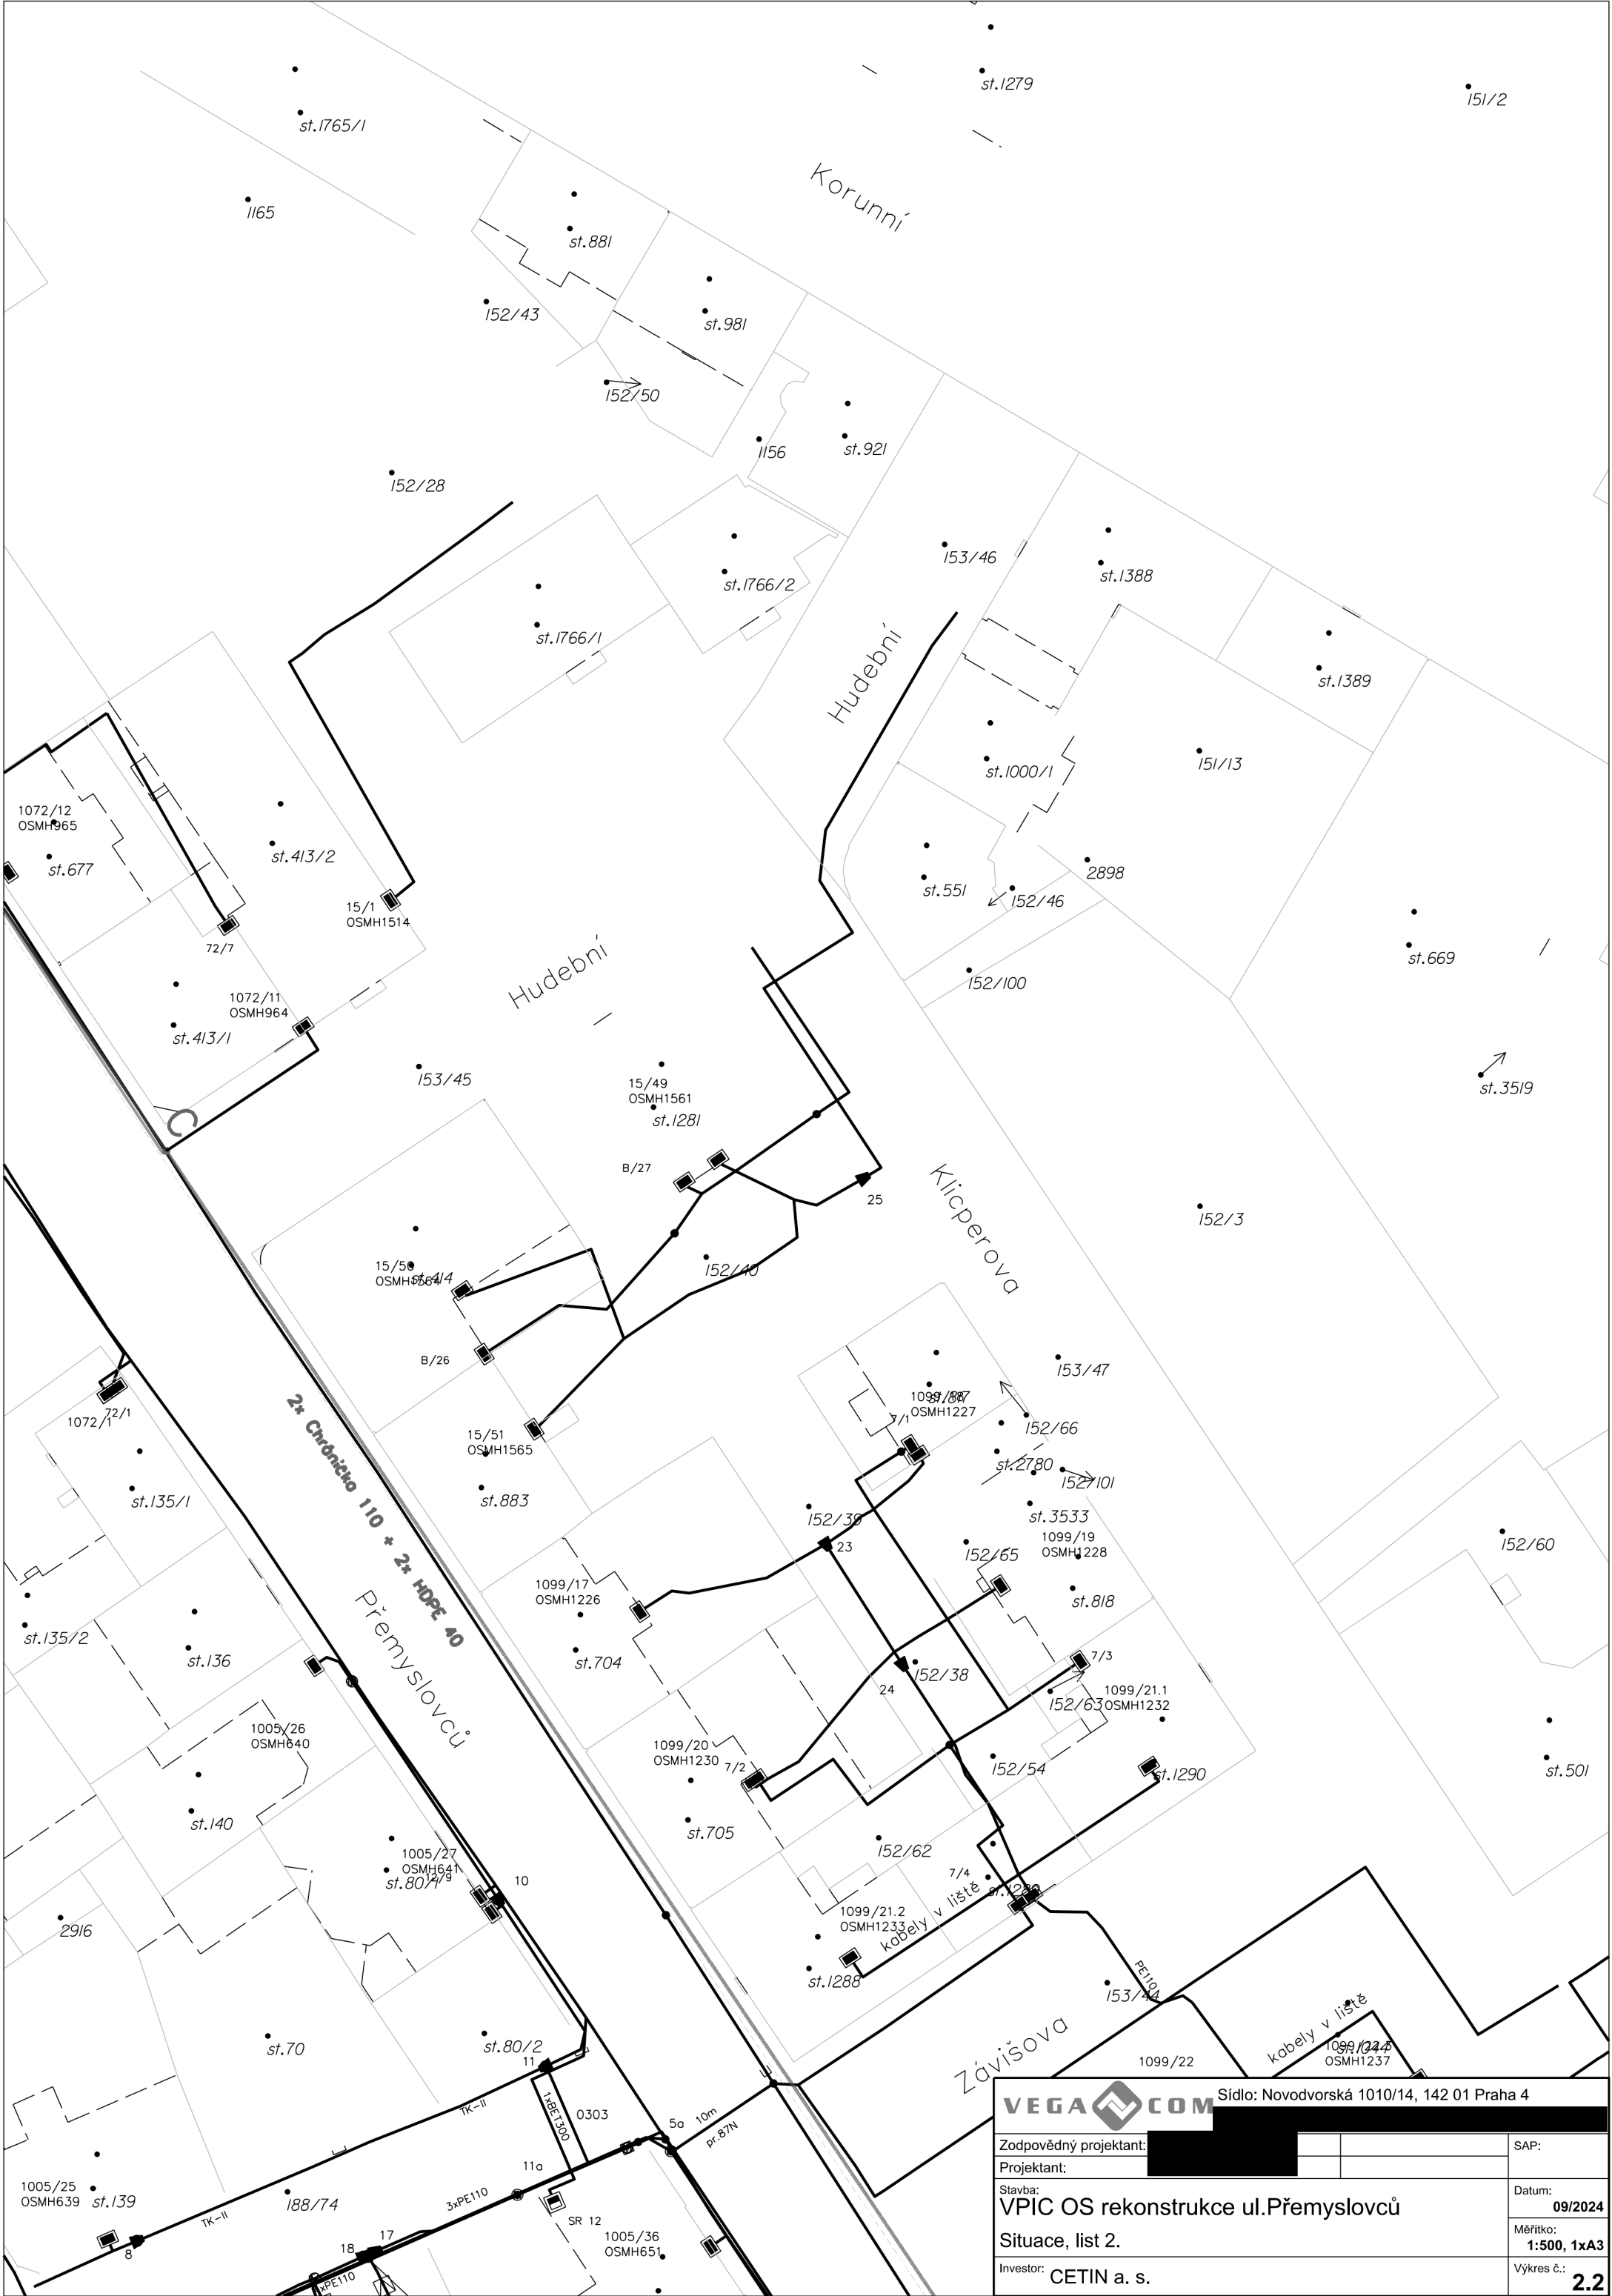

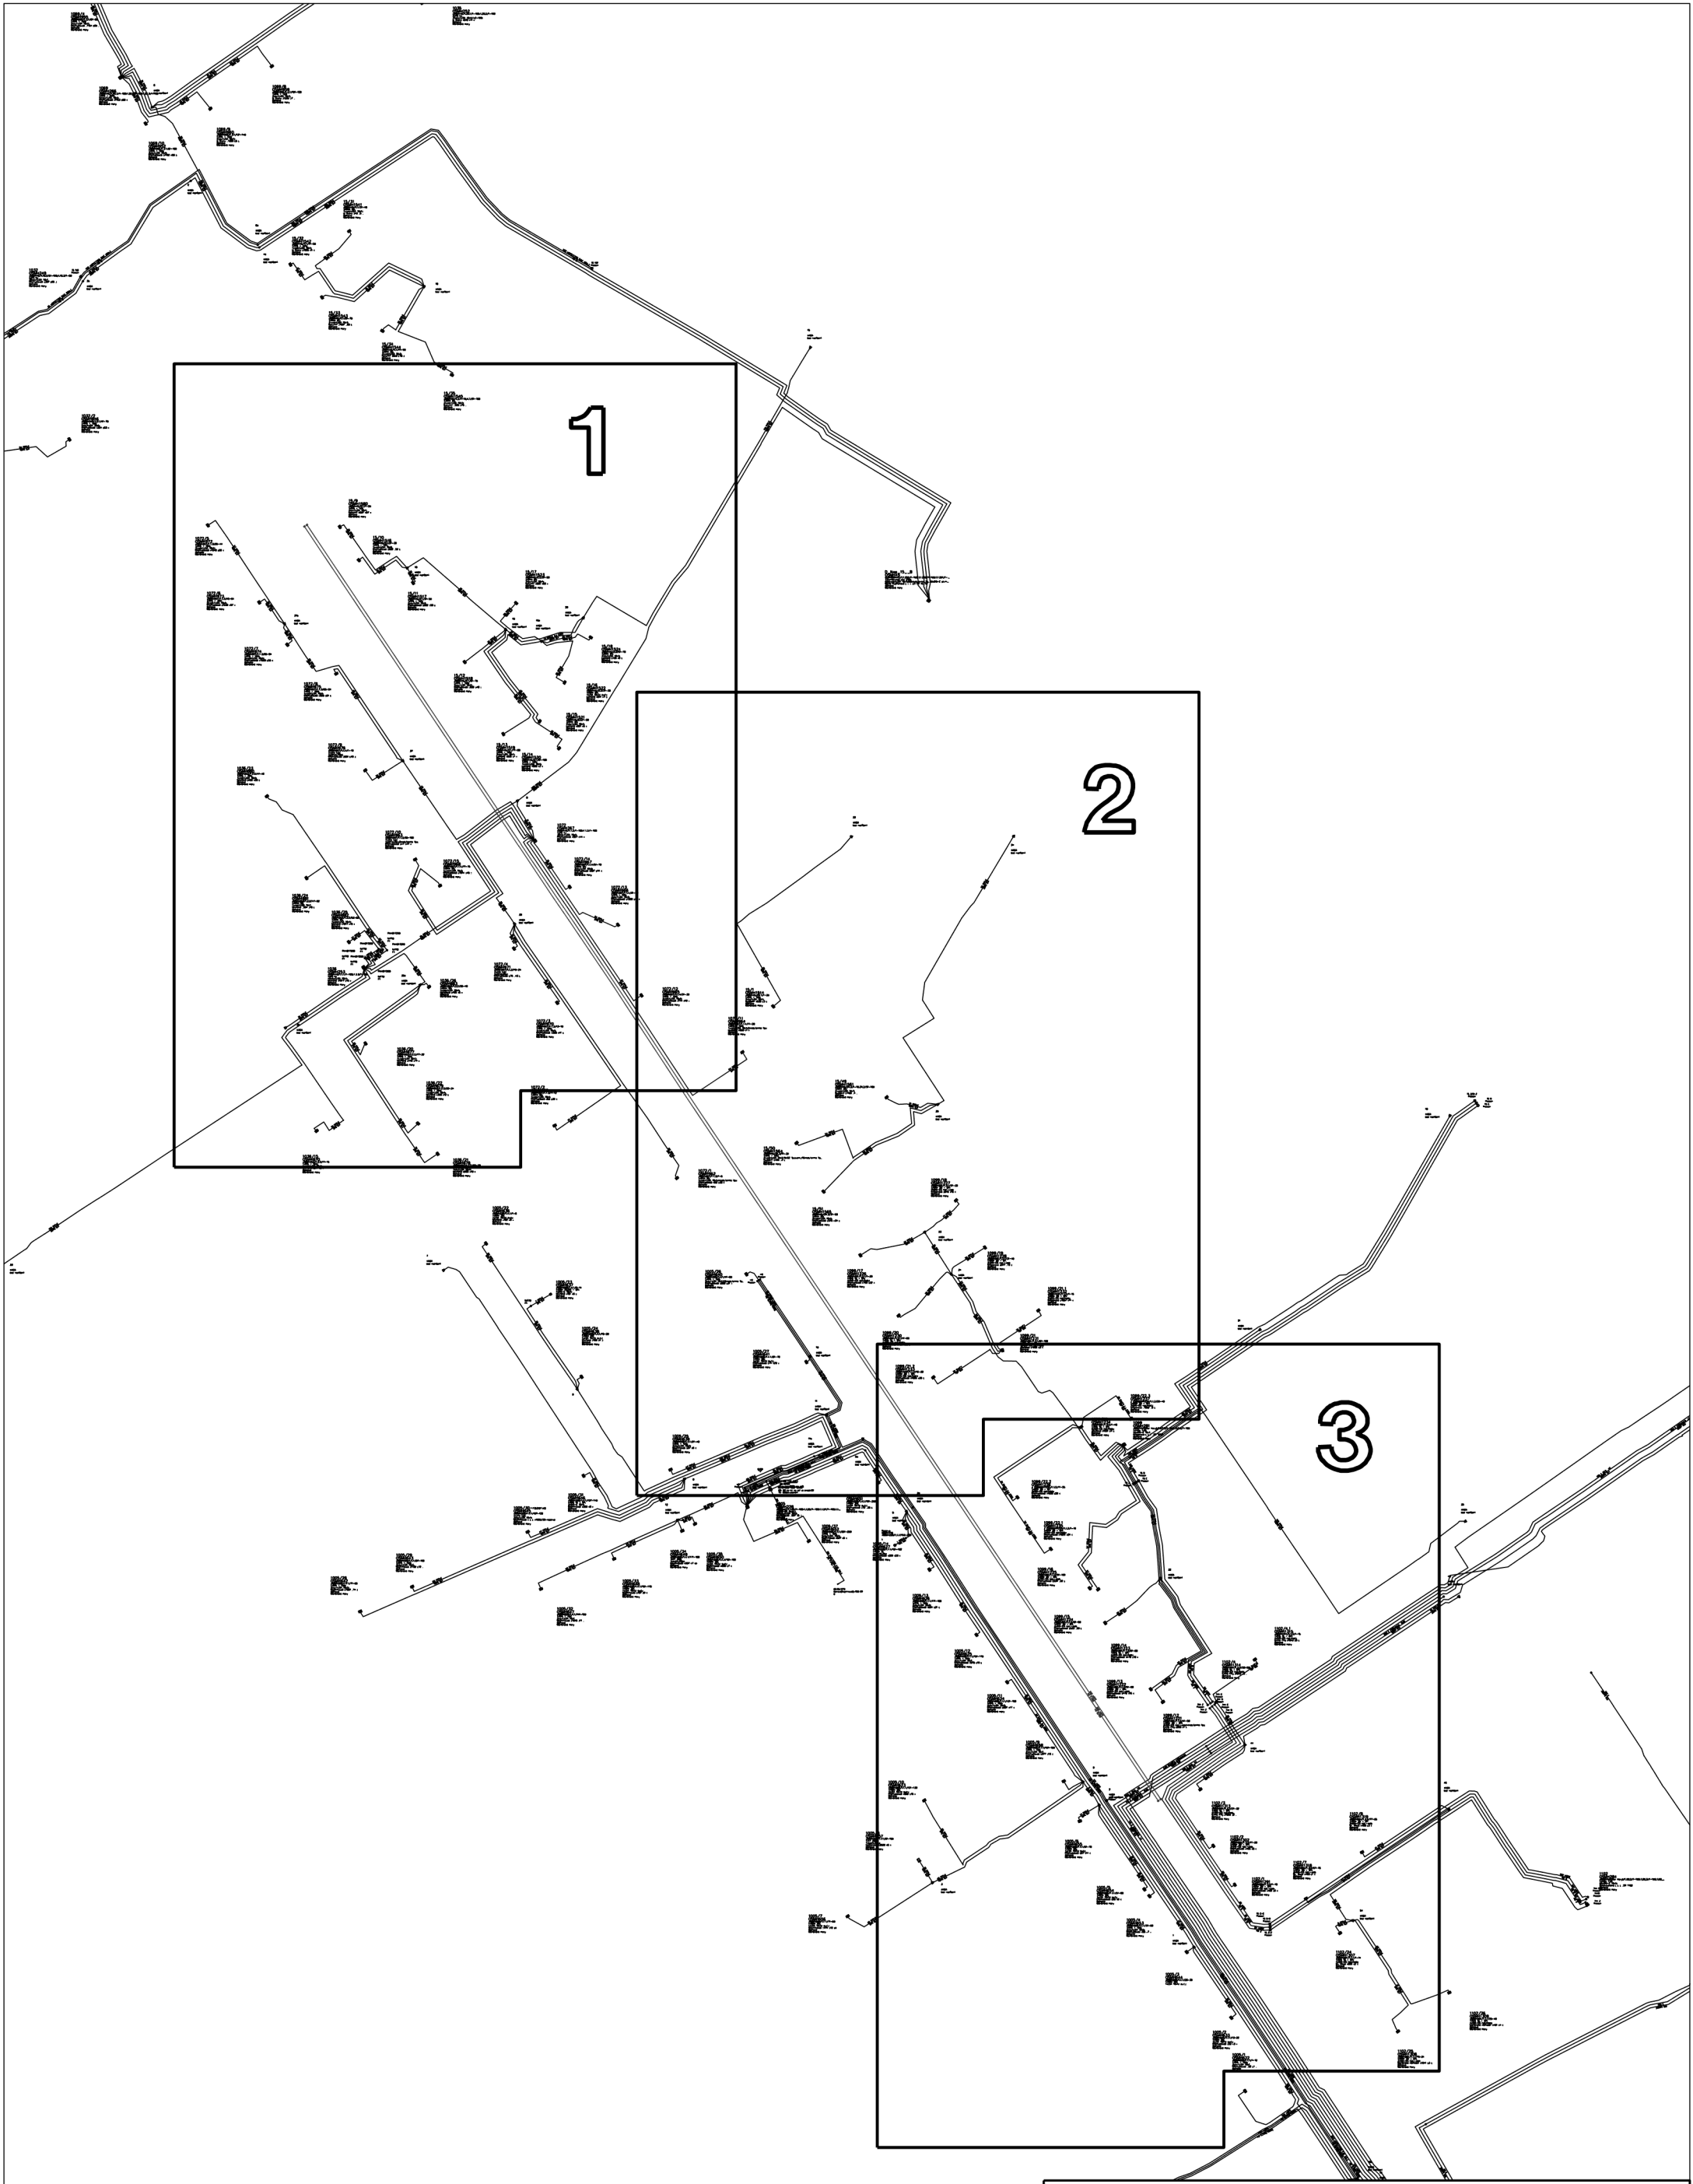


VEGA COM		Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
Zodpovědný projektant:		SAP:	
Projektant:		Datum:	
Stavba:		09/2024	
VPIC OS rekonstrukce ul. Přemyslovců		Měřítko:	
Celkově schéma trubek HDPE a MET		1:1500, 1xA3	
Investor:		Výkres č.:	
CETIN a. s.		3.0	



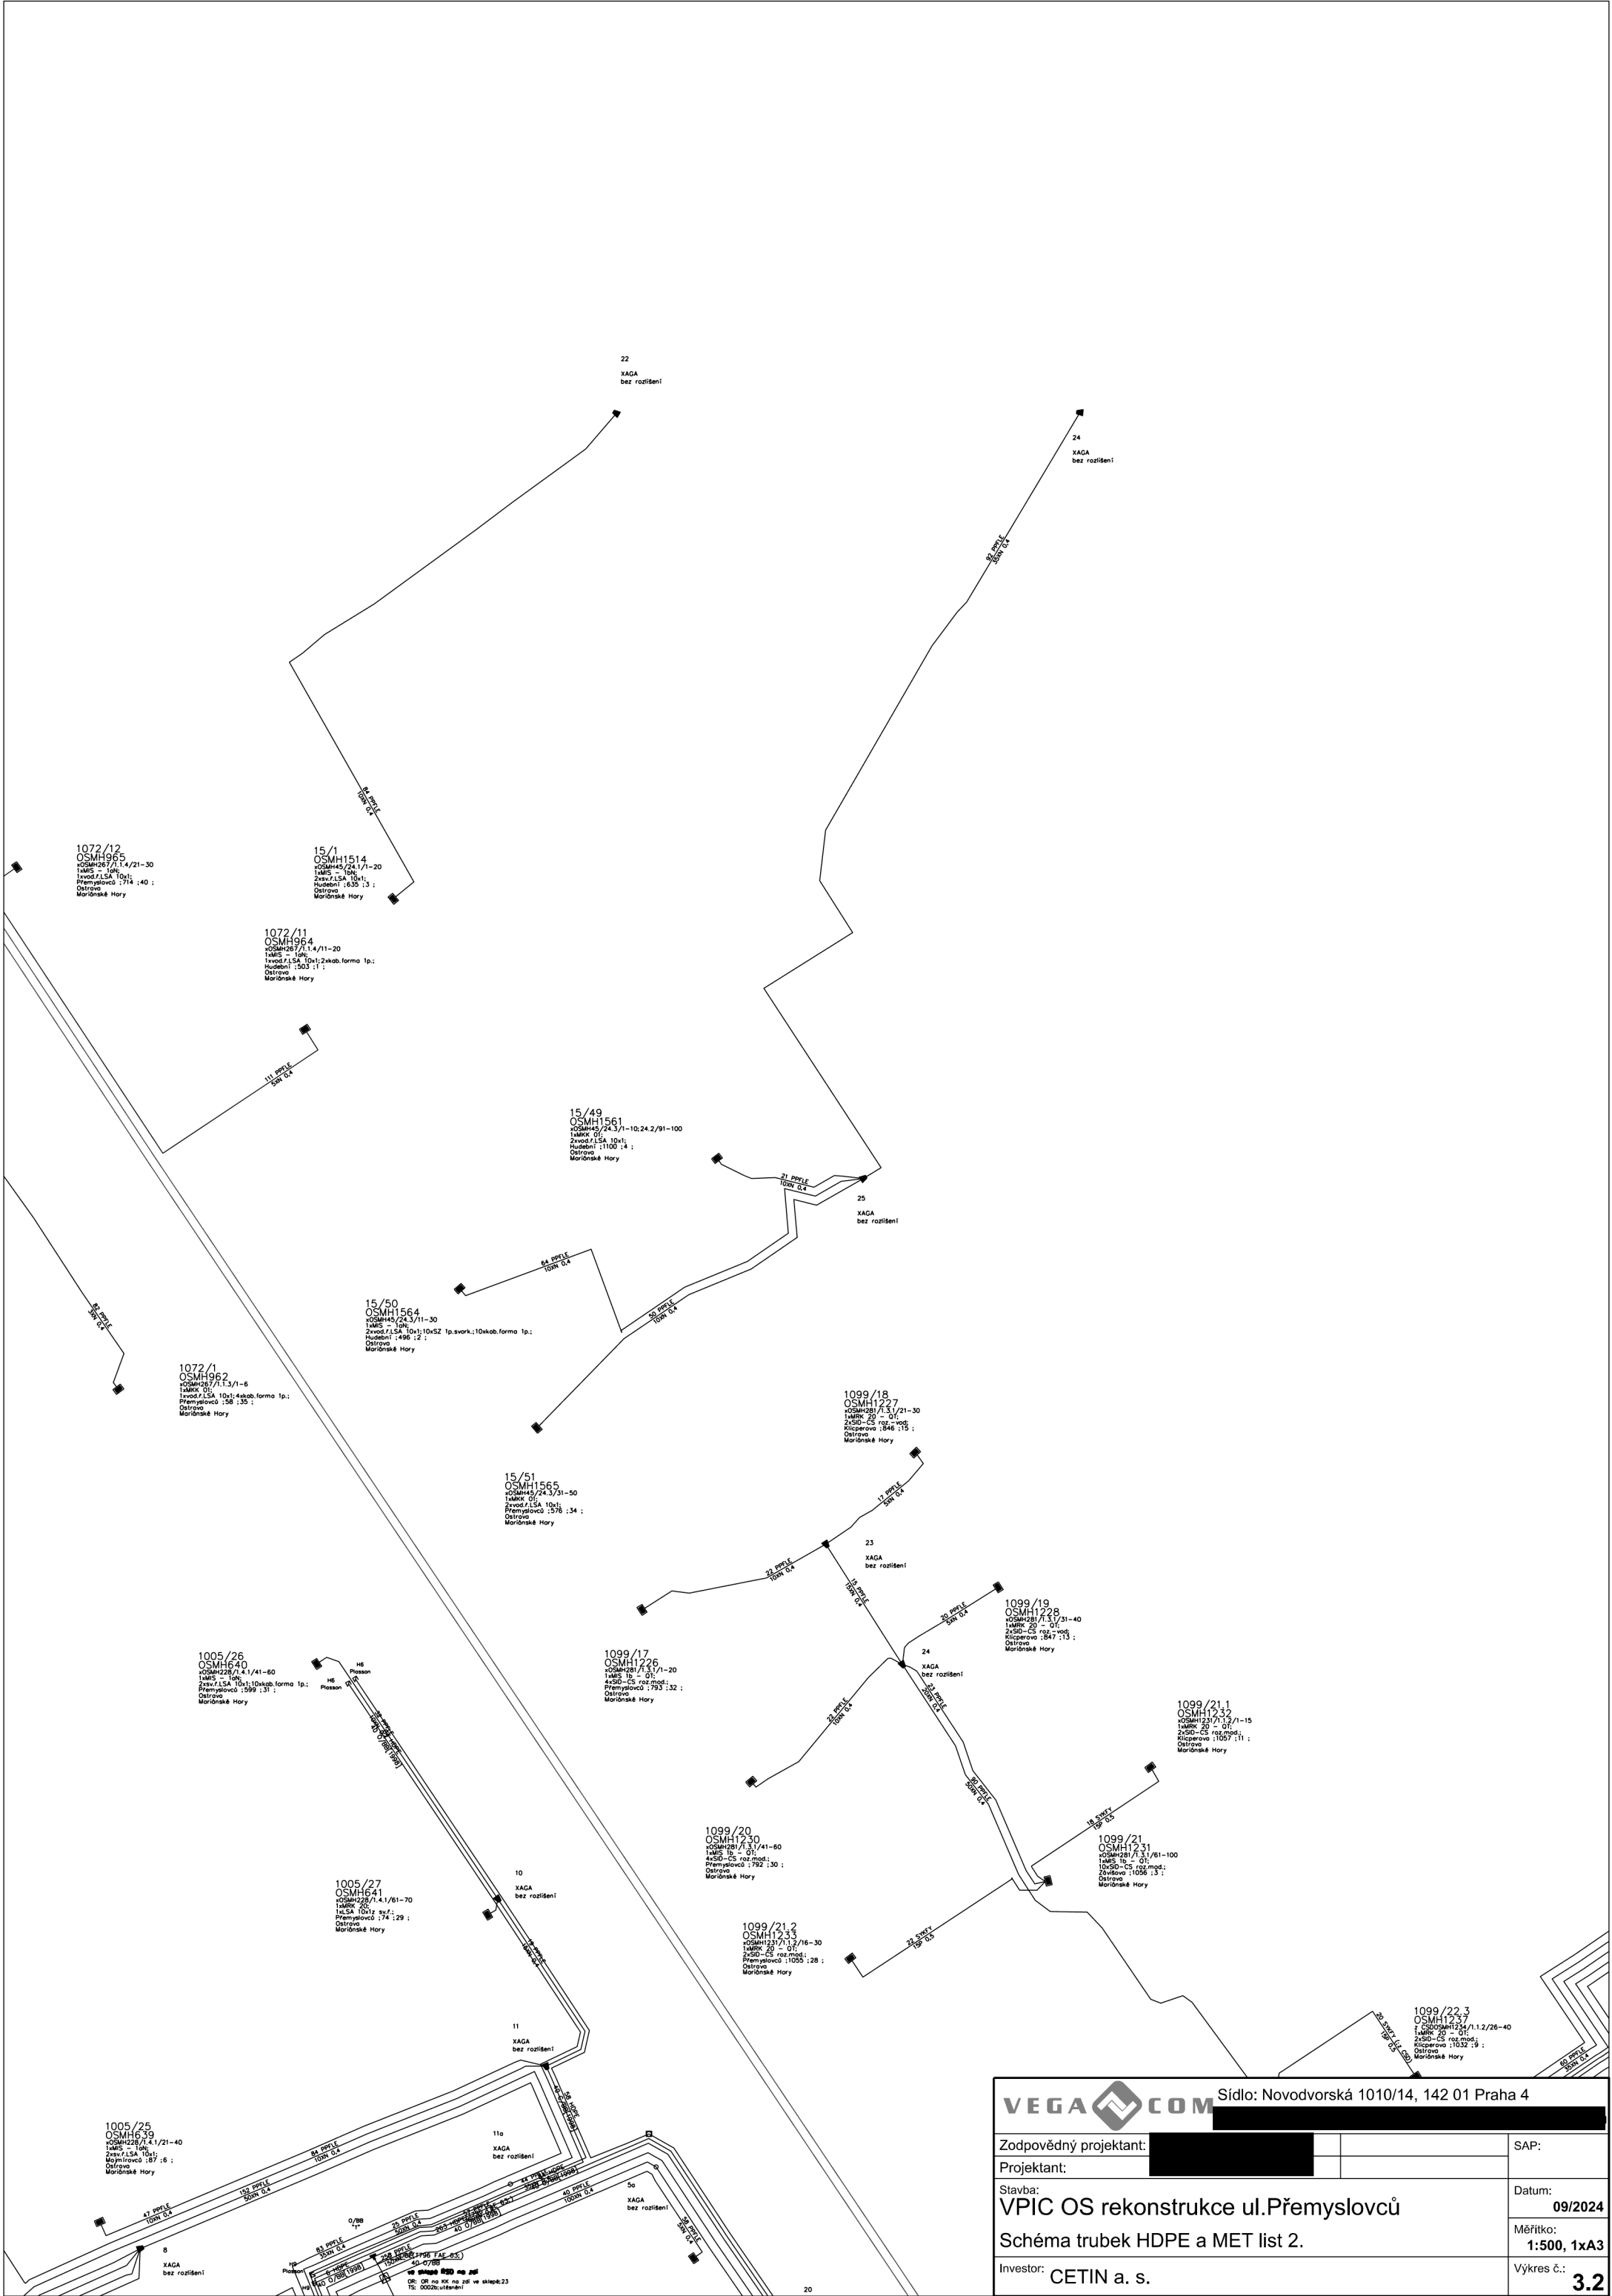

VEGA COM		Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4	
Zodpovědný projektant:		SAP:	
Projektant:		Datum:	
Stavba:		09/2024	
VPIC OS rekonstrukce ul. Přemyslovců		Měřítko:	
Schéma trubek HDPE a MET list 2.		1:500, 1xA3	
Investor:		Výkres č.:	
CETIN a. s.		3.2	



Specifikace nákladů_VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2024.10

Položková databáze: 2024.10

Název stavby: VPIC OS rekonstrukce ul.Přemyslovců

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a. s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	44 019,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	704 261,67 Kč
MONTÁŽ	90 230,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	16 004,39 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	19 532,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	123 231,37 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	159 521,69 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 1 160 955,29 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 994 316,47 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 166 638,82 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	7 691,09 Kč
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	36 328,05 Kč
	Z1 - 0,401-0,6 km			
ZEMNÍ PRÁCE				
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	896.00 m	26 871,04 Kč
	955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	36900.00 JV	36 900,00 Kč
	Projekční rezerva, vícepráce na překládce			
	951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	8.00 ks	402,16 Kč
	954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	390.00 m	110 721,00 Kč
	952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	409.00 m	413 691,23 Kč
	954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	36.00 m	107 424,72 Kč
	955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	450.00 m	7 578,00 Kč
	951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	673,52 Kč
MONTÁŽ				
	958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1250.00 m	6 462,50 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	1 356,84 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	20.00 ks	1 044,80 Kč
	952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	20.00 ks	695,80 Kč
	952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	6.00 ks	730,80 Kč
	955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	298,68 Kč
	955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	23370.00 JV	23 370,00 Kč
	Montážní práce na stranové překládce met. kabelů			
	955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	12.00 ks	795,00 Kč
	952602 S	Montáž trubky úložné	1250.00 m	28 425,00 Kč
	954980 S	Překládka trubky úložné	156.00 m	3 452,28 Kč
	958469 S	Uvedení stavby do provozu	7126.62 JV	7 126,62 Kč

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	6.00 ks	9 306,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	7 166,30 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	350.00 m	8 389,50 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 614,89 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	350.00 m	11 917,50 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	20 770,10 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	95000.00 JV	95 000,00 Kč
Odhad za VBŘ + ocenění			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 230,22 Kč

Limitka materiálu		Množství	Celková cena	
Číslo SAP	Stavební činnost			Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303910 S	Deska krycí plast. 300x500 mm	1078.00 ks	20 837,74 Kč	
319092 S	Díl ohybový Syspro 160/110	4.00 ks	1 368,12 Kč	
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	72.00 m	301,68 Kč	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	539.00 m	2 581,81 Kč	
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	459,64 Kč	
302814 S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	456,94 Kč	
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	10.00 ks	2 974,20 Kč	
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	12.00 ks	535,32 Kč	
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	12.00 ks	1 589,76 Kč	
319184 S	Spona trubkySYSPRO	312.00 ks	11 388,00 Kč	
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	52.00 m	30 087,72 Kč	
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	405.00 m	12 101,40 Kč	
300028 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.	440.00 m	13 147,20 Kč	
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	405.00 m	12 101,40 Kč	
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	12.00 ks	6 591,00 Kč	
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	772.00 m	42 691,60 Kč	
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	12.00 ks	308,16 Kč	

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	153/39
Obec:	Ostrava [554821]
Katastrální území:	Mariánské Hory [713830]
Číslo LV:	2048
Výměra [m²]:	1003
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce	Podíl
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, Mariánské Hory, 70900 Ostrava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 **Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj**

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.09.2024 09:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	750
Obec:	Ostrava [554821]
Katastrální území:	Mariánské Hory [713830]
Číslo LV:	1729
Výměra [m²]:	13350
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno vedení
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 **Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj**

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.09.2024 09:00.
