
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2025_0011**

mezi

CETIN a.s.

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená na základě pověření Lubošem Minářem, supervizorem, VFS Čechy východ

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(„CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

DIČ: CZ00085031

ID DS: ffhk8fq

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.

Pr 162

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

(„Stavebník“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítě elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(„Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN znamená cenový a technický návrh provedení Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Definitivní překládka znamená část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Etapu Překládky znamená kteroukoliv část Překládky, která je CTN určená za etapu, vymezená v CTN a co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky;

Provizorní překládka znamená část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – Etapou Překládky;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Klenovka spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „Most ev.č. 34216-1 Klenovka“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací“ ze dne 2. 5. 2024 vydané pod č.j. 120823/24, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Klenovka(PA) rek. Most 34216-1 SO451“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v CTN.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společnostmi CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že není-li Smlouvou určeno jinak, platí pro Etapu Překládky práva a povinnosti Smluvních stran, lhůty a podmínky, ujednané Smlouvou pro Překládku.

- 3.5. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.6. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
- a) před realizací Překládky:
 - (i) zajistit zpracování Projektu,
 - (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
 - (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
- 4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:
- a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
 - b) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Provizorní překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“);
 - c) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení záměru Městského úřadu Přelouč – rozhodnutí o umístění stavby „Most ev.č. 34216 – 1 Klenovka“ č.j. MUPC 21569/2024 ze dne 26. 11. 2024, pravomocného dne 28. 12. 2024 („**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

- 4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:
- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
 - c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.
- 4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7. Dnem ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky a/nebo Etapy Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **242 330,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet dva tisíc tři sta třicet korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě („**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- f) náklady na identifikaci parcel,
- g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5. Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu, se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **34 539,- Kč** (slovy: třicet čtyři tisíc pět set třicet devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy;
- b) Faktura za Provizorní Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy;
- c) Faktura za Definitivní Překládku bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace dotčené Etapy Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy
- d) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7. Smlouvy.

6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu fakturace.tu@suspk.cz

- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1. Za společnost CETIN:

[REDACTED]

[REDACTED]

- 8.2. Za Stavebníka:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:
- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
 - b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 20 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5. Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6. Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky dle odst. 4.7. Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.7. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.8. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1. Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku.
- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.
- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a

dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převáží text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Rozhodnutí

V Praze dne

V Pardubicích dne

Za CETIN:

**Luboš
Minář**

Digitálně podepsal Luboš Minář
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-04084063,
o=CETIN a.s., ou=70490,
cn=Luboš Minář, sn=Minář,
givenName=Luboš,
serialNumber=P783117
Datum: 2025.03.18 09:26:05
+01'00'

Luboš Minář
supervizor, VFS Čechy východ
na základě pověření
CETIN a.s.
(podepsáno elektronicky)


Za Stavebníka:

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.03.18
15:27:29 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
(podepsáno elektronicky)

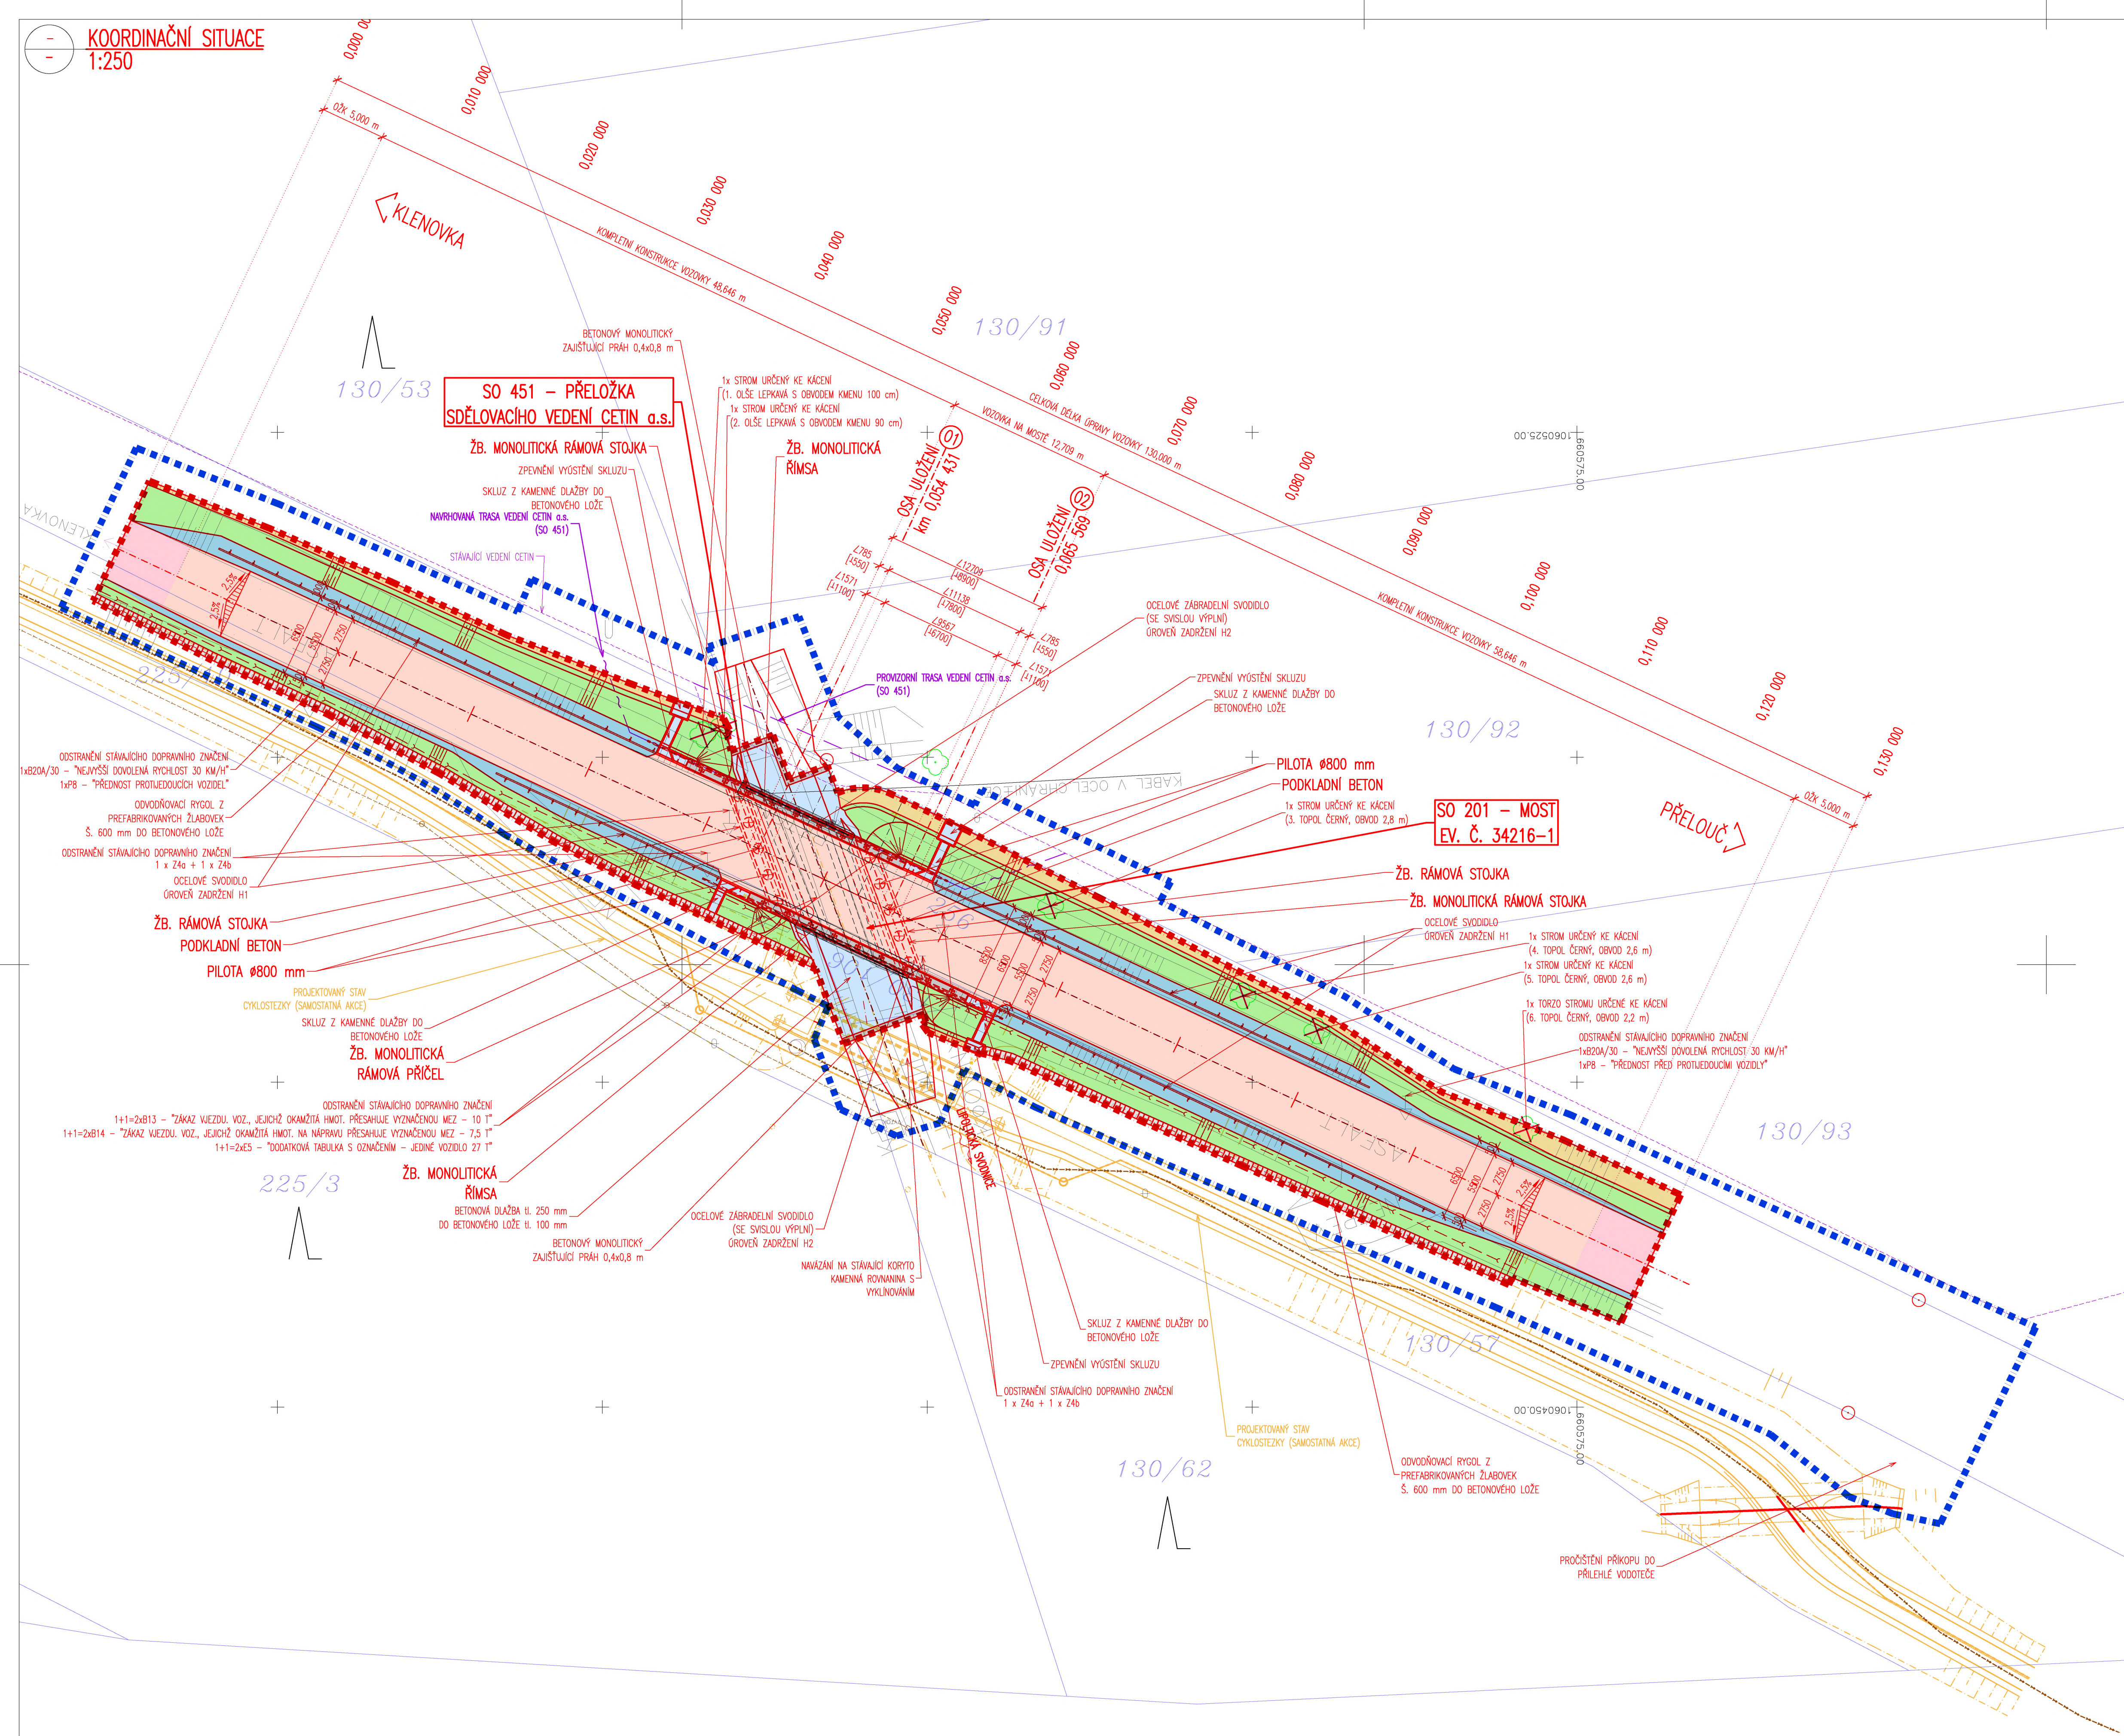

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 182 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
SO 201 – MOST EV.Č.34216-1
SO 451 – PŘELOŽKA SĚLOVACHO VEDENÍ CETIN a.s.

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :
HRANÝ PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
ZAMĚŘENÉ BUDOVY
HRANICE KATASTRU
OR. ZÁŘEŠ DLE KN
ČÍSLO POZEMKŮ DLE KN
STROMY
DOPRAVNÍ ZNAČKA
LAMPA VEŘ. OSVĚTLENÍ
KANALIZAČNÍ VÝPUST

LEGENDA NOVÝ STAV:
OSA KOMUNIKACE
DRENÁŽNÍ TRÁVNIK
REZNÁ SPÁRA S, 10 mm TL, 40 mm S ASF. ŽALOUKOU
PŘÍPOJKY VÝPUSTI
HRANICE TRVALÉHO ZABORU POZEMKŮ STAVBOU
HRANICE DOČASNÉHO ZABORU POZEMKŮ STAVBOU
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
ULOVÍ VÝPUST
NOVÝ STOLŽAR VO
STROM URČENÝ KE SKÁCENÍ

POZNÁMKA:
- PŘESNOST VÝKRESU A PŘÍPUSNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:
ČSN 73 04 22
ČSN 01 34 19
TKP KARTOLA 1, PŘÍLOHA 6.9
TKP KARTOLA 18, A SOUVISEJÍCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
SĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN a.s.
STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ KANALIZACE – VAK Pardubice a.s.
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VAK Pardubice a.s.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
NAVRHOVANÉ TRASA SĚLOVACHO VEDENÍ – CETIN a.s. (SO 451)

LEGENDA POVRCHŮ:
NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY – VOZOVKA NA PŘEDMOSTÍ/MOSTĚ
OSNOVA ŽIVČNÉHO KRYTÍ
ŽB KONSTRUKCE
KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONOVÉHO LŮŽE
OHUMISOVÁNÍ A OSETI OSTATNÍ PLOCHY – NÁSYP
OHUMISOVÁNÍ A OSETI OSTATNÍ PLOCHY – ZÁŘEZ
KRAJNICE Z R-MAT

MATERIÁLY			
BETON A MALTY:			
dle TKP 18, a dle ČSN EN 206			
PILOTY			
C30/37	XA1	-	CI 0,40; Dmax 22 – S4
ZÁKLADOVÉ PASY			
C30/37	XC2, XF2, XD1	(C2 F.1.2)	- CI 0,40; Dmax 22
RÁMOVÉ STOUJKY, KŘÍDLA, PŘECHODOVÉ DESKY			
C30/37	XC2, XF2, XD1	(C2 F.1.2)	- CI 0,40; Dmax 22
RÁMOVÁ PŘÍČEL			
C30/37	XC2, XF2, XD1	(C2 F.1.2)	- CI 0,40; Dmax 22
ŘÍMSY			
C30/37	XC4, XF4, XD3	(C2 F.1.2)	- CI 0,40; Dmax 22
BETONOVÉ OBRUBNÍKY			
C30/37	XC4, XF4		
BETONOVÉ PRAHY			
C30/37	XC4, XF4		
PODKLADNÍ BETON POD ZADLAŽBY, OPEVNĚNÍ KORYTA			
C20/25n	XF3		
LŮŽE POD OBRUBNÍKY			
C20/25n	XF3		
DRENÁŽNÍ BETON			
MCB-8			
M25 XF4			
<u>VÝZTUŽ:</u>			
oznažení dle ČSN EN 10080, EN 10138			
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ			
B 500B			

SKLADBA "A" – VOZOVKA NA MOSTĚ:			
dle TP 170 – 01–N–2–TOZ IV – PI			
– obrusná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACO 11	TL 40 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
– ložná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACL 16+	TL 60 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
– ochrana izolace			
LITÝ ASFALT	(ČSN EN 13 108–1)	MA 11 N	TL 35 mm
– izolace			
CELOPLOŠNÁ ISOLACE Z MODIF. NAP. DLE ČSN 73 6242			TL 5 mm
–			
CELKOVÁ TL. VOZOVKY			TL 140 mm


SKLADBA "B" – VOZOVKA NA PŘEDMOSTÍ:			
dle TP 170 – 01–N–2–TOZ IV – PI			
– obrusná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACO 11	TL 40 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
– ložná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACL 16+	TL 60 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
– podkladní vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACP 16+	TL 50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PI-EM	0,40 kg/m ²
–			
STĚRKOVRSTVA	E _{del} 2 = 100 MPa	SD ₄	TL 150mm
–			
STĚRKOVRSTVA	E _{del} 2 = 80 MPa	SD ₄	TL 150mm
–			
CELKOVÁ TL. VOZOVKY	E _{del} 2 = 45 MPa		TL 450mm

SKLADBA "C" – OŽK:			
dle ČSN 73 6242			
– obrusná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACO 11	TL 40 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
– ložná vrstva			
ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13 108–1)	ACL 16+	TL 60 mm
SPUJOVACÍ POSTŘÍK	ČSN 73 6129	PS-EM	0,40 kg/m ²
–			
CELKOVÁ TL. VOZOVKY			TL 100 mm





Stavební/investor:		Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	
Zákazce/investor:		Ing. Jiří Synek, technický náměstek; jiri.synek@suspk.cz	
Generální projektant:		PRODIN a.s. K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 130 IČO: 252 92 161 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):		BC MARTIN HUDEC	
Souřadný systém:		S-JTSK, B.p.v.	
Název stavby/lokace:		Most ev.č. 34216-1 Klenovka	
Místo stavby:		Obec: Přelouč, k.ú. Klenovka [666131]	
Název části:		SITUAČNÍ VÝKRESY	
Název objektu:			
Odpovědný projektant:		ING. JAN BURSA	
Zpracovatel přílohy:		ING. JAN PIDIMA	
Název přílohy:		KOORDINAČNÍ SITUACE	
Zakázka:		2023/4067	
Datum:		11/2023	
Stupeň dokumentace:		DUSP	
Označení části:		C.	
Označení objektu:			
Formát:		10x44	
Měřítko:		1:250	
Číslo přílohy:		C.3.	
Č. par:			

polohopis provizorní

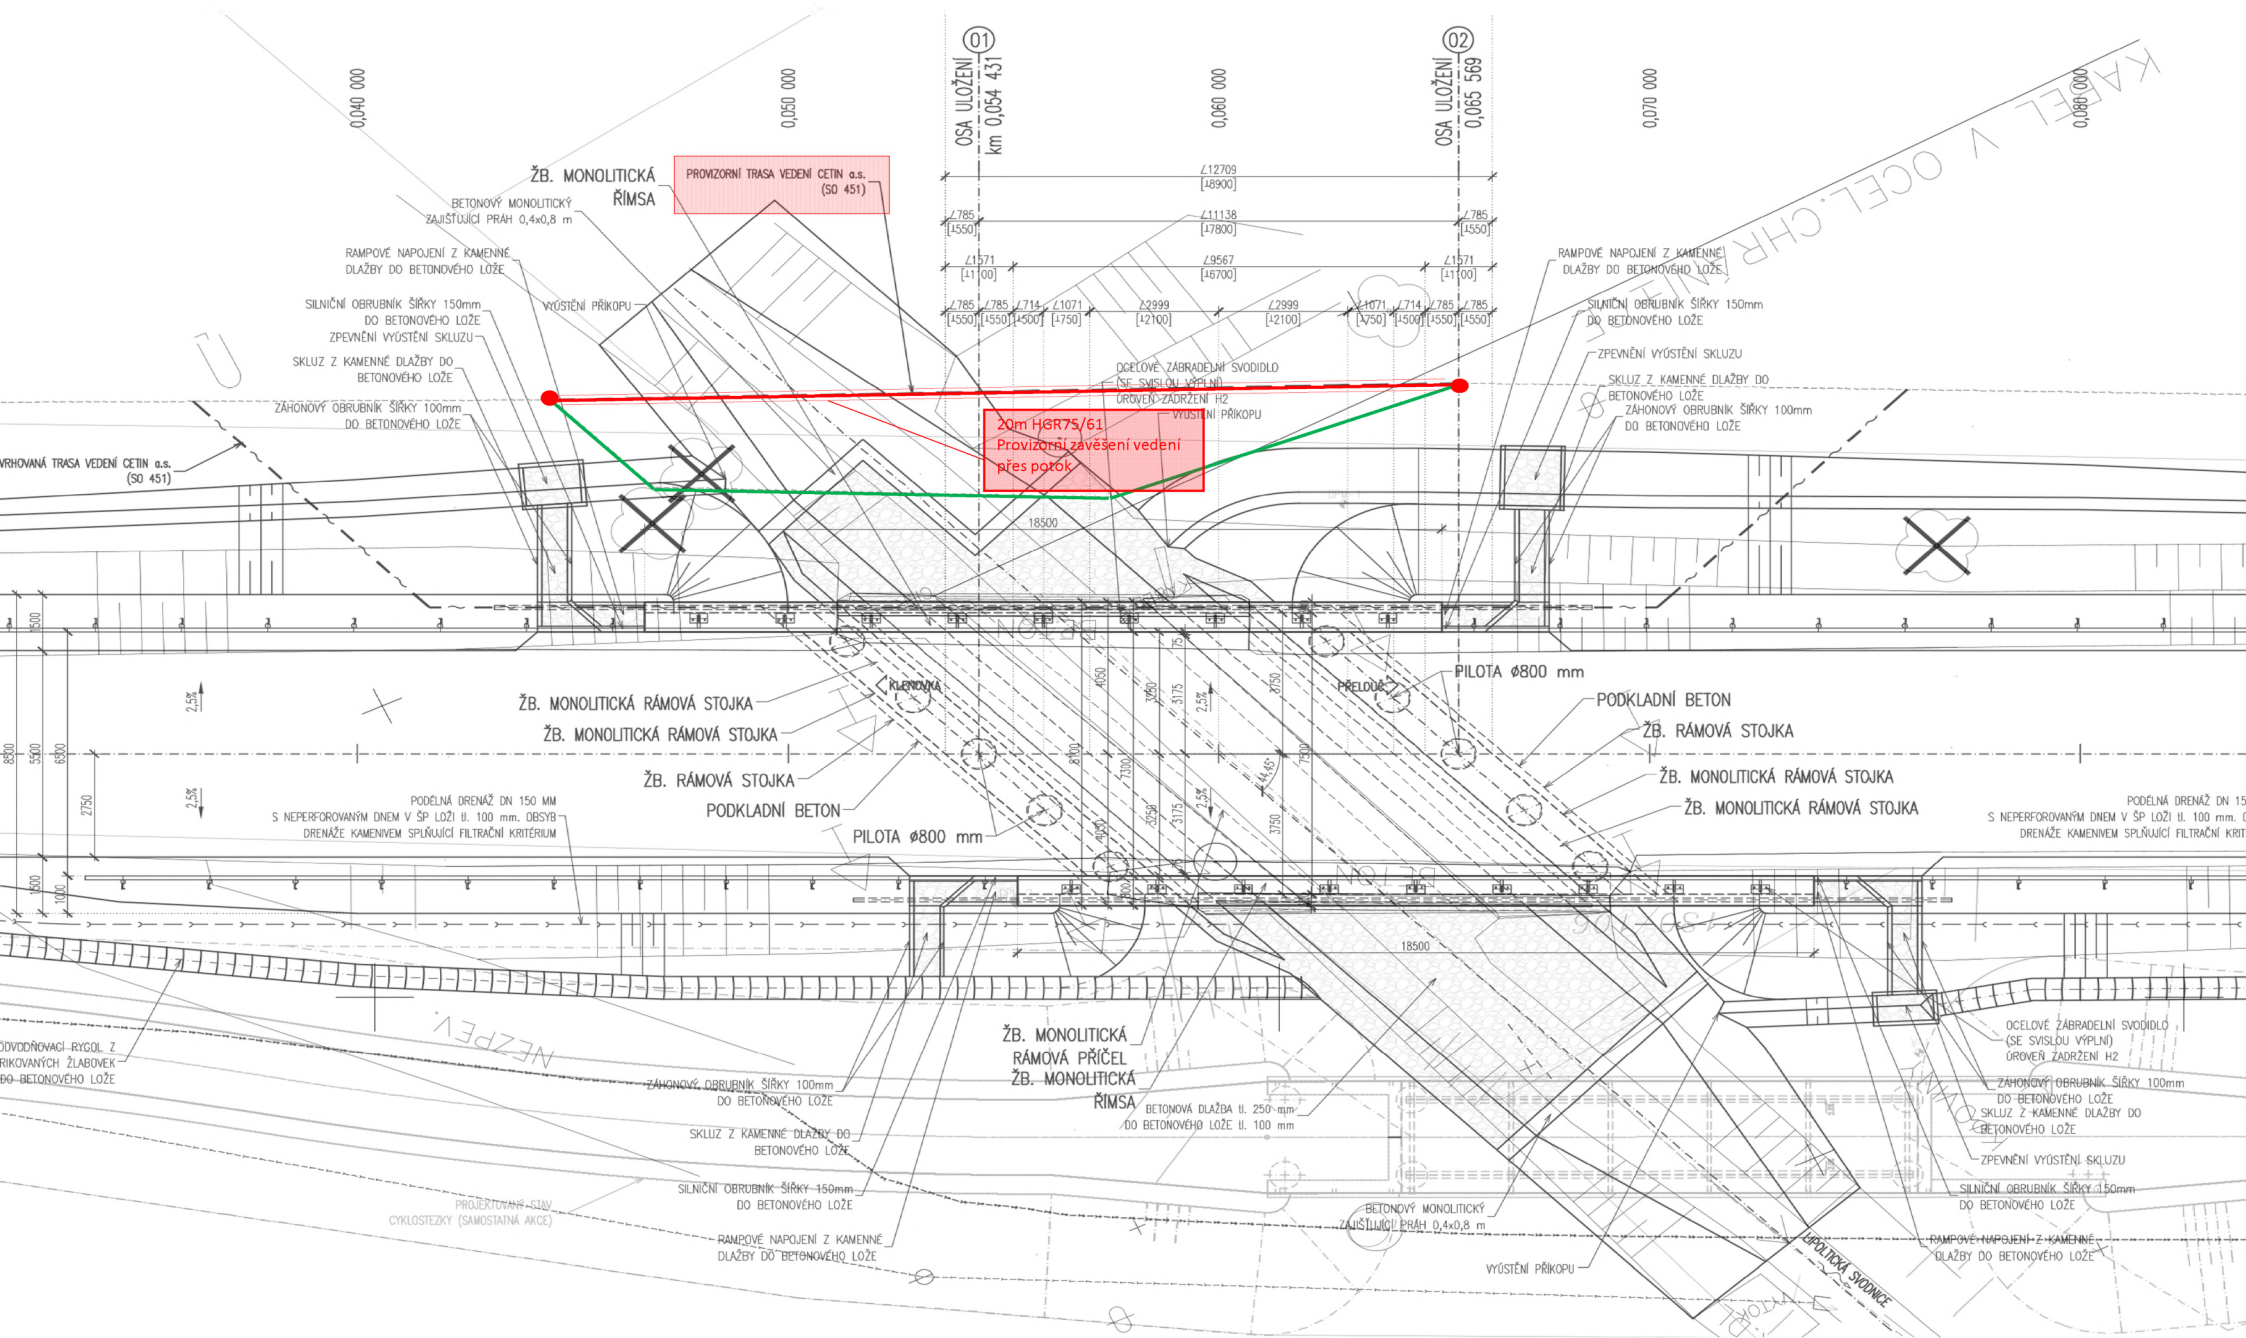







Název stavby: Most ev. č. 34216-1 Klenovka, SO 451 - přeložka CETIN a.s

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 840,08 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	36 370,28 Kč
MONTÁŽ	102 861,37 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	11 698,86 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	37 142,44 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	12 839,94 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	5 000,00 Kč

Celkové náklady:	242 330 Kč
------------------	------------

z toho Příprava:	34 539 Kč
------------------	-----------

STAVEBNÍ ČINNOST	162 126,29 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	80 203,94 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 799,66 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		17040.42 J	17 040,42 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		46.00 m	1 130,68 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	6 191,95 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		15.00 m	10 729,20 Kč
958755 S	Rýha v chodníku 50/130		6.00 m	10 614,90 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		15.00 m	6 880,05 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		50.00 m	823,50 Kč
MONTÁŽ				
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		72.00 m	4 194,72 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		2.00 ks	410,26 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		18.00 ks	851,76 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		18.00 ks	568,62 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		2.00 ks	220,98 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním		40.00 ks	1 578,40 Kč

955267	S	Montáž nadzemní tratě síťové Zřízení přechodu přes potok	12300.00 J ¹	12 300,00 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	5 990,16 Kč
958592	S	Provádění PEW v maintenance window	2.00 ks	64 419,28 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou projektová rezerva	6150.00 JV	6 150,00 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	4814.22 JV	4 814,22 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 362,97 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278	S	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	6 964,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	6 612,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313	S	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	11 698,86 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958747	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 441,94 Kč
954830	S	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	15000.00 J ¹	15 000,00 Kč
955315	S	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 731,66 Kč
958085	S	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	10 968,84 Kč
POPLATKY				
955367	S	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	5000.00 JV	5 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	17.00 ks	760,58 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	6.00 m	24,72 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	36.00 m	169,56 Kč
300118	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	80.00 m	5 473,60 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	522,98 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	8.00 ks	211,92 Kč
312881	S	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	4.00 ks	3 259,24 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	26.00 m	1 411,54 Kč
302388	S	Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	20.00 m	708,80 Kč
309759	S	Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50	4.00 ks	297,00 Kč



MUPCX00K4YO6

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Ě

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.:

Č.j.:

Spis.,skart.znak

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Přelouč, odbor stavební (dále „správní orgán“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 34a odst. 2 a § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále „společné povolení“), kterou dne 27.06.2024 podal **Pardubický kraj, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Most ev.č. 34216 – 1 Klenovka“

na pozemcích parc. č. 130/92 (orná půda), 256 (ostatní plocha), 130/57 (ostatní plocha), 130/106 (ostatní plocha), 225/10 (ostatní plocha), 130/93 (orná půda), 130/53 (lesní pozemek) v katastrálním území Štěpánov u Přelouče. Pozemky p.č. 130/92 a 130/53 jsou dotčeny pouze dočasným zábořem

Popis a členění stavby:

SO 181 - dočasné dopravní opatření – tento objekt není předmětem stavebního povolení

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky provozu. Předmětem objektu jsou veškeré práce a dopravní značení pro vyznačení uzavírky komunikace

SO 201 - most ev.č. 34216-1

Je navržena kompletní demolice stávajícího mostního objektu. Nový mostní objekt je monolitická jednopoložá železobetonová rámová konstrukce založená pomocí velkopřůměrových pilot. Převáděná komunikace je v kategorii S 6,5/90 s šířkou jízdního pruhu 2,75 m a nezpevněnou krajnicí 0,5 m. Celková volná šířka mostu je 8,5m, Celková délka mostu je 18,5 m s délkou přemostění 6,7 m (kolmou). Součástí je rekonstrukce navazující vozovky v celkové délce 130 m a úprava koryta vodního toku v délce 25 m

SO 451 – přeložka sdělovacího vedení CETIN

Stávající metalické vedení bude po dobu stavby provizorně vymístěno mimo prostor stavby a následně bude vedení osazeno do ochranné trubky na mostě v levé římse. Délka nového vedení bude 45 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené stavbou zahrnuje výše uvedené pozemky, na které se předmětná stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby

Stavba bude umístěna v souladu s výkresem Koordinační situace C.3 v měřítku 1:250, který je součástí Projektové dokumentace stavby.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace z data 11/2023, č. zak. 2023/4067, zpracované společností PRODIN a.s., IČ 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a ověřené Ing. Janem Bursou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0601653), která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. U případných změn stavby před jejím dokončením bude postupováno v souladu s § 118 stavebního zákona.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení celé prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě vytýčeny a s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci zhotovitelů. Vytýčení sítí je nutné provést za účasti příslušných správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací musí být stanovena ochranná pásma jednotlivých sítí a stanoveny požadavky na omezení prací pomocí mechanismů.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně oprávnění k provádění stavby**. Stejně údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.
5. Stavba bude dokončena **nejpozději do 31.12.2027**.
6. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či **prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí**, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti.
7. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, zejména vlivem prašnosti, hluku a otřesů. U výkopových prací a manipulaci s prašným materiálem bude zajištěna minimalizace produkce prachu, mezideponie prašného materiálu budou plachtovány a kropeny. V případě znečištění veřejných komunikací dopravou bude neprodleně provedeno jejich očištění. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. Výstavbou, staveništní dopravou, skládkováním či zařízením staveniště nebudou dotčeny sousední pozemky.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
9. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby případně investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s., zejména dodržet podmínky uvedené ve vyjádření čj. 120823/24 ze dne 02.05.2024.
10. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby případně investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození zařízení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., zejména dodržet podmínky uvedené ve vyjádření čj. VS/Hav/2024/1476 ze dne 20.05.2024.
11. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 7569/2024/OŽP/Ša ze dne 06.05.2024:
 - Při stavební činnosti postupovat v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností – září 2019.

12. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 9065/2024/OŽP/Fe ze dne 27.05.2024
- Odstranění dřevin neproběhne od 01. září do 28. února běžného roku (resp. proběhne mimo reprodukční období, zejména hnízdění ptáků či vyvážení mláďat ostatních živočišných druhů).
 - Stávající zeleň bude ponechána bez zásahu. Nezbytně může být provedeno pouze kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a dřevin stojících v místě stavby. Nesmí být odstraněna doprovodná vegetace z obou břehů. Kácení bude provedeno v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 - Vzrostlé dřeviny, zejména, stromy, kterým by hrozilo v důsledku činnosti poškození kořenových náběhů a kmenů, budou preventivně opatřeny účinnou ochranou. Stavbou nedojde k poškození trvalých porostů a nebude porušen kořenový systém okolního porostu. Bude dodržen standard AOPK SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
 - Pokud dojde v průběhu zásahu k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny dle standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 - řez stromů.
 - Veškeré materiály použité na stavbu musí splňovat předepsané podmínky a charakteristiky neohrožující životní prostředí.
 - V průběhu stavby účinně zabránit unikům škodlivých látek (oleje, pohonné hmoty atd.) do půdy a povrchové vody.
 - Areál staveniště bude dostatečně vybaven absorpčními látkami pro případ úniku škodlivých látek do půdy a povrchové vody.
 - Dostupnými prostředky zabránit nadměrnému úhynu rostlin a živočichů, jejich zraňování nebo úhynu. Výkopy hlubší než 30 cm vždy před opuštěním staveniště zabezpečit proti pádu živočichů do výkopu a ráno před zahájením prací musí být výkop zkontrolován.
 - Vytěžený sediment nesmí být vyhrnován do břehu vodního toku, přilehlých mokřadních luk a na druhově bohaté luční porosty.
 - V rámci realizace prací nebudou měněny směrové poměry koryta toku ani výškový průběh původní nivelety dna toku.
 - Bude zajištěn minimální zůstatkový průtok ve stávajícím korytě.
 - Při zranění živočicha v důsledku činnosti na stavbě, zajistit jeho nezbytné ošetření nebo ho předat provozovateli záchranné stanice.
 - Pokud by mohlo dojít při realizaci akce k ohrožení přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nebo rostlin, budou práce zastaveny a bude okamžitě vyrozuměn Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
 - Veškeré okolní pozemky dotčené záměrem budou po ukončení činnosti uvedeny do původního stavu.
 - S odpady, které budou vznikat v průběhu akce je nutno nakládat způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v aktuálním znění a s ním souvisejících prováděcích předpisů.
 - Stavební práce nesmí probíhat v noci z hlediska omezení doby rušení bioty. Ze stejného důvodu by mělo být minimalizováno noční osvětlení stavby a jejího okolí.
 - Během realizace akce nesmí dojít k narušení stabilizující funkce v krajině základních skladebních částí územního systému ekologické stability (LBC 8 a LBK 22-8).
 - Podmínky tohoto závazného stanoviska se vztahují rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru žadatelem prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto závazného stanoviska.
 - O zahájení a ukončení akce je třeba (min. 7 dní) prokazatelně informovat OOP Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí.
13. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 9911/2024/OŽP/Fe ze dne 31.05.2024
- Ve vztahu k možnostem využití PUPFL k jiným účelům než těm, které stanovuje lesní zákon, lze stavbou přímo dotčenou část lesního pozemku p.č. 130/53 o výměře 47 m² z celkové výměry 9989 m² v k.ú. Štěpánov u Přelouče využít ke stavbě „Most ev.č. 34216-1 Klenovka“ za předpokladu existence pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL vydaného na základě ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 až 18 lesního zákona, a to před započítáním stavby.
14. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Povodí Labe čj. PLa/2024/018252 ze dne 28.05.2024:
- Při demolici a stavbě mostu požadujeme zachování průtočnosti, nesmí docházet ke spadu materiálu do vodního toku. Pokud se tak stane, musí být z koryta toku neprodleně odstraněn.
 - Most včetně opevnění na vtoku a výtoku zůstane v majetku investora, který na něm bude provádět následnou údržbu a opravy.

- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebi podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) požadujeme předložit havarijní plán před jeho schválením vodoprávní úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (495088708, stulcovap@pla.cz).
 - Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat jeho povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz)
 - Termín zahájení prací a jejich ukončení požadujeme oznámit zástupci našeho závodu v Pardubicích (Cihelna 135, tel. 466 868 246 nebo 721 963 729, p. Šprync).
15. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti čj. KUPA-9532/2024-2:
- Má-li být po dobu uzavírky obslužnost zastávky Přelouč, „Klenovka zajištěna linkovými autobusy, musí být v Klenovce zajištěn dostatečný prostor pro bezpečné otočení autobusu v blízkosti současného umístění zastávky,
 - nebude-li splněna výše uvedená podmínka, je zhotovitel stavby povinen na své náklady zajistit svoz cestujících minimálně do nejbližší obsluhované zastávky, a to v rozsahu na kterém se domluví se starostou obce
 - konkrétní řešení dopravní obslužnosti pro linkovou dopravu bude stanoveno až v rámci podání žádosti o uzavírku či dopravní omezení dané komunikace. Tato žádost bude **dopravnímu úřadu** předložena minimálně 25 dní před termínem zahájení uzavírky.
16. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu dotčené sítě jejího správce.
17. Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby
19. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikaci, stanovené vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 73 6121 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody, ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů (a dalších technických norem dle projektové dokumentace).
20. Most bude označen dopravním zařízením Z11e-f dle platných technických podmínek TP 58 – Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání (Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 37/2016-120-TN/1 ze dne 10.2.2016 s účinností od 15.2.2016).
21. Po dobu výstavby bude prostor stavby zcela jasně vymezen a viditelně označen. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo provést stavbu.
22. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být včas projednány s jejich vlastníky.
23. O povolení úplné uzavírky dotčené pozemní komunikace a stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční správní úřad zhotovitelem stavby v předstihu nejpozději 2 měsíce před požadovaným termínem úplné uzavírky.
24. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od společného povolení, příp. změny společného povolení,
 - b) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy,
 - c) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zkoušky hutnění pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, certifikáty všech použitých materiálů, výsledky první hlavní prohlídky mostu, mostní list
 - d) doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením,
 - e) protokoly o předání a převzetí dokončené stavby,
 - f) stanovení místní úpravy provozu,
 - g) doklady o kontrole sítí před záhozem,
 - h) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

25. Stavebník nejpozději 10 dní předem oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby a pozve na kontrolní prohlídky stavby:
- Po vytýčení stavby
 - Po provedení výztuže nosné konstrukce (před betonáží)
 - Po provedení výztuže říms (před betonáží)
 - Závěrečnou kontrolní prohlídku – po dokončení stavby

IV. V souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC/14867/2024/OŽP/Ke ze dne 20.08.2024 povoluje kácení dřevin:

Specifikace dřeviny:

označení	druh	Obvod kmene ve 130 cm výšky	pozemek p.č.	k.ú.
1	Olše lepkavá	100 cm	256	Štěpánov u Přelouče
2	Olše lepkavá	90 cm	256	Štěpánov u Přelouče
3	Topol černý	280 cm	256	Štěpánov u Přelouče
4	Topol černý	260 cm	256	Štěpánov u Přelouče
5	Topol černý	260 cm	256	Štěpánov u Přelouče
6	Topol černý (torzo)	220 cm	256	Štěpánov u Přelouče

za následující podmínky:

- Kácení je možno provést v době platnosti územního a stavebního povolení na stavební záměr „Most ev. č. 34216-1 Klenovka“ na pozemku p.č. 256 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, a to v termínu, kdy, již bude prokazatelně zřejmé, že bude stavba realizována.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“):

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

Simona Oplištilová, nar. 13.6.1973, Oldřiš 57, 569 82 Oldřiš

OJGAR, s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 27.06.2024 podal stavebník žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu na Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Správní orgán přezkoumal žádost podle §94l zákona č. 183/2006 Sb. a zjistil, že obsahuje podklady nutné k jejímu posouzení. Na základě této skutečnosti správní orgán oznámil zahájení společného řízení i účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 11.10.2024 pod čj. MUPC 19039/2024.

Správní orgán v souladu s ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska. V určené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.

V souladu s § 36 odst. 3 byla dána účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy správní orgán vycházel z podání stavebníka, z výpisů z KN a koordinační situace stavby se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:

- § 94k písm. a) stavebníka – Pardubický kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
- § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - město Přelouč
- § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – CETIN, a.s
- § 94k písm. d) vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (nejsou-li sami stavebníkem) – Vodovody a kanalizace, a.s., Simona Oplišilová, OJGAR, s.r.o.
- § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – Radek Ďoubal, Ing. Martina Mertová, Ing. Kateřina Rohovcová, Jiří Turyna, TRAAM s.r.o.

Vlastnictví pozemků ověřil správní orgán dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne 24.07.2024.

Stavebník v průběhu řízení (k datu odeslání oznámení o zahájení řízení) upravil rozsah žádosti tak, že pozemek p.č. 130/93 **nebude dotčen dočasným záborem**.

Dle § 94l, odst. 2 stavebního zákona byly doloženy souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru na pozemcích p.p.č. 130/57, 130/106, 255/10, 130/53, 130/92 dle § 184a na situačním výkresu stavby.

Správní orgán v provedeném společném řízení přezkoumal žádost o územní a stavební řízení podle § 94o odst. 1 a § 94o odst. 2 stavebního zákona a zjistil následující:

Stavba je navržena v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, splňuje obecné požadavky na umísťování staveb dle § 23 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, svými parametry, provedením a způsobem připojení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu, vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, stavba je umístěna v souladu s § 25 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména s ustanovením § 8. Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým.

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba je veřejnou dopravní infrastrukturou, která je napojena na stávající pozemní komunikace.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. Ve stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, které stavebník předložil k žádosti:

- Vyjádření podle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. vydané Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství čj. KUPA-10463/2024-2 ze dne 20.05.2024 – dle vyjádření záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
- Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj. KUPA-10330/2024-2 – záměr nemůže mít vliv na vymezené ptáčí oblasti ani na významné evropské lokality
- Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 8219/2024 ze dne 02.05.2024

- Vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního čj. MUPC 7620/2024 ze dne 23.04.2024 – záměr se nedotýká nemovitých kulturních památek ani památkově chráněného území
- Společné vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 7569/2024/OŽP/Ša ze dne 06.05.2024 – z důvodu ochrany ŽP po dobu stavby byly podmínky vyjádření převzaty do výrokové části
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 9652/2024/OŽP/MH ze dne 27.05.2024 – bez podmínek
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC 9065/2024/OŽP/Fe ze dne 27.05.2024 k zásahu do VKP – podmínky závazného stanoviska byly z důvodu ochrany VKP převzaty do výrokové části
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí (orgán státní správy lesů) čj. MUPC 9911/2024/OŽP/NF ze dne 31.05.2024 - podmínky závazného stanoviska byly z důvodu ochrany PUPFL převzaty do výrokové části
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní oblužnosti čj. KUPA-9352/2024-2 ze dne 07.05.2024 – podmínky dané vyjádřením byly z důvodu zajištění dopravní obslužnosti převzaty do výrokové části
- Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát čj. KRPE-37026-2/ČJ-2024-170606 ze dne 29.04.2024 s podmínkami, které jsou splněny v projektové dokumentaci a podmínkami rozhodnutí
- Souhlasné závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany čj. MO 358684/2024-1322 ze dne 29.04.2024
- Souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí čj. MUPC/14867/2024/OŽP/Ke ze dne 20.08.2024 ke kácení dřevin

Projektová dokumentace stavby je vyhotovena v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, členěná na jednotlivé po sobě jdoucí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby. Projektovou dokumentaci stavby ověřil Ing. Jan Bursa, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0601653),

Přijezd ke stavbě je zajištěn ze stávající silnice č. III/34216. Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí.

Spolu se žádostí stavebník v souladu s § 941 odst. 2 stavebního zákona předložil:

- Vyjádření obce Valy k návrhu objízdných tras ze dne 19.06.2024
- Vyjádření obce Veselí k návrhu objízdných tras ze dne 18.06.2024
K výše uvedeným vyjádřením správní orgán uvádí, že uzavírka a objízdné trasy, vč. DIO budou projednány v rámci řízení o povolení uzavírky.
- Vyjádření Povodí Labe, s.p. čj. PLa/2024/018252 ze dne 28.05.2024 – z důvodu ochrany vodního toku byly podmínky správce převzaty do výrokové části
- Vyjádření odborného lesního hospodáře Lesy České republiky, s.p. čj. LCR157/001512/2024 ze dne 03.06.2024 – podmínky jsou splněny podmínkami rozhodnutí danými vyjádřeními Městského úřadu Přelouč, OŽP
- Vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury k existenci sítí v místě stavby. Z uvedených vyjádření je zřejmé, že při stavbě dojde k dotyku s tech. infrastrukturou ve vlastnictví/správě Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. a CETIN a.s., ochrana uvedené tech. infrastruktury je zajištěna podmínkami rozhodnutí.

Předložená výše uvedená závazná stanoviska i vyjádření jsou souhlasná. Správní orgán zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací.

Jelikož správní orgán v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. §81 odst. 1 a §83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru

Příloha pro stavebníka:

1. Štítek „Stavba povolena“ (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí)
2. Ověřená projektová dokumentace (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Město Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 01 Přelouč

Simona Oplištilová, Oldřiš č.p. 57, 569 82 Borová u Poličky

TRAAM s.r.o., IDDS: 5yj7yzt
sídlo: U Hájku č.p. 1587, 535 01 Přelouč

OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9
sídlo: Křížová č.p. 1018/6, 150 00 Praha 5-Smíchov

Radek Ďoubal, Jedousov č.p. 42, 535 01 Přelouč

Ing. Martina Mertová, Horka I č.p. 20, 286 01 Čáslav

Ing. Kateřina Rohovcová, Prokopa Holého č.p. 1905, 286 01 Čáslav-Nové Město

Jiří Turyna, Štěpánov č.p. 24, 535 01 Přelouč

ostatní

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nasavrky, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Náměstí č.p. 13, 538 25 Nasavrky

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Váta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3



MUPCX00K96E7

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/12095/2024/Ju
Č.j.: MUPC 177/2025
Spis.,skart.znak 280.13, A, 20
Vyřizuje: Ing. Jiří Jura
Tel.: 466 094 150, 736 607 107
E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz

Datum: 6.1.2025

SDĚLENÍ

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí – společné povolení č.j. MUPC 21569/2024 ze dne 26.11.2024 na stavbu „**Most ev.č. 34216 - 1 Klenovka**“

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 28.12.2024** a je vykonatelné.

Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ODBOR STAVEBNÍ
535 33 PŘELOUČ

Příloha pro stavebníka:
1x štítek Stavba povolena
2x ověřená PD

Příloha pro DO:
1x kopie společného povolení s doložkou nabytí právní moci

Obdrží:

stavebník

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

dotčené orgány

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopavní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
sídlo: Roškova č.p. 2757, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení
ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopavní obslužnosti, IDDS:
z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
