
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPIC/MS/2025/00046**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Bohumín

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená dle pověření Petrem Truhlářem, supervizorem VFS Morava sever
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(„**CETIN**“)

a

Město Bohumín

se sídlem Masarykova 158, Bohumín 735 81
IČO: 00297569
DIČ: CZ 00297569
ID DS: u3kbfuf
zastoupený Ing. Lumírem Macurou, starostou města
(„**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Společnost CETIN je podnikatelem dle Zákona o elektronických komunikacích a zajišťuje dle Zákona o elektronických komunikacích výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací a je vlastníkem a provozovatelem Vedení a zařízení společnosti CETIN;
- B) Stavba vyvolala Překládku;
- C) Stavebník má zájem a přeje si, aby společnost CETIN zajistila Překládku,

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku a dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích tuto

**Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(„Smlouva“)**

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Faktura znamená daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 435 Občanského zákoníku a s náležitostmi dle příslušných ustanovení ZDPH;

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018;

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Projekt znamená realizační projektovou dokumentaci Překládky, která je přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka znamená stavbu v k.ú. Nový Bohumín spočívající (i) ve změně trasy nebo místa umístění Vedení a zařízení společnosti CETIN, a/nebo (ii) v provedení zvýšené mechanické ochrany Vedení a zařízení společnosti CETIN v jeho stávající trase umístění, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky znamená přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky znamená předpoklady určené v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK znamená komunikační síť ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. d) Zákona o elektronických komunikacích, tj. síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Stavba znamená stavbu pod označením „Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše Bohumín“, jejímž stavebníkem je Stavebník;

Stavební připravenost znamená stav Stavby, který stavebně a technicky umožňuje umístění překládané části SEK, zejména jsou dokončeny hrubé terénní úpravy v nové trase Vedení a zařízení společnosti CETIN, vyřezány dřeviny, odstraněny neprovozované inženýrské sítě a jiné další objekty v trase a terén je zarovnan do úrovně konečné nivelity;

Stavební zákon znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Vedení a zařízení společnosti CETIN znamená podzemní nebo nadzemní vedení komunikační sítě společnosti CETIN nebo telekomunikační zařízení společnosti CETIN;

Vyjádření o poloze sítě znamená „*Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací*“ ze dne 3.8.2022 vydané pod č.j. 721105/22, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o vyvlastnění znamená zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění;

ZDPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

- 1.2. Stavebník dle Vyjádření o poloze sítě vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Bohumín, Štefánikova, E. Beneše_NEJ**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1. Překládka bude realizována v rozsahu a na nemovitostech určených v Projektu.
- 3.2. Předpokladem pro realizaci Překládky je splnění každé z následujících podmínek:
 - a) pro stavbu Překládky je dle příslušných ustanovení Stavebního zákona vydáno povolení, povolení je pravomocné a společnosti CETIN bylo takové pravomocné povolení, včetně jeho grafické a dokladové části, předáno;
 - b) ve prospěch společnosti CETIN je zajištěno právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou tak, že mezi společností CETIN a každým vlastníkem každé nemovitosti dotčené v souvislosti s Překládkou je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle ust. § 104 odst. 3 Zákona o elektronických komunikacích nebo vzniklo společnosti CETIN oprávnění k užívání cizích nemovitostí dle ust. § 104a nebo je ve prospěch společnosti CETIN právo užívat nemovitosti dotčené Překládkou dle Zákona o vyvlastnění vyvlastněno.
- 3.3. Společnost CETIN nemá povinnost (i) zahájit provedení Překládky dříve, než nastaly Předpoklady pro realizaci Překládky a (ii) provést Překládku, nejsou-li splněny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5. Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Společnost CETIN se zavazuje
 - a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - b) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
 - (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2. Stavebník je povinen před realizací Překládky:

- a) plnit podmínky určené Vyjádřením o poloze sítě;
- b) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN Stavební připravenost („**Kvalifikovaná výzva**“).

Práva a povinnosti z rozhodnutí o povolení záměru vydané Městským úřadem Bohumín, odbor stavební – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MUBO/07712/2023 ze dne 6.2.2023 pravomocného dne 8.3.2023 („**Rozhodnutí**“), které je Přílohou č. 2 Smlouvy, a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny, svědčí ode dne právní moci Rozhodnutí společnosti CETIN.

4.3. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední ze všech následujících podmínek:

- a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1. písm. a) Smlouvy;
- c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2. Smlouvy.

4.4. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ust. § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6. Jakákoliv lhůta určená společnosti CETIN Smlouvou k realizaci Překládky se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

4.7. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi odesláno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty určenou v odst. 8.2. Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1. Stavebník je dle ust. § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny

nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

- 5.2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **398.739,- Kč** (slovy: tři sta devadesát osm tisíc sedm set třicet devět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2. Smlouvy, se Stavebník zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - f) náklady na identifikaci parcel,
 - g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - i) náklady související se zvláštním užíváním dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.4. Výše nákladů na Překládku uvedená v odst. 5.2. Smlouvy se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi („**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2. a/nebo odst. 5.4. Smlouvy je Stavebník povinen

uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů. Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **43.157,- Kč** (slovy: čtyřicet tři tisíc jedno sto padesát sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření Smlouvy;
 - b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.3. Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce Smlouvy, do datové schránky Stavebníka nebo elektronicky na adresu: faktury@mubo.cz. Daňový doklad zaslaný na adresu elektronické pošty určenou v předchozí větě musí obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být zabezpečen jakýmkoliv jiným certifikátem uznávaným právním řádem České republiky.
- 6.5. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na Faktuře.
- 6.6. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

ve věcech technických: Martin Lednický
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: martin.lednický@cetin.cz, tel.: +420 606 095 799

8.2. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Lumír Macura
funkce: starosta města
e-mail: macura.lumir@mubo.cz, tel.: +420 596 092 151

ve věcech technických: Ing. Petr Popek

funkce: referent odboru rozvoje a investic
e-mail: popek.petr@mubo.cz, tel.: +420 596 092 172

- 8.3. Kontaktní osobu má Smluvní strana právo kdykoli změnit, a to písemným oznámením, doručeným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením druhé Smluvní straně, ledaže Smluvní strana v oznámení uvedla pozdější datum účinnosti změny.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany ujednávají, že je-li v téže věci určeno více kontaktních osob, jedná každá samostatně, ledaže je Smlouvou určeno jinak.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smlouvu lze zrušit:

- (a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- (b) odstoupením z důvodů a za podmínek stanovených Smlouvou.

- 9.2. Společnost CETIN má právo, aniž by tím omezila jakékoliv své jiné právo nebo možnost nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc:

- a) je-li Stavebník v prodlení se splněním kterékoliv povinnosti dle Smlouvy a takové prodlení trvá déle než šedesát (60) Dnů,
- b) je-li Stavebník v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy, a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení určeno pozdější datum jeho účinnosti.

- 9.3. Odstoupí-li společnost CETIN od Smlouvy dle odst. 9.2. Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- 9.4. Pokud Smluvní strany ujednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů určených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po pozbytí účinnosti Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ust. § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 10.2. Smlouva pozbude účinnosti dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná kvalifikovaná výzva.

- 10.3. Pozbude-li Smlouva účinnosti rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy. Stavebník souhlasí s tím, že společnost CETIN provede na náklad Stavebníka veškeré nezbytné práce, které zajistí funkčnost a ochranu stavbou či dosavadní činností dotčené části SEK a dále veškeré činnosti a právní jednání, která jsou nezbytná k zajištění souladnosti umístění SEK s veřejnými a

soukromými oprávněními společnosti CETIN k SEK. Náklady dle předchozí věty uhradí Stavebník společnosti CETIN do třiceti (30) dnů od vystavení Faktury.

- 10.4. Pozbytím účinnosti Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje („**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a

časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti okamžikem uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákona o elektronických komunikacích. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
 - c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.
- Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a, jedná-li se o právní jednání doručované společnosti CETIN, současně na e-mailovou adresu contract_termination@cetin.cz.
- 12.4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že nad rámec ustanovení Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemně. Smluvní strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny kontaktních osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku:
- a) § 557;
 - b) § 1767 odst. 2;
 - c) § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3;
 - d) § 1743; a
 - e) § 2002 a § 2003.
- 12.7. Smluvní strany na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

- 12.8. S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, zejména ust. § 1881 a § 1895 Občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.9. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejími přílohami, převládá text Smlouvy.
- 12.10. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.11. Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

- 12.12. Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 12.13. Stavebník potvrzuje, že ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou nezbytné k platnému uzavření Smlouvy.
- 12.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Rozhodnutí

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města č. 890 / 60 na schůzi č. 60 dne 10. 3. 2025.

V Ostravě dne _____

Za CETIN:

**Petr
Truhlář**

Digitálně podepsal
Petr Truhlář
Datum: 2025.03.21
13:08:13 +01'00'

Petr Truhlář
Supervizor, VFS Morava sever
CETIN a.s.

V Bohumíně dne _____

Za Stavebníka:

**Ing. Lumír
Macura**

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.03.24
15:52:47 +01'00'

Ing. Lumír Macura
starosta města
Město Bohumín



Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.

Příčná 2828/10, Opava, 746 01

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

VPIC Bohumín, Štefánikova, E. Beneše_NEJ

Investor generální stavby:	Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín
Investor:	CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 130 00 Praha 3
Dodavatel stavby:	Vegacom a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4
Zpracovatel projektové dokumentace:	Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. Příčná 28287/10 746 01 Opava
Projektant:	Ing. Zdeněk Salzmänn
Datum:	03/2025

Číslo výtisku:

0

A. Průvodní zpráva

○ A.1 Identifikační údaje

○ A.1.1 Údaje o stavbě

- **Název stavby:** VPIC Bohumín, Štefánikova, E. Beneše_NEJ
- **SPP prvek:**
- **Místo stavby:** k.ú. Nový Bohumín
- **Kraj:** Moravskoslezský
- **Účel stavby:** Stavba řeší přeložení (ochranu) telekomunikačního vedení a zařízení společnosti CETIN, z důvodů výstavby okružní křižovatky ul.Štefánikova x E.Beneše v Bohumíně.
- **Druh stavby:** Podzemní vedení sítě elektronických komunikací
- **Zadavatel stavby:** Vegacom a.s.
- **Zhotovitel stavby:** Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
- **Stavební úřad:** Odbor výstavby MěÚ Bohumín

○ A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- **Obchodní jméno stavebníka:** CETIN a.s.
- **Sídlo stavebníka:** Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha9
- **IČ:** 04084063
- **Zápis v obchodním rejstříku:** Spisová značka B 2322 vedená u Městského soudu v Praze
- **Projektový koordinátor:** Martin Lednický, tel. (+420)606095799,
martin.lednický@cetin.cz

○ A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

- **Obchodní jméno zhotovitele PD:** Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
- **Sídlo zhotovitele PD:** Příčná 2828/10, Opava, 746 01
- **IČ:** 439 64 435
- **Zápis v obchodním rejstříku:** Spisová značka C 2399 vedená u Krajského soudu v Ostravě
- **Zápis v obchodním rejstříku:** Ing. Zdenek Salzmann, tel. (+420)602527470, email:
zdenek.salzmann@smt.cz

○ A.1.4 Údaje o investorovi

Obchodní jméno investora:

Město Bohumín
Masarykova 158
735 81 Bohumín
IČ: 00297569

○ A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba přeložky není členěna na objekty.

○ **A.3. Seznam vstupních podkladů**

- Startovací dokumentace
- Mapové podklady poskytnuté zhotovitelem dokumentace generální stavby, správci inženýrských sítí a města
- Katastrální mapy dané lokality a informace z Katastru nemovitostí
- Vydané územní rozhodnutí s nabytím právní moci

○ **A.4. Údaje o území**

○ **Popis polohy stavby**

Stavba se nachází na křižovatce ul. Štefánikova x E.Beneše v Bohumíně v místě připravované výstavby okružní křižovatky v k.ú. Nový Bohumín“.

○ **Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů**

Stavba se nenachází se v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, v chráněném území ani v národním parku. Stavba se nenachází v záplavovém území řeky.

○ **Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci (regulační plán)**

Není předmětem PD.

○ **Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Na tuto stavbu projednával ÚR a SP generální projektant generální stavby.

○ **Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)**

Jedná se o novou stavbu, seznam stavbou dotčených pozemků je součástí dokladové části projektové dokumentace (viz. Tabulka vlastníků dotčených nemovitostí).

○ **Seznam souvisejících a podmiňujících investic, všechny známé vazby a souvislosti**

Stavby jednotlivých stavebních objektů je nutno koordinovat s pracemi na generální stavbě.

○ **Seznam výjimek a úlevových řešení (výjimka ze stavební uzávěry, ...)**

Na stavbu není potřeba žádné výjimky ani úlevového řešení.

○ **A.5. Údaje o stavbě**

○ **Nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba**

Stavba řeší přeložení (ochranu) telekomunikačního vedení společnosti CETIN. Po dokončení stavby se bude jednat o trvalou stavbu.

○ **Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)**

Stavba nezasahuje do památkově chráněného objektu ani kulturní památky.

○ **Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb**

Stavba se netýká vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

○ **Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Není předmětem PD.

○ **Seznam výjimek a úlevových řešení**

Na stavbu není potřeba žádné výjimky ani úlevového řešení.

○ **Etapizace výstavby**

Není předmětem PD.

○ **Orientační náklady stavby - viz. rozpočtová část - PPD**

B. Souhrnná technická zpráva

○ B.1. Popis území stavby

- Stavba přeložky se nachází na křižovatce ul. Štefánikova x E.Beneše v Bohumíně v místě připravované výstavby okružní křižovatky na nemovitostech parc.č. 393/16, 393/11, 550, 549, 544/10 v k.ú. Nový Bohumín. Jedná se o vynucenou překládku.

○ B.2 Celkový popis stavby – technické řešení

○ B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Stavba řeší přeložení telekomunikačního vedení společnosti CETIN, na křižovatce ul. Štefánikova x E.Beneše v Bohumíně v místě připravované výstavby okružní křižovatky na nemovitostech parc.č. 393/16, 393/11, 550, 549, 544/10 v k.ú. Nový Bohumín, z důvodů připravované generální stavby „Okružní křižovatka ulic Štefánikova, Tř. Dr. E. Beneše - Bohumín“. Po dokončení stavby se bude jednat o trvalou stavbu.

○ B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

○ Specifikace rizikových faktorů BOZP

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro zemní, nadzemní a montážní práce určené ČSN, zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce - v platném znění č.85/2001 Sb. a příslušnými vyhláškami - zejména vyhláškou č. 309/2006 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, dále vyhlášku č.48/1982 základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na technických zařízeních + změna č.207/1991, vyhláškou č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ČSN 343100 Bezpečností předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a související normy a předpisy. Při montážních pracích je zhotovitel povinen dodržovat Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. a 67/2001 Sb. v platném znění a vyhlášku č. 246/2001 o požární prevenci včetně materiálního zabezpečení a technického vybavení pro dodržování požární bezpečnosti na svěřených stavbách.

Bezpečnostní rizika spojená s realizací stavby

1	Silniční vozidla a pojízdné zdroje
2	Žebříky – žebříky přenosné
3	Stavební práce – staveniště
4	Stavební práce – práce ve výškách
5	Stavební práce – zemní práce – výkopy
6	Malá mechanizace – benzinové přenosné přístroje
7	Malá mechanizace – Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací
8	Malá mechanizace – Elektrická mechanizovaná nářadí
9	Malá mechanizace – Horkovzdušné pistole
10	Malá mechanizace – Elektrické vrtačky
11	Stavební stroje – elektrocentrály
12	Stavební stroje – kompresor PD200
13	Stavební stroje – vibrační pěchy, pěchovadla
14	Stavební stroje – kolová rypadla, pásová rypadla
15	Zdvihací zařízení – Mobilní jeřáby – autojeřáby vlastní i pronajaté
16	Zdvihací zařízení – Hydraulická ruka HR 3001
17	Zdvihací zařízení – Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku
18	Manipulace a skladování – ruční manipulace
19	Manipulace a skladování – nakládka a vykládka dopravních prostředků

20	Manipulace a skladování – skladovací regály
21	Manipulace a skladování – skladovací prostory
22	Elektrická zařízení – úraz el. proudem
23	Elektrická zařízení – atmosférická elektřina – blesk
24	Psi

○ **Popis projektovaných opatření pro zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání**

Při ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců musí zaměstnavatelé dbát zejména na ustanovení zákoníku práce:

Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti“.

Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatele povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:

- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a
- b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Z těchto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovníků dodavatelské (realizační) firmy vyžadovat před započítím prací v prostorách cizí organizace, od této organizace rizika, která vyplývají z činnosti druhé organizace a z pohybu svých zaměstnanců v prostorách této organizace a mohlo by při pohybu vlastních zaměstnanců v těchto prostorách dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví těchto zaměstnanců. **Zaměstnanci dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou činnost, pokud nebudou obě ustanovení zákoníku práce splněna!!!!**

Tato ustanovení zákoníku práci platí i v případě, že dodavatel zadá část zakázky jinému subdodavateli (např. zemní práce).

○ **Posouzení možnosti vzniku nebezpečných, případně rušivých vlivů NN, VN, VVN, ZVN, drážní elektrické trakce a vlivů atmosférických výbojů**

Nebezpečné, případně rušivé vlivy NN, VN, VVN, ZVN, drážní elektrické trakce a vlivů atmosférických výbojů nejsou předmětem PD.

○ **Posouzení zabezpečení stavby a identifikace rizik z pohledu zneužití při provozování vedení a zařízení sloužícího k provozování služby s ohledem na bezpečnost informací (ochrana vedení a zařízení polohou, uzamykatelnost rozpojovacích bodů, ochrana koncového bodu sítě, klíčový režim u zákazníků, ...)**

- V průběhu stavby bude při zemních pracích a montáži pracovní prostor ohrazen výstražnou fólií a bude zajištěno přechodné dopravní značení. Po dokončení stavby není nutné stavbu speciálně chránit před vniknutím nepovolaných osob.

○ **Návrh opatření ke snížení rizik na akceptovatelnou úroveň**

Není předmětem PD.

○ **B.2.3 Základní technický popis staveb**

○ **Údaje o souvisejících stavebách, bilancích zemních prací a vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy**

Stavba vyžaduje koordinaci s výstavbou silniční křižovatky.

○ **Popis stavebních objektů**

Stavbu přeložek je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN dle „Smlouvy o překládce sítě CETIN“.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘEKLÁDKY

- Stavba řeší přeložení telekomunikačního vedení společnosti CETIN, na křižovatce ul. Štefánikova x E. Beneše v Bohumíně v místě připravované výstavby okružní křižovatky na nemovitostech parc.č. 393/16, 393/11, 550, 549, 544/10 v k.ú. Nový Bohumín, z důvodů připravované generální stavby „Okružní křižovatka ulic Štefánikova, Tř. Dr. E. Beneše - Bohumín“. Jedná se o vynucenou překládku. Po dokončení stavby se bude jednat o trvalou stavbu.

Překládaný dotčený kabel: Coax CABELCON PG11MU.

Nový koaxiální kabel přeložky typu Coax3 CT33 A bude v místě napojení na stáv. kabel (na severní straně přeložky) ukončen konektory PG11M – H011 a spojen v armaturní spojení SPL – G003.

Na jižní straně přeložky psk bude nový koaxiální kabel typu Coax3 CT33 A ukončen konektorem PG11M – H011 a zapojen do stávajícího zděného sloupkového rozvaděče R-Nej.cz.

V celé délce trasy přeložky koaxiálního kabelu bude připolozena HDPE40mm trubka.

Dle vyjádření bývalého pracovníka Nej.cz – p.Tymicha, jediná dostupná dokumentace exNej.cz – poskytnutá situace exNej.cz (viz. výkresová část) neodpovídá skutečnosti a kabelové schéma není k dispozici. Pro zpracování generálního projektu a projektu přeložky k projednání společného územního a stavebního rozhodnutí, bylo nutno trasu stávajícího koaxiálního kabelu vytýčit zástupcem Nej.cz. Trasa koaxiálního kabelu bude detailně vytýčena i před realizací přeložky, dle potřeby budou na trase koaxiálního kabelu provedeny sondy.

Navrhovanou trasou přeložky dojde k dotčení nemovitostí:
parc.č. 393/16, 393/11, 550, 549, 544/10 v k.ú. Nový Bohumín
– vlastník Město Bohumín

Koaxiální kabel a rezervní HDPE40mm trubka bude v celé délce uložena do samostatné 1x HGR/PE 125mm chráničky.

Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Bude zpracována realizační dokumentace stavby přeložky a uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi CETIN a vlastníky dotčených nemovitostí.

Přeložku SEK je nutno koordinovat s připravovanou generální stavbou.

Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů.

Stavbu je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti CETIN a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“.

Min. krytí PE/HGRmm chrániček a podzemního vedení CETIN pod budoucími a stávajícími komunikacemi a na přilehlých nemovitostech bude min 0,9m. V dostatečném předstihu před realizací bude požádáno o přerušování provozu PEW na metalickém kabelu. Konce chrániček a nové kabelové spojky kabelové vložky budou označeny minimarkery 3M 1255.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení v trase přeložky. Uložení chrániček s met. kabely a HDPE musí být provedeno dle ČSN334050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Budou dodrženy podmínky vyjádření všech vlastníků a správců sítí.

- **Popis výkopových prací (stanovení rozměrů výkopů podle jednotlivých povrchů a způsobu jejich využití a počtu projektovaných prvků v rýze, stanovení minimálního krytí dle jednotlivých povrchů, použití mechanických ochranných kabelů a trubek ve výkopu, popis souběhů a křížení s inženýrskými sítěmi, použití markerů a dalších označnicků)**

Chráničky PE/HGR budou ukládány přímo do výkopu a budou zakryty výstražnou fólií. Nové spojky metalických kabelů a HDPE trubek budou označeny minimarkem 3M 1255.

- **Popis vstupů kabelů do objektů a jejich zajištění proti vnikání vody, popis vedení kabelů uvnitř objektů**
Není předmětem PD.
- **Podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí, vlastníků a uživatelů nemovitostí uplatněné při projednávání stavby**
Společné povolení stavbeního záměru (vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a správců inženýrských sítí) projednal projektant generální stavby – kompletní dokladovou část dle potřeby předá zhotoviteli před realizací přeložky zástupce investora Město Bohumín, příp. generální dodavatel stavby.
- **Popis křížení komunikací**
Křížení stáv. komunikací a vjezdů bude provedeno výkopem a uložením PE chrániček s min. krytím 1,2m pod úroveň nové nivelety dle požadavku vyjádření správce.
- **Popis křížení vodních toků**
Není předmětem PD.
- **Popis křížení železničních tratí**
Není předmětem PD.
- **Popis křížení kabelovodů, kolektorů, produktovodů, horkovodů, případné využití konstrukcí (např. mostních)**
Není předmětem PD.
- **Popis uvedení povrchů nemovitostí do původního, popřípadě náležitého stavu**
Povrchy nemovitostí budou po realizaci uvedeny do stavu dle požadavku vlastníků.
- **Další popisy speciálních a nestandardních zemních prací**
Není předmětem PD.
- **Pokládka a montáž kabelů (popis technického řešení, popis vazeb na stávající síť, použité typy kabelů a kabelových souborů)**
Na provedení kabelových vložek bude použit nový kabel Coax3 CT33A, kabelová spojka bude označena minimarkem 3M 1255.
- **Umístění rozvaděčů, způsob instalace, uzemnění**
Není předmětem PD.
- **Vyrovnání kapacitních nerovnováh (zhodnocení, zda je nutno provádět vyrovnání kapacitních nerovnováh, popis technického řešení)**
Není předmětem PD.
- **Popis případného řešení tlakové, izolační a protikorozi ochrany kabelů**
Není předmětem PD.
- **Popis měření na kabelech**
Správce PVSEK požaduje kontrolní měření metalické sítě po ukončení přeložky.
- **B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení**
- **B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Z hlediska požární ochrany zákona č. 67/2001 Sb. v platném znění o požární ochraně je stavba bez zvýšeného požárního rizika. Z hlediska požární ochrany a civilní ochrany je potřeba případné překopy komunikací provádět po částech tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace. Dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích čl. 17., 18., 19., 20. a 21., vyhlášky č. 48/1982 základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízeních + změna č. 207/1991 Sb. Při montážních pracích je zhotovitel povinen dodržovat Zákon o požární ochraně č. 67/2001 v platném znění a vyhlášku 246/2001 o požární prevenci včetně materiálního zabezpečení a technického vybavení pro dodržování požární bezpečnosti na svěřených stavbách. Při realizaci je zhotovitel povinen postupovat dle standardních technologických postupů pro zemní a montážní práce, bude dodržovat podmínky stanovené v územním rozhodnutí, výkopového povolení a podmínek pro zábor veřejných prostranství jakož i vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb., zejména § 17 – 19 a dále

technicky a věcně splnitelné podmínky stanovené v připomínkách dotčených orgánů a organizací. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Specifikace faktorů požárních rizik, zejména členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí do kategorií:

- **Bez zvýšeného požárního nebezpečí**
Nebudou prováděny montáže v objektech.
- **Se zvýšeným požárním nebezpečím**
Není předmětem PD.
- **S vysokým požárním nebezpečím a protipožární prevence**
Není předmětem PD.
- **B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**
 - **Ochranná opatření k zajištění bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace v průběhu realizace stavby**
Stavba není určena pro obsluhu veřejností, provozovatelem stavby je společnost CETIN, která bude řešit správu, údržbu a provoz prostřednictvím svých pracovníků, případně dohodnutými rámcovými dodavateli.
- **B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**
 - **Povodně**
Jedná se o umístění nových metalických vedení a HDPE trubek pro optické kabely bez vlivu na případnou povodeň..
 - **Sesuvy půdy**
Není předmětem PD.
 - **Poddolování**
Není předmětem PD.
 - **Seizmická**
Není předmětem PD.
- **B.3. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**
 - **Ochrana porostů, zemědělských plodin**
Zemědělské plodiny ani porosty nebudou stavbou dotčeny.
 - **Uvedení terénu do původního stavu**
Veškeré výkopy a zemní práce spojené s narušením stávajících povrchů budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu.
- **B.4. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**
 - **Řešení vlivu stavby na zdraví osob a na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, popřípadě provedení opatření sloužící k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků**
Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění zemních prací. Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a realizaci stavby, vztahujících se k ochraně životního prostředí ze strany realizátora.
 - **Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů**
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, příloha č.1, čl. 10.15, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství - (horní zákon) § 19.
Při přípravě a realizaci stavby je nutno dodržovat zákon č. 114/1992 Sb. - trasa je navržena tak, že nevyžaduje kácení vzrostlých stromů a dále je upravena tak, aby se maximálně vyhýbala přiblížení ke vzrostlým stromům, kde by mohlo dojít k poškození kořenového systému.
Dále je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Hloubené výkopy se smí provádět v minimální vzdálenosti od stromů, která činí čtyřnásobek obvodu kmene měřeného ve výšce 1m, nejméně však 2,5m od paty kmene za předpokladu ručního výkopu bez přerušení kořenů o průměru 2cm a více. Blíže stromům nelze stavbu umístit.

Jestliže přes všechna opatření dojde při stavebních pracích k poškození stromu nebo jeho kořenového systému, je provádějící firma povinná zajistit okamžité ošetření poškozeného stromu, tj. kolmé odříznutí poškozeného kořenu, vyčištění ran na kmeni a zatření odříznuté části barvou LUXOL s fungicidem 1202 (popř. fermežovou barvou). Při delší době otevření výkopu je nutno provést zakrytí a vlhčení kořenového systému.

Podle potřeby budou stromy v blízkosti trasy chráněny obedněním. V případě dotčení keřů, které nebude možno obejít, bude provedeno dočasné přesázení a po provedení zemních prací budou keře přesázeny zpět.

○ **Řešení likvidace nebo využití odpadů (recyklace apod.)**

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, dle vyhlášky č. 8/2021 katalog odpadů a dle vyhlášky č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady. Stavbou bude vyprodukován odpad kategorie ostatní ze skupiny katalogu odpadů 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst):

Název odpadu	Zařazení odpadu	Číslo odpadu	Podskupina	Množství
stavební suť	beton	170101	1701	~ 0m ³
	cihla	170102	1701	~ 0m ³
materiál z demolic asf. vozovek a asf. chodníků	asfalt bez dehtu	170302	1703	~ 0m ³
vykopaná zemina (kabelová rýha)	zemina a kamení neuvedené pod číslem 170507	170504	1705	~ 4,0m ³
izolační materiály	izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603	170604	1706	~ 0,1m ³

Původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. je realizační firma, která musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů.

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů.

Plánované koncové nakládání s odpady:

- stavební suť – beton bude předán do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace, příp. do zařízení k odstraňování odpadů na skládku (nerecyklovatelná stavební suť).

- materiál z demolic asf. vozovek a asf. chodníků – asfalt bez dehtu bude předán do zařízení k materiálovému využívání odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace.

- zemina a kamení neuvedené pod číslem 170507 – bude předána do zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu; případně do zařízení k odstraňování odpadů - skládka.

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby(kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachyt unikajících olejů. V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou zákonem o odpadech (materiálové využití, energetické využití, odstranění).

○ **B.5. Ochrana obyvatelstva**

○ **Opatření vyplývající z požadavků využití staveb k ochraně obyvatelstva**

Není předmětem PD.

○ **Řešení zásad prevence závažných havárií**

Není předmětem PD.

- **Zóny havarijního plánování**

- Není předmětem PD.

- **B.6. Zásady organizace výstavby**

- **Ochrana okolí staveniště**

Jedná se o přeložku stávajícího vedení SEK, budou provedeny výkopové a montážní práce s pokládkou chrániček s novými metalickými kabely a HDPE trubkami. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění okolí staveniště vlivem provádění zemních prací. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny s maximální možnou ochranou okolí staveniště. Jestliže přes všechna opatření dojde při stavebních pracích k poškození stromu nebo jeho kořenového systému, je provádějící firma povinná zajistit okamžité ošetření poškozeného stromu, tj. kolmé odříznutí poškozeného kořenu, vyčištění ran na kmeni a zatření odříznuté části barvou LUXOL s fungicidem 1202 (popř. fermežovou barvou).

- **Požadavky na kácení dřevin**

Není předmětem PD.

- **Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin**

Není předmětem PD.

- **Maximální zábory pro staveniště**

Zábor veřejného prostranství pro výkopové práce a pro příp. parkování dopravních prostředků a strojů bude v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu pro provádění výkopových a montážních prací.

C. Situační výkresy - samostatná příloha PD

D. Dokumentace objektů - samostatná příloha PD

E. Dokladová část – samostatná příloha PD

F. Kontakty:


Investor:

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569, DIČ: CZ00297569,

Kontakt: Ing. Petr Popek - odbor rozvoje a investic, 596 092 172, 731 130 714, popek.petr@mubo.cz

Zpracovatel PD přeložky:

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmänn, 602527470, zdenek.salzmänn@smt.cz.

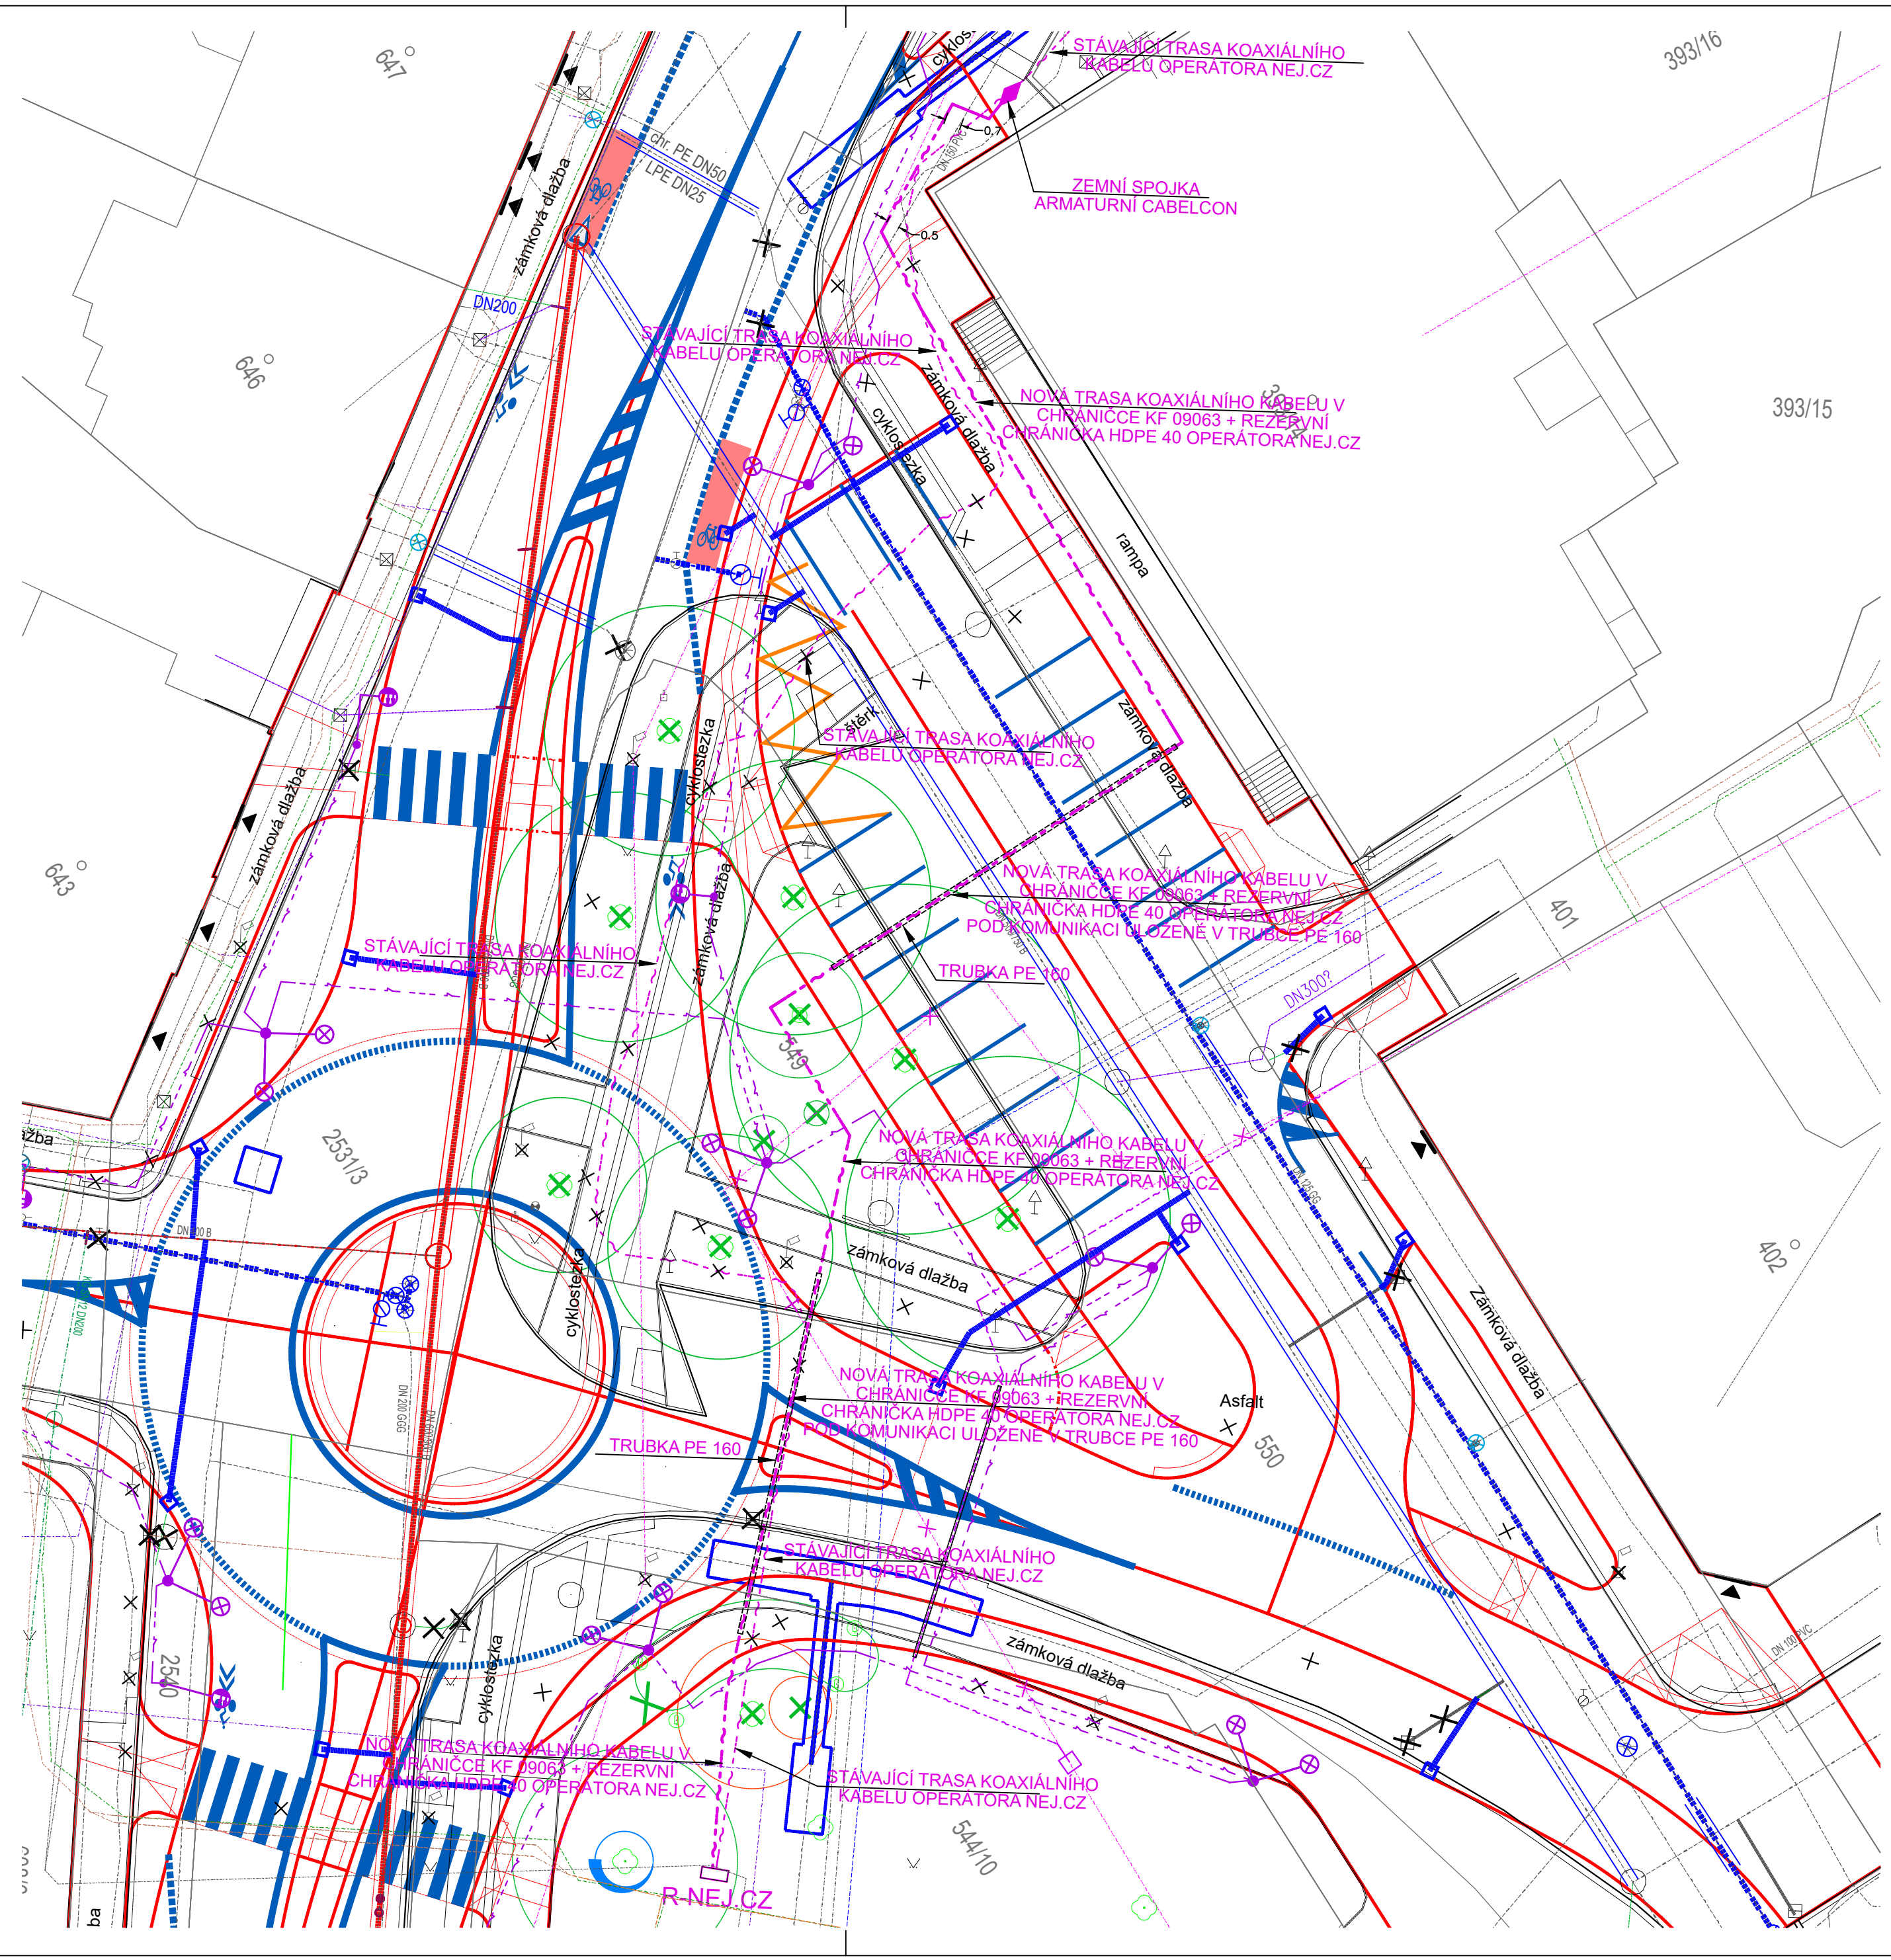

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS)
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV (ČEZ)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV (ČEZ)
- HORKOVOD (ČEZ Teplárenská, a.s.)
- PLYNOVOD NTL (GasNet, s.r.o.)
- PLYNOVOD STL (GasNet, s.r.o.)
- SÍŤ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (Nordic Telecom Regional, s.r.o.)
- PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - PODA (PŘIPOLOŽENO K POTRUBÍ TEPLOVODU)
- VEDENÍ OPTICKÉ TRASY (T-Mobile Czech Republic a.s.)
- NADZEMNÍ VEDENÍ (Cetin, a.s.)
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU - (CETIN, a.s.)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - SÍTĚ S NN, ELEKTROPŘÍPOJKY (Cetin, a.s.)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - NEZAMĚŘENÉ (Cetin, a.s.)
- ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ - VYTÝČENÝ (NEJ.CZ s.r.o.)
- ZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ (NEJ.CZ s.r.o.)
- ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ NEZAMĚŘENÉ (NEJ.CZ s.r.o.)
- VODOVOD (SmVaK)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE (SmVaK)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:


- NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO - BM SERVIS
- NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ (NEJ.CZ S.R.O.)
- NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ EK SPOLEČNOSTI NORDIC TELECOM
- SANACE KANALIZACE VYVLOŽKOVÁNÍM
- NOVÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ DN 150 mm
- PŘELOŽKY VODOVODU

LEGENDA SO 403 PŘELOŽKA EK SPOLEČNOSTI NIC.CZ


- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ KABEL EK SPOLEČNOSTI NEJ.CZ
- ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ KABEL EK SPOLEČNOSTI NEJ.CZ
- PŘELOŽKA ZEMNÍHO KOAXIÁLNÍHO KABELU EK SPOLEČNOSTI NEJ.CZ TYP COAX 3 CT33 A PE/C3 XT351
- ZEMNÍ SPOJKA ARMATURNÍ CABELCON PRO KOAXÁLNÍ KABEL VČETNÉ KONEKTORŮ ARMATURNÍHO PRO COAX 3 CABELCON

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZDENĚK CHUDÁREK		VYPRACOVAL ING. ZDENĚK CHUDÁREK		KONTROLOVAL ING. JIŘÍ TALÁŠEK, Ph.D.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM		BALT p.v. JTSK	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU RSE PROJECT, s. r. o. Ing. Jiří Talášek, Ph.D.		OBEC, KRAJ BOHUMÍN MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		INVESTOR / OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		RSE Project s.r.o. Ruská 83/24, 703 00 Ostrava e-mail: info@rseproject.cz			
NÁZEV AKCE OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA ULIC ŠTEFÁNIKOVA, TR. DR. E. BENEŠE – BOHUMÍN									
ČÁST PD D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		D.1 STAVEBNÍ ČÁST		D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE		DATUM FORMÁT MĚŘITKO STUPEŇ PD		DUBEN 2023 4 x A4 1:200 DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 403 - PŘELOŽKA VEDENÍ EK SPOLEČNOSTI NEJ.CZ						ARCHIVNÍ ČÍSLO Č. SOUPRAVY		21Zak021 Č. VÝKRESU	
NÁZEV VÝKRESU SITUACE - PŘELOŽKA VEDENÍ EK NEJ.CZ								403-02	


ŘEZ 1 - 1'
ULOŽENÍ KABELŮ- VOLNÝ TERÉN
MĚŘ.: 1:20

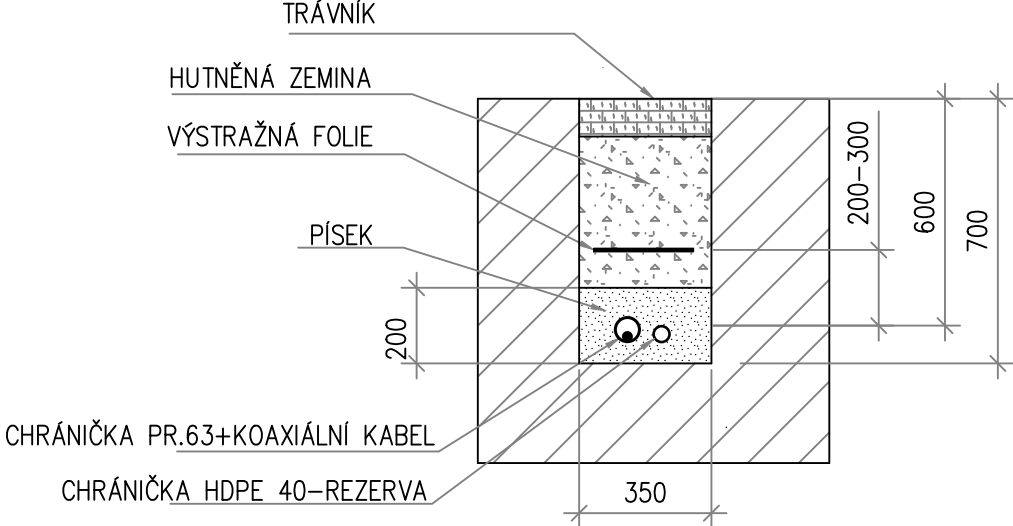

ŘEZ 2 - 2'
ULOŽENÍ KABELŮ- CHODNÍK
MĚŘ.: 1:20

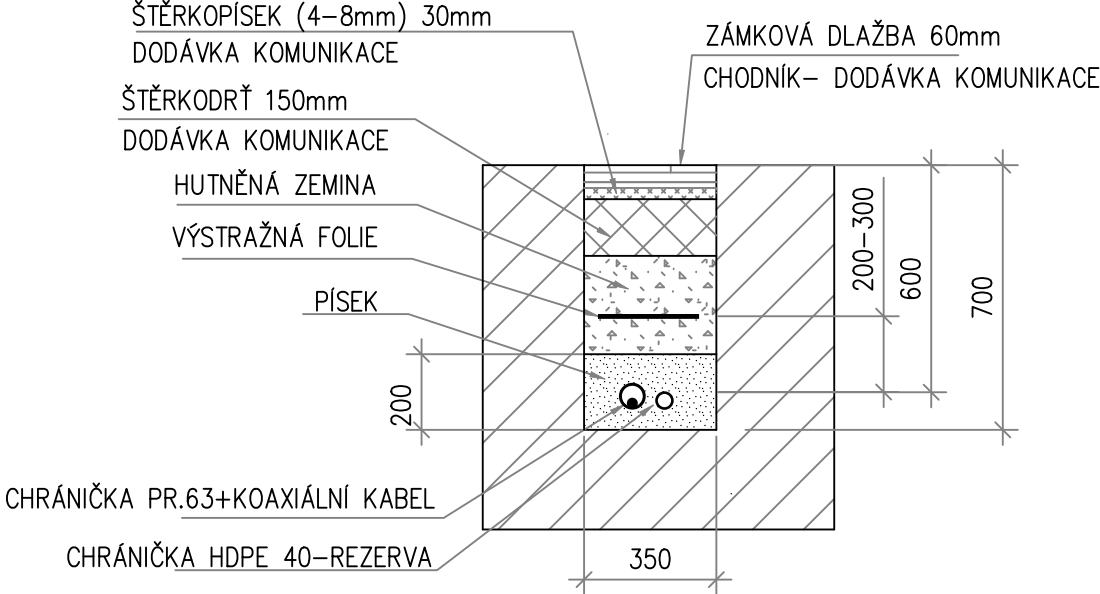


ŘEZ 3- 3'
ULOŽENÍ KABELŮ POD KOMUNIKACÍ
MĚŘ.1:20

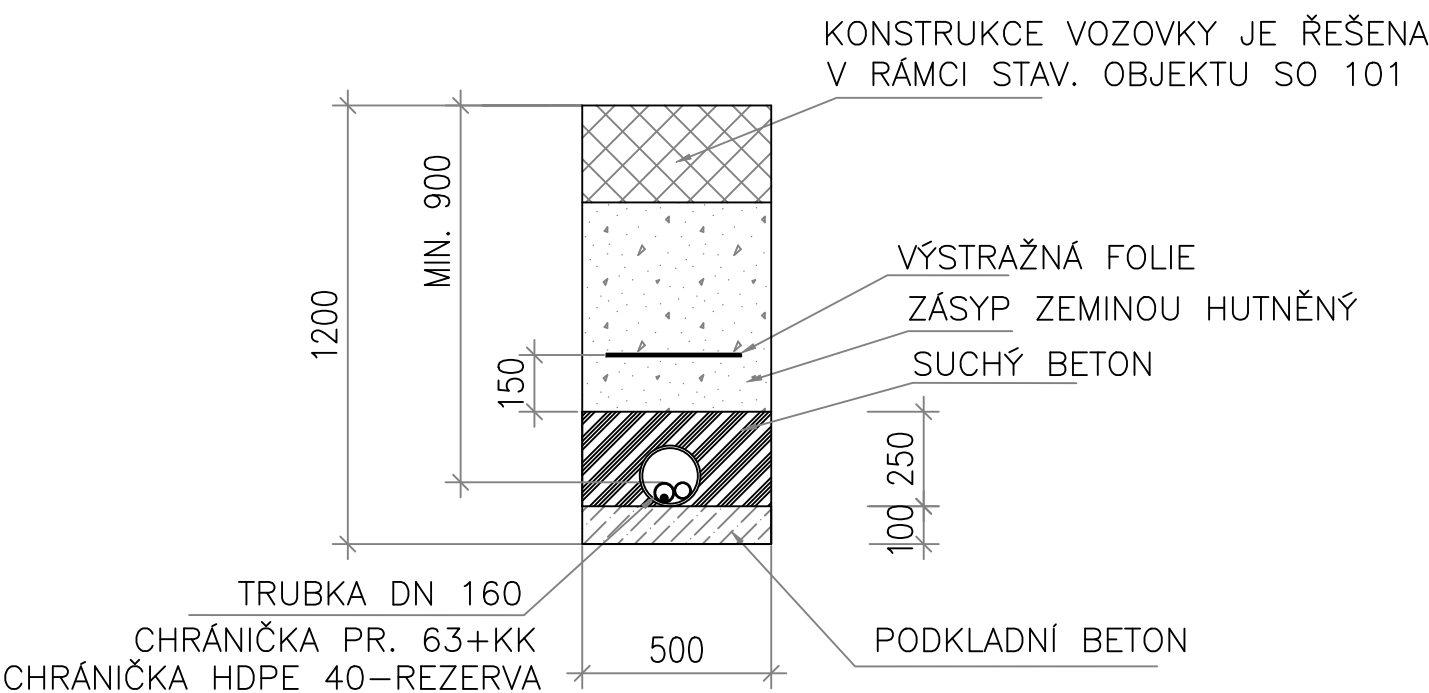

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ZDENĚK CHUDÁREK	VYPRACOVAL ING. ZDENĚK CHUDÁREK	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ TALÁŠEK, Ph.D.	VÝŠKOVÝ SYSTÉM SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM	BALT p.v. JTSK
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU RSE PROJECT, s. r. o. Ing. Jiří Talášek, Ph.D.	OBEC, KRAJ BOHUMÍN MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	INVESTOR / OBJEDNATEL MĚSTO BOHUMÍN MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	 Ruská 83/24, 703 00 Ostrava e-mail: info@rseproject.cz	
NÁZEV AKCE OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ULIC ŠTEFÁNIKOVA, TŘ. DR. E. BENEŠE – BOHUMÍN			DATUM DUBEN 2023	
ČÁST PD D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			FORMÁT 2 x A4	
D.1 STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO 1:20	
D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE			STUPEŇ PD DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 403 - PŘELOŽKA VEDENÍ EK SPOLEČNOSTI NEJ.CZ			ARCHIVNÍ ČÍSLO 21Zak021	
NÁZEV VÝKRESU ŘEZY KABELOVÝMI TRASAMI			Č. SOUPRAVY Č. VÝKRESU	403-03

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:200

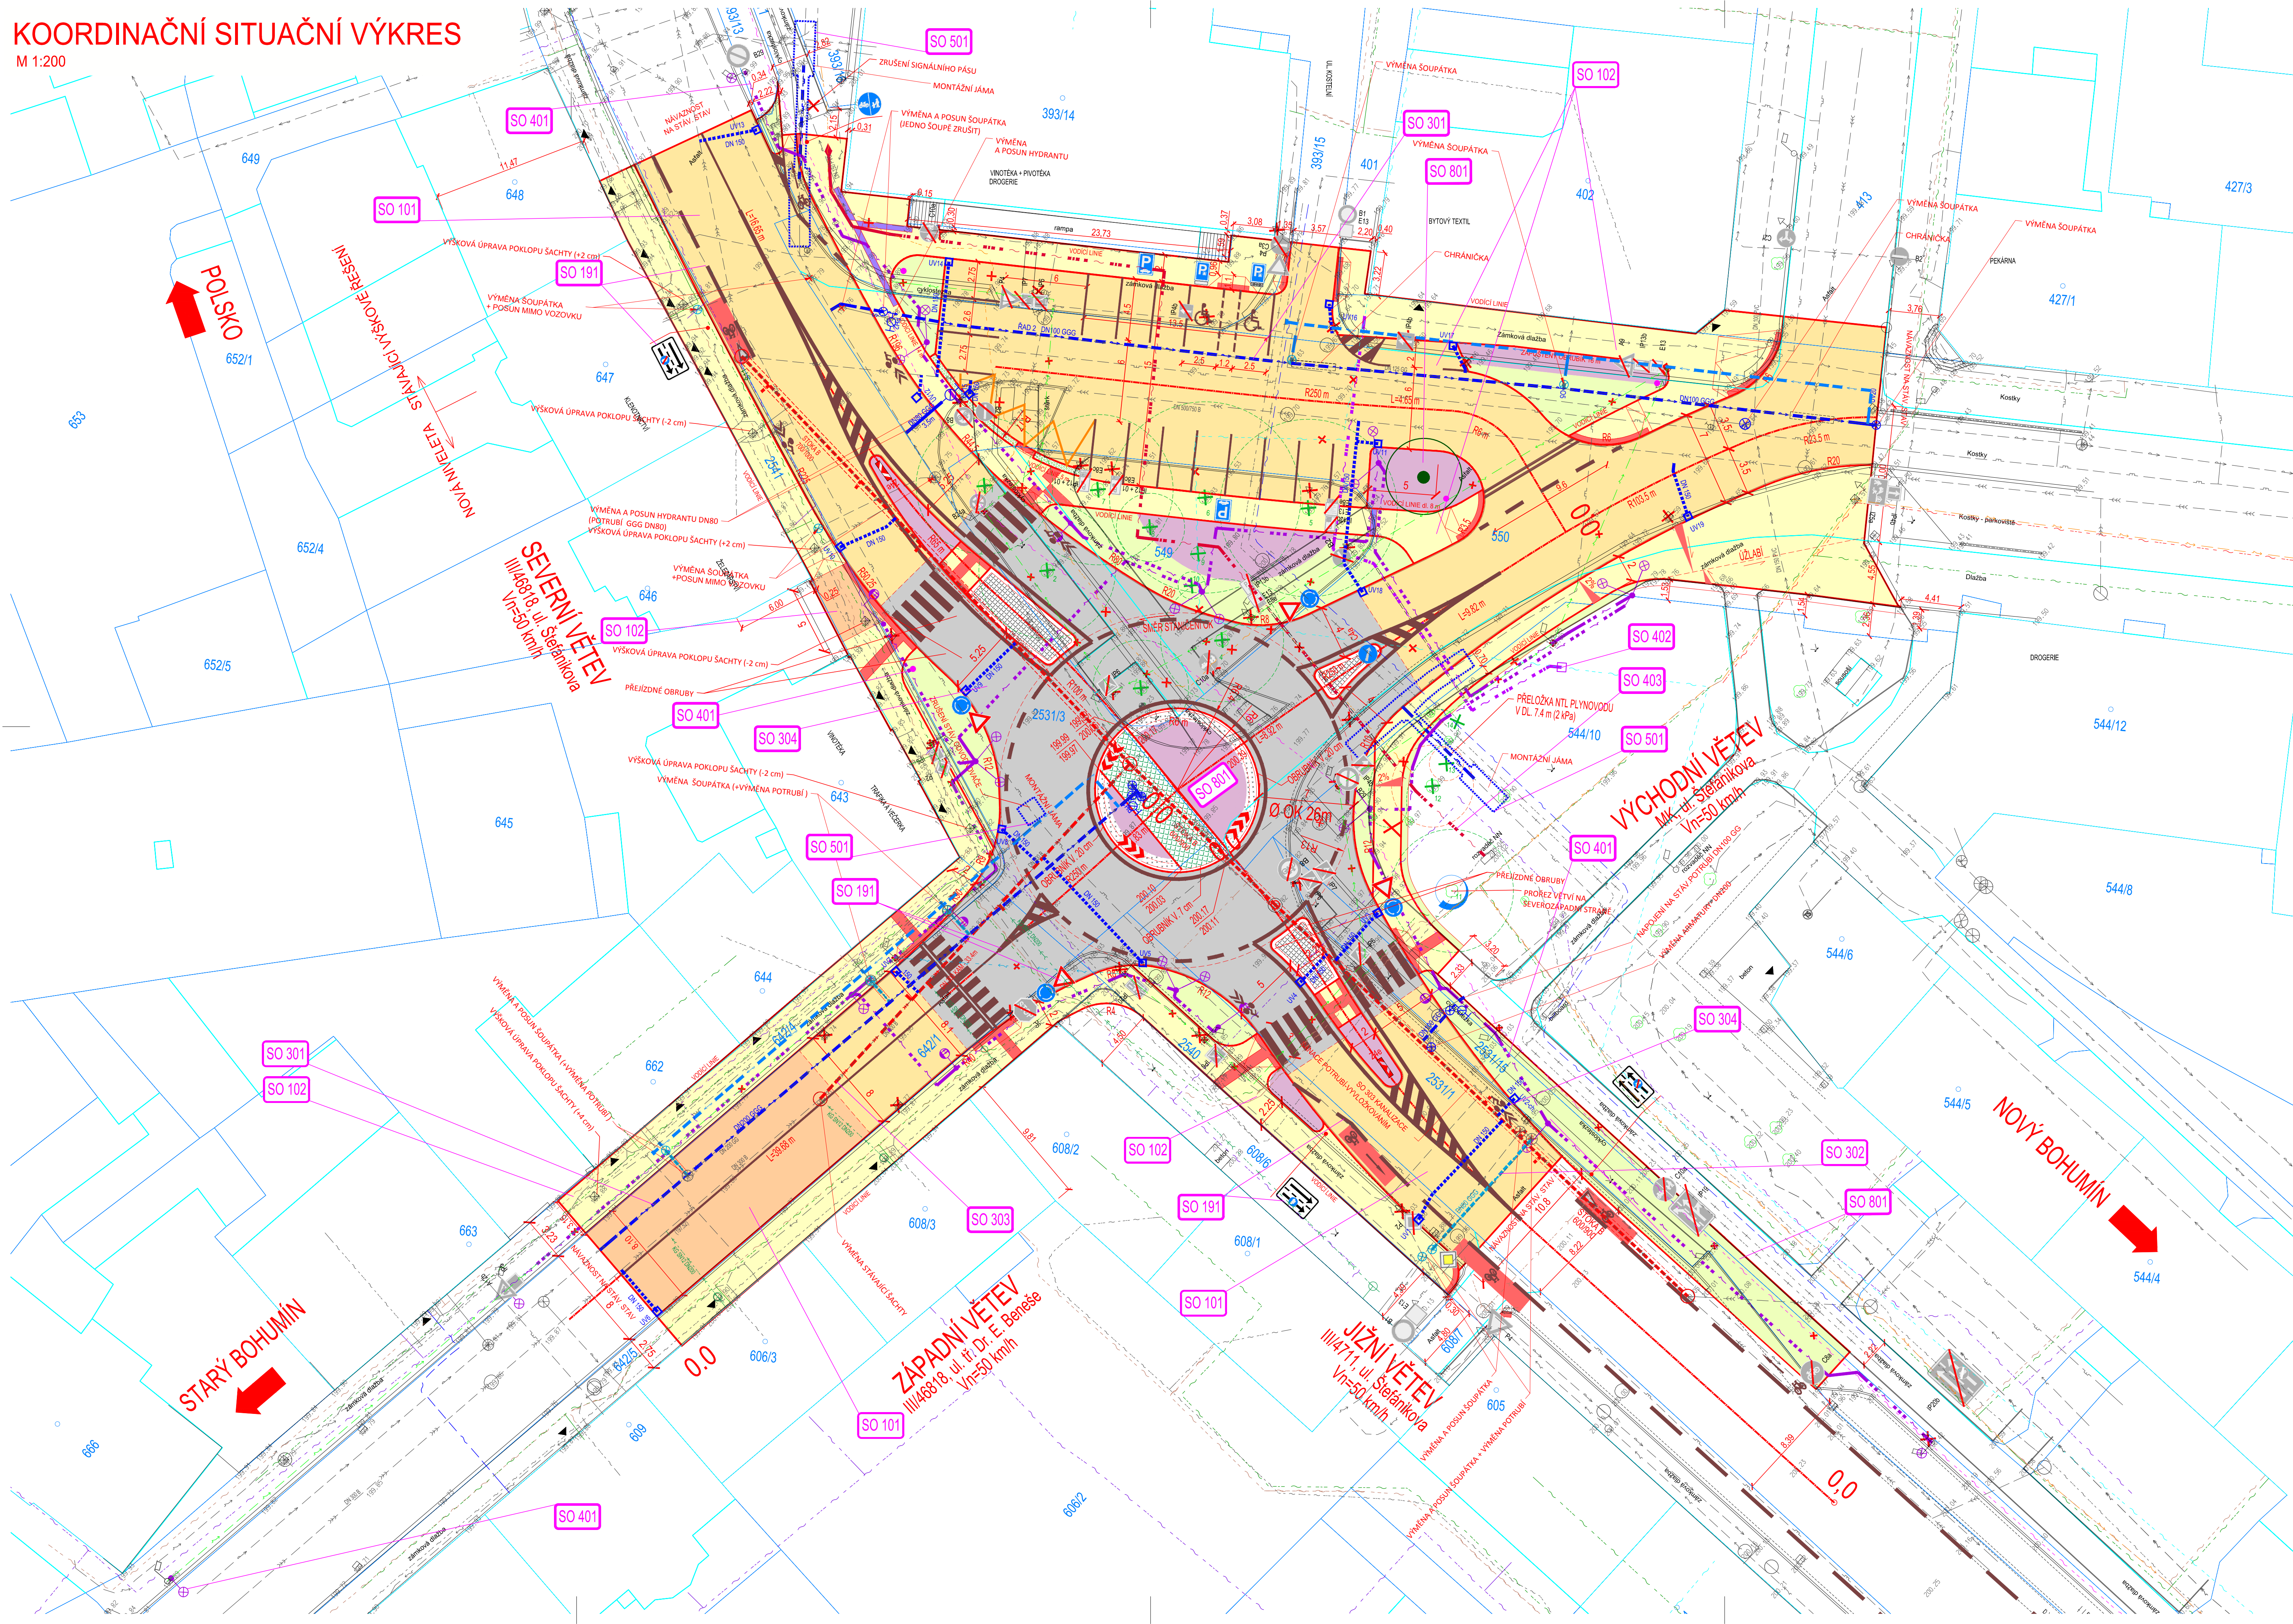

LEGENDA PLOCH:

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ POVRCH

FŘEZOVÁNÍ + POKLÁDKA ASFALTU

CHODNÍKY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

OKRUŽNÍ JÍZDNÍ PÁS - CEMENTOBETONOVÝ POVRCH

ŽULOVÉ KOSTKY

BEZBARIÉROVÉ PRVKY, RELIEFNÍ DLAŽBA

NÁSPY, DOROVNÁVKY TERÉNU

VEGETAČNÍ DLAŽBA

KAČÍREK

UMĚLÁ VODÍČÍ LIE

ZAHONOVÁ VÝSADBA KEŘŮ A TRVALEK

ŠTERKOVÁ PLOCHA

LEGENDA ČAR:

NOVÝ NÁVRH

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

ROZHRANÍ PARCEL DLE KN

ROZHRANÍ PARCEL VNITŘNÍ DLE KN

NAVHOVÁNE VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SADOVÉ ÚPRAVY, DENDROLOGIE:

STÁVAJÍCÍ STROMI MIMO DOSAH STAVBY

NOVÁ VÝSADBA STROMU

STÁVAJÍCÍ STROMI SADOVNICKÁ HODNOTA 3

STÁVAJÍCÍ STROMI SADOVNICKÁ HODNOTA 2

STÁVAJÍCÍ KEŘI SADOVNICKÁ HODNOTA 3

NÁVRH KÁČENÍ

OCHRANA KMEŇE V PRŮBĚHU STAVBY

KLASIFIKACE SADOVNICKÉ HODNOTY DLE MACHOVCE

LEGENDA DZ:

NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA:

RUŠENÍ / DEMOLICE

ODPADKOVÝ KŮŠ

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PŘELOŽKY VODOVODU (SmVak, a. s.) - SO 301

NOVÉ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSŤÍ DN 150 mm (SSMSK, p. o.) - SO 301

SANACE KANALIZACE VÝVLOŽKOVÁNÍM (SmVak, a. s.) - SO 303

NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS) - SO 401

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ EK (NORDIC TELECOM s. r. o.) - SO 402

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ (NEJ. CZ s. r. o.) - SO 403

NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU (GASNET, s. r. o.) - SO 501

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS)

ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS)

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV (ČEZ)

NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV (ČEZ)

HORKOVOD (ČEZ Teplárenská, a. s.)

PLYNOVOD STL (GasNet, s. r. o.)

SÍŤ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (Nordic Telecom Regional, s. r. o.)

PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - PODA

(PŘÍPOLOŽENO K POTRUBÍ TEPOVODU)

VEDENÍ OPTICKÉ TRASY (T-Mobile Czech Republic a. s.)

NADZEMNÍ VEDENÍ (Cetin, a. s.)

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU - (CETIN, a. s.)

SĚLOVACÍ VEDENÍ - SÍŤ S NN, ELEKTROPŘÍPOJKY (Cetin, a. s.)

SĚLOVACÍ VEDENÍ - NEZAMĚŘENÉ (Cetin, a. s.)

ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ - VYTVOŘENÝ (NEJ. CZ s. r. o.)

ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ NEZAMĚŘENÉ (NEJ. CZ s. r. o.)

VODOVOD (SmVak)

JEDNOTNÁ KANALIZACE (SmVak)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (SmVak)

STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ

PŘEDPOKLAD NÁPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PŘEDPOKLAD NÁPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

STAVEBNÍ OBJEKT

NÁZEV SO

BUDOUCÍ SPRÁVCE

SO 101

OK + NÁPOJENÍ ULIC TR. DR. E. BENEŠE A ŠTEFÁNKOVA

SSMSK, p. o.

SO 102

NÁPOJENÍ MK VČ. PARKOVIŠTĚ

MĚSTO BOHUMÍN

SO 191

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SPRÁVCE KOMUNIKACE

SO 192

PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZHOTVITEL STAVBY

SO 301

VODOVOD

SmVak, a. s.

SO 302

ÚPRAVY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Vlastníci objektů

SO 303

KANALIZACE

SmVak, a. s.

SO 304

PŘÍPOJKY OD ULIČNÍCH VPUSŤÍ

Správa komunikace

SO 401

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

B. M. Servis, a. s.

SO 402

PŘELOŽKA VEDENÍ EK SPOLEČNOSTI NORDIC TELECOM

NORDIC TELECOM, s. r. o.

SO 403

PŘELOŽKA VEDENÍ EK SPOLEČNOSTI NEJ. CZ

NEJ. CZ, s. r. o.

SO 501

PLYNOVOD

GASNET, s. r. o.

SO 801

SADOVÉ ÚPRAVY

VLASTNÍK POZEMLKU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYRACOVAL
Ing. Káča Borková
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Taláček, Ph.D.
OBEK. KRAJ
MĚSTO BOHUMÍN
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
INVESTOR / UDRŽOVATEL
MĚSTO BOHUMÍN
MASARYKOVA 155, 735 01 BOHUMÍN

KONTROLOVAL
Ing. Jiří Taláček, Ph.D.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jiří Taláček, Ph.D.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM
JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM
BAL T. p. v.

NAZEV AKCE

OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA ULIC ŠTEFÁNKOVA, TR. DR. E. BENEŠE – BOHUMÍN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jiří Taláček, Ph.D.

ARCHIVNÍ ČÍSLO
212ak021
DATUM
SRPEN 2023
FORMÁT
10 x A4
MĚŘÍTKO
1:200
STUPĚN PD
DPS
C. VÝKRESU
C.2





SITUACE S VYZNAČENÍM UMÍSTĚNÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY

- V ÚZEMÍ



- V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

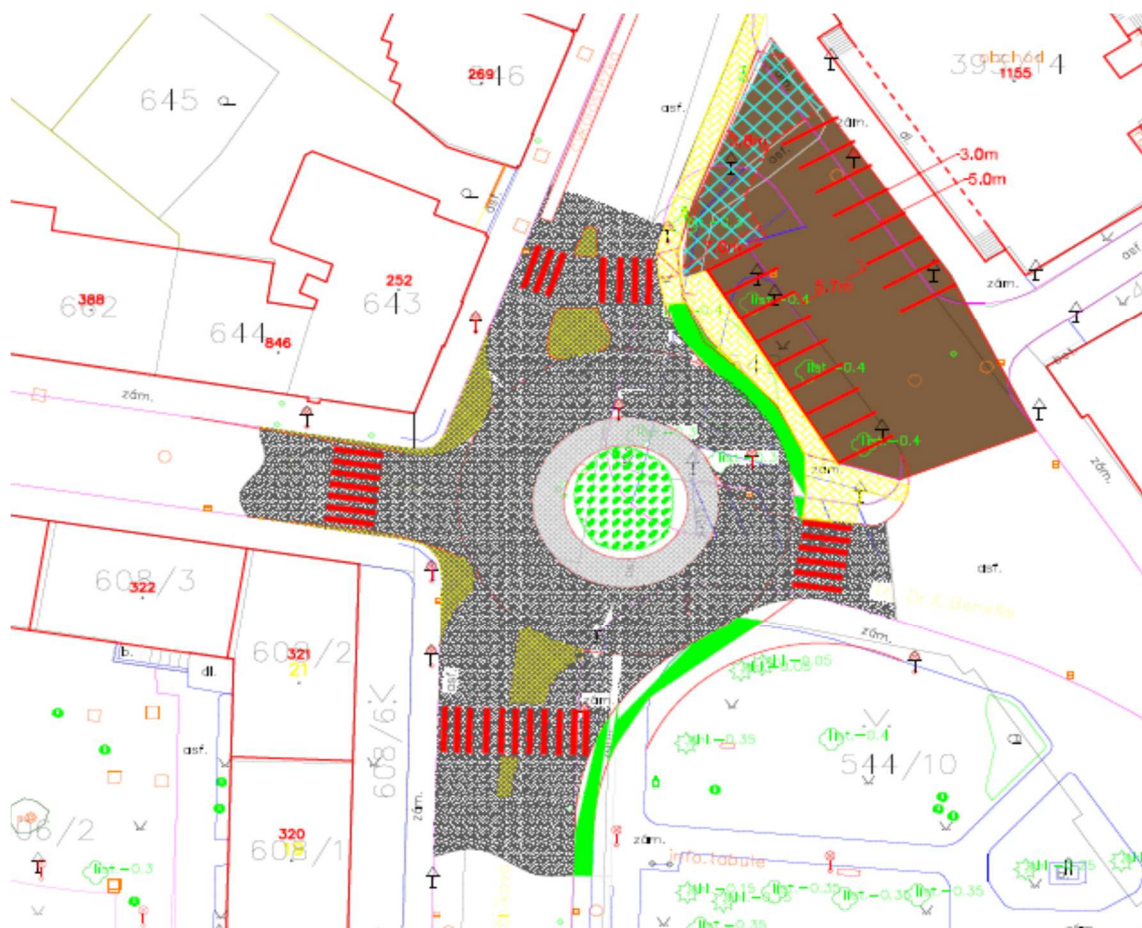

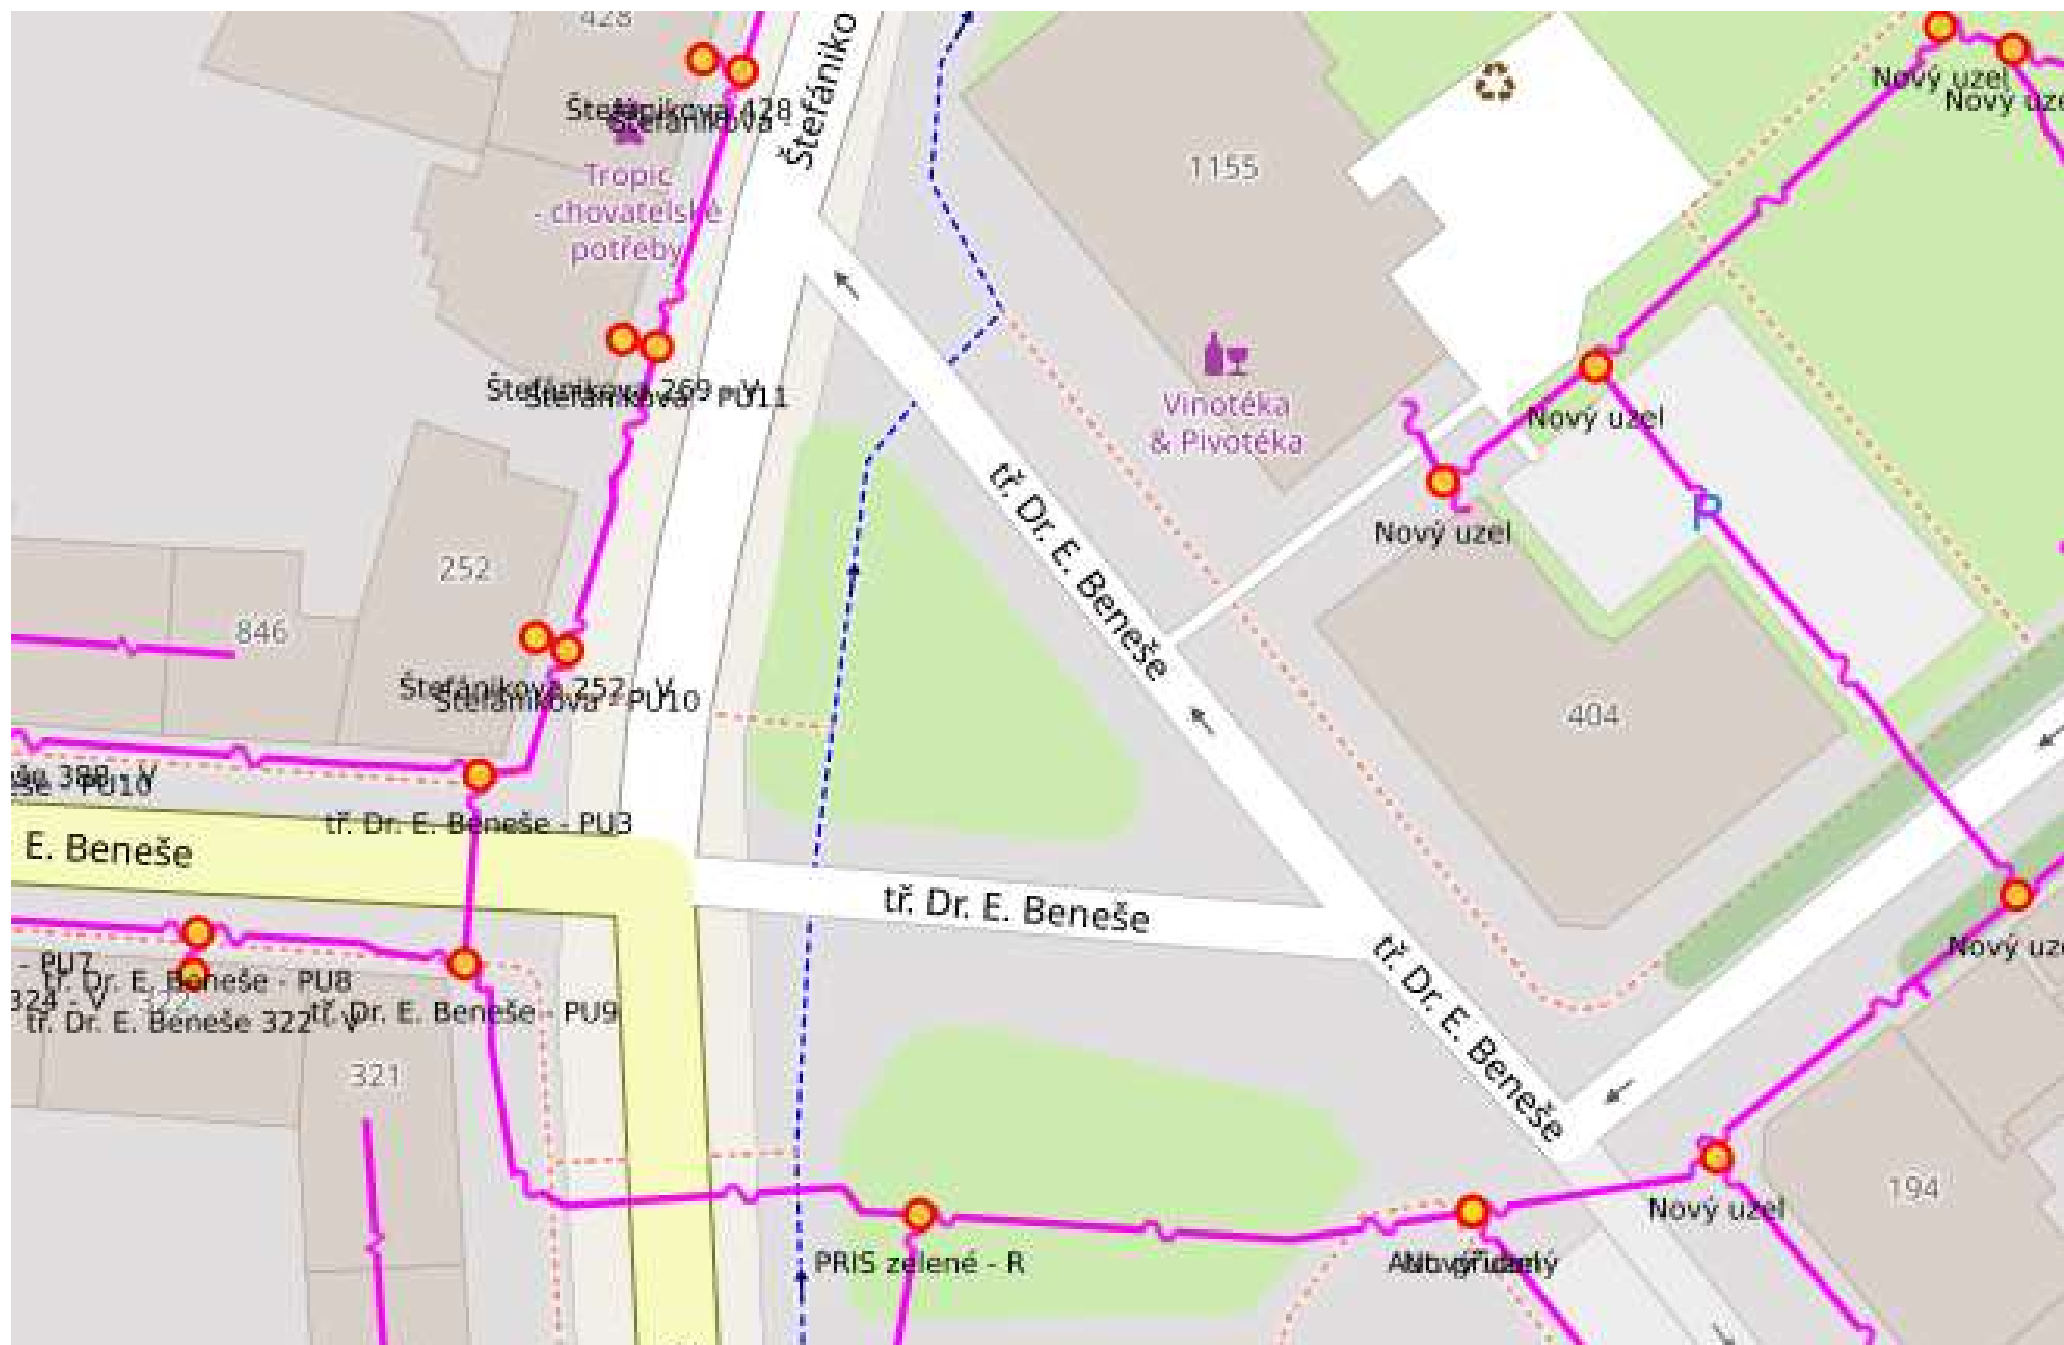

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	393/16
Obec:	Bohumín [599051]
Katastrální území:	Nový Bohumín [707031]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	403
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.02.2025 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	393/11
Obec:	Bohumín [599051]
Katastrální území:	Nový Bohumín [707031]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	538
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

✱ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.02.2025 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	550
Obec:	Bohumín [599051]
Katastrální území:	Nový Bohumín [707031]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	7245
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.02.2025 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	549
Obec:	Bohumín [599051]
Katastrální území:	Nový Bohumín [707031]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	394
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.02.2025 14:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	544/10
Obec:	Bohumín [599051]
Katastrální území:	Nový Bohumín [707031]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	2885
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Bohumín, Masarykova 158, Nový Bohumín, 73581 Bohumín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

chráněná ložisková území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

☒ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 26.02.2025 14:00.

Specifikace nákladů_VPIC Bohumín, Štefánikova, E. Beneše_NEJ

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2025.02

Položková databáze: 2025.02

Název stavby: VPIC Bohumín, Štefánikova, E. Beneše_NEJ

Číslo SPP prvku: zatím není

Zhotovitel PD: Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.

KPO: Moravskoslezsko

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	39 003,30 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	85 142,81 Kč
MONTÁŽ	94 192,11 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	7 614,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 790,73 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 484,65 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	18 913,09 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	72 443,54 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	52 000,00 Kč

Celkové náklady: 398 739,14 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě		1.00 ks	2 952,00 Kč
955835	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě		1.00 ks	11 662,86 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		1.00 ks	24 388,44 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		54.00 m	1 619,46 Kč
952368 S	Pokládka žlabů TK2,T2N		6.00 m	754,38 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové - kvalifikovaná		12.00 hod.	8 140,80 Kč
Vytýčení inženýrských sítí				
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		92.00 m	6 796,04 Kč
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		23.00 m	17 610,41 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		34.00 m	34 389,98 Kč
952378 S	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM		4.00 ks	4 026,24 Kč
958789 S	Výměna materiálu pro zához rýhy-vozovka		6.00 m	9 195,42 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice		95.00 m	1 599,80 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		6.00 ks	1 010,28 Kč
MONTÁŽ				
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN		85.00 m	3 844,55 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		100.00 m	6 957,00 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		100.00 m	517,00 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		1.00 ks	226,14 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent		2.00 ks	99,56 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické		1.00 ks	12 300,00 Kč
Koordinace stavby přeložky s generální stavbou				
955283 S	Montáž spojky mechanické		1.00 ks	2 781,23 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb		2.00 ks	132,50 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné		100.00 m	2 274,00 Kč

958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	36 804,87 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	10 147,50 Kč
Přepojení a kontrolní měření koaxiálního kabelu			
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	503,90 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	7 126,62 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	3 102,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	1.00 ks	7 166,30 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	208,94 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 614,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	7 614,89 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	1.00 ks	5 175,84 Kč
Vytýčení souřadnic vytyčovaných bodů pro provedení zemních prací			
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	4 154,02 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 923,38 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	100.00 JV	100,00 Kč
SoSB s Městem Bohumín - předpoklad finanční náhrady za VBŘ			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	3 231,05 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	4 230,22 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1.00 ks	52 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		12.00 ks	546,72 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		57.00 m	273,03 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		200.00 m	456,00 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks	229,82 Kč
320879 S	Materiál pro tratě síťové		45379.00 ks	45 379,00 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		6.00 ks	1 784,52 Kč
408094 S	Páska PVC 38mmx10m antikorozi NITTO		4.00 ks	935,16 Kč
303001 S	Poklop žlabu beton 50x31x6 cm k T2N		12.00 ks	1 054,56 Kč
316166 S	Spojka plastová 125/107mm		18.00 ks	973,26 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		2.00 ks	264,96 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		100.00 m	2 988,00 Kč
302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm		11.00 ks	12 194,05 Kč
302441 S	Trubka vrapovaná 125/107 s lankem		30.00 m	2 222,70 Kč
303483 S	Víčko plastové trubky 125/110 mm		8.00 ks	302,80 Kč
305258 S	Žlab kabelový beton 100x31x26 cm T2N		6.00 ks	2 838,96 Kč
