

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **SML1-38/2017**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-4190/2017**

s názvem

Rušení kolejových vah Adamov, Čejč, Hrušovany nad Jevišovkou, Jihlava město

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

TOMI – REMONT a.s.

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2501

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

- 1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
- 1.4 Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“);
 - Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
 - České technické normy a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací;
 - Výzva k podání nabídky ze dne 07.06.2017, č.j. 13408/2017-SŽDC-OR BNO-NPI včetně příloh č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6;
 - Nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2017, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 21.07.2017, č.j. 14939/2017-SŽDC-OR BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OR) Brno,
 - Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby, a pokud budou objednatel uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

- 3.1 Název díla: „Rušení kolejových vah Adamov, Čejč, Hrušovany nad Jevišovkou, Jihlava město“.
- 3.2 Předmětem díla je ve smyslu ust. § 2587 OZ rušení kolejových vah Adamov, Čejč, Hrušovany nad Jevišovkou, Jihlava město v rozsahu dle zadávací dokumentace v obvodu dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. v rozsahu dále specifikovaném v oceněných výkazech výměr - příloha č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, řádně a ve sjednané době a objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 3.3 Místem provedení díla viz. §§ 2088, 2599 OZ je obvod dráhy na pozemcích Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s.

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním objednateli v termínech:
- 4.1.1. zahájení prací: po podpisu smlouvy
- 4.1.2. dokončení prací: listopad 2017

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 1 488 919,-Kč
(slovy bez DPH: jedenmiliónčtyřistaosmdesátosmtisícdevětsetdevatenáct korunčeských)

- 5.2 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 6.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 6.5 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatelem, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele denně po celou pracovní dobu.

- 6.7 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku objednatele, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.
- 6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve věci provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud se bude objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.6.7. této smlouvy.
- 6.9 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.
- 6.10 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 6.11 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Dílo se považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 6.12 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 6.13 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel.
- 6.14 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyložené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.

- 6.15 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.
- 6.16 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a pod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit.
- 6.17 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 6.18 V případě svařečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svařečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svařečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svařečem podmínky zajištění požárně bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svařečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svařečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).
- 6.19 V případě prací na bezстыkové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 „Bezстыková kolej“ v platném znění.
- 6.20 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady pořizené v průběhu realizace díla:
- dokumentaci skutečného provedení
 - geodetické zaměření
 - doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - průkazy UTZ
 - atesty od použitých materiálů
 - originál stavebního deníku
- 6.21 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví.

Čl. 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 7.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy je stanovena čl. 11 Obchodních podmínek Oblastního ředitelství Brno ze dne 1.7.2015. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy prokazatelně převezme objednatel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 8. Platební podmínky

- 8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ nebo dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 8.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění..
- 8.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

a zasílány na korespondenční adresu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,

Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43

- 8.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

- 8.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 8.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.
- 8.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 8.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Čl. 9. Smluvní pokuty

- 9.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení.
- 9.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele.
- 9.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - odřekne předem projednanou výluky nebo
 - změní termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.

- 9.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky:
- do 60 min.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a);
 - od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b);
 - od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c);
 - při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. d).
- Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 9.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
- 9.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 9.10 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 9.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

Čl. 10. Oprávnění zástupce objednatele

10.1

10.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:

- provádí a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu,
- je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru,
- zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
- při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku,
- provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
- provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
- v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce,
- rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímk a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
- zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,
- kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 11. Předání a převzetí díla

11.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve stanovených termínech.

- 11.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.
- 11.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 11.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 11.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 12.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- 12.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).
- 12.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 12.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 12.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Brně dne 07.08.2017

V Prostějově dne 31.07.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TOMI – REMONT a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

IC: 70992

34

ředitel Oblastního ředitelství Brno


předseda představenstva člen představenstva

TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Průmyslovka 2514/4 30
796 01 PROSTĚJOV
IČ 255 085 71, DIČ CZ25508571

REKAPITULACE

Rušení kolejových vah Adamov, Čejč, Hrušovany nad Jevišovkou, Jihlava město			1 488 918,51
Zrušení kolejové váhy Čejč			
SO1	Demolice váhy		
SO2	Železniční svršek		
VRN	VRN		
Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou			
SO1	Demolice váhy		
SO2	Železniční svršek		
VRN	VRN		
Zrušení kolejové váhy Adamov			
SO1	Demolice váhy		
SO2	Železniční svršek		
SO3	Úprava kabelových rozvodů		
VRN	VRN		
Rušení kolejové váhy Jihlava město			
Objekt 01	Železniční svršek		
Objekt 02	Demolice váhy		
Objekt 03	VRN		

Kód klasifikace produkce CZ-CPA : 42.12.20

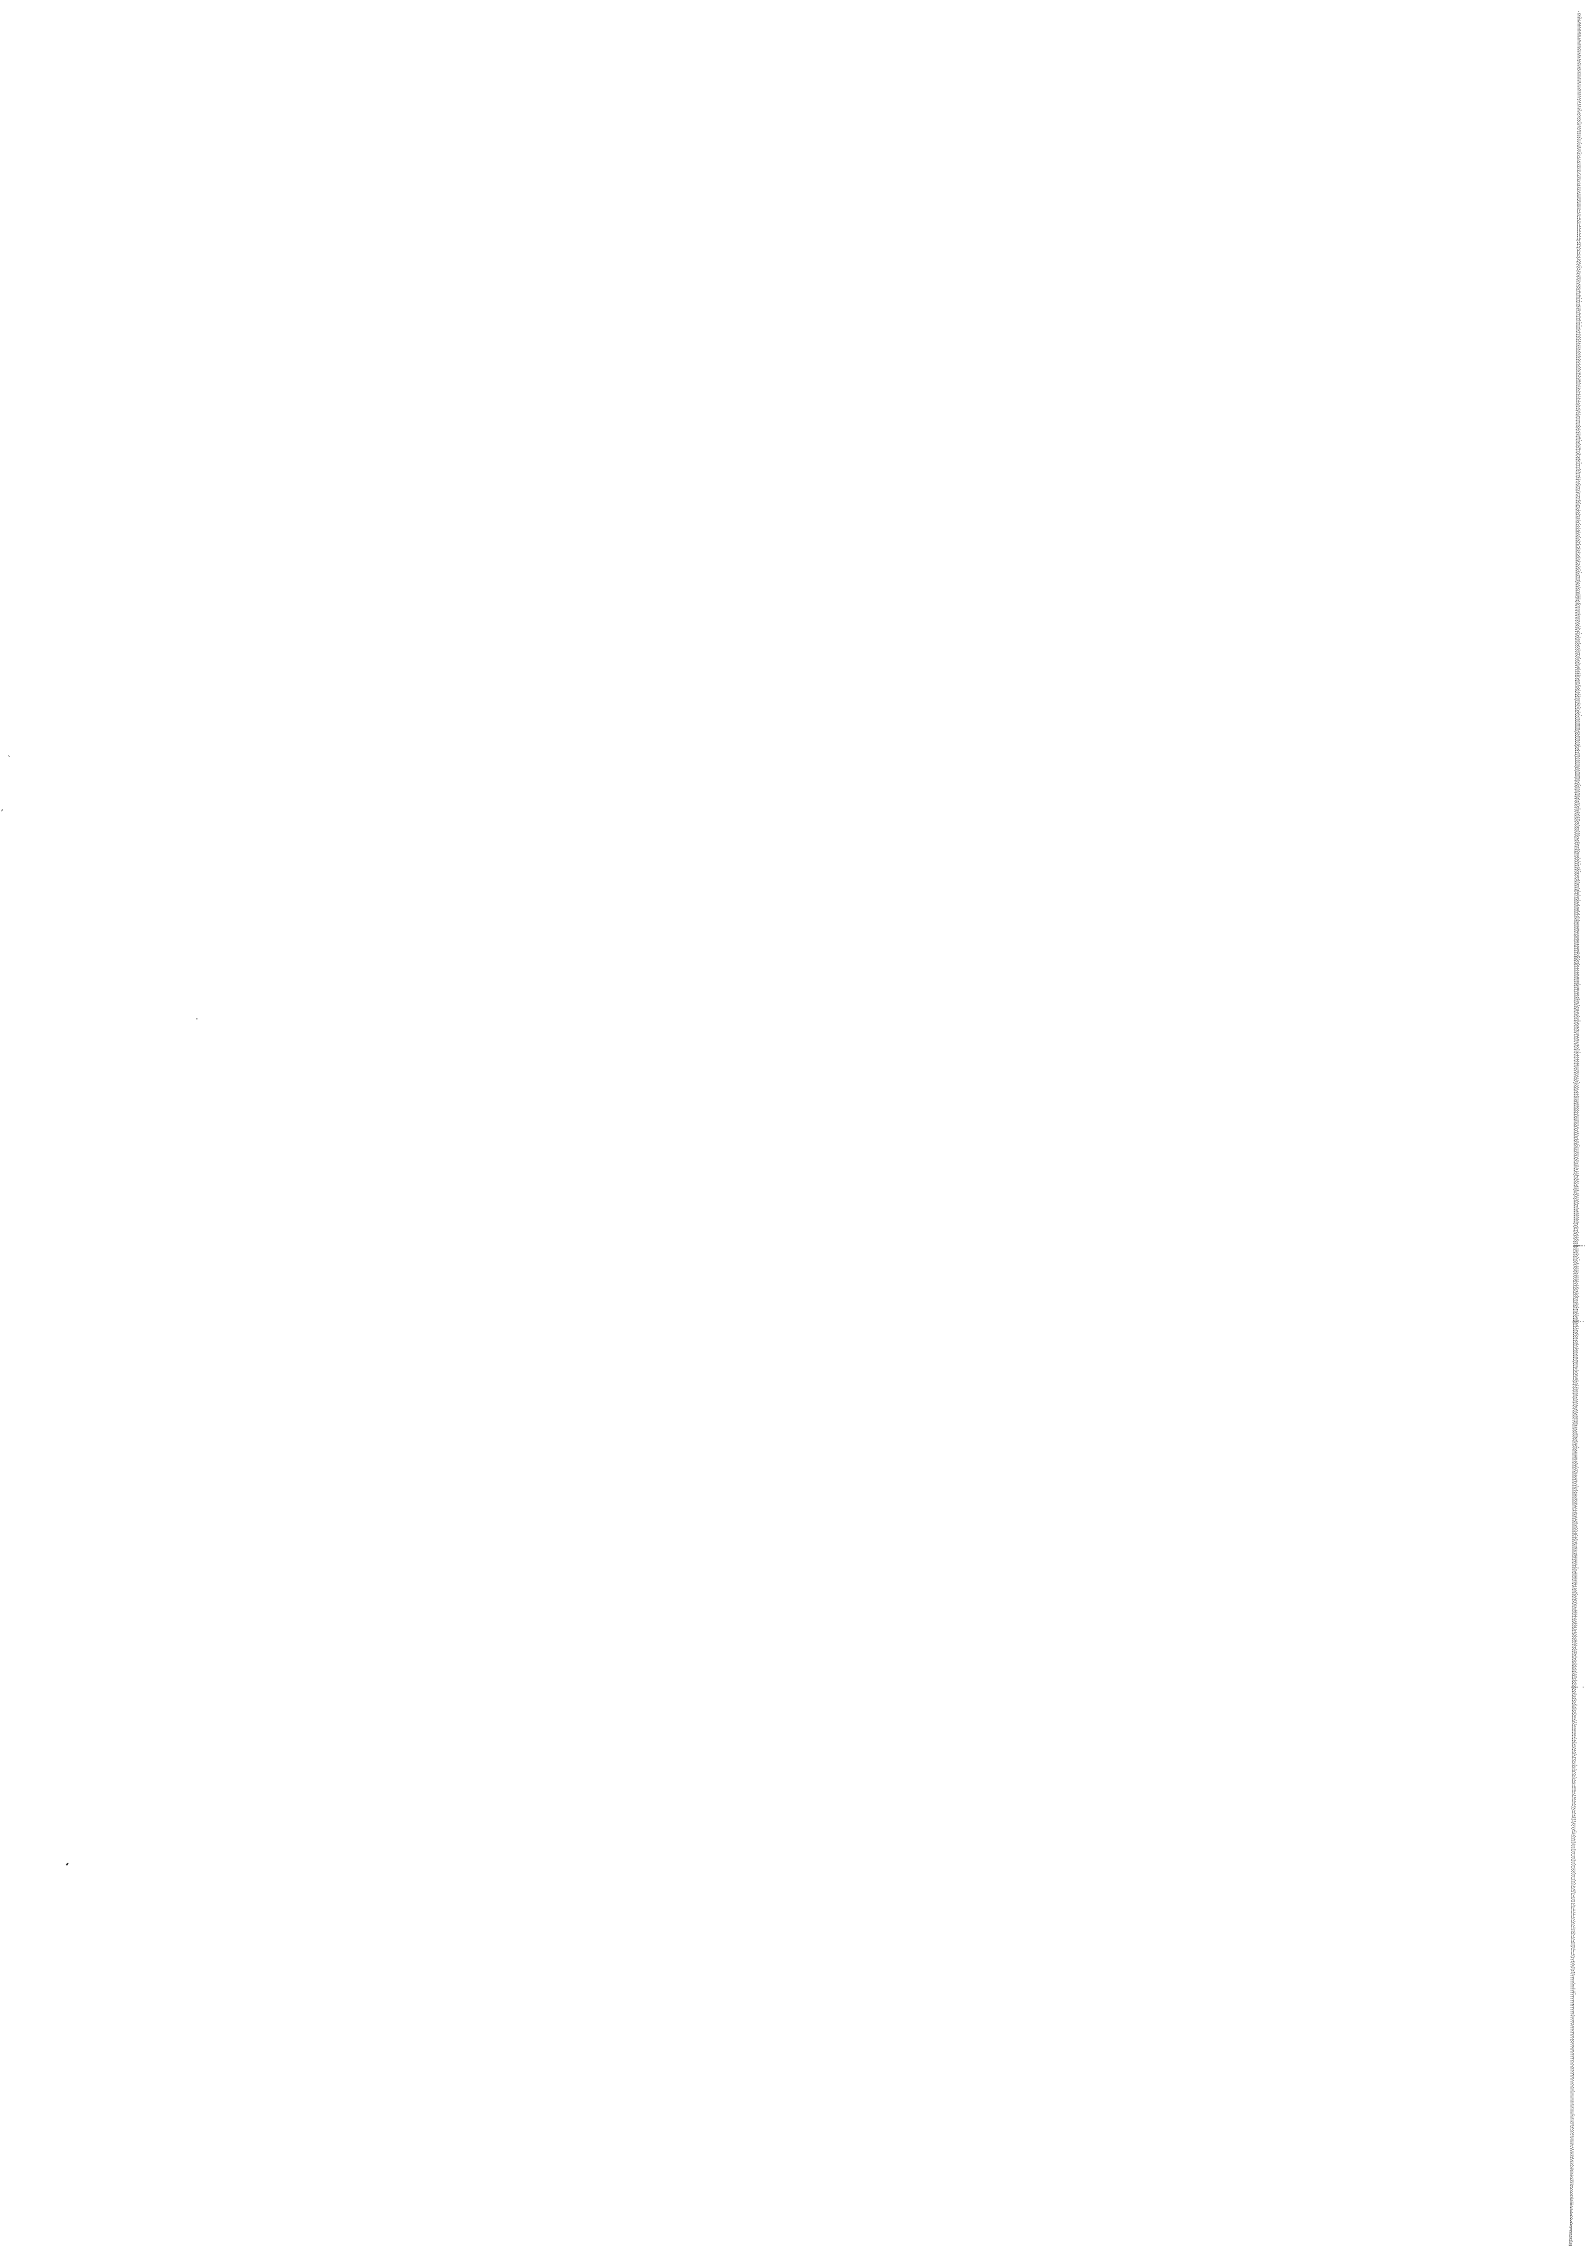

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018-548_TU2091
Stavba: Zrušení kolejové váhy Čejč

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.2.2017

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:
DIČ:
IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Uchazeč:
TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018-548_TU2091

Stavba: Zrušení kolejové váhy Čejč

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

SO1	Demolice váhy
SO1	Demolice váhy
SO2	Železniční svršek
SO2	Železniční svršek
VRN	VRN
VRN	VRN

22.2.2017

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

SO1 - Demolice váhy

Soupis:

SO1 - Demolice váhy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

S01 - Demolice váhy

Soupis:

S01 - Demolice váhy

Místo:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

SO1 - Demolice váhy

Soupis:

SO1 - Demolice váhy

Místo:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	115201601	Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200	hod				
2	K	119001421	Dobasné zajistění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopistře ve stavu i potoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m				
3	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3				
VV		"kolem váhy" 16,2						
4	K	122212502	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 nesoudržných	m3				
5	K	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3				
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
VV		4,28 "zásyp kanálu a jámy pod vážním domkem "						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		12,9*1,35"zásyp dna jámy směsí štěrkopísku a sutí (12,9m2-plocha zásyvu v podélném řezu)"					
	WV		Součet					
7	M	583373680	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná	t				
	WV		(21,7-6,85)*1,8					
8	K	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze štěrkodrtě	m3				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3				CS ÚRS 2017 01
	D	4	Vodorovné konstrukce					
10	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
11	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3				CS ÚRS 2017 01
12	M	313166590	sít' výztužná svařovaná, 150 x 150 mm, D 5 mm, 3 x 2 m	kus				CS ÚRS 2017 01
13	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3				CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
	WV		"vážní jáma+vážní kanál" 6,85					
15	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
16	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m				
	D	99	Přesuny hmot a sutí					
17	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t				


P

Poznámka k položce:
vážní zařízení

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	330590072	Opravy vah a vážících aparátů Demontáž+ rozřezání autogen rámu kolej váhy, délka mostu do 10 m	kus	■	■	■	CS ÚRS 2017 01
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				■0	
19	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	■	■	■	CS ÚRS 2017 01
20	K	R02	Dvoucestný bagr	SH	■	■	■	

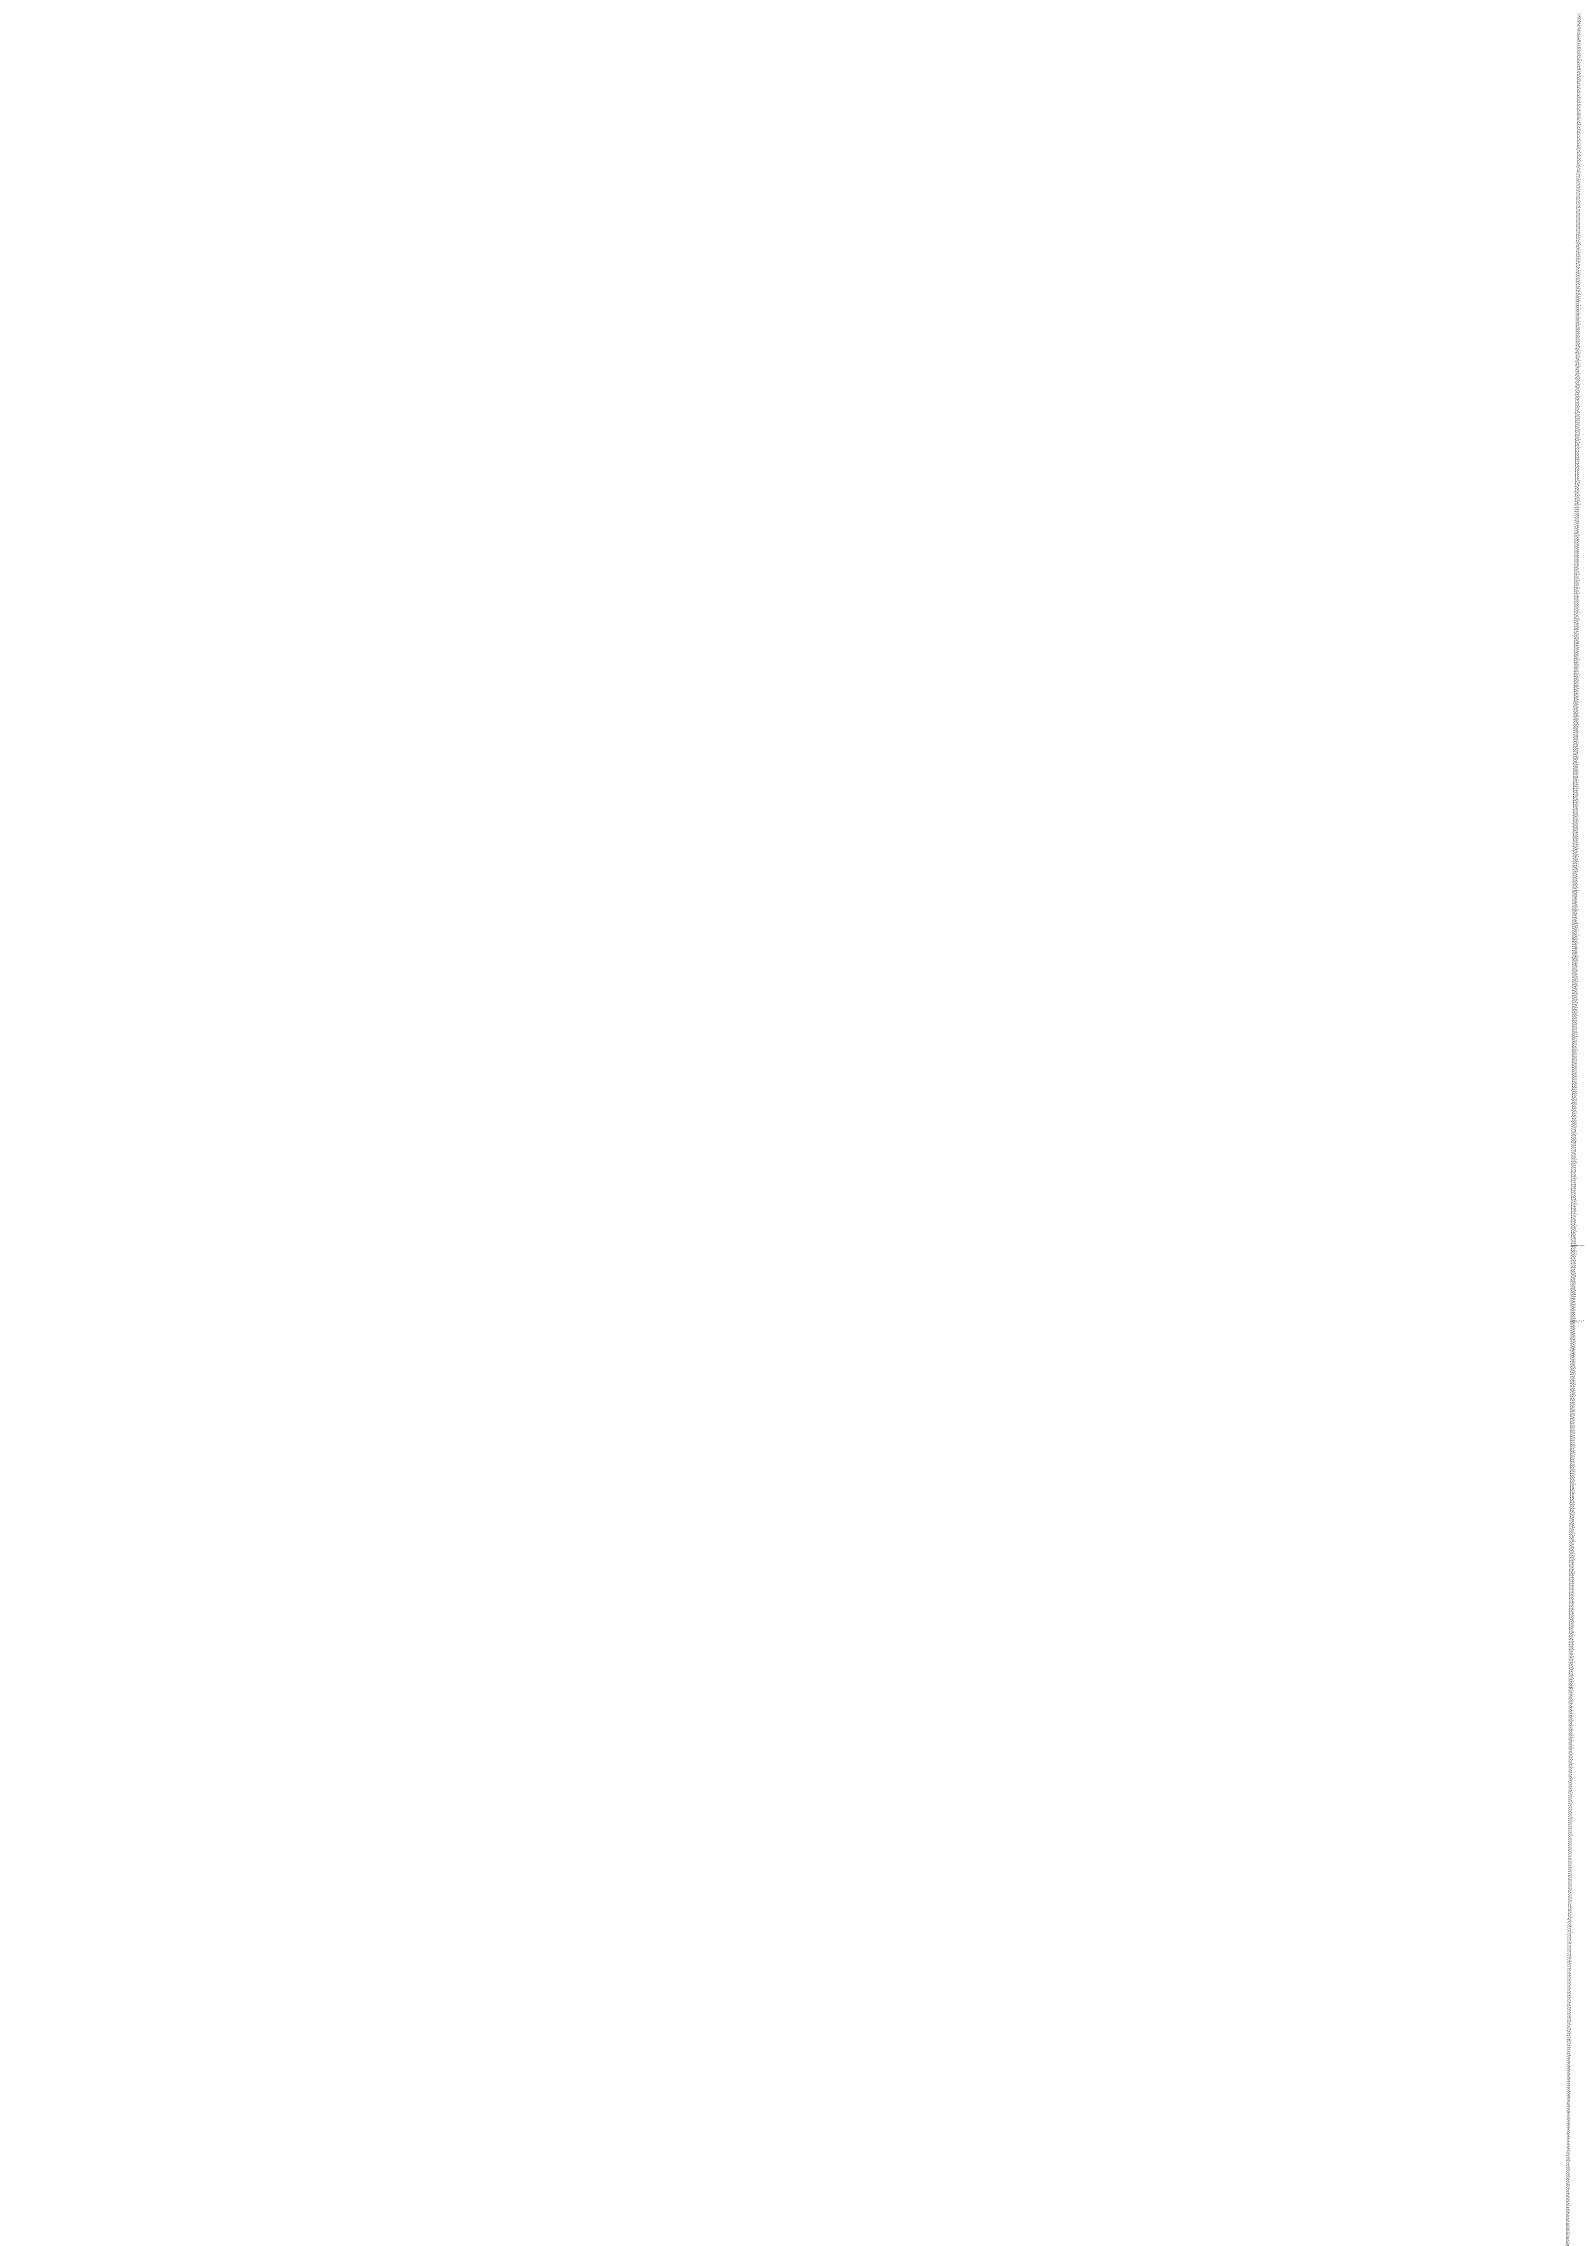

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

S02 - Železniční svršek

Soupis:

S02 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 22.2.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

S02 - Železniční svršek

Soupis:

S02 - Železniční svršek

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

Datum: 22.2.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.2. Položka se použije v případech, kdy se nové KL nezřizuje.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
3	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km				Sborník UOŽI 01 2017
4	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus				Sborník UOŽI 01 2017
5	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus				Sborník UOŽI 01 2017
6	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.	km	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
8	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
9	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr koleje=m					
10	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

██████████

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Čejč

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 22.2.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%				Sborník UOŽI 01 2017

P

Poznámka k položce:
6%

2	K	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou	kus				Sborník UOŽI 01 2017
3	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>štěrka</i>					
4	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km <i>Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>	t	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>převoz bet. pražců z Nematic</i>					
5	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot <i>Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.</i>	t	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pražce SB8</i>					
D		VRN3	Zařízení staveniště					■
6	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	■	■	■	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vybudování příjezdové komunikace/ provizorního přejezdu</i>					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					■
7	K	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	%	■	■	■	CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>% z ceny montáže - denní doprava pracovníků na pracoviště + přeprava na další objekty, a to autem, případně pěší</i>					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 126-545_TU2081

Stavba: Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

KSO:

Místo:

CC-CZ: 21211

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 126-545_TU2081

Stavba: Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Místo: Datum: 19.12.2016

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO1	Demolice KV			STA
SO1	Demolice KV			Soupis
SO2	Železniční svršek			STA
SO2	Železniční svršek			Soupis
VRN	VRN			STA
VRN	VRN			Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

SO1 - Demolice KV

Soupis:

SO1 - Demolice KV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

SO1 - Demolice KV

Soupis:

SO1 - Demolice KV

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

S01 - Demolice KV

Soupis:

S01 - Demolice KV

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	115201601	Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200	hod				CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--	--	--	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odsávání a čerpání vody ve dne i v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na odsávací a čerpací zařízení sestávající ze dvou centrifugálních čerpadel, dvou centrifugálních vývěv a tlakového kotle. Jedno z těchto čerpadel a jedna z těchto vývěv jsou předpokládány v pohotovosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce potřebné pro vytvoření prostoru pro všechna zařízení a snižování hladiny podzemní vody čerpacími jehlami; tyto práce se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části. 4. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je odsávací a čerpací stanice v provozu. Doba, po kterou není stanice v provozu, se neoceňuje. Výjimku činí přerušení na dobu 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby odsávání a čerpání neodečítá.

2	K	119001421	Dobasne zajisteni podzemního potrubí nebo vedení ve vykopisti ve stavu i protoze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m				CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vykopávky: a) příkopů pro železnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky těchto příkopů samostatným objektem; b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto vykopávky souvisejí územně s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu železnic; c) při zahlubování železnice při mimoúrovňovém křížení a pro vykopávky pod mosty vybudovanými v předstihu, pokud vzdálenost vnějších hran mostu, měřená ve svislé rovině proložená podélnou osou procházející železnice, nepřesahuje 15 m. Je-li tato vzdálenost větší, oceňují se náklady na vykopávky pod mostem cenami do 100 m3 pro jakýkoliv objem vykopávky; d) sejmutí podorničí. 2. Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. Je-li při odkopávce nebo prokopávce pro spodní stavbu železnic mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž podle projektu nemá být zemními pracemi rušen provoz, nepovažuje se vodorovné přemístění výkopku z výkopiště za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, ať je šířka pláňe spodku jakákoliv. Toto vodorovné přemístění se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

5	K	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3				CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vykopávky: a) příkopů pro železnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky těchto příkopů samostatným objektem; b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto vykopávky souvisejí územně s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu železnic; c) při zahlubování železnice při mimoúrovňovém křížení a pro vykopávky pod mosty vybudovanými v předstihu, pokud vzdálenost vnějších hran mostu, měřená ve svislé rovině proložená podélnou osou procházející železnice, nepřesahuje 15 m. Je-li tato vzdálenost větší, oceňují se náklady na vykopávky pod mostem cenami do 100 m3 pro jakýkoliv objem vykopávky; d) sejmutí podorničí. 2. Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. Je-li při odkopávce nebo prokopávce pro spodní stavbu železnic mezi výkopištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž podle projektu nemá být zemními pracemi rušen provoz, nepovažuje se vodorovné přemístění výkopku z výkopiště za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, ať je šířka pláňe spodku jakákoliv. Toto vodorovné přemístění se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
	VV		2,6 "zásyp kanálu a jámy pod vážním domkem "					
	VV		12,9*1,35"zásyp dna jámy směsí štěrkopísku, vyzískaného KL a suti (12,9m2-plocha zásypu v podélném řezu)"					
	VV		Součet					
7	M	583373680	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná	t				
	VV		(20,015-6,14-0,8-6,66)*1,8					
8	K	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze štěrkodrtě	m3				CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro pražcové podloží podle vzorového listu ČD Ž 4. 2. V cenách je započteno i případné zřízení jednotlivých typů pražcového podloží po vrstvách. 3. V cenách -1813 až -1834 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou. 4. V cenách -1813 a -1814 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně ztratného ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1813 26,55 kg/m², b) u ceny -1814 37,17 kg/m². 5. V cenách -1823 a -1824 jsou započteny i náklady na dodání vápna v množství 2,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně ztratného ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1823 13,28 kg/m², b) u ceny -1824 18,59 kg/m². 6. V cenách -1833 až -1834 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 3,5 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně dohodnutého ztratného ve výši 1 %, to je: a) u ceny -1833 18,59 kg/m², b) u ceny -1834 26,02 kg/m². 7. Pokud projekt u upravených zemín předepisuje jinou tloušťku nebo inženýrsko-geologický průzkum jiné množství pojiva než je uvedeno v cenách -1813 až -1834, lze tyto práce ocenit cenami souboru cen 561 0. Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.</p>					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
9	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m ²				CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³				CS ÚRS 2017 01
	VV		"vážní jáma+kanál" 6,14+0,8					
	VV		"základové pasy pod vážním domkem" 2,016					
	VV		Součet					
11	K	962032432	Bourání zdiva nadzakladoveno z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³				CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</p>					
12	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m ³				CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m³ včetně dutin.</p>					
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³				CS ÚRS 2017 01
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m				CS ÚRS 2017 01
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtu.</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	99		Přesuny hmot a sutí						
15	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t				CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.						
D	997		Přesun sutě						
16	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
VV			"zdivo" 3,4*1,9						
VV			"beton podlah" 0,94*2,2						
VV			"stropní konstrukce" 0,97*2,2						
VV			"základové pasy domek" 2,25*2,2						
VV			Součet						
17	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
P			<i>Poznámka k položce:</i> předpokládaná vzdálenost skládky 10 km						
VV			9*15,612						
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t				CS ÚRS 2017 01	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.						
VV			"beton podlah" 0,94*2,2						
VV			"stropní konstrukce" 0,97*2,2						
VV			"základové pasy domek" 2,25*2,2						
VV			Součet						
19	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t				CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

S02 - Železniční svršek

Soupis:

S02 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	K	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	km				Sborník UOŽI 01 2017
2	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t				Sborník UOŽI 01 2017
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3				Sborník UOŽI 01 2017

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017

P

*Poznámka k položce:
dosypávka nad úložnou plochu pražce*

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 19.12.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 19.12.2016

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:


Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	030001000	Základní členění VRN Zařízení a vybavení staveniště	ks				Sborník UOZI 01 2017
D		VRN3	Zařízení staveniště					
2	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	ks				CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Zřízení provizorního přejezdu</i>					
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					
3	K	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	%				CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: % z ceny montáže - denní doprava pracovníků na pracoviště + přeprava na další objekty, a to autem, případně pěši</i>					

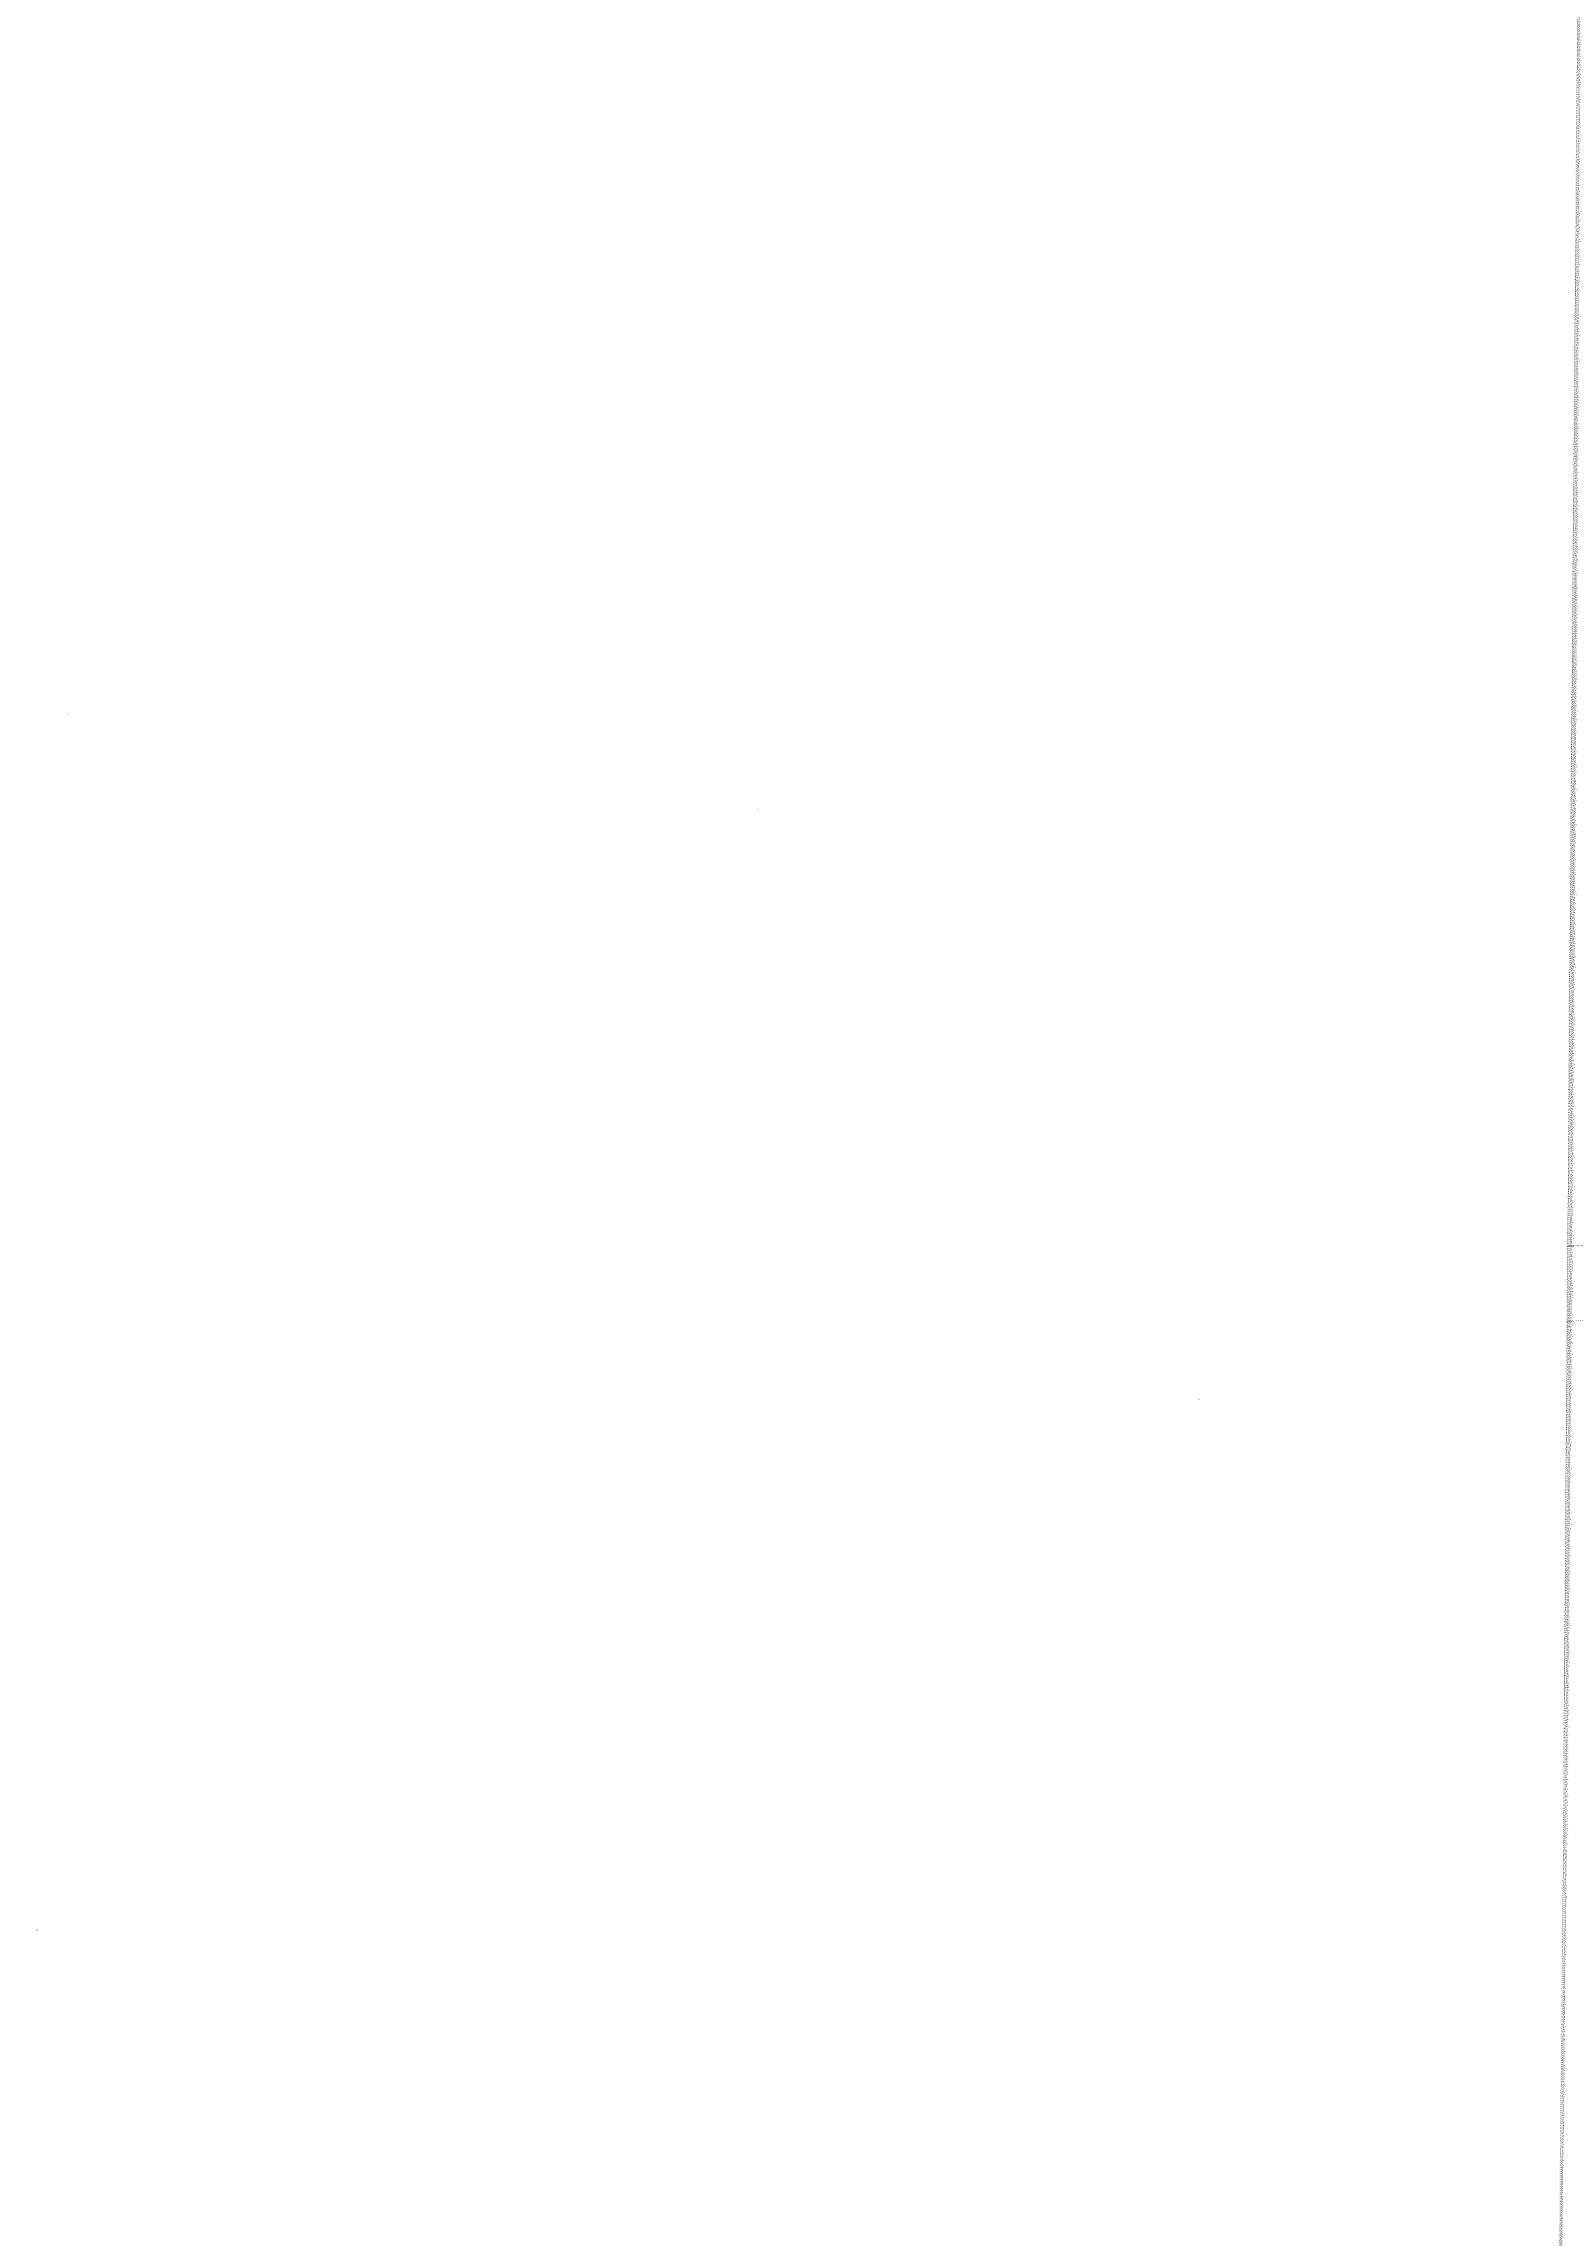

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171-100_TU2002
Stavba: Zrušení kolejové váhy Adamov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:
TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171-100_TU2002

Stavba: Zrušení kolejové váhy Adamov

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

S01	Demolice KV
S01	Demolice KV
S02	Železniční svršek
S02	Železniční svršek
S03	Úprava kabelových rozvodů
S03	Úprava kabelových rozvodů
VRN	VRN
VRN	VRN

28.4.2017

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis
[REDACTED]	[REDACTED]	STA
[REDACTED]	[REDACTED]	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

S01 - Demolice KV

Soupis:

S01 - Demolice KV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 28.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

██████████

Základ daně

██████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

██████████

0,00

v CZK

██████████

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO1 - Demolice KV

Soupis:

SO1 - Demolice KV

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO1 - Demolice KV

Soupis:

SO1 - Demolice KV

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	115201601	Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200	hod				
2	K	119001421	časné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopávce ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m				
3	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3				
4	K	122212502	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 nesoudržných	m3				
5	K	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3				
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				
VV		"zásyp kanálu a jámy pod vážním domkem " 3						
VV		"zásyp dna jámy směsí štěrkopísku a suti" 50,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zásyp jímký" 13,5					
	VV		Součet					
7	M	583373680	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce netříděná	t				
	VV		(67-12,2-2,2)*1,8					
8	K	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze štěrkodrtě	m3				
	VV		14*2,9*0,2					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
9	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
10	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
	VV		"vážní jáma+kanál" 12,2					
	VV		"základové pasy pod vážním domkem" 4					
	VV		"jímka" 2,2					
	VV		Součet					
11	K	962032432	Bourání zaiva nadzakladoveno z cihel nebo tvarnic z dutých cihel nebo tvarnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3				
12	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3				CS ÚRS 2017 01
13	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3				
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m				
	VV		"vážní jáma" 6*0,7					
	VV		"jímka" 2*0,5					
	VV		Součet					
	D	99	Přesuny hmot a sutí					
15	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce do 5 t	t				
	P		Poznámka k položce: Vážní mechanismus					
	D	997	Přesun sutě					
16	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				
	VV		"zdívo" 9*1,9					
	VV		"beton podlah" 1,12*2,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stropní konstrukce" 3,3*2,2					
	VV		"základové pasy domek" 4,125*2,2					
	VV		Součet					
17	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				
	P		<i>Poznámka k položce: předpokládaná vzdálenost skládky 10 km</i>					
	VV		9*35,899					
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t				
	VV		"beton podlah" 1,12*2,2					
	VV		"stropní konstrukce" 3,3*2,2					
	VV		"základové pasy domek" 4,125*2,2					
	VV		Součet					
19	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t				CS ÚRS 2017 01
	VV		"zdívo" 9*1,9					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
20	K	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných	m2				
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh					
21	K	330590075.1	Opravy vah a vážicích aparátů Demontáž+ rozřezání autogen rámu kolej váhy, délka mostu do 13 m	kus				
	P		<i>Poznámka k položce: délka konstrukce 14,0 m</i>					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
22	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km				CS ÚRS 2017 01
23	K	R02	Dvoucestný bagr	SH				

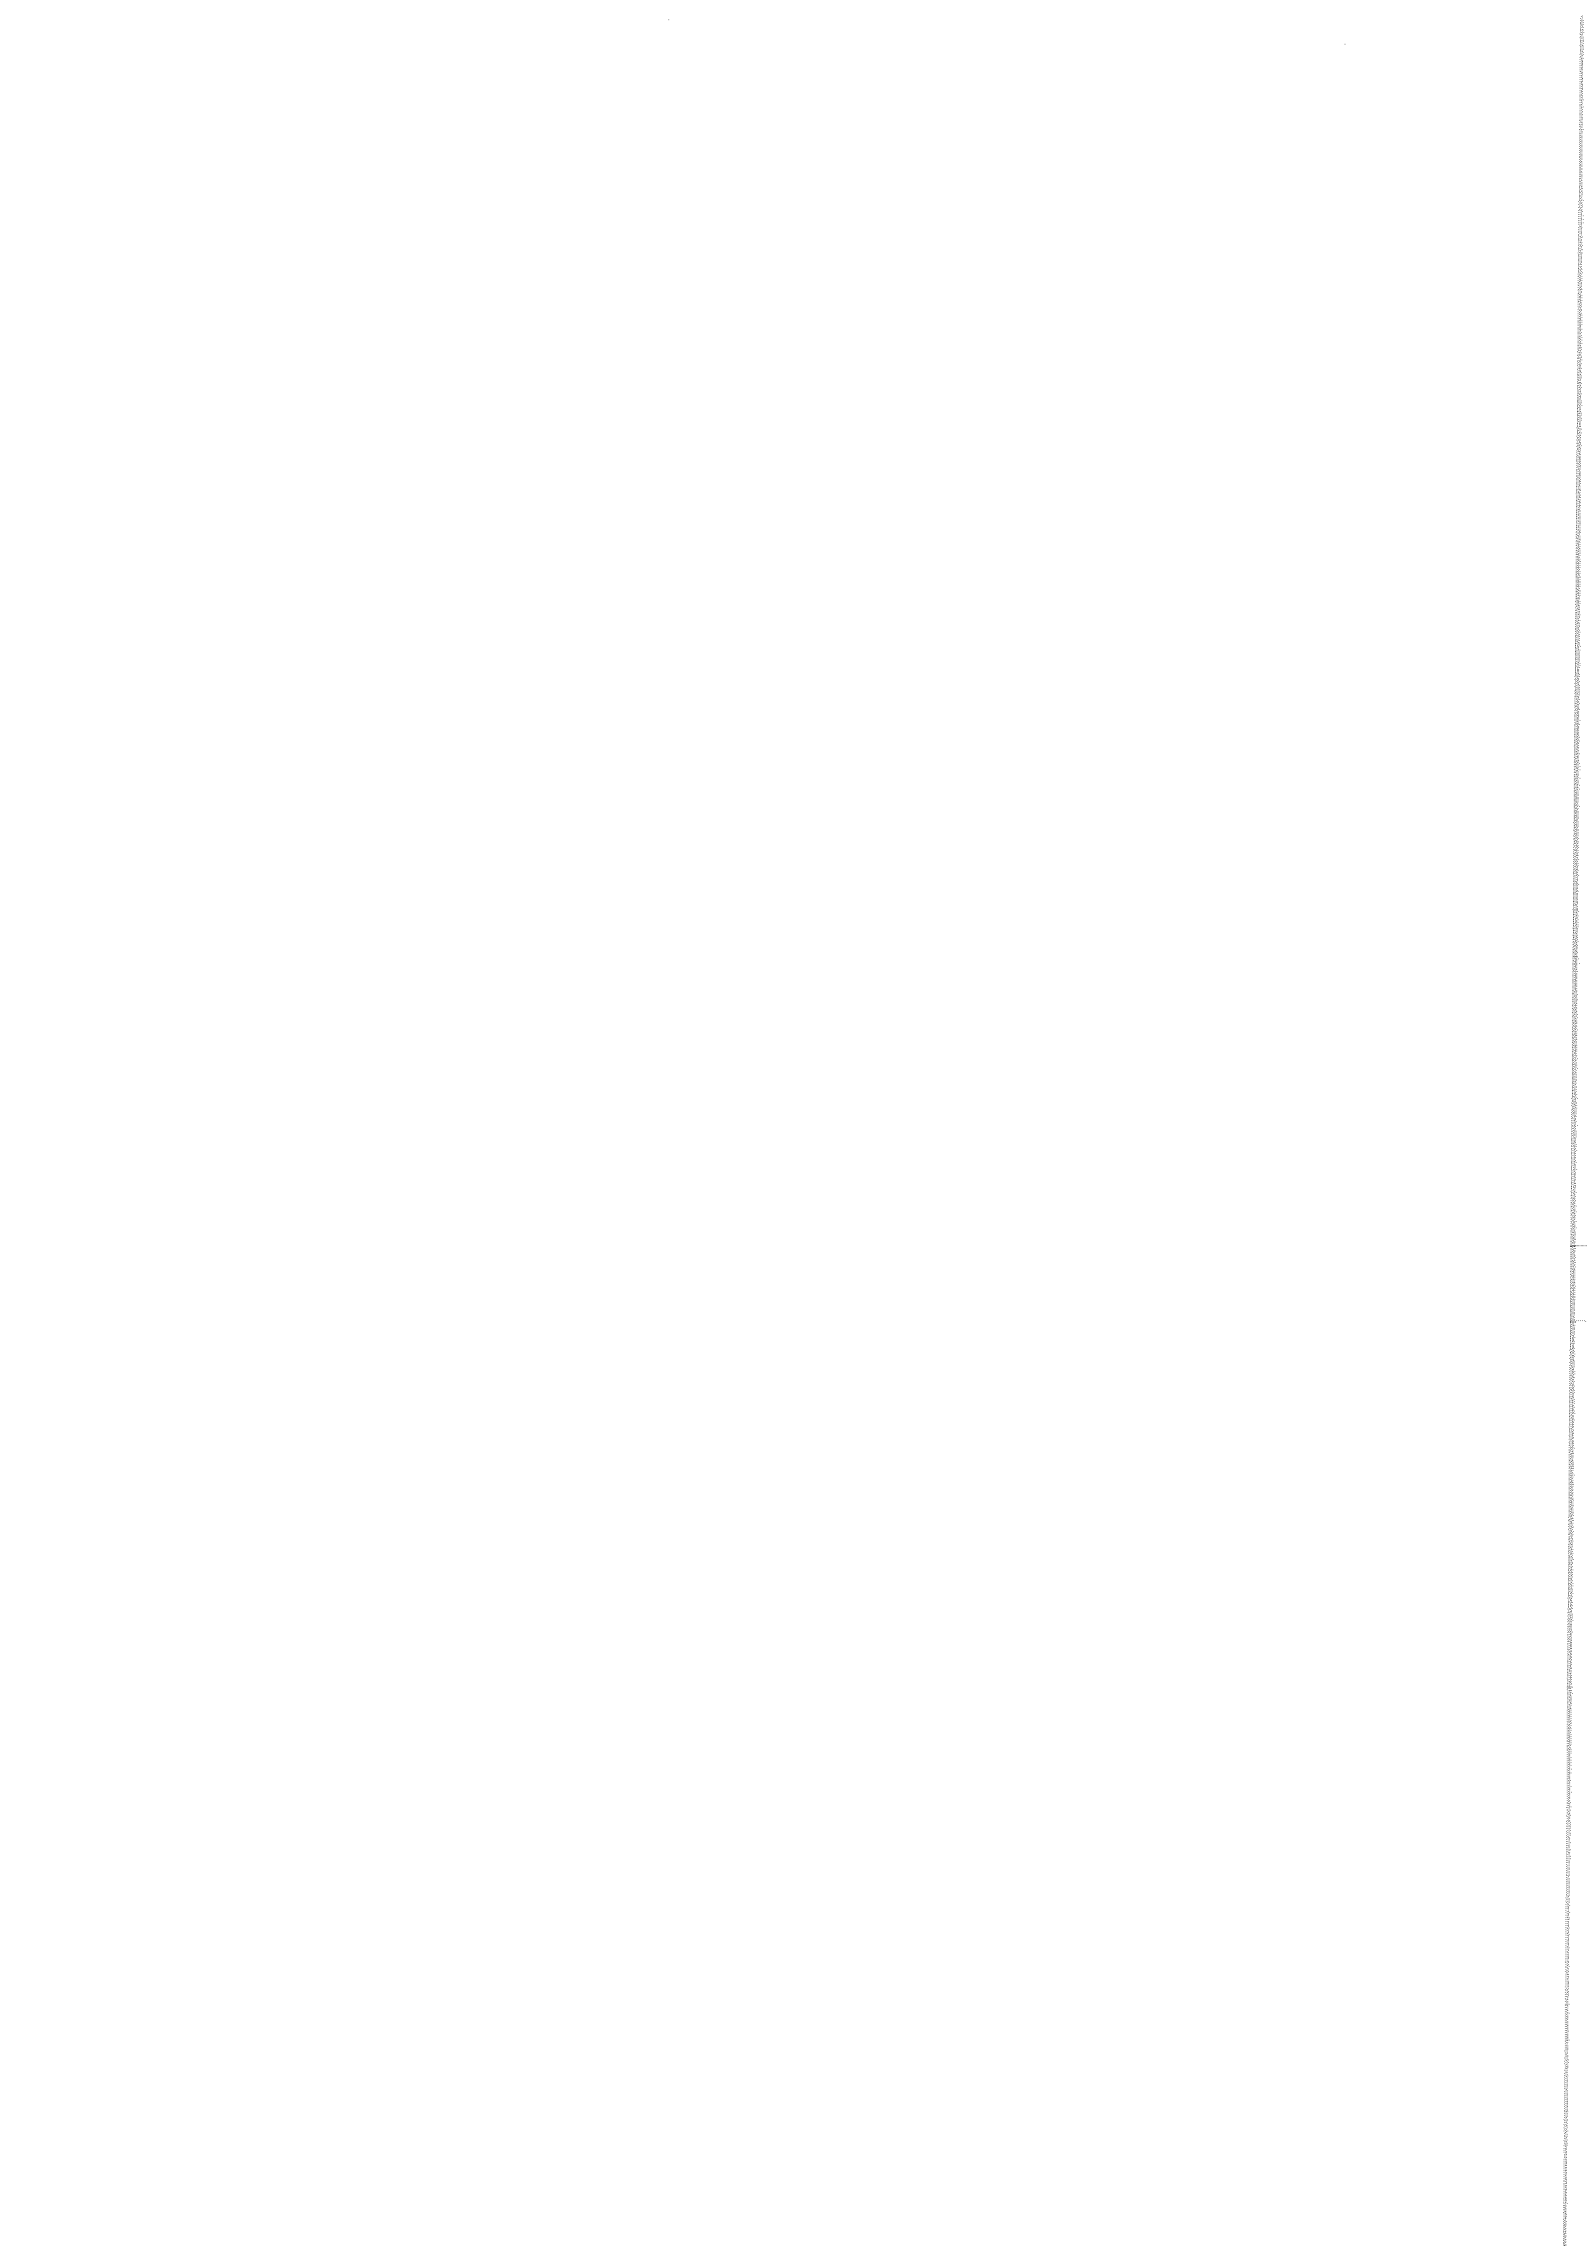

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 28.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO2 - Železniční svršek

Soupis:

SO2 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 0

D HSV

Práce a dodávky HSV


D 5

Komunikace pozemní

1	K	5905025110	Doplnění stezky sterkoortci souvisle. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva	m3				Sborník UOŽI 01 2017
2	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t				Sborník UOŽI 01 2017
3	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t				Sborník UOŽI 01 2017
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva.	m3				Sborník UOŽI 01 2017
9	K	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku materiálu.	km				Sborník UOŽI 01 2017
10	K	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m				Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m</p>					
11	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přízdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.	m	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m</p>					
12	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Řez=kus</p>					
13	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Spojka=kus</p>					
14	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
15	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
16	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	■	■	■	Sborník UOŽI 01 2017
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
19	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
P			<i>Poznámka k položce: drobné kolejivo</i>					
20	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
P			<i>Poznámka k položce: štěrk</i>					
22	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017
23	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t				Sborník UOŽI 01 2017



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

Soupis:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.4.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

Soupis:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní

Datum: 28.4.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

Soupis:

SO3 - Úprava kabelových rozvodů

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	M	Práce a dodávky M						
1	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m				
2	K	132102601	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v horninách tř. 1 a 2	m3				
3	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m				
4	M	611553100	fólie PE 0,2 mm šíře 2 m	m2				
5	M	7492600190	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x16	m				
6	M	7492700270	Ukončení vodičů a kabelů Nn Ukončení kabelu kabelovou spojkou pro 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus				
7	K	460560074	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m				
8	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m				
9	M	7494003390	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus				
10	M	7494003382	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus				
11	M	7494003392	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	7494003406	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA	kus	████	████	████	
13	M	7494003426	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA	kus	████	████	████	
14	M	7494003164	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	████	████	████	
15	M	7494003872	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A	kus	████	████	████	
16	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ²	kus	████	████	████	
17	M	7493600970	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře v provedení kompaktní piliř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, výška do 800mm, hloubka do 320mm	kus	████	████	████	
18	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	████	████	████	
19	M	7491600260	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnicí	kus	████	████	████	

D OST

Ostatní

20	K	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	████	████	████	
----	---	------------	--	-----	------	------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 28.4.2017

IČ:
DIČ:

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

IČ:
DIČ:

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN3 - Zařízení staveniště

██████████

VRN7 - Provozní vlivy

██████████

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zrušení kolejové váhy Adamov

Objekt:

VRN - VRN

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:


Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl				CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: Vybudování příjezdové komunikace/ provizorního přejezdu</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy					
2	K	075103000	Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	kpl				CS ÚRS 2017 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
3	K	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	%				CS ÚRS 2017 01
P			<i>Poznámka k položce: % z ceny montáže - denní doprava pracovníků na pracoviště + přeprava na další objekty, a to autem, případně pěši</i>					



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1801-90,553
Stavba: Rušení kolejové váhy Jihlava město

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.11.2016

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s. IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1801-90,553

Stavba: Rušení kolejové váhy Jihlava město

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

Objekt - 01	Železniční svršek
Objekt - 02	Demolice váhy
Objekt - 03	VRN

21.11.2016

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
--------------------	------------------	-----

██████████

██████████

██████████

████████████████████

██████████

████████████████████

██████████

████████████████████

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 01 - Železniční svršek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 01 - Železniční svršek

Místo:

Datum: 21.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

██████████

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	5908005230	Oprava kolejnicového styku montáž spojky tv. S49. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus				Sborník UOŽI 01 2016
15	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
VV		14						
14	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus				Sborník UOŽI 01 2016
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t				Sborník UOŽI 01 2017
VV		38,43						
12	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t				Sborník UOŽI 01 2016
VV		38,43						
13	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus				Sborník UOŽI 01 2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 02 - Demolice váhy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 02 - Demolice váhy

Místo:

Datum: 21.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 02 - Demolice váhy

Místo:

Datum: 21.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
12	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3				CS ÚRS 2016 02
13	K	122212509	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3				CS ÚRS 2016 02
2	K	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se ztuhnutím	m3				CS ÚRS 2016 02
	VV		8,25*2,4*0,85 + 1,6*1,2*1,3					
3	M	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t				CS ÚRS 2016 02
	VV		Zásyp štěrkokem 50%					
	VV		(8,25*2,4*0,85 + 1,6*1,2*1,3)*0,50*1,5					
D	4		Vodorovné konstrukce					
14	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2				CS ÚRS 2016 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				CS ÚRS 2016 02
	VV		0,55*8,25*1,2*2					
	VV		0,75*1,3*1,3*2					
	VV		0,25*1,325*1,6*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
10	K	962086111	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m ³ , tl. do 150 mm	m ²				CS ÚRS 2016 02
	VV		2,40*3,3*2 + 2,40*1,4*2		0			
11	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m ³				CS ÚRS 2016 02
	VV		3,30*1,4*0,2					
	D	997	Přesun sutě					
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2016 02
	VV		(28,975/1,5-9,65)*10					
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2016 02
	VV		28,975/1,5-9,65					
	D	998	Přesun hmot					
8	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t				CS ÚRS 2016 02
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí					
16	K	430152203	Demontáž mostních provizorií Demontáž mostního provizoria rozpětí přes 11,0 do 13,0 m, dvojčítý nosník	kus				CS ÚRS 2016 02
	VV		"demontáž váhy					
	VV		1		0			
	D	OST	Ostatní					
9	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	■				Sborník UOŽI 01 2015
	VV		"likvidace demontovaných mostnic a prachů					
	VV		"pražce					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 03 - VRN

Místo:

Datum: 21.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TOMI - REMONT a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rušení kolejové váhy Jihlava město

Objekt:

Objekt - 03 - VRN

Místo:

Datum: 21.11.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TOMI - REMONT a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	■	■	■	CS ÚRS 2016 02
2	K	032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	...	■	■	■	CS ÚRS 2016 02
4	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	...	■	■	■	CS ÚRS 2016 02
5	K	039203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	...	■	■	■	CS ÚRS 2016 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3	K	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	■	■	■	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	---	---	---	----------------

